INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090537 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 8´-7´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 8´-7´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 8´-7´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 8´-7´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	206.717,52			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	207.012,34			TOTAL	207.012,34

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

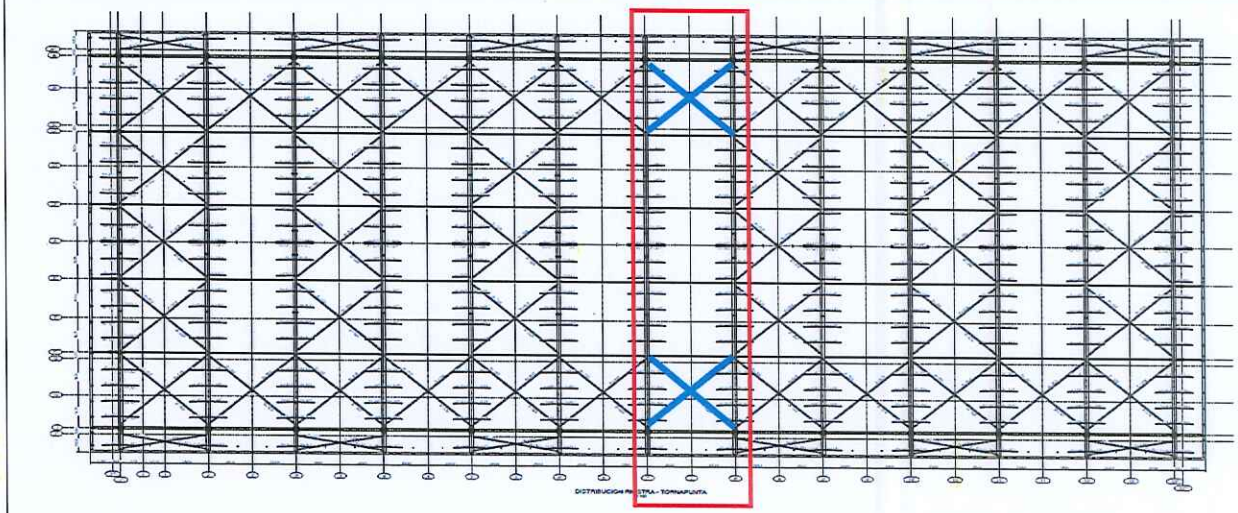

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79680147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 7´-6´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 7´-6´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 7´-6´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 7´-6´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
			P		
VIENEN:	207.012,34			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	207.307,16			TOTAL	207.307,16

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

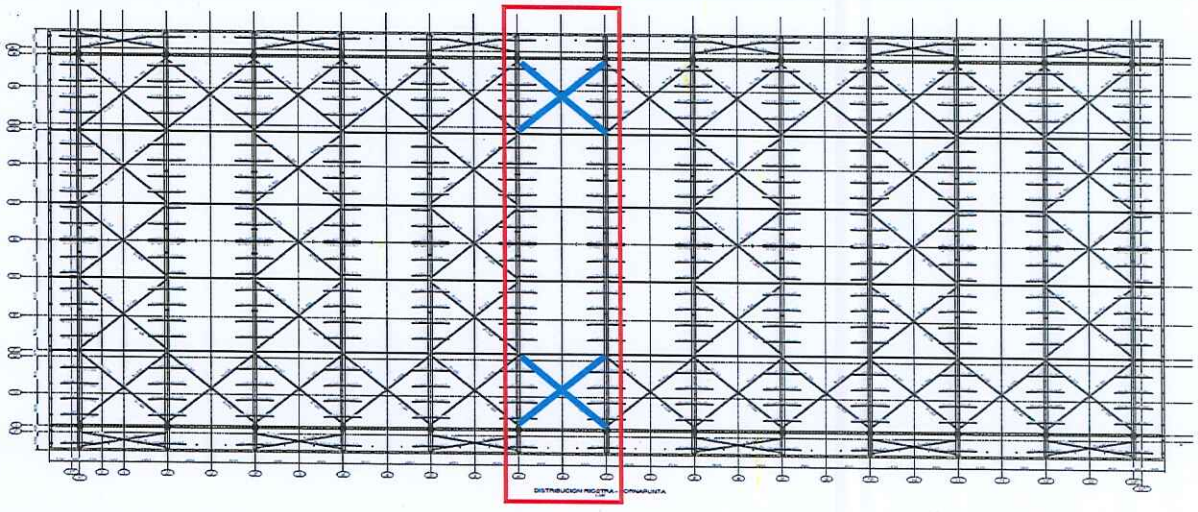

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-000337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA / KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 6´-5´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 6´-5´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 6´-5´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 6´-5´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 6´-5´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 6´-5´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 6´-5´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 6´-5´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 6´- 5´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 6´- 5´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	207.307,16			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	208.007,61			TOTAL	208.007,61

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

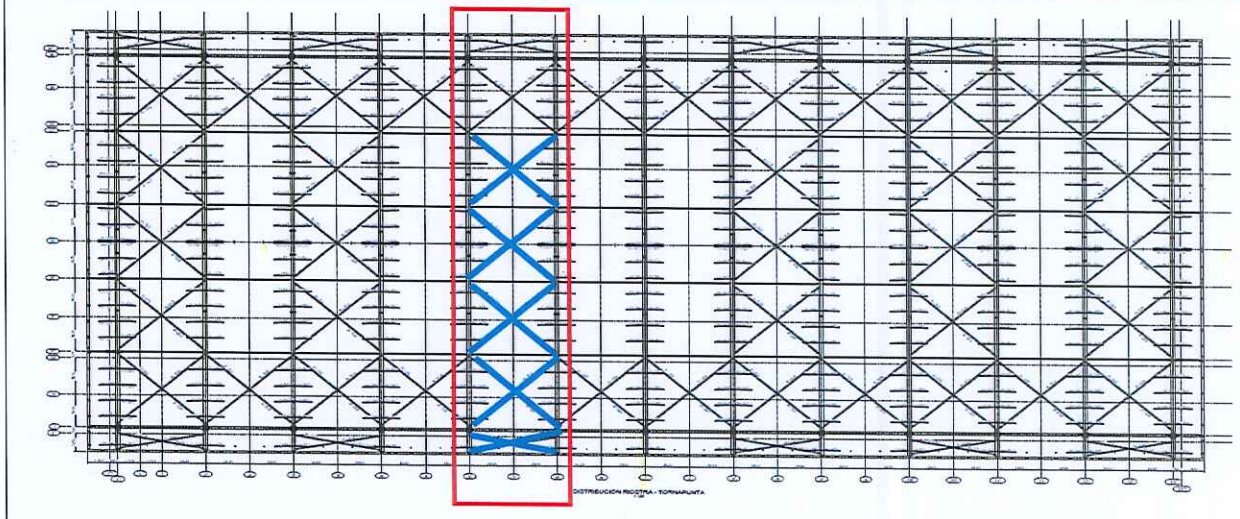

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-0903[illegible]7 CND

Firma
Nombre: LENÍN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-09033T CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 6´-5´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 6´- 5´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 6´- 5´ CON A´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 6´- 5´ CON A´´	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	208.007,61			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	208.265,83			TOTAL	208.265,83

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

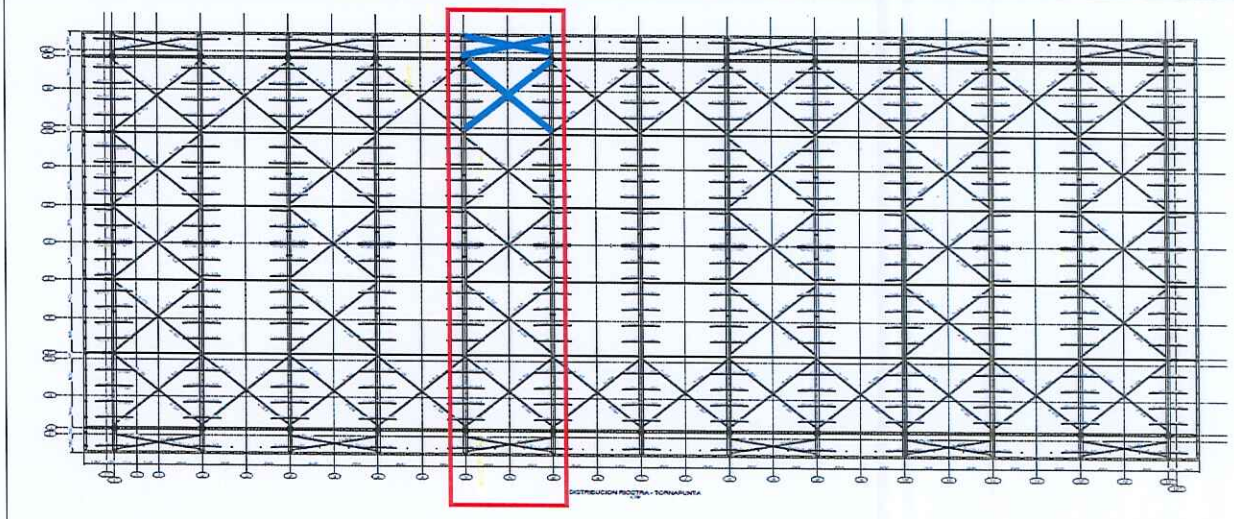

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7985014

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 5´-4´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 5´-4´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 5´-4´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 5´-4´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	208.265,83			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	208.560,65			TOTAL	208.560,65

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

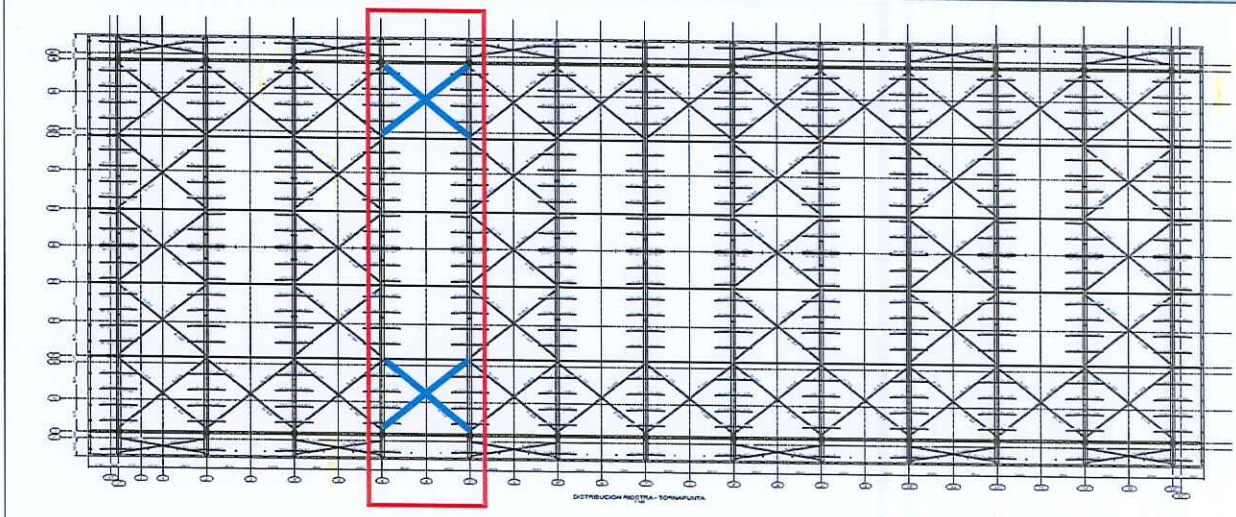

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 4´-3´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 4´-3´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 4´-3´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 4´-3´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 4´-3´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 4´-3´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 4´-3´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 4´-3´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 4´- 3´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 4´- 3´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	208.560,65			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	209.261,10			TOTAL	209.261,10

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

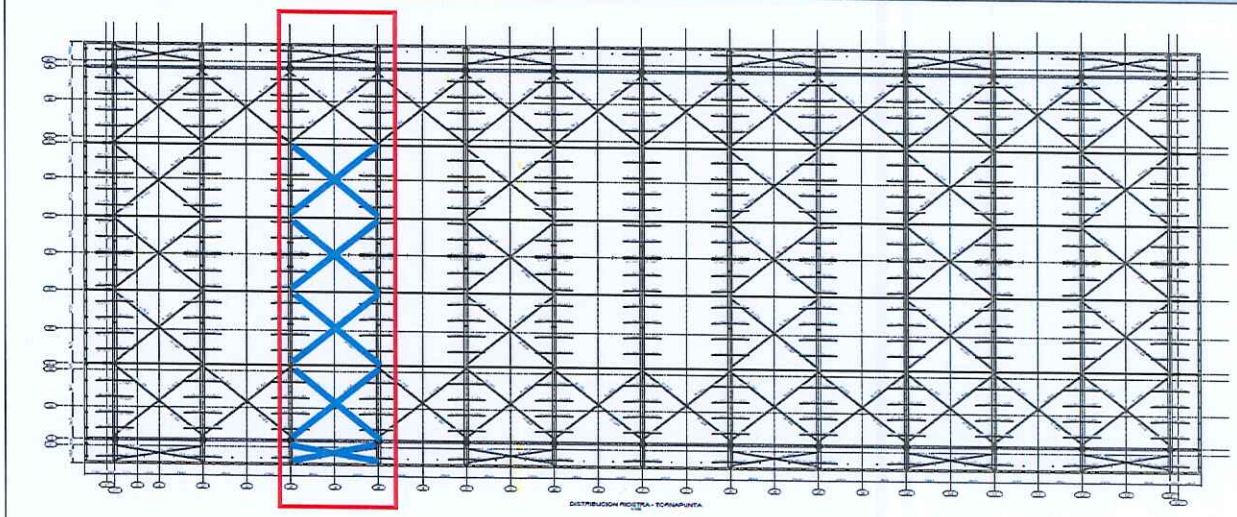

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 20 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 4´-3´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 4´- 3´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 4´- 3´ CON A´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 4´- 3´ CON A´´	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	209.261,10			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	209.519,32			TOTAL	209.519,32

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

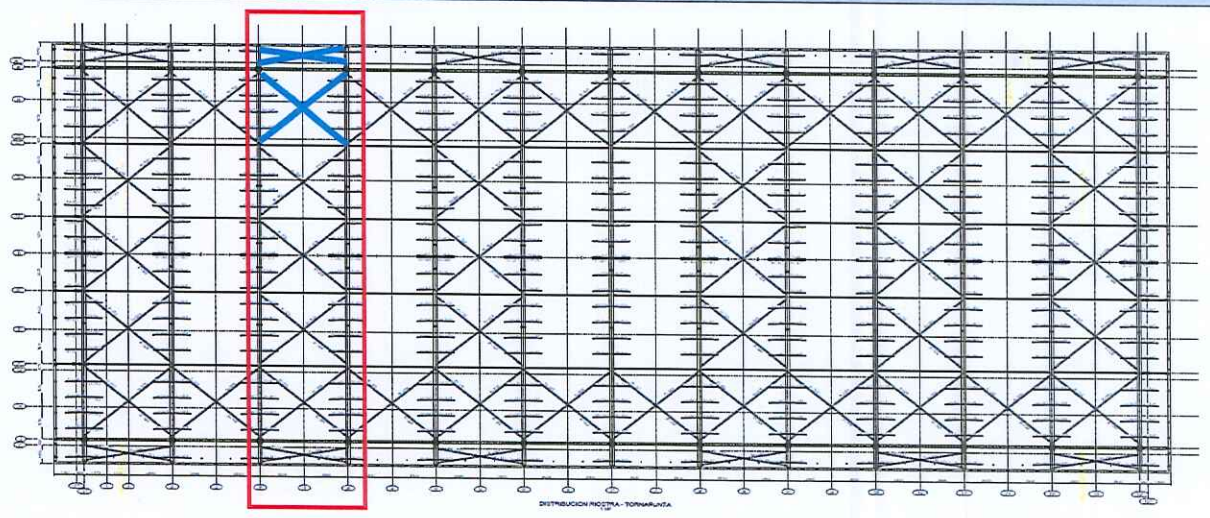

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090367 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 3´-2´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 3´-2´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 3´-2´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 3´-2´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	209.519,32			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	209.814,14			TOTAL	209.814,14

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

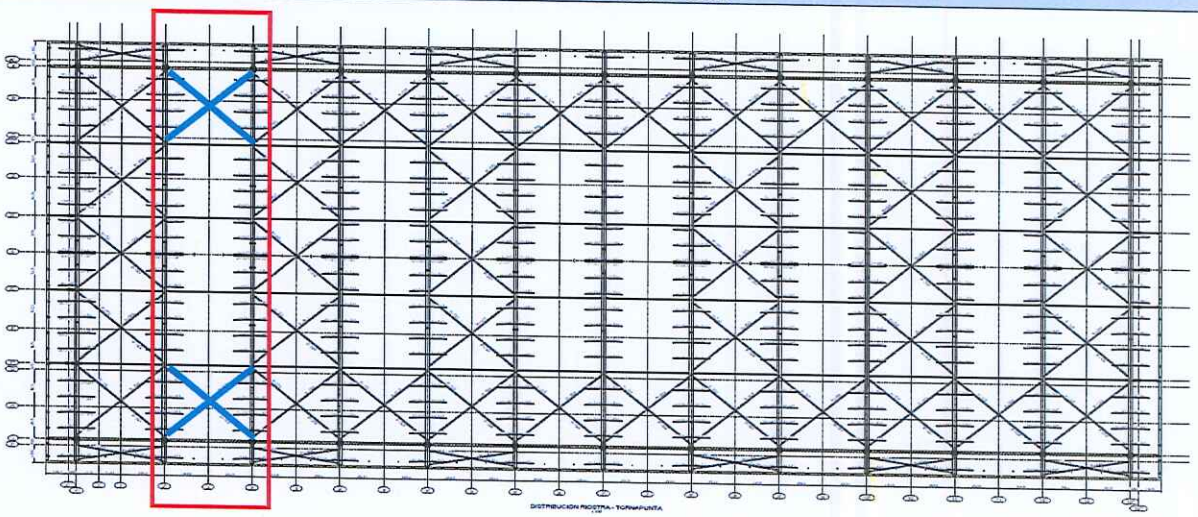

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090377 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 2´-1´´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 2´-1´´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 2´-1´´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 2´-1´´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 2´-1´´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 2´-1´´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 2´-1´´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 2´-1´´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 2´- 1´´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 2´- 1´´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	209.814,14			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	210.514,59			TOTAL	210.514,59

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

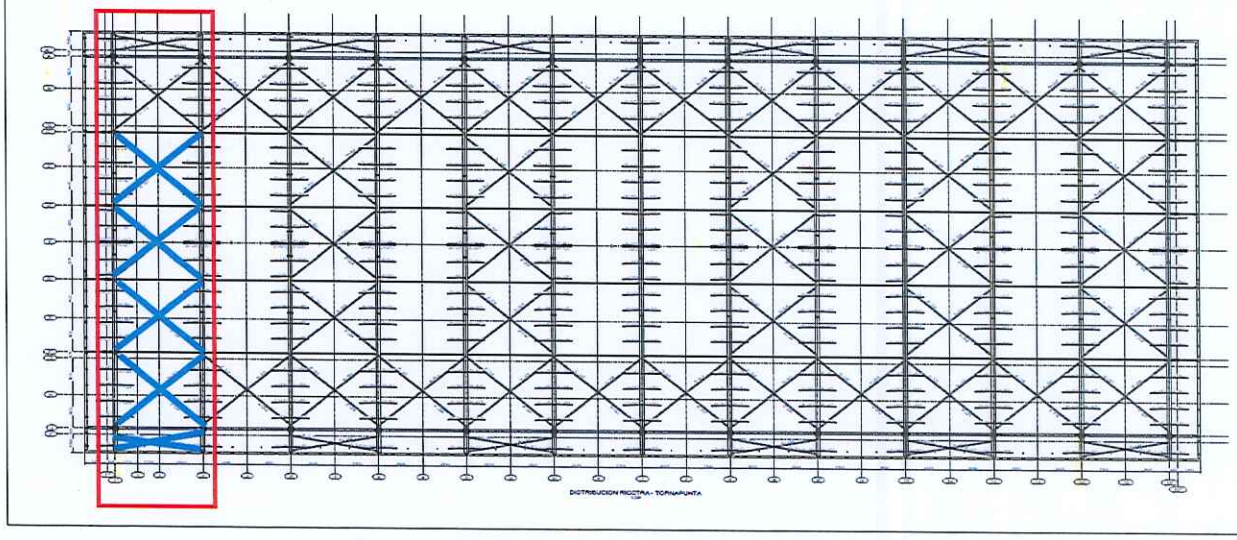

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-2000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 2´-1´´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 2´- 1´´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 2´- 1´´ CON A´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 2´- 1´´ CON A´´	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	210.514,59			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	210.772,81			TOTAL	210.772,81

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

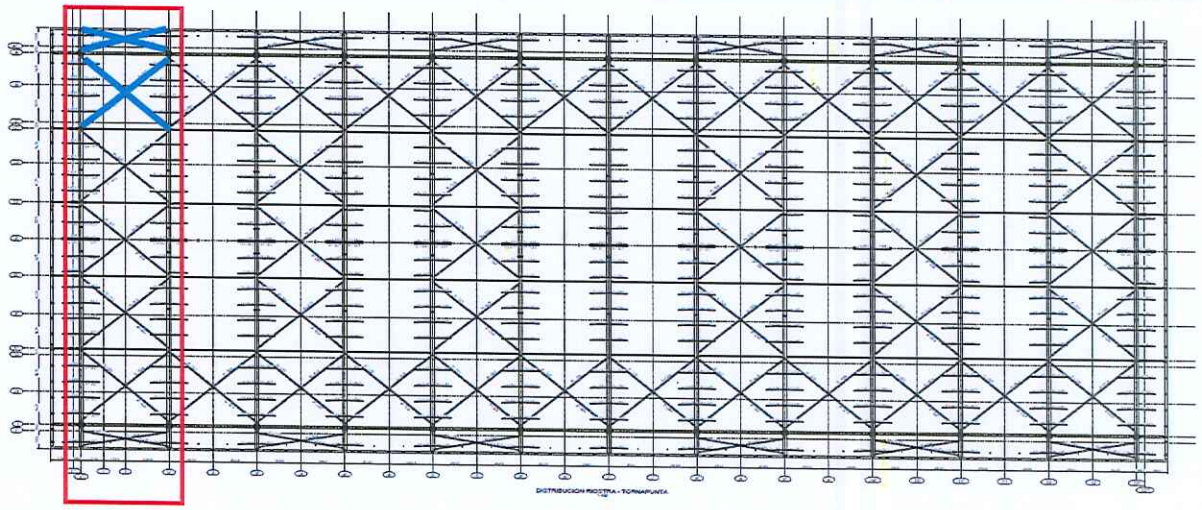

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE F´					
V-327 EJE 12´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
V-341 EJE 12´´-12´	6 - 16 Y 96	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-337 EJE 12´- 11´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 11´- 10´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 10´- 9´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 9´- 8´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 8´- 7´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 7´- 6´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 6´- 5´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
VIENEN:	210.772,81			SUBTOTAL	3.020,99
PASAN:	213.793,80			TOTAL	213.793,80

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

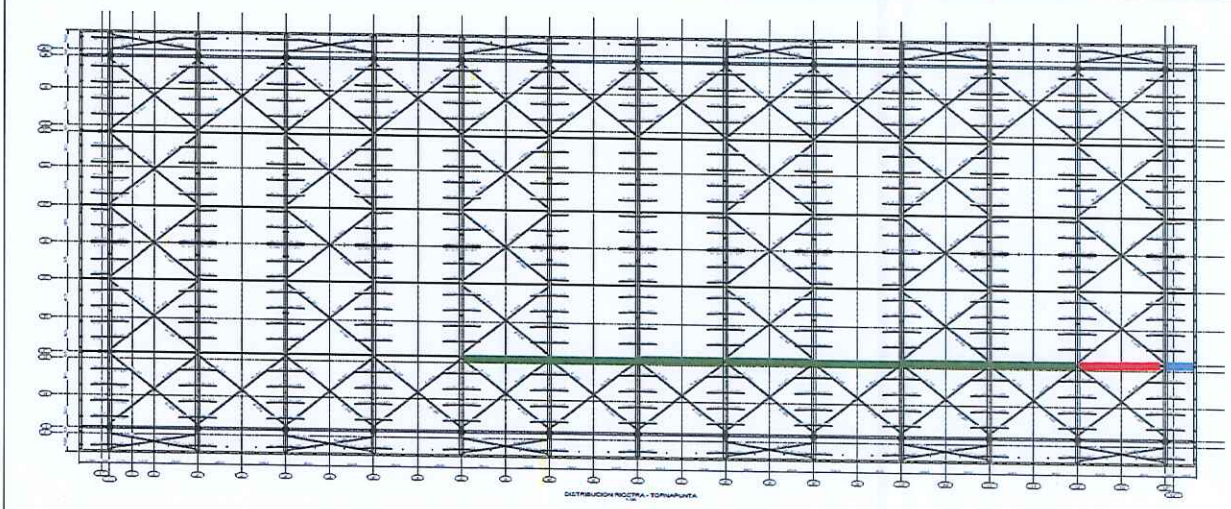

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-73650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LORERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

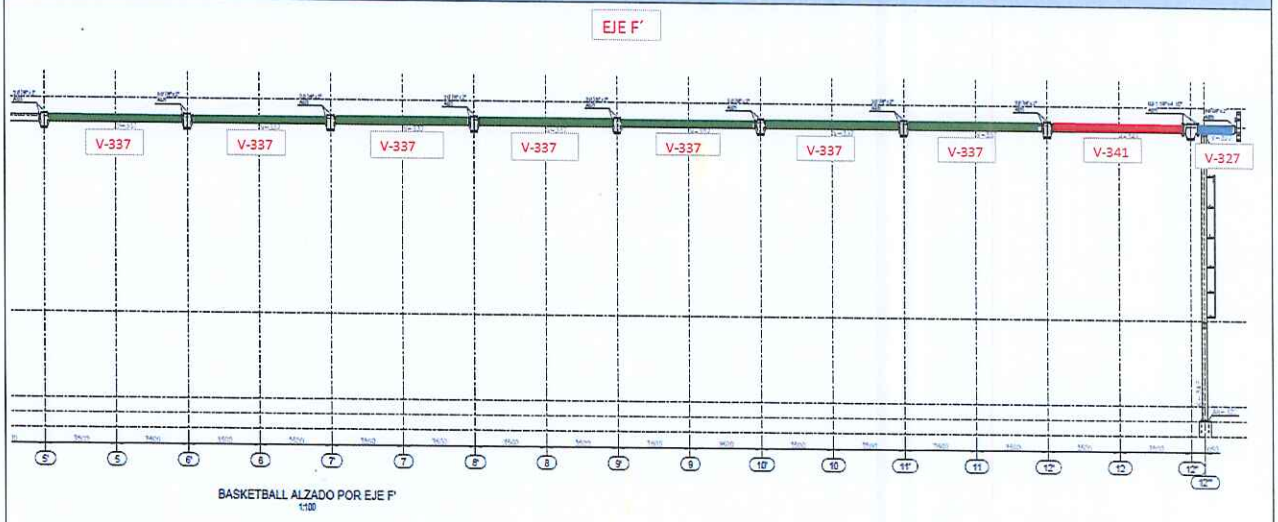

BASKETBALL ALZADO POR EJE F'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 20 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE F´					
V-337 EJE 5´- 4´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 4´- 3´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 3´- 2´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-335 EJE 2´- 1´´	6 - 16 Y 90	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-326 EJE 1´´´	6 - 16 Y 81	141,68	1877MM	1,00	141,68
VIENEN:	213793,80			SUBTOTAL	1.594,95
PASAN:	215388,75			TOTAL	215.388,75

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

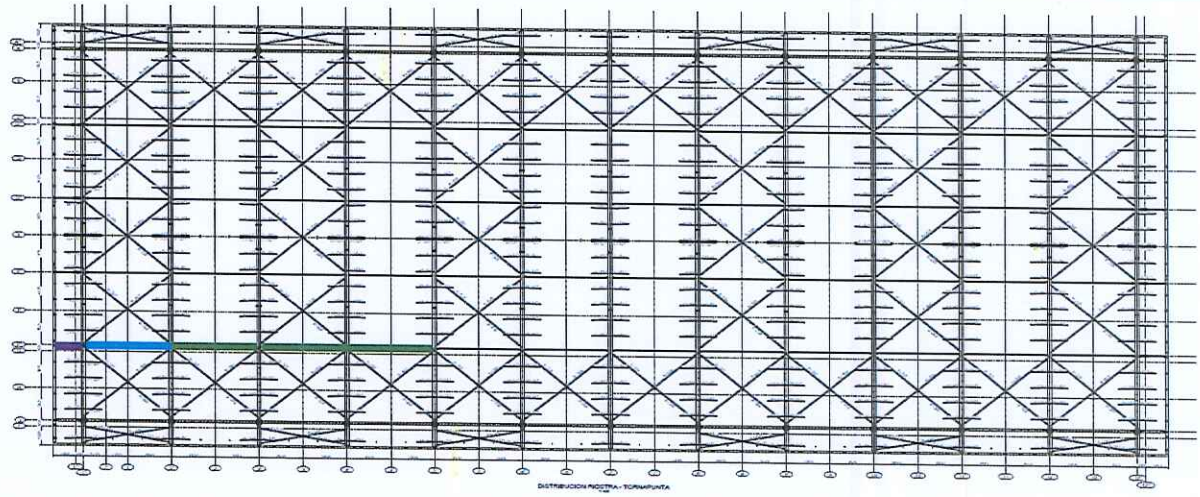

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072800-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

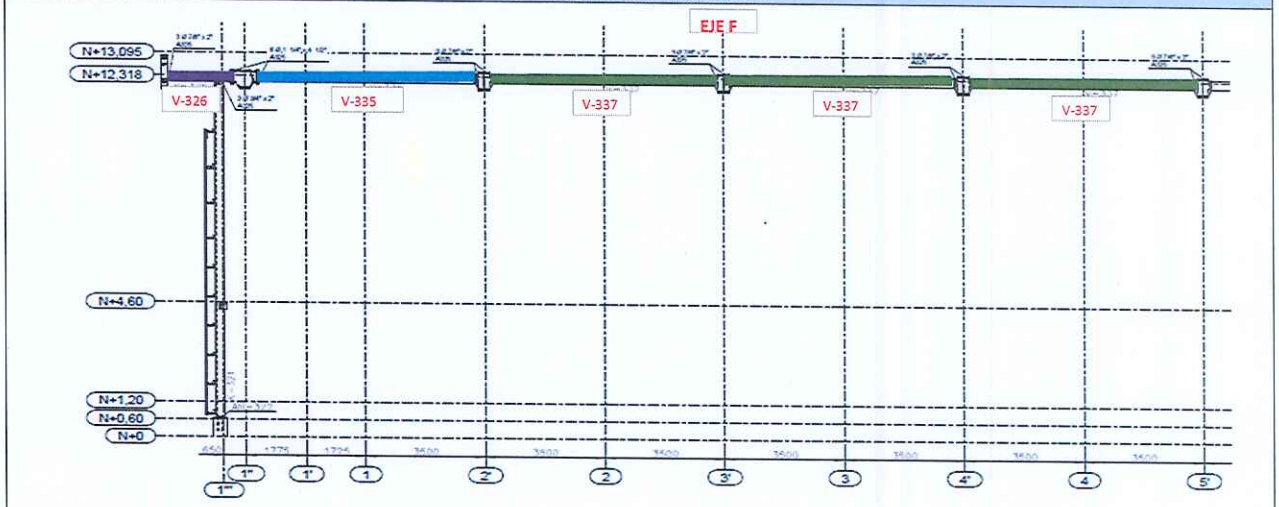

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79950147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE E´					
V-327 EJE 12´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
V-341 EJE 12´´-12´	6 - 16 Y 96	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-337 EJE 12´- 11´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 11´- 10´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 10´- 9´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 9´- 8´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 8´- 7´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 7´- 6´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 6´- 5´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
VIENEN:	215.388,75			SUBTOTAL	3.020,99
PASAN:	218.409,74			TOTAL	218.409,74

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

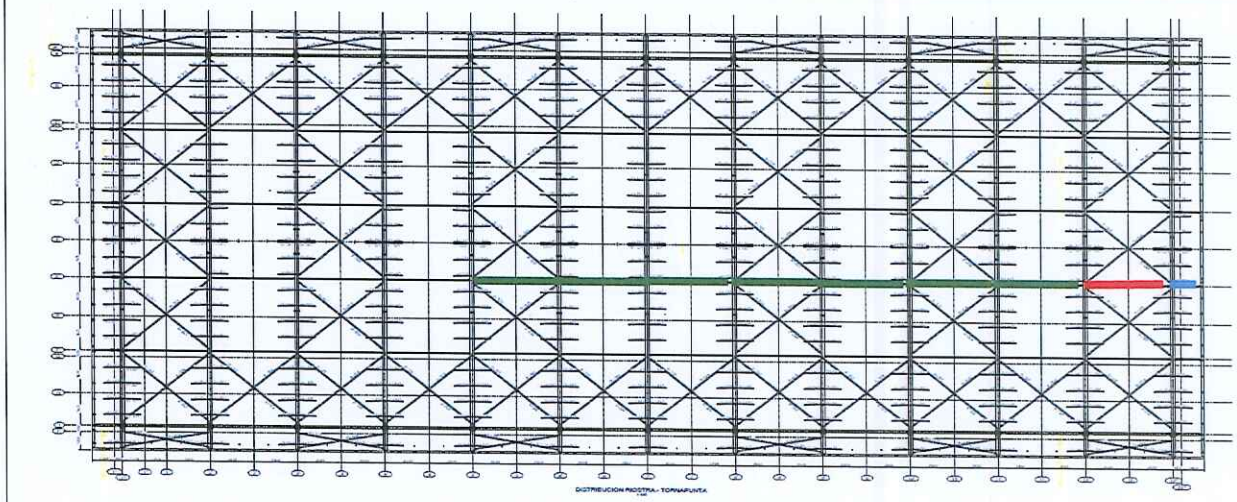

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

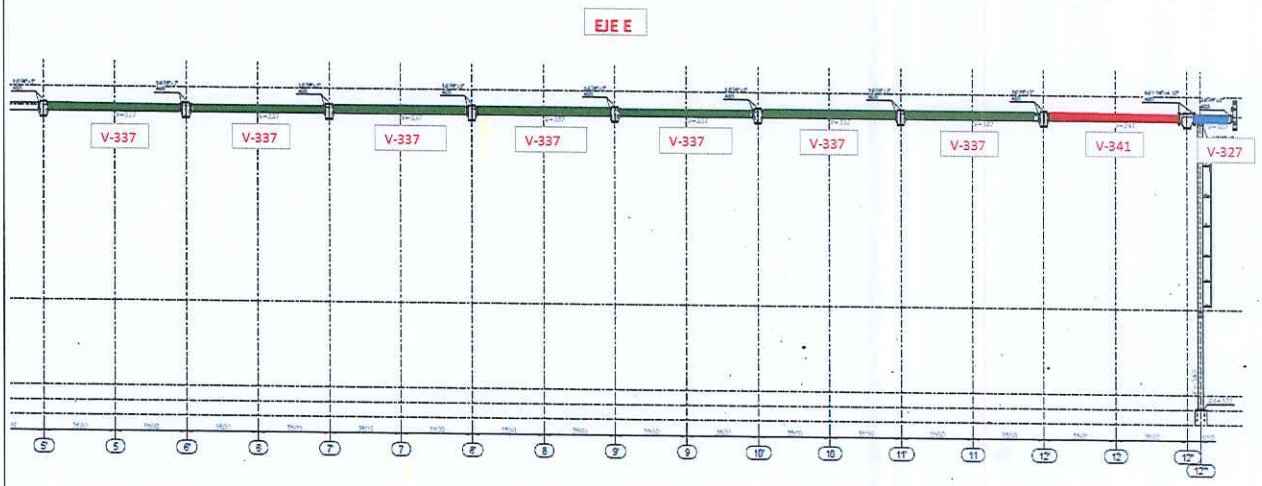

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	PARCIAL No. 3
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA / KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE E´					
V-337 EJE 5´- 4´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 4´- 3´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 3´- 2´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-335 EJE 2´- 1´´	6 - 16 Y 90	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-327 EJE 1´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
VIENEN:	218.409,74			SUBTOTAL	1.594,95
PASAN:	220.004,69			TOTAL	220.004,69

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

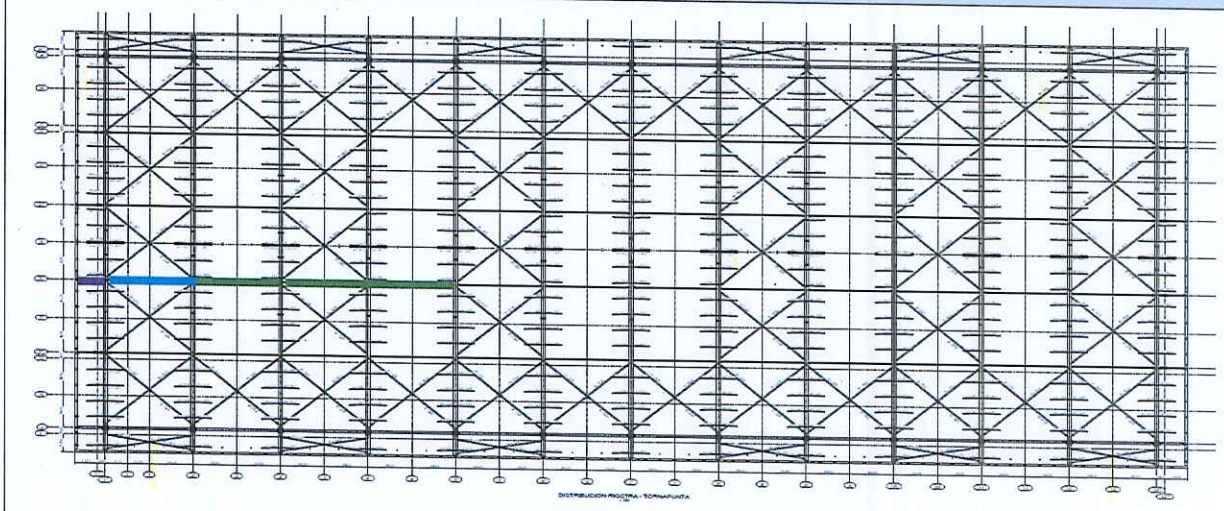

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

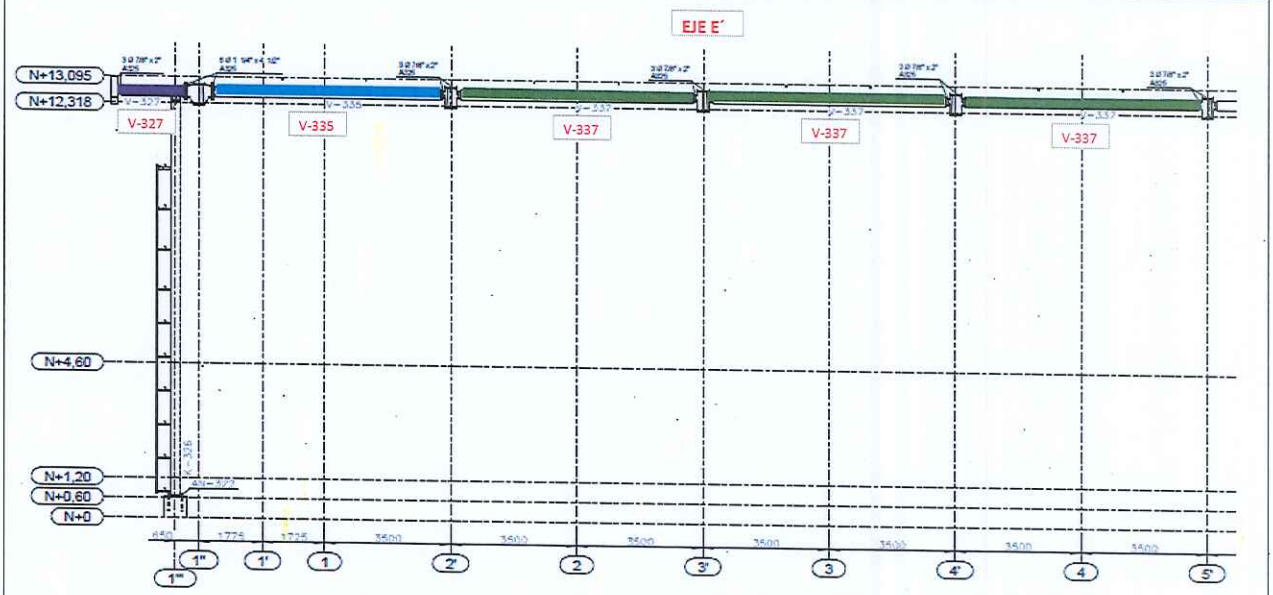

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE E



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650247

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE D´					
V-327 EJE 12´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
V-341 EJE 12´´-12´	6 - 16 Y 96	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-337 EJE 12´- 11´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 11´- 10´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 10´- 9´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 9´- 8´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 8´- 7´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 7´- 6´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 6´- 5´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
VIENEN:	220.004,69			SUBTOTAL	3.020,99
PASAN:	223.025,68			TOTAL	223.025,68

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

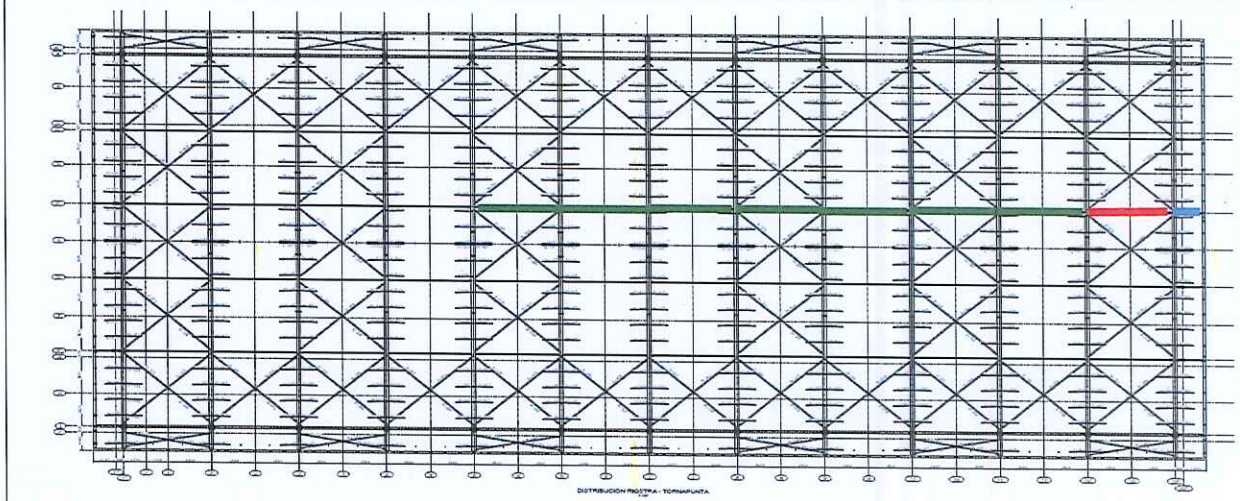

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072009-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

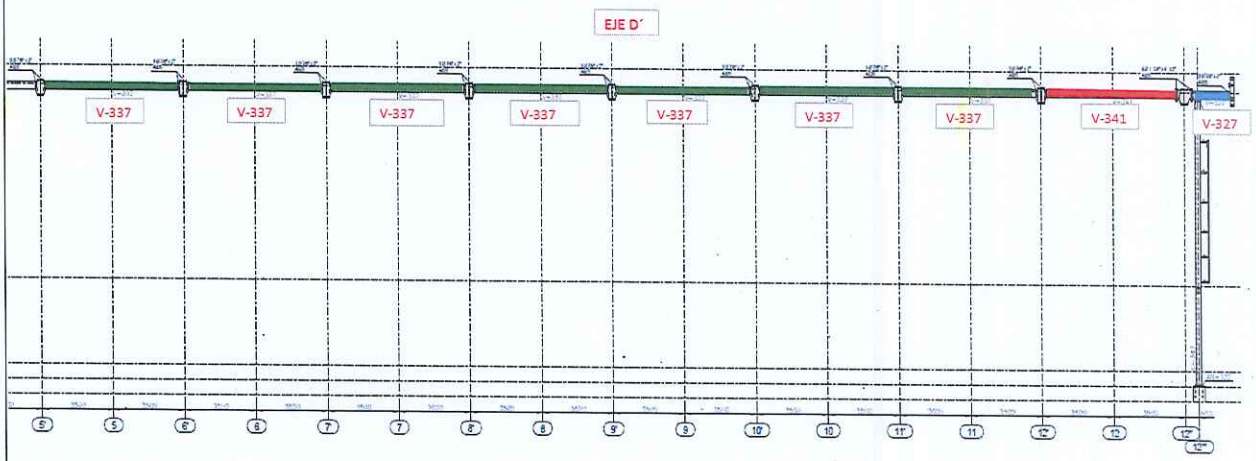

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA.CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE D´					
V-337 EJE 5´- 4´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 4´- 3´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 3´- 2´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-335 EJE 2´- 1´´	6 - 16 Y 90	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-327 EJE 1´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
VIENEN:	223.025,68			SUBTOTAL	1.594,95
PASAN:	224.620,63			TOTAL	224.620,63

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

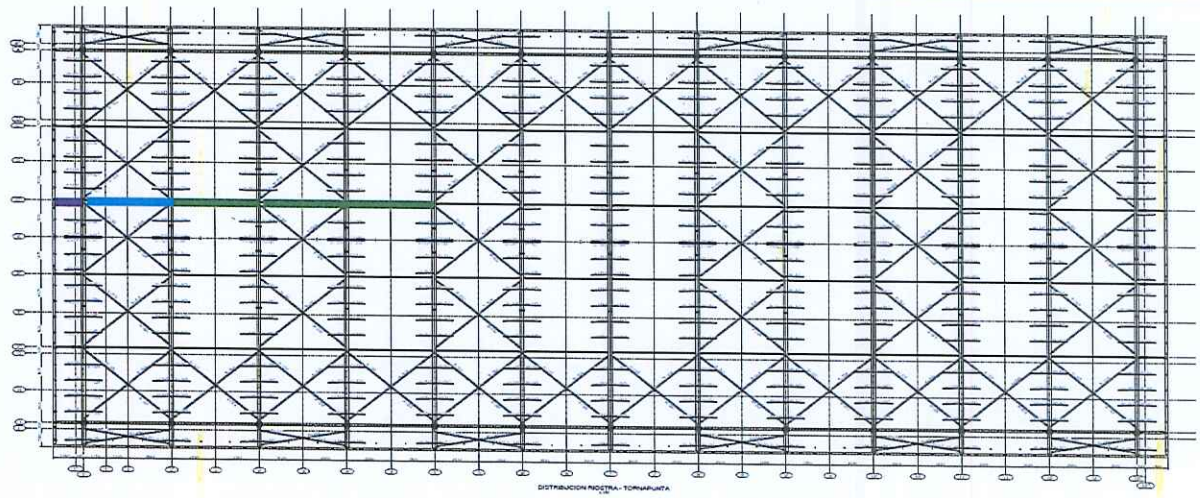

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

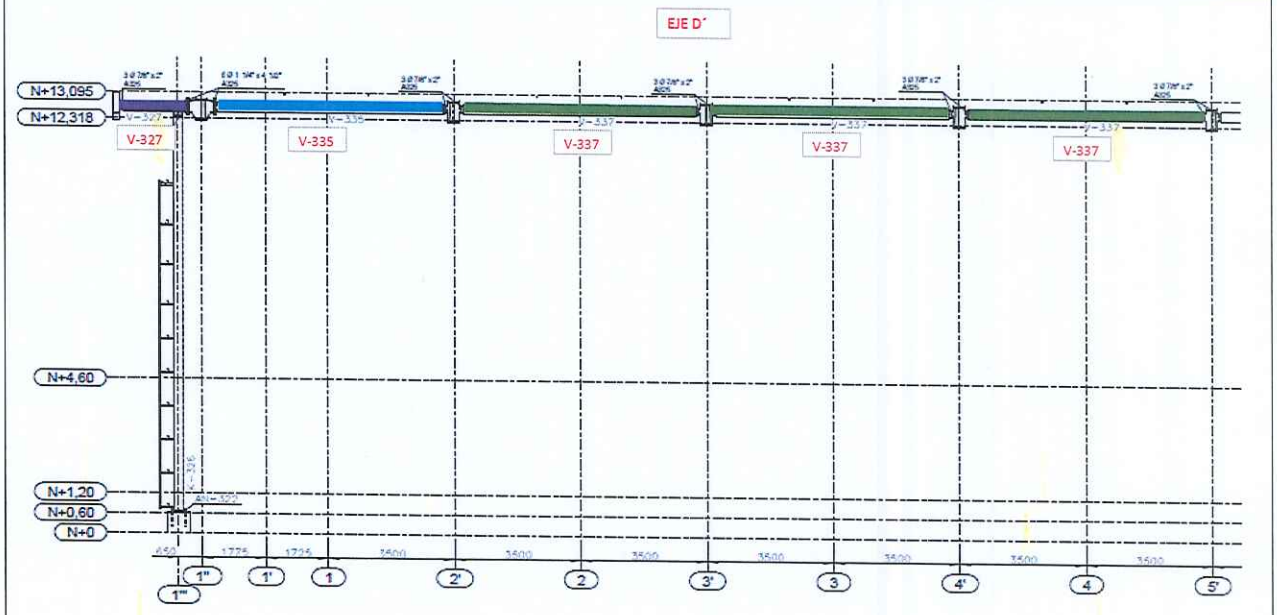

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE C´					
V-327 EJE 12´´´	6 - 16 Y 82	141,68	1877MM	1,00	141,68
V-341 EJE 12´´-12´	6 - 16 Y 96	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-337 EJE 12´- 11´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 11´- 10´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 10´- 9´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 9´- 8´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 8´- 7´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 7´- 6´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 6´- 5´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
VIENEN:	224.620,63			SUBTOTAL	3.020,99
PASAN:	227.641,62			TOTAL	227.641,62

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

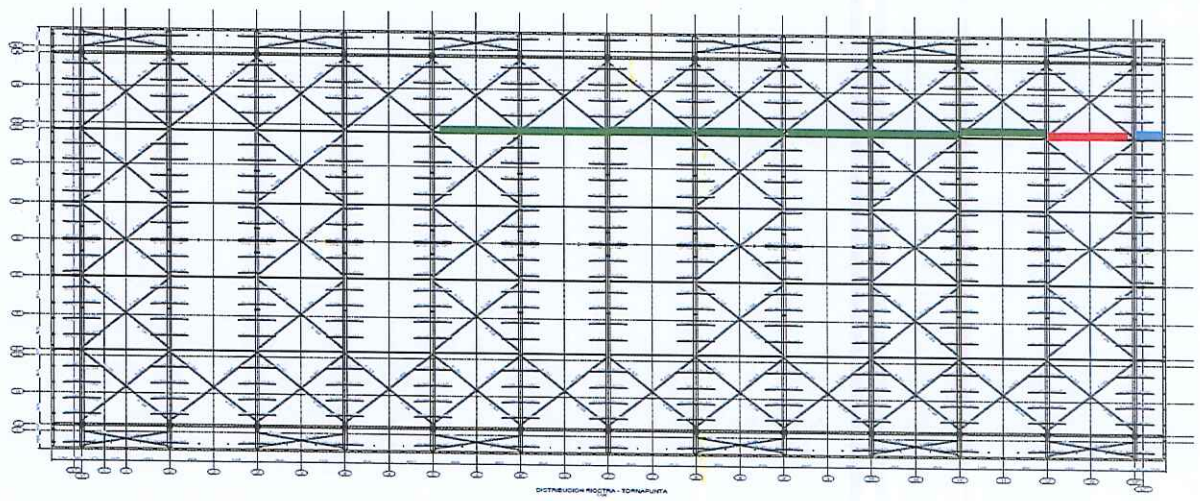

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

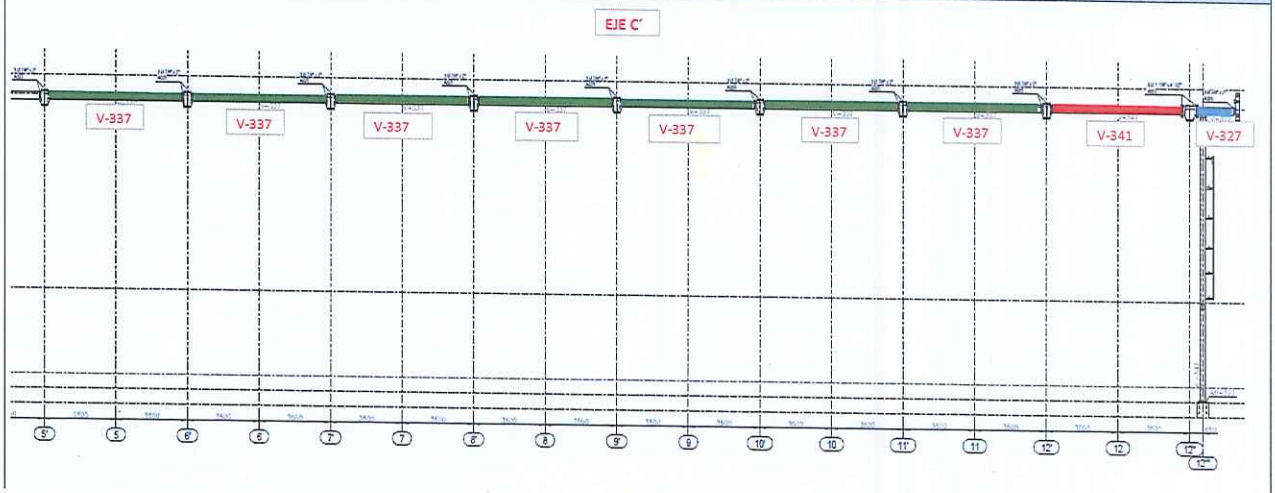

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACION:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGA CUBIERTA					
EJE C´					
V-337 EJE 5´- 4´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 4´- 3´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-337 EJE 3´- 2´	6 - 16 Y 92	356,51	6656MM	1,00	356,51
V-335 EJE 2´- 1´´	6 - 16 Y 90	383,74	6465MM	1,00	383,74
V-326 EJE 1´´´	6 - 16 Y 81	141,68	1877MM	1,00	141,68
VIENEN:	227.641,62			SUBTOTAL	1.594,95
PASAN:	229.236,57			TOTAL	229.236,57

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

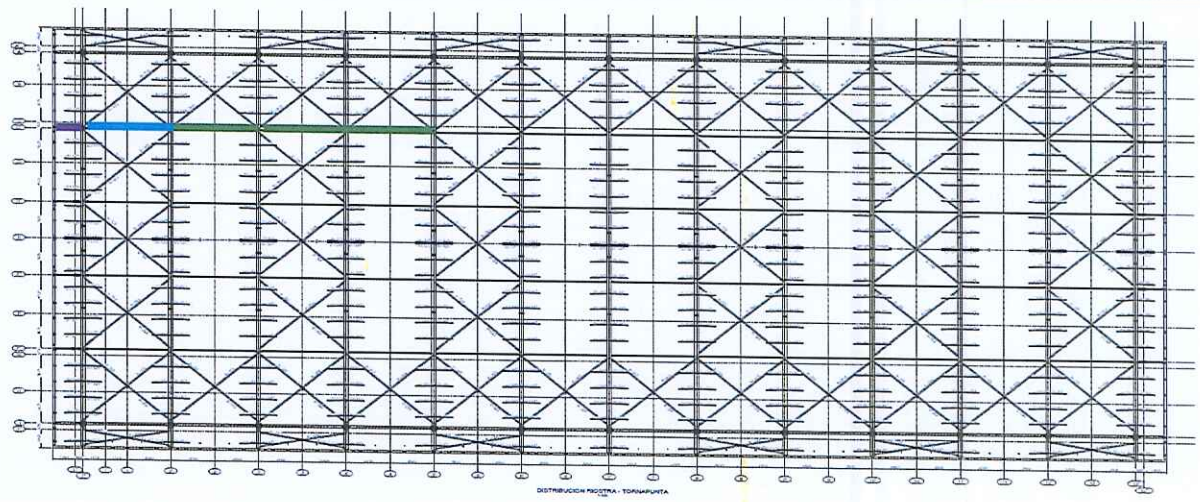

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

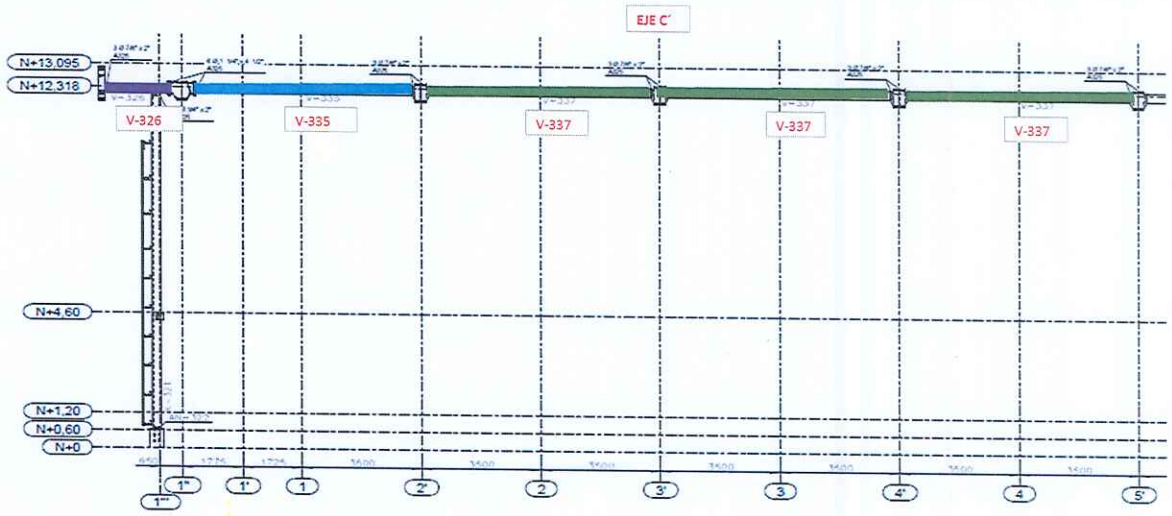

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-78650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-096337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE 12'''					
K-349 EJE A''	13 Y 44	685,70	9940MM	1,00	685,70
K-347 EJE C'	13 Y 42	782,67	11450MM	1,00	782,67
K-348 EJE D'	13 Y 43	809,35	11851MM	1,00	809,35
K-348 EJE E'	13 Y 43	809,35	11851MM	1,00	809,35
K-347 EJE F'	13 Y 42	782,67	11450MM	1,00	782,67
K-346 EJE I''	13 Y 41	691,83	9940MM	1,00	691,83
VIENEN:	229.236,57			SUBTOTAL	4.561,57
PASAN:	233.798,14			TOTAL	233.798,14

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

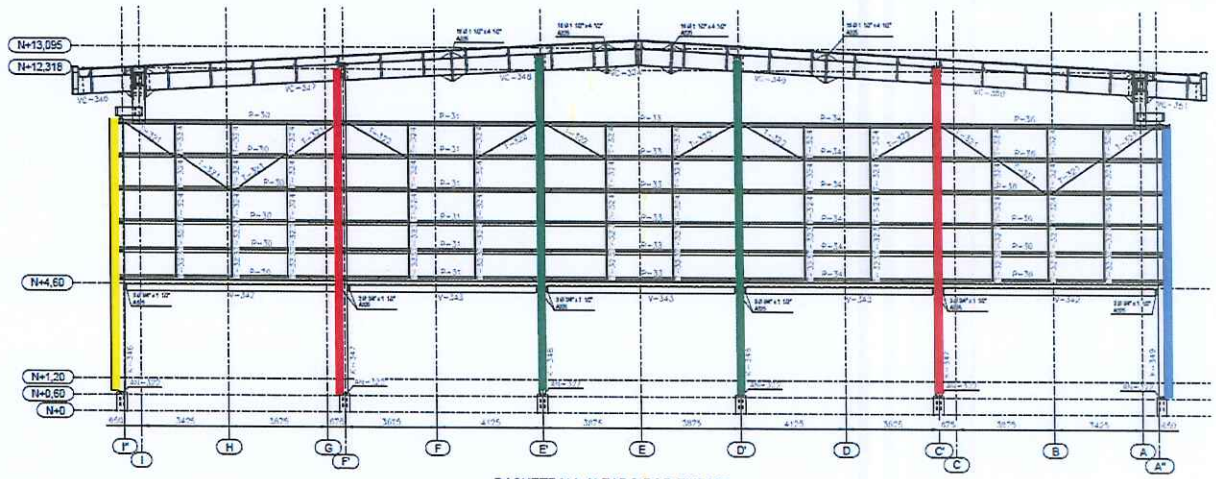

BASKETBALL ALZADO POR EJE 12'''
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008279650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090377 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE 1'''					
K-327 EJE A''	7 Y 24	691,83	9940MM	1,00	691,83
K-324 EJE A''- B	7 Y 21	85,97	4290MM	1,00	85,97
K-323 EJE B - C	7 Y 20	85,97	4290MM	1,00	85,97
K-322 EJE C'	7 Y 19	783,88	11450MM	1,00	783,88
K-326 EJE D'	7 Y 23	814,71	11851MM	1,00	814,71
K-326 EJE E'	7 Y 23	814,71	11851MM	1,00	814,71
K-321 EJE F'	7 Y 18	783,88	11450MM	1,00	783,88
K-324 EJE G - H	7 Y 21	85,97	4290MM	1,00	85,97
K-323 EJE H - I	7 Y 20	85,97	4290MM	1,00	85,97
K-325 EJE I''	7 Y 22	691,83	9940MM	1,00	691,83
VIENEN:	233.798,14			SUBTOTAL	4.924,72
PASAN:	238.722,86			TOTAL	238.722,86

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

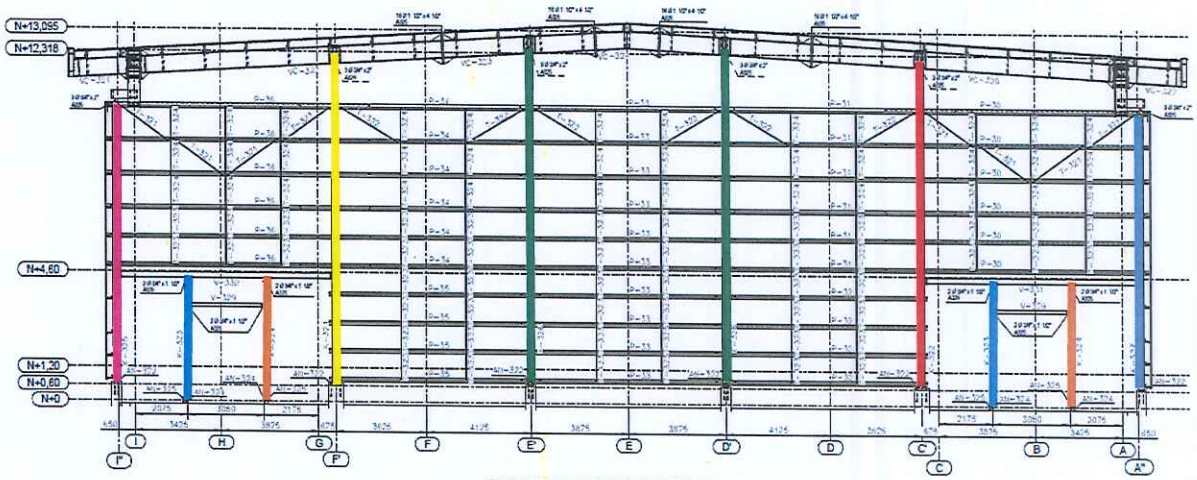

BASKETBALL ALZADO POR EJE 1'''
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE A					
K-332 EJE 12´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 11´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 10´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 9´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-337 EJE 8	15 Y 34	370,70	3406MM	1,00	370,70
K-341 EJE 8 - 8´	15 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-340 EJE 8	15 Y 02	377,08	6808MM	1,00	377,08
K-338 EJE 8´- 7	15 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-342 EJE 7	15 Y 37	328,80	3406MM	1,00	328,80
K-341 EJE 7 - 7´	15 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
VIENEN:	238.722,86			SUBTOTAL	3.897,66
PASAN:	242.620,52			TOTAL	242.620,52

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

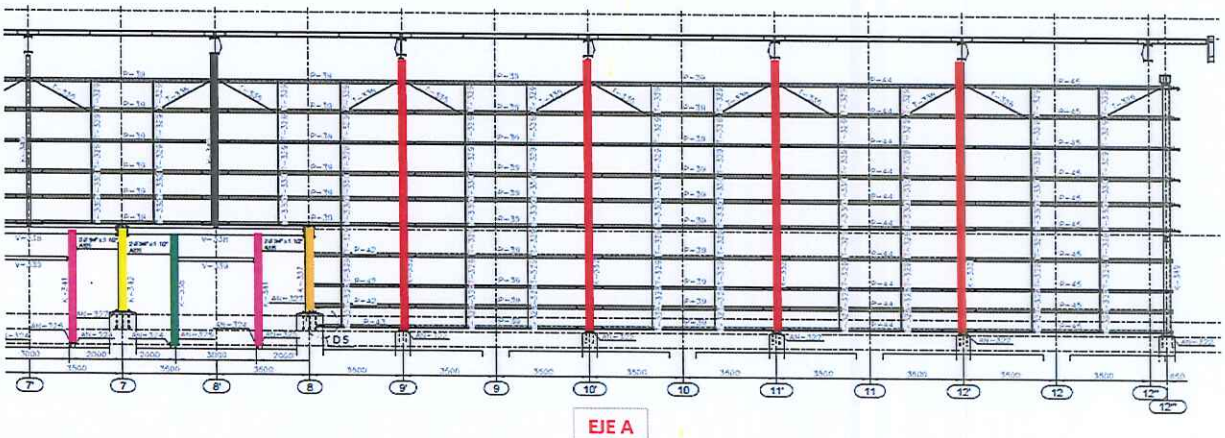

EJE A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE A					
K-340 EJE 7´	15 Y 35B	377,08	6808MM	1,00	377,08
K-338 EJE 7´- 6	15 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-342 EJE 6	15 Y 37	328,80	3406MM	1,00	328,80
K-341 EJE 6 - 6´	15 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-340 EJE 6´	15 Y 35B	377,08	6808MM	1,00	377,08
K-338 EJE 6´- 5	15 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-336 EJE 5	15 Y 33	370,70	3406MM	1,00	370,70
K-332 EJE 5´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 4´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 3´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-332 EJE 2´	15 Y 29	597,96	10767MM	1,00	597,96
VIENEN:	242.620,52			SUBTOTAL	4.274,74
PASAN:	246.895,26			TOTAL	246.895,26

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

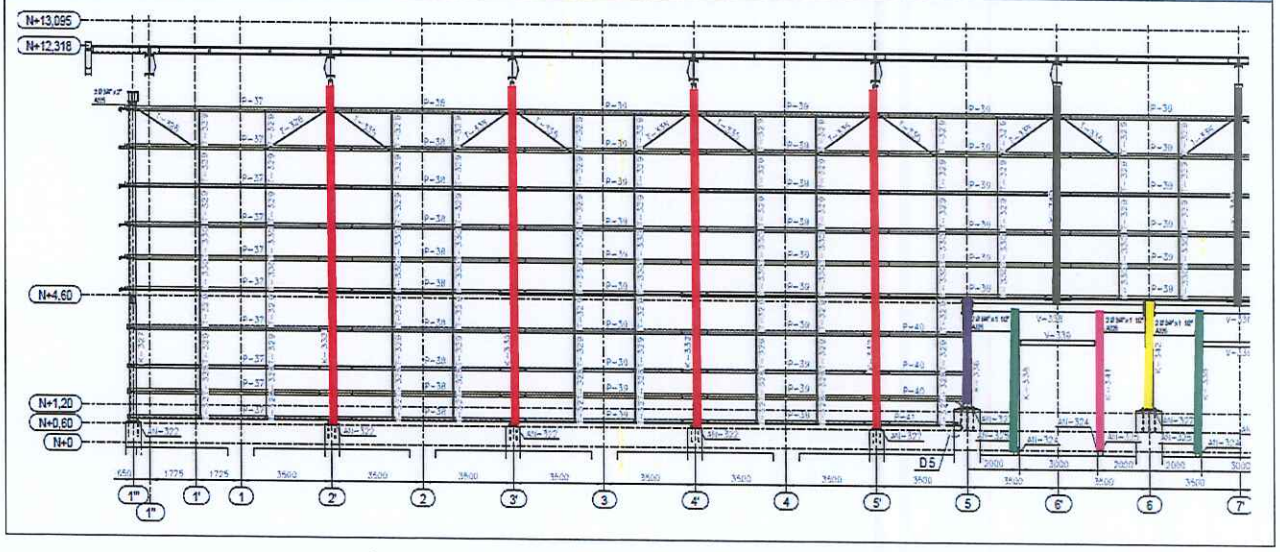

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE I					
K-331 EJE 12´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 11´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 10´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 9´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-336 EJE 8	17 Y 33	370,70	3406MM	1,00	370,70
K-341 EJE 8 - 8´	17 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-339 EJE 8´	17 Y 35A	377,08	6808MM	1,00	377,08
K-338 EJE 8´- 7	17 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-342 EJE 7	17 Y 37	328,80	3406MM	1,00	328,80
K-341 EJE 7 - 7´	17 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-339 EJE 7´	17 Y 35A	377,08	6808MM	1,00	377,08
VIENEN:	246.895,26			SUBTOTAL	4.274,74
PASAN:	251.170,00			TOTAL	251.170,00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

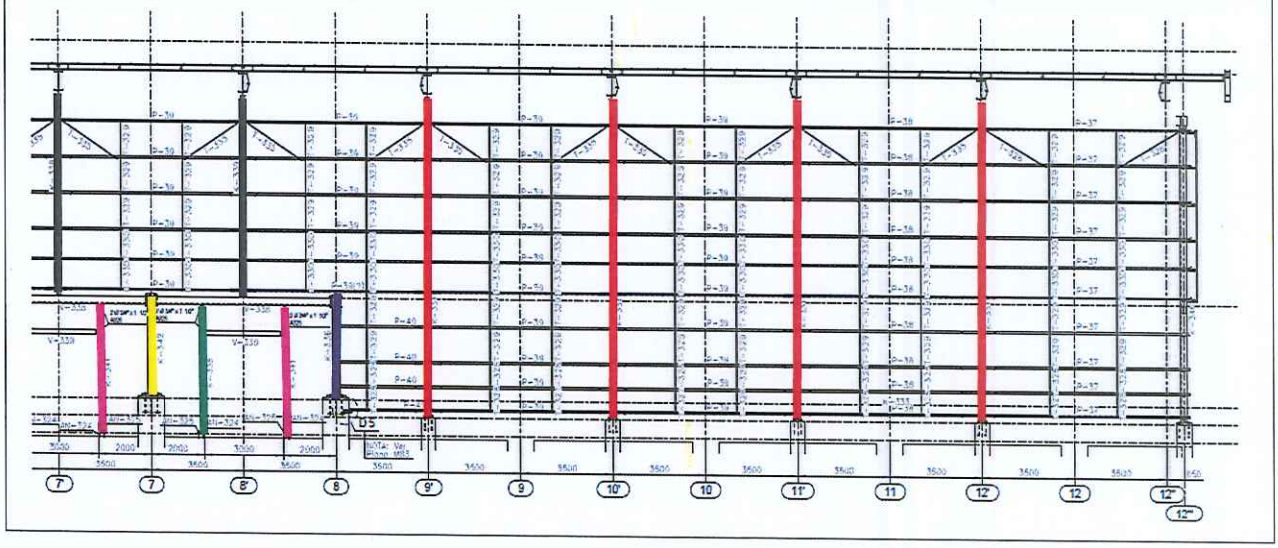

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-73658147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN CUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79550147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN / UNIDAD
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA / KG

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS FACHADA EJE I					
K-338 EJE 7´- 6	17 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-342 EJE 6	17 Y 37	328,80	3406MM	1,00	328,80
K-341 EJE 6 - 6´	17 Y 36	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-339 EJE 6´	17 Y 35A	377,08	6808MM	1,00	377,08
K-338 EJE 6´- 5	17 Y 35	143,08	4290MM	1,00	143,08
K-337 EJE 5	17 Y 34	370,70	3406MM	1,00	370,70
K-331 EJE 5´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 4´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 3´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
K-331 EJE 2´	17 Y 28	597,96	10767MM	1,00	597,96
VIENEN:	251.170,00			SUBTOTAL	3.897,66
PASAN:	255.067,66			TOTAL	255.067,66

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

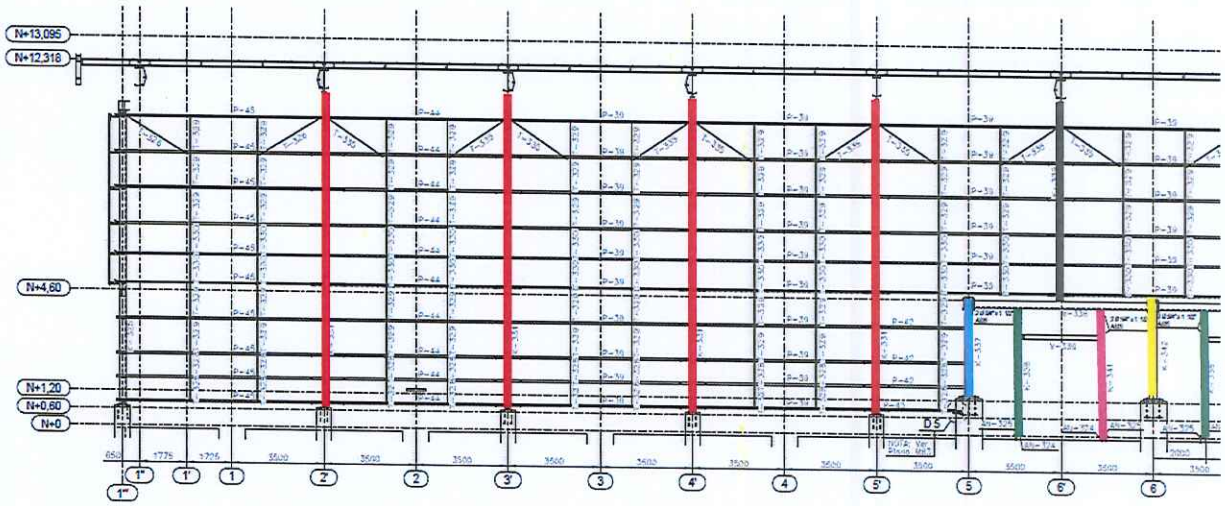

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO·ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE 12''' N + 4.60					
V-342 EJE A''- C'	13 Y 97	255,41	8455MM	1,00	255,41
V-343 EJE C'- D'	13 Y 98	226,06	7480MM	1,00	226,06
V-343 EJE D'- E'	13 Y 98	226,06	7480MM	1,00	226,06
V-343 EJE E' - F'	13 Y 98	226,06	7480MM	1,00	226,06
V-342 EJE F'- I''	13 Y 97	255,41	8455MM	1,00	255,41
VIENEN:	255.067,66			SUBTOTAL	1.189,00
PASAN:	256.256,66			TOTAL	256.256,66

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

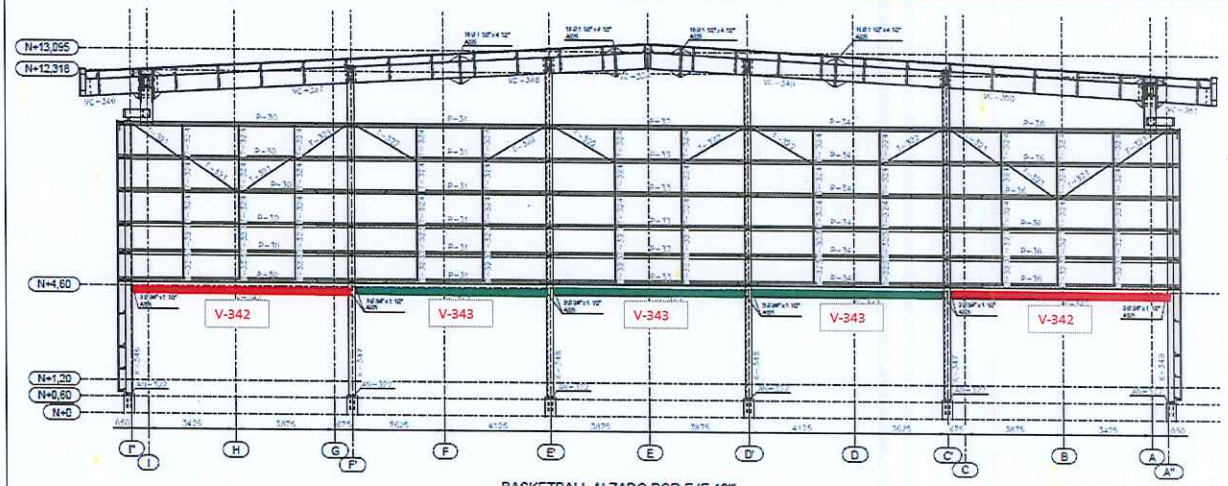

BASKETBALL ALZADO POR EJE 12'''
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-Z9650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE 12''' N + 12.318					
V-345 EJE I''- F'	03 - 04 Y 100	858,22	10801MM	1,00	858,22
V-346 EJE F'- E'	03 - 04 Y 101	702,78	8201MM	1,00	702,78
V-323 EJE E'- D'	03 - 04 Y 78	536,45	6112MM	1,00	536,45
V-347 EJE D' - C'	03 - 04 Y 102	702,75	8200MM	1,00	702,75
V-348 EJE C'- A''	03 - 04 Y 103	858,22	10801MM	1,00	858,22
VIENEN:	256.256,66			SUBTOTAL	3.658,42
PASAN:	259.915,08			TOTAL	259.915,08

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

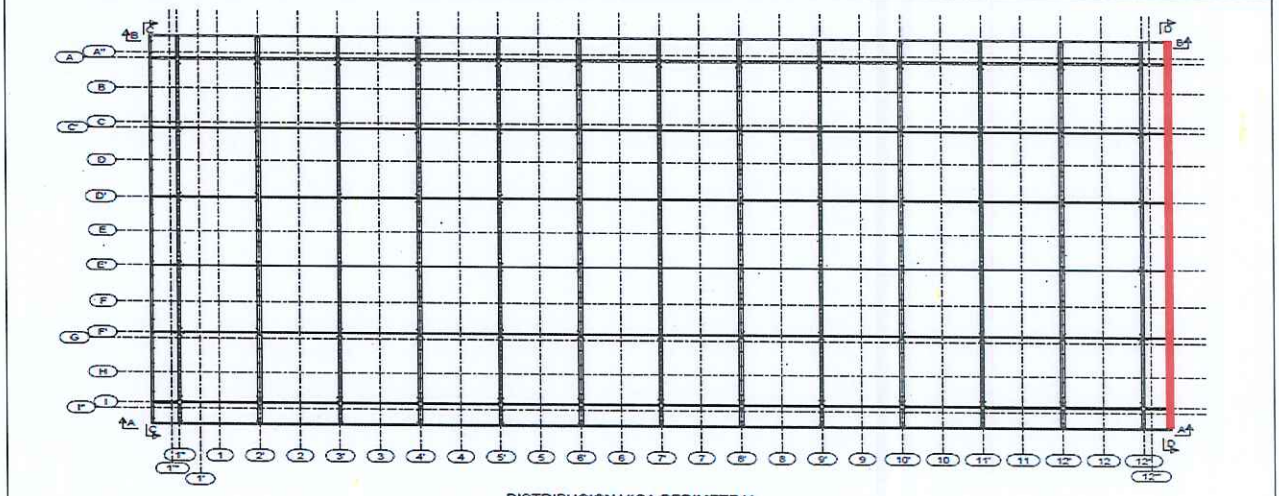

DISTRIBUCION VIGA PERIMETRAL
1:250

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

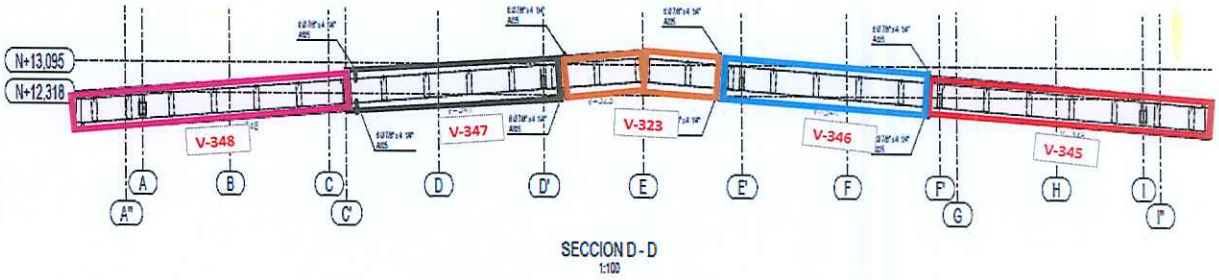

SECCION D - D
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN DUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072005-79660147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE 1''' N + 4.60					
V-331 EJE A''- C'	07 Y 86	256,39	8455MM	1,00	256,39
V-329 EJE A''- C'	07 Y 84	54,96	3030MM	1,00	54,96
V-330 EJE F'- I''	07 Y 85	256,39	8455MM	1,00	256,39
V-329 EJE F'- I''	07 Y 84	54,96	3030MM	1,00	54,96
VIENEN:	259.915,08			SUBTOTAL	622,70
PASAN:	260.537,78			TOTAL	260.537,78

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

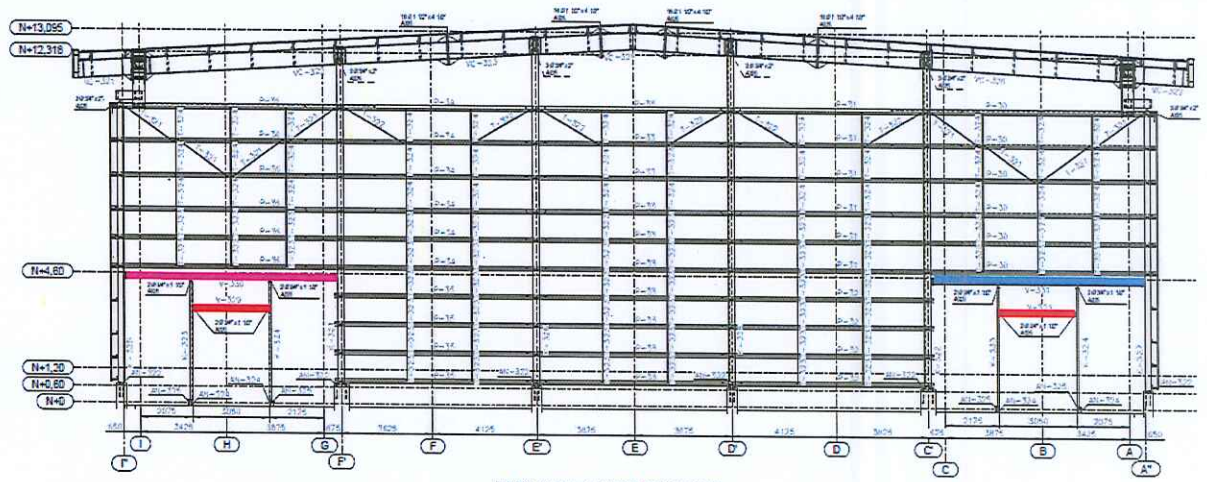

BASKETBALL ALZADO POR EJE 1'''
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-76650447

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072080-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE 1''' N + 12.318					
V-321 EJE I''- F'	3 - 4 Y 76	858,22	10801MM	1,00	858,22
V-322 EJE F'- E'	3 - 4 Y 77	702,75	8200MM	1,00	702,75
V-349 EJE E'- D'	3 - 4 Y 104	536,45	6112MM	1,00	536,45
V-324 EJE D' - C'	3 - 4 Y 79	702,75	8200MM	1,00	702,75
V-325 EJE C'- A''	3 - 4 Y 80	858,22	10801MM	1,00	858,22
VIENEN:	260.537,78			SUBTOTAL	3.658,39
PASAN:	264.196,17			TOTAL	264.196,17

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

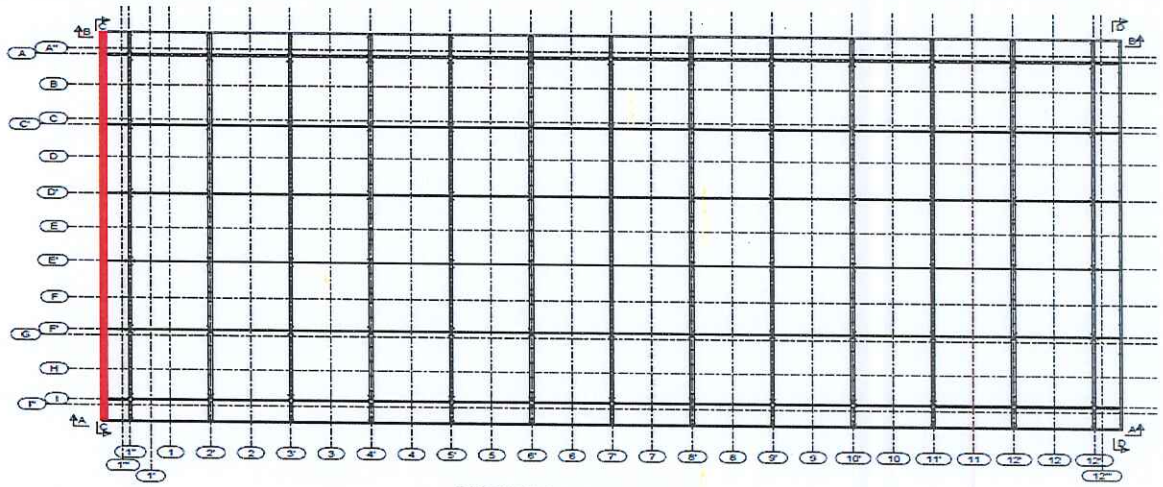

DISTRIBUCION VIGA PERIMETRAL
1:250

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



SECCION C - C
1:100



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7955014?

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE A N + 4.60					
V-338 EJE 8 - 7	15 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 8 - 7	15 Y 94	91,19	2980MM	1,00	91,19
V-338 EJE 7 - 6	15 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 7 - 6	15 Y 94	91,19	2980MM	1,00	91,19
V-338 EJE 6 - 5	15 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 6 - 5	15 Y 94	91,19	2980MM	1,00	91,19
VIENEN:	264.196,17			SUBTOTAL	1.845,09
PASAN:	266.041,26			TOTAL	266.041,26

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

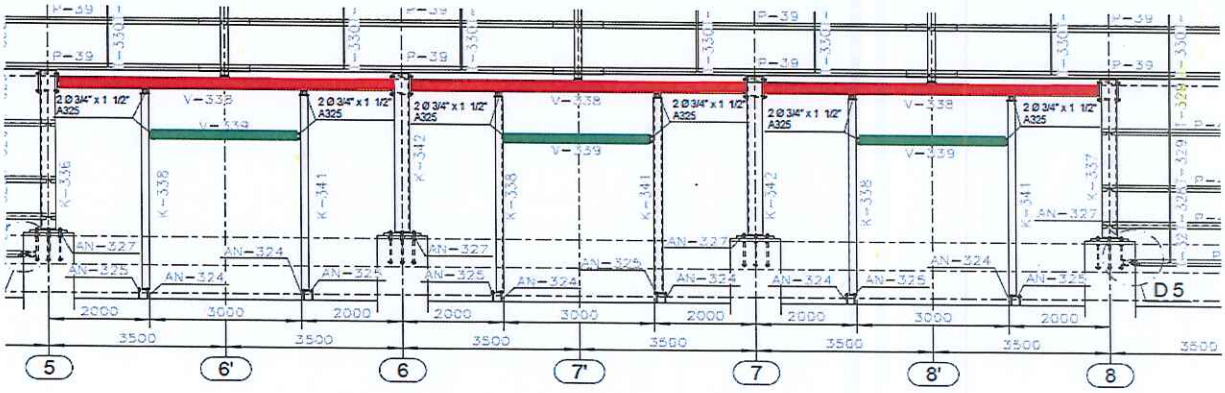

BASKETBALL ALZADO POR EJE A"
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650747

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE A N + 12,318					
V-333 EJE 12''' - 12'	3 - 4 Y 88	847,56	10000MM	1,00	847,56
V-336 EJE 12'- 11'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 11'- 10'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 10'- 9'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 9'- 8'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 8'- 7'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 7'- 6'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 6'- 5'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 5'- 4'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 4'- 3'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 3'- 2'	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-332 EJE 2' - 1'''	3 - 4 Y 87	741,21	8900MM	1,00	741,21
VIENEN:	266.041,26			SUBTOTAL	8.068,97
PASAN:	274.110,23			TOTAL	274.110,23

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

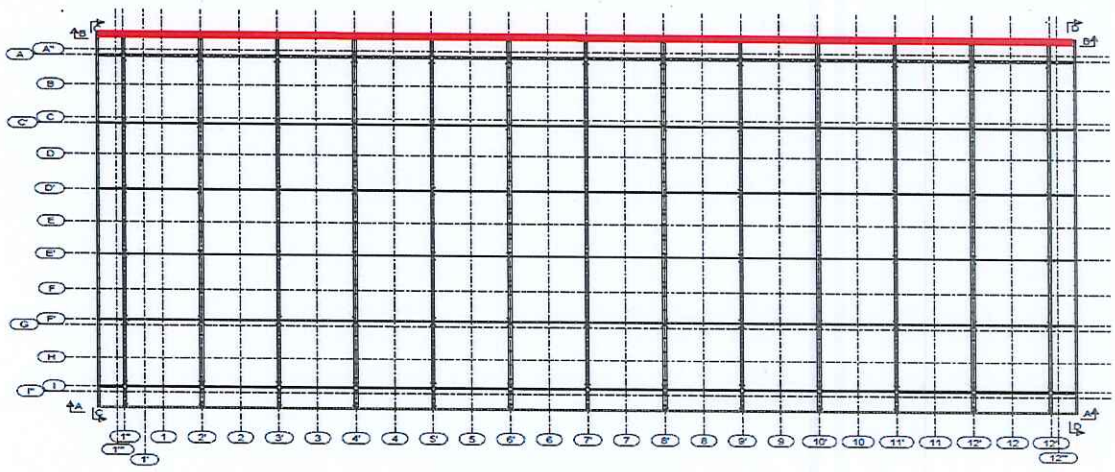

DISTRIBUCION VIGA PERIMETRAL
1:250

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 31/01/2023
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 02

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



SECCION B-B



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN CUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 20 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072006-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE I N + 4.60					
V-338 EJE 8 - 7	17 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 8 - 7	17 Y 111	91,19	2980MM	1,00	91,19
V-338 EJE 7 - 6	17 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 7 - 6	17 Y 111	91,19	2980MM	1,00	91,19
V-338 EJE 6 - 5	17 Y 93	523,84	6700MM	1,00	523,84
V-339 EJE 6 - 5	17 Y 111	91,19	2980MM	1,00	91,19
VIENEN:	274.110,23			SUBTOTAL	1.845,09
PASAN:	275.955,32			TOTAL	275.955,32

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

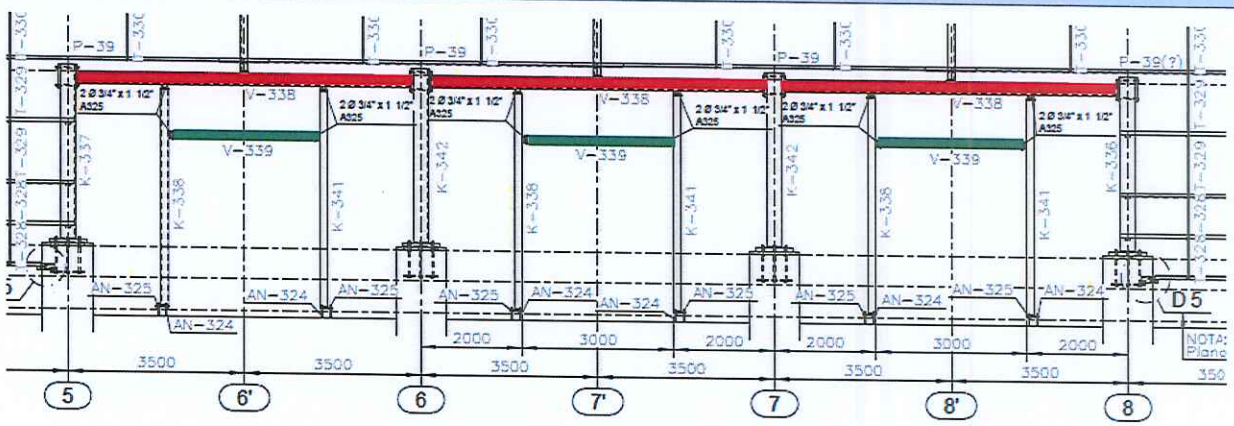

BASKETBALL ALZADO POR EJE I"
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79680147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	0
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
VIGAS FACHADA EJE I N + 12,318					
V-332 EJE 12´´´ - 12´	3 - 4 Y 87	741,21	8900MM	1,00	741,21
V-336 EJE 12´- 11´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 11´- 10´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 10´- 9´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 9´- 8´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 8´- 7´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 7´- 6´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 6´- 5´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 5´- 4´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 4´- 3´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-336 EJE 3´- 2´	3 - 4 Y 91	648,02	7000MM	1,00	648,02
V-333 EJE 2´ - 1´´´	3 - 4 Y 88	847,56	10000MM	1,00	847,56
VIENEN:	275.955,32			SUBTOTAL	8.068,97
PASAN:				TOTAL	284.024,29
			TOTAL	90%	255.621,86

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	255.621,86
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	2.316,16
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	253.305,70
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	73.206,32

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

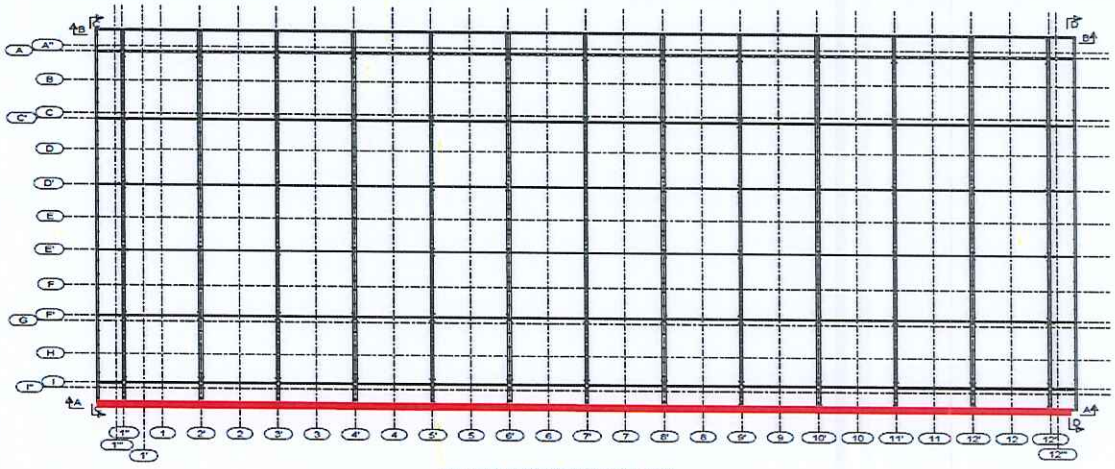

DISTRIBUCION VIGA PERIMETRAL
1:250

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND


Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



SECCION A-A



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-09033 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

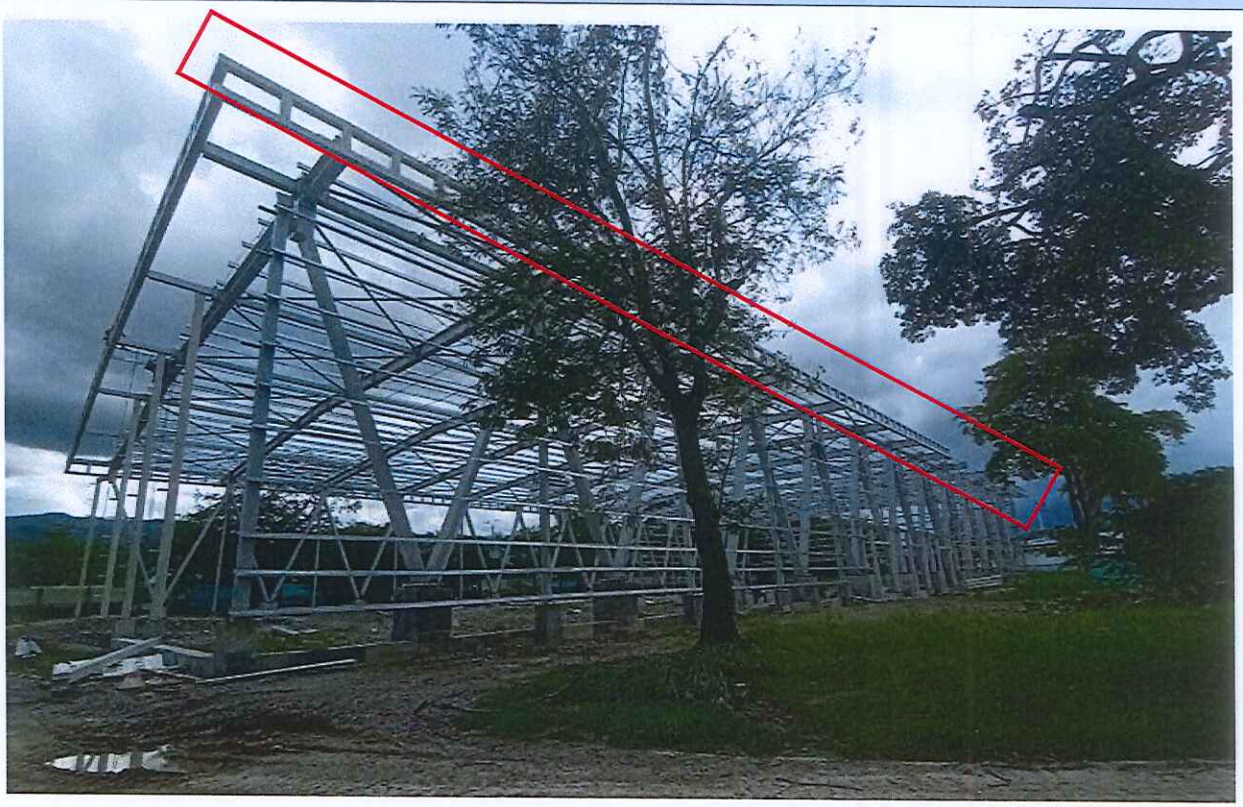

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ZAPATA					
Z6 - RH8	3/4"	2,235	4,15	308	2856,78
Z6 - RH9	3/4"	2,235	3,65	280	2284,17
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
Z5 - RH11	3/4"	2,235	3,55	133	1055,26
PEDESTALES					
PD-2 - RV1	1"	3,973	3,89	714,00	11034,849
PD2 - E1	1/2"	0,994	4,04	630,00	2529,929
PD2 - E2	1/2"	0,994	1,09	2520,00	2730,319
PD2 - E3	1/2"	0,994	1,29	1890,00	2.423,47
VIENEN:				SUBTOTAL	25.970,04
PASAN:	25.970,04			TOTAL	

OBSERVACIONES: VER PLANO 01 DE 01		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	33.944,57
LAS LETRAS AZULES, SON LAS CANTIDADES PAGAS EN LA PARCIAL N°2	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

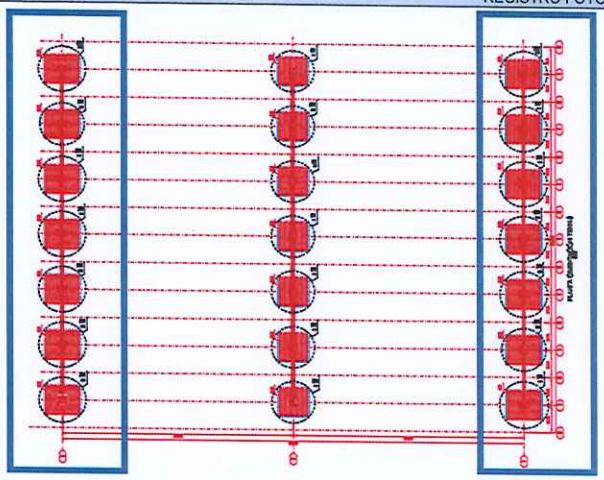

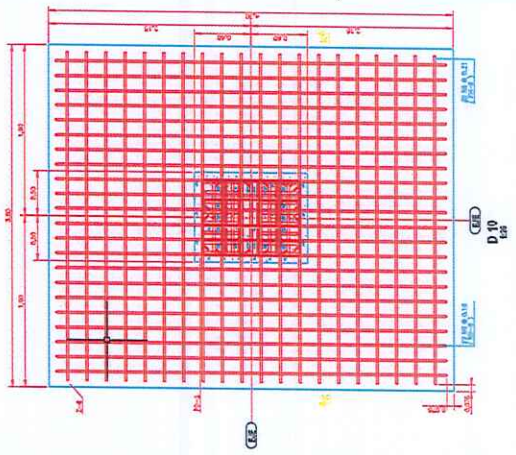

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
VIGA CIMENTACION					
INFERIOR	3/4"	2,235	6	9	114,66
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	12	9	241,38
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	12	9	241,38
SUPERIOR	3/4"	2,235	12	9	241,38
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	12	9	241,38
	3/4"	2,235	9	9	181,04
	3/4"	2,235	6	9	114,66
ESTRIBOS - E11	3/8"	0,560	1,21	810	548,86
VIENEN:	25.970,04			SUBTOTAL	2.467,86
PASAN:	28.437,90			TOTAL	28.437,90

OBSERVACIONES: VER PLANO 01 DE 01		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	33.944,57
LAS LETRAS AZULES, SON LAS CANTIDADES PAGAS EN LA PARCIAL N°2	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

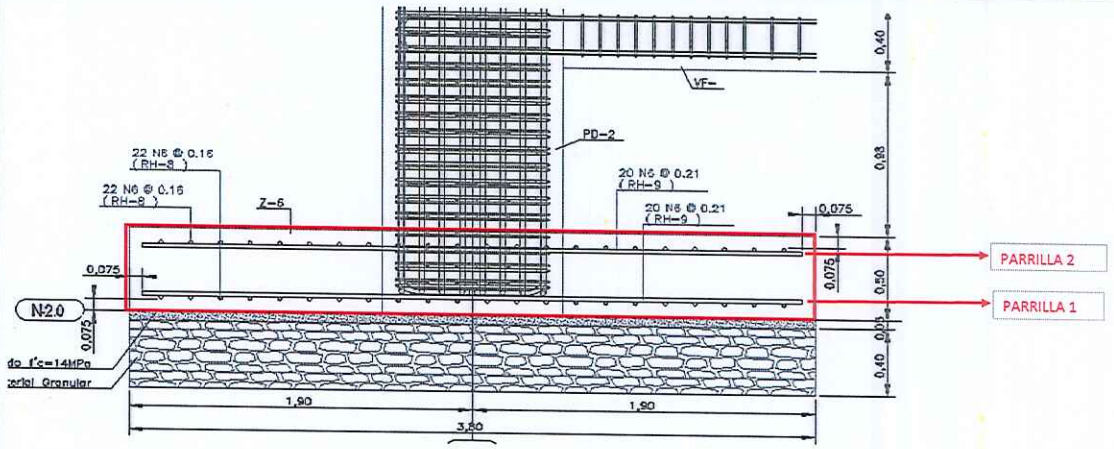

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090377 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	
ZAPATA - Z6 EJES A Y C					
Z6 - RH8 (PARRILLA 2)	3/4"	2,235	4,15	308	2856,78
Z6 - RH9 (PARRILLA 2)	3/4"	2,235	3,65	280	2284,17
VIENEN:	28.437,90			SUBTOTAL	5.140,95
PASAN:	5.140,95			TOTAL	33.578,85

OBSERVACIONES: VER PLANO 01 DE 01
SE INCLUYE 1 PARRILLA DE ESTE TIPO DE ZAPATAS, YA QUE EN EL ACTA ANTERIOR SOLO SE CUANTIFICO UNA PARRILLA, PERO EL DISEÑO INDICABA UNA PARRILLA INFERIOR Y UNA SUPERIOR, Y ASI SE CONSTRUYERON ESTAS ZAPATAS. LA PARRILLA FALTANTE ES 5,140,95 Kg

CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	33.944,57
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	33.578,85
CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	28.437,90
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	5.140,95
CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	365,72

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090237 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

ACTA	PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	CIMENTACION	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-73650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276
