ACTA DE PAGO PARCIAL
PARQUE SIKUANI

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 36.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.668.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.														
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	10.450,10	$ 5.457,00	$ 57.026.185,00	13.216,91	$ 72.124.678,00	8.926,89	$ 48.714.039,00		$ 0,00	8.926,89	$ 48.714.039,00	67,54%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00		289,10	$ 33.664.828,00	289,10	$ 33.664.828,00		$ 0,00	289,10	$ 33.664.828,00	100,00%
NP1.3	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00		249,60	$ 4.867.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TRANSPORTE Y DESPOSICIÓN DE EXCAVACIONES													
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3		$ 14.280,00		12.018,74	$ 171.627.607,00	4.012,87	$ 57.303.784,00		$ 0,00	4.012,87	$ 57.303.784,00	33,39%
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ		$ 248.800,00		1.699,93	$ 422.942.584,00	837,40	$ 208.345.120,00		$ 0,00	837,40	$ 208.345.120,00	49,26%
	SUBTOTAL				$ 57.026.185,00		$ 705.227.147,00		$ 348.027.771,00		$ 0,00		$ 348.027.771,00	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	197,59	$ 374.357,00	$ 73.970.493,00	495,42	$ 185.463.945,00	474,61	$ 177.673.576,00		$ 0,00	474,61	$ 177.673.576,00	95,80%
2,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	536,63	$ 18.557,00	$ 9.958.237,00	962,22	$ 17.855.917,00	754,16	$ 13.994.947,00		$ 0,00	754,16	$ 13.994.947,00	78,38%
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536,63	$ 13.810,00	$ 7.410.856,00	329,46	$ 4.549.843,00	307,68	$ 4.249.061,00		$ 0,00	307,68	$ 4.249.061,00	93,39%
2,4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	114,66	$ 292.430,00	$ 33.529.322,00	482,59	$ 141.123.794,00	260,67	$ 76.227.728,00		$ 0,00	260,67	$ 76.227.728,00	54,01%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 33.199,00		319,27	$ 10.599.445,00	319,27	$ 10.599.445,00		$ 0,00	319,27	$ 10.599.445,00	100,00%
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND		$ 113.082,00		13,00	$ 1.470.066,00	10,00	$ 1.130.820,00		$ 0,00	10,00	$ 1.130.820,00	76,92%
NP2.7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 24.024,00		74,75	$ 1.795.794,00	29,53	$ 709.429,00		$ 0,00	29,53	$ 709.429,00	39,51%
NP2.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 8.058,00		73,10	$ 589.040,00	73,10	$ 589.040,00		$ 0,00	73,10	$ 589.040,00	100,00%
NP2.9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 10.951,00		351,61	$ 3.850.481,00	159,86	$ 1.750.627,00		$ 0,00	159,86	$ 1.750.627,00	45,47%
NP2.10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN		$ 42.060,00		18,00	$ 757.080,00	9,00	$ 378.540,00		$ 0,00	9,00	$ 378.540,00	50,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND		$ 52.585,00		6,00	$ 315.510,00	4,00	$ 210.340,00		$ 0,00	4,00	$ 210.340,00	66,67%
NP2.12	DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 13.897,00		208,06	$ 2.891.410,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP2.13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 236.457,00		12,00	$ 2.837.484,00	8,00	$ 1.891.656,00		$ 0,00	8,00	$ 1.891.656,00	66,67%
NP2.14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 236.875,00		20,00	$ 4.737.500,00	20,00	$ 4.737.500,00		$ 0,00	20,00	$ 4.737.500,00	100,00%
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 169.110,00		20,00	$ 3.382.200,00	20,00	$ 3.382.200,00		$ 0,00	20,00	$ 3.382.200,00	100,00%
NP2.16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND		$ 92.696,00		8,00	$ 741.568,00	8,00	$ 741.568,00		$ 0,00	8,00	$ 741.568,00	100,00%
NP2.17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 411.540,00		55,01	$ 22.638.815,00	55,01	$ 22.638.815,00		$ 0,00	55,01	$ 22.638.815,00	100,00%
NP2.18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 489.919,00		28,45	$ 13.938.196,00	27,04	$ 13.247.410,00		$ 0,00	27,04	$ 13.247.410,00	95,04%
NP2.19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 607.205,00		314,72	$ 191.099.558,00	261,89	$ 159.020.917,00		$ 0,00	261,89	$ 159.020.917,00	83,21%
NP2.20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 14.700,00		105,12	$ 1.545.264,00	84,37	$ 1.240.239,00		$ 0,00	84,37	$ 1.240.239,00	80,26%
NP2.21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M3		$ 242.874,00		225,66	$ 54.806.947,00	225,66	$ 54.806.947,00		$ 0,00	225,66	$ 54.806.947,00	100,00%
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 434.789,00		81,01	$ 35.222.257,00	74,39	$ 32.343.954,00		$ 0,00	74,39	$ 32.343.954,00	91,83%
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 24.294,00		588,47	$ 14.296.290,00	256,96	$ 6.242.586,00		$ 0,00	256,96	$ 6.242.586,00	43,67%
	SUBTOTAL				$ 124.868.908,00		$ 716.508.404,00		$ 587.807.345,00		$ 0,00		$ 587.807.345,00	
	CANCHA DE BASKETBALL													
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	816,31	$ 38.640,00	$ 31.542.064,00	1.043,01	$ 40.301.906,00	1.043,01	$ 40.301.906,00		$ 0,00	1.043,01	$ 40.301.906,00	100,00%
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	794,35	$ 76.585,00	$ 60.835.448,00	192,36	$ 14.731.891,00	89,07	$ 6.821.426,00		$ 0,00	89,07	$ 6.821.426,00	46,30%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.626,15	$ 63.830,00	$ 103.797.266,00	2.080,53	$ 132.800.230,00	728,56	$ 46.503.985,00		$ 0,00	728,56	$ 46.503.985,00	35,02%
	SUBTOTAL				$ 196.174.778,00		$ 187.834.027,00		$ 93.627.317,00		$ 0,00		$ 93.627.317,00	
4	CIMENTACIÓN													

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005560071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.260,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18,59	$ 643.591,00	$ 11.963.070,00	23,74	$ 15.278.850,00	22,28	$ 14.339.207,00		$ 0,00	22,28	$ 14.339.207,00	93,85%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,8485	$ 2.338.652,00	$ 156.335.378,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	76,115	$ 939.801,00	$ 71.532.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	53,664	$ 1.012.044,00	$ 54.310.329,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	117,912	$ 651.075,00	$ 76.769.555,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	36.605,332	$ 8.544,00	$ 312.755.957,00	44.390,32	$ 379.270.894,00	39.726,11	$ 339.419.884,00		$ 0,00	39.726,11	$ 339.419.884,00	89,49%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	514,68375	$ 824.636,00	$ 424.426.749,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.881.175,00		100,93	$ 189.866.993,00	100,85	$ 189.716.499,00		$ 0,00	100,85	$ 189.716.499,00	99,92%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.213.868,00		240,53	$ 291.971.670,00	240,53	$ 291.971.670,00		$ 0,00	240,53	$ 291.971.670,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.247.102,00		35,65	$ 44.459.186,00	34,88	$ 43.498.918,00		$ 0,00	34,88	$ 43.498.918,00	97,84%
	SUBTOTAL				**$ 1.108.093.991,00**		**$ 920.847.593,00**		**$ 878.946.178,00**		**$ 0,00**		**$ 878.946.178,00**	
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	298,164	$ 128.878,00	$ 38.426.780,00	298,16	$ 38.426.264,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	30,80277	$ 677.128,00	$ 20.857.418,00	30,80	$ 20.855.542,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.253.916,00		522,04	$ 654.594.309,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 59.284.198,00**		**$ 713.876.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**													
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217.276,0821567	$ 25.899,00	$ 5.627.233.252,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12.747,20	$ 9.991,00	$ 127.357.275,00	12.747,20	$ 127.357.275,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.066.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG		$ 33.906,00		328.828,18	$ 11.149.248.271,00	2.316,16	$ 78.531.721,00	253.305,70	$ 8.588.583.064,00	255.621,86	$ 8.667.114.785,00	77,74%
	SUBTOTAL				**$ 6.754.590.527,00**		**$ 11.276.605.546,00**		**$ 78.531.721,00**		**$ 8.588.583.064,00**		**$ 8.667.114.785,00**	
7	CUBIERTA Y FACHADA													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	4.081,53	$ 255.278,00	$ 1.041.924.815,00	4.081,53	$ 1.041.924.815,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	2.126,6602	$ 1.064.060,00	$ 2.262.694.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	276,90	$ 136.546,00	$ 37.809.587,00	276,90	$ 37.809.587,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE O SIMILAR PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLEEN DOS CARAS	M2		$ 904.233,00		2.126,66	$ 1.922.996.152,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.342.628.454,00**		**$ 3.002.730.554,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
8	MAMPOSTERÍA													
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	759,33078	$ 53.902,00	$ 40.929.448,00	759,33	$ 40.929.406,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,39403	$ 1.343.430,00	$ 11.276.792,00	8,39	$ 11.271.378,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12,3135	$ 1.382.134,00	$ 17.018.907,00	12,31	$ 17.014.070,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	19,99	$ 1.012.044,00	$ 20.231.164,00	19,99	$ 20.230.760,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,5	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,632	$ 1.996.272,00	$ 3.257.916,00	1,63	$ 3.253.923,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,6	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	8,16	$ 142.694,00	$ 1.164.383,00	8,16	$ 1.164.383,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	276,91275	$ 26.628,00	$ 7.373.633,00	276,91	$ 7.373.559,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	262,3388	$ 36.215,00	$ 9.500.600,00	262,34	$ 9.500.643,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.260,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.740,938592	$ 8.544,00	$ 14.874.579,00	1.740,94	$ 14.874.591,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 125.627.422,00**		**$ 125.612.713,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	15,00	$ 1.416.495,00	$ 21.247.425,00	18,00	$ 25.496.910,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 903.966,00	$ 903.966,00	1,00	$ 903.966,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	6,00	$ 957.101,00	$ 5.742.606,00	6,00	$ 5.742.606,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	19,00	$ 506.457,00	$ 9.622.683,00	22,00	$ 11.142.054,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	5,00	$ 162.556,00	$ 812.780,00	5,00	$ 812.780,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1,00	$ 329.093,00	$ 329.093,00	1,00	$ 329.093,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	11,64	$ 156.736,00	$ 1.824.407,00	12,00	$ 1.880.832,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	19,00	$ 388.578,00	$ 7.382.982,00	22,00	$ 8.548.716,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 47.865.942,00**		**$ 54.856.957,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**													
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	64,62	$ 722.824,00	$ 46.708.887,00	64,62	$ 46.708.887,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	15,675	$ 225.058,00	$ 3.527.784,00	15,68	$ 3.528.909,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	77,45	$ 311.411,00	$ 24.118.782,00	77,45	$ 24.118.782,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	83,35	$ 1.597.087,00	$ 133.117.201,00	83,35	$ 133.117.201,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1,80 m E= 10mm. INC DEMARCACIÓN	JGO	3,00	$ 1.483.648,00	$ 4.450.944,00	3,00	$ 4.450.944,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 211.923.598,00**		**$ 211.924.723,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
11	**OBRAS EXTERIORES**													
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	125,784	$ 63.830,00	$ 8.028.793,00	125,78	$ 8.028.537,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5 CM	M2	628,92	$ 226.441,00	$ 142.413.274,00	628,92	$ 142.413.274,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	270,80	$ 131.566,00	$ 35.628.073,00	270,80	$ 35.628.073,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 186.070.140,00**		**$ 186.069.884,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
12	PISOS Y ENCHAPES													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	138,1425	$ 48.283,00	$ 6.669.934,00	138,14	$ 6.669.814,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	138,1425	$ 204.130,00	$ 28.199.029,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	101,2455	$ 52.732,00	$ 5.338.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	178,645	$ 136.174,00	$ 24.326.804,00	316,79	$ 43.138.561,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,5	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 40 CMS X 40 CMS, FILTRO UV	M2	2.501,73	$ 832.690,00	$ 2.083.165.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP12.6	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 30 CMS X 30 CMS, FILTRO UV	M2		$ 813.992,00		1.839,33	$ 1.497.199.905,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 2.147.700.199,00		$ 1.547.008.280,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
13	ACABADOS													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	100,50525	$ 12.171,00	$ 1.223.249,00	100,51	$ 1.223.307,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	262,3388	$ 13.992,00	$ 3.670.644,00	262,34	$ 3.670.661,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	100,50525	$ 17.849,00	$ 1.793.918,00	100,51	$ 1.794.003,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	137,786	$ 131.515,00	$ 18.120.926,00	137,79	$ 18.121.452,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 24.808.737,00		$ 24.809.423,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	14. CUBIERTA DE TENIS													
14	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	584,25	$ 38.640,00	$ 22.575.420,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	1.537,76	$ 59.419.046,00		$ 0,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	100,00%
14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	516,57425	$ 76.585,00	$ 39.561.839,00	1.281,26	$ 98.125.297,00	64,92	$ 4.971.898,00		$ 0,00	64,92	$ 4.971.898,00	5,07%
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.437,538	$ 63.830,00	$ 91.758.051,00	1.437,54	$ 91.758.178,00	423,24	$ 27.015.409,00		$ 0,00	423,24	$ 27.015.409,00	29,44%
	SUBTOTAL				$ 153.895.310,00		$ 249.302.521,00		$ 91.406.353,00		$ 0,00		$ 91.406.353,00	
	CIMENTACIÓN													
15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	11,20	$ 643.591,00	$ 7.208.219,00	19,23	$ 12.376.255,00	18,40	$ 11.842.074,00		$ 0,00	18,40	$ 11.842.074,00	95,68%
15,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50,27	$ 2.338.652,00	$ 117.564.036,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	52,68	$ 939.801,00	$ 49.508.717,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,41	$ 1.012.044,00	$ 35.836.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
15,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	68,78	$ 651.075,00	$ 44.780.939,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	25.841,28	$ 8.544,00	$ 220.787.896,00	33.944,57	$ 290.022.406,00	28.437,90	$ 242.973.418,00	5.140,95	$ 43.924.251,00	33.578,85	$ 286.897.669,00	98,92%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	M3		$ 749.229,00		42,57	$ 31.894.679,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.881.175,00		68,04	$ 127.995.147,00	68,04	$ 127.995.147,00		$ 0,00	68,04	$ 127.995.147,00	100,00%
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.213.868,00		162,30	$ 197.010.776,00	162,30	$ 197.010.776,00		$ 0,00	162,30	$ 197.010.776,00	100,00%
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.247.102,00		17,28	$ 21.549.923,00	17,28	$ 21.549.923,00		$ 0,00	17,28	$ 21.549.923,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 475.686.285,00		$ 680.849.186,00		$ 601.371.338,00		$ 43.924.251,00		$ 645.295.589,00	
	CUBIERTA Y FACHADA													
16,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	3.576,42	$ 255.278,00	$ 912.981.345,00	3.576,42	$ 912.981.345,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	1.064,00	$ 1.064.060,00	$ 1.132.159.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	216,00	$ 136.546,00	$ 29.493.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 2.074.635.121,00		$ 912.981.345,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	ESTRUCTURAS EN ACERO													
17,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	152.252,840691	$ 25.899,00	$ 3.943.196.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG		$ 33.906,00		242.425,48	$ 8.219.678.325,00	218.181,38	$ 7.397.657.870,00		$ 0,00	218.181,38	$ 7.397.657.870,00	90,00%
	SUBTOTAL				$ 3.943.196.321,00		$ 8.219.678.325,00		$ 7.397.657.870,00		$ 0,00		$ 7.397.657.870,00	

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.145.260,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	OBRAS EXTERIORES													
18,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	234,95148	$ 63.830,00	$ 14.996.953,00	234,95	$ 14.996.859,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5	M2	1.174,7574	$ 226.441,00	$ 266.013.240,00	1.174,76	$ 266.013.829,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	218,00	$ 131.566,00	$ 28.681.388,00	218,00	$ 28.681.388,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML		$ 94.072,00		2.200,05	$ 206.963.104,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 309.691.581,00		$ 516.655.180,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS													
19,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	509,12478	$ 38.640,00	$ 19.672.581,00	842,45	$ 32.552.268,00	609,30	$ 23.543.352,00		$ 0,00	609,30	$ 23.543.352,00	72,32%
19,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	509,12478	$ 63.830,00	$ 32.497.435,00	1.584,18	$ 101.118.209,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,3	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P	M3	58,6176	$ 651.075,00	$ 38.164.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	488,48	$ 131.566,00	$ 64.267.360,00	488,48	$ 64.267.360,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE	UN	16,00	$ 722.490,00	$ 11.559.840,00	16,00	$ 11.559.840,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	488,48	$ 138.781,00	$ 67.791.743,00	488,48	$ 67.791.743,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,7	CAPA FILTRANTE (15 CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 100.451,00	$ 340.947.289,00	3.394,17	$ 340.947.771,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,8	CAPA MIXTA NUEVA (5CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 78.633,00	$ 266.893.392,00	3.394,17	$ 266.893.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,9	CAPA DE POLVO DE LADRILLO FINO	M2	3.394,1652	$ 33.901,00	$ 115.065.594,00	3.394,17	$ 115.065.757,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS SINTETICAS AMERICANAS	JGO	4,00	$ 8.702.957,00	$ 34.811.828,00	4,00	$ 34.811.828,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,11	POSTES TIPO ATP	JGO	4,00	$ 4.674.253,00	$ 18.697.012,00	4,00	$ 18.697.012,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	UN	4,00	$ 1.719.740,00	$ 6.878.960,00	4,00	$ 6.878.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,13	PASING DE SALIDA DE AGUA	UN	4,00	$ 850.954,00	$ 3.403.816,00	4,00	$ 3.403.816,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.020.651.304,00		$ 1.063.988.334,00		$ 23.543.352,00		$ 0,00		$ 23.543.352,00	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071		
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024	a	20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.148.260,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023		
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com		
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.		
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
20	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FUTBOL 5													
20,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	337,50	$ 38.640,00	$ 13.041.000,00	337,50	$ 13.041.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.125,00	$ 14.734,00	$ 16.575.750,00	1.125,00	$ 16.575.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	240,00	$ 131.566,00	$ 31.575.840,00	240,00	$ 31.575.840,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12,00	$ 722.490,00	$ 8.669.880,00	12,00	$ 8.669.880,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	1.125,00	$ 3.284,00	$ 3.694.500,00	1.125,00	$ 3.694.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,6	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE RECEBO B-400 40 CMS	M3	168,75	$ 367.287,00	$ 61.979.681,00	168,75	$ 61.979.681,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRAVA(INCLUYE: MATERIAL GRAVA, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA) E=0,15M	M3	112,50	$ 378.776,00	$ 42.612.300,00	112,50	$ 42.612.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,8	SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM DE ALTURA LICENCIATARIA PRODUCER (FPP), MONOFILAMENTO, COLOR VERDE IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE MANO DE OBRA, RELLENOS EN CAUCHO Y ARENA.	M2	1.125,00	$ 326.244,00	$ 367.024.500,00	1.125,00	$ 367.024.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,9	CERRAMIENTO EN PIOLA NYLON, IMPERMEABILIZADA, HUECO DE 10 CM, INCLUYE POSTES METALICOS DE 2" 1/2 EN AGUA NEGRA CALIBRE 16, DADOS EN CONCRETO EN CADA POSTE, TEMPLETES Y GUAYAS. PERIMETRAL 5 MTS DE ALTURA.	M2	1.200,00	$ 169.273,00	$ 203.127.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS 3X2 DE FUTBOL(INC MALLAS IMPERMEABILIZADAS)	UND	6,00	$ 6.844.156,00	$ 41.064.936,00	6,00	$ 41.064.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.11	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 12.776,00		1.248,00	$ 15.944.448,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 789.365.987,00		$ 602.182.835,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
21	PARQUEADERO													
21,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	2.040,4642	$ 38.640,00	$ 78.843.537,00	2.805,66	$ 108.410.702,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	816,18568	$ 63.830,00	$ 52.097.132,00	1.438,80	$ 91.838.604,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.991.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
21,3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.020,2321	$ 229.934,00	$ 234.586.048,00	1.020,23	$ 234.585.565,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	410,533284	$ 1.096.869,00	$ 450.301.233,00	410,53	$ 450.297.631,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	553,9996	$ 98.967,00	$ 54.827.678,00	554,00	$ 54.827.718,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 870.655.628,00**		**$ 939.960.220,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
22	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
22,1	LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET	M2	7.127,1322	$ 6.945,00	$ 49.497.933,00	7.127,13	$ 49.497.918,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP22.2	MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS EXISTENTES	UN		$ 131.000.000,00		8,00	$ 1.048.000.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP22.3	CERRAMIENTO EN TUBO CIRCULAR DE 2 PULGADAS GALVANIZADO 1.5MM CADA 2,5M Y MODULOS TUBO CUADRADO DE 1 1/2x1 1/2 X 1.1MM CAL 18 H 2M	ML		$ 813.191,00		284,00	$ 230.946.244,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 49.497.933,00**		**$ 1.328.444.162,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
23	**RED ELECTRICA**													
23,1	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: AREALED II 512LED Potencia: 274W.	UN	68,00	$ 4.629.839,00	$ 314.829.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,2	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 320 LED Potencia: 170W.	UN	50,00	$ 1.943.720,00	$ 97.186.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,3	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 256 LED Potencia: 137W.	UN	24,00	$ 1.114.019,00	$ 26.736.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,4	Luminaria para la iluminación de vias y espacios urbanos REF.: OMEGA I 48LED Potencia: 28W.	UN	137,00	$ 753.667,00	$ 103.252.379,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,5	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADORAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	59,00	$ 1.450.126,00	$ 85.557.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,6	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO DOBLE TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	39,00	$ 1.896.203,00	$ 73.951.917,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.260,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
23,7	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 2 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 10,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	12,00	$ 3.601.143,00	$ 43.213.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,8	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 4 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 14,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	8,00	$ 4.970.820,00	$ 39.766.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	98,00	$ 606.586,00	$ 59.445.428,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,10	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	6,00	$ 1.156.397,00	$ 6.938.382,00	8,00	$ 9.251.176,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,11	ACOMETIDA PARCIAL 2X8+10T THHN AWG	ML	2.374,00	$ 60.777,00	$ 144.284.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,12	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	514,00	$ 85.814,00	$ 44.108.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,13	Tubo Metalico Conduit Galvanizado IMC de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	36,00	$ 163.411,00	$ 5.882.796,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,14	Tubo PVC de 2" CONDUIT INLCUYE ACCESORIOS	ML	3.468,00	$ 43.364,00	$ 150.386.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,15	Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos INCLUYE BRAKERS	UN	3,00	$ 521.599,00	$ 1.564.797,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,16	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	104,00	$ 74.470,00	$ 7.744.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,17	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	118,00	$ 222.317,00	$ 26.233.406,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,18	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 480.306,00	$ 4.322.754,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	UN	112,00	$ 73.301,00	$ 8.209.712,00	520,00	$ 38.116.520,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	32,00	$ 14.053.024,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	56,00	$ 59.832,00	$ 3.350.592,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP23.22	RECONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND		$ 8.614.325,00		3,00	$ 25.842.975,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFOMADORES	UND		$ 25.701.870,00		3,00	$ 77.105.610,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO BALONCESTO													
NP23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BALONCESTO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 10.205.049,00		1,00	$ 10.205.049,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.25	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x4/0+4/0+1/0T) AL	ML		$ 499.043,00		85,00	$ 42.418.655,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.668.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.26	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO		$ 633.848,00		15,00	$ 9.507.720,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.27	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML		$ 128.057,00		320,00	$ 40.978.240,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.28	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (TOMACORRIENTE BIFÁSICO Y ACCESORIOS)	PTO		$ 239.211,00		30,00	$ 7.176.330,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.29	SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA, EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO		$ 481.678,00		25,00	$ 12.041.950,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.30	SALIDA LETRERO LED Y LUMINARIA EMERGENCIA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO		$ 420.826,00		49,00	$ 20.620.474,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.31	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO		$ 331.117,00		30,00	$ 9.933.510,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.32	ACOMETIDA PARCIAL (1X12+12+12T) CU CANCHA 1 Y 2 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2)	ML		$ 83.300,00		430,00	$ 35.819.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.33	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (ACCESORIOS)	PTO		$ 37.725,00		12,00	$ 452.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.34	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS) INTERIOR	PTO		$ 415.109,00		5,00	$ 2.075.545,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO BALONCESTO	ML		$ 198.941,00		92,00	$ 18.118.572,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.36	LUMINARIA HIGH BAY 100W	UND		$ 777.314,00		6,00	$ 4.663.884,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.37	LUMINARIA HIGH BAY 200W	UND		$ 1.153.755,00		45,00	$ 51.918.975,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.38	LUMINARIA HERMÉTICA 40W	UND		$ 459.591,00		49,00	$ 22.519.959,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.39	LUMINARIA EMERGENCIA 3,2W	UND		$ 272.525,00		15,00	$ 4.087.875,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.40	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND		$ 283.032,00		10,00	$ 2.830.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO TENIS													
NP23.41	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO TENIS Y SUS CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 13.922.597,00		1,00	$ 13.922.597,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (3X4/0+4/0+2/0T) AL	ML		$ 262.375,00		112,00	$ 29.386.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.43	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO		$ 632.310,00		32,00	$ 20.233.920,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.44	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA TENIS INCLUYE (CABLEADO #12 CU, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO		$ 316.340,00		20,00	$ 6.326.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 36.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO TENIS	ML		$ 196.941,00		18,00	$ 3.544.938,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.46	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ESCENARIO TENIS	ML		$ 26.865,00		72,00	$ 1.934.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.47	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 5.408.516,00		8,00	$ 43.268.128,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.48	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 8.361.929,00		4,00	$ 33.447.716,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.49	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) ESCENARIO EXTERIOR	UND		$ 7.809.211,00		2,00	$ 15.618.422,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL ESCENARIO TENIS	ML		$ 74.143,00		291,00	$ 21.575.613,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.51	LUMINARIA HIGH BAY 240W (PROYECTORES) ESCENARIO TENIS EXTERIOR	UND		$ 1.342.405,00		32,00	$ 42.956.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND		$ 650.944,00		24,00	$ 15.622.656,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	ESCENARIO FUTBOL 5													
NP23.53	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO FUTBOL 5 CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIGRAMA UNIFILAR	UND		$ 10.847.782,00		1,00	$ 10.847.782,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.54	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CANCHA DE FUTBOL	ML		$ 26.865,00		159,96	$ 4.297.325,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.55	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML		$ 128.057,00		12,00	$ 1.536.684,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL CANCHA FÚTBOL 5	ML		$ 74.143,00		237,00	$ 17.571.891,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.57	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 8.361.929,00		8,00	$ 66.895.432,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.58	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) CANCHA FUTBOL5	UND		$ 7.809.211,00		2,00	$ 15.618.422,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND		$ 650.944,00		12,00	$ 7.811.328,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1 - 1/2"	ML		$ 170.531,00		8,00	$ 1.364.248,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	BAJA TENSION													
NP23.61	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND		$ 1.726.392,00		37,00	$ 63.876.504,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.62	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC	ML		$ 96.056,00		178,00	$ 17.097.968,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.63	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1 1/2" PVC	ML		$ 65.988,00		922,00	$ 60.840.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.64	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 76.576,00		583,40	$ 44.675.605,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.65	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.446,00		466,20	$ 17.457.325,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.66	LED Street Light Urban 60W PARA A.P	UND		$ 1.683.078,00		21,00	$ 35.344.638,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 38.225.140.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.67	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO DOBLE CON AVANCE 2M ALTURA 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 7.282.929,00		5,00	$ 36.414.645,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.68	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO SENCILLO AVANCE 2M ALTURA 11 M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND		$ 6.996.091,00		11,00	$ 76.957.001,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL AP	ML		$ 74.143,00		420,00	$ 31.140.060,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.70	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO CU 3X12 AP	ML		$ 26.865,00		389,97	$ 10.476.544,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.71	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML		$ 148.243,00		541,00	$ 80.199.463,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO													
NP23.72	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UND		$ 1.646.175,00		4,00	$ 6.584.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC DE 1"	UND		$ 129.349,00		4,00	$ 517.396,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)													
NP23.74	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML		$ 96.056,00		150,00	$ 14.408.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.75	REUBICACION CABLE DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)	ML		$ 46.146,00		150,00	$ 6.921.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.76	PRUEBAS VLF CABLE MEDIA TENSION	UND		$ 2.575.895,00		1,00	$ 2.575.895,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.77	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO		$ 898.221,00		1,00	$ 898.221,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.78	CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML		$ 48.929,00		48,00	$ 2.348.592,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.248.722.235,00		$ 1.342.254.998,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	HIDROSANITARIO													
24	**RED DE SUMINISTRO**													
	PRELIMINARES													
24,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	548,52	$ 5.542,00	$ 3.039.898,00	862,84	$ 4.781.859,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 3.039.898,00		$ 4.781.859,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	EXCAVACIONES													
24,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,9820	$ 68.927,00	$ 13.232.743,00	254,32	$ 17.529.515,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	41,5961	$ 248.800,00	$ 10.349.110,00	44,00	$ 10.947.200,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 23.581.853,00		$ 28.476.715,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	RELLENOS Y BASES													
24,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	54,852	$ 120.260,00	$ 6.596.502,00	91,61	$ 11.017.019,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
24,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	137,13	$ 63.830,00	$ 8.753.008,00	168,25	$ 10.739.398,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 15.349.510,00**		**$ 21.756.417,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
24,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	258,64	$ 40.469,00	$ 10.466.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	189,15	$ 38.486,00	$ 7.279.627,00	233,17	$ 8.973.781,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,75	$ 27.820,00	$ 744.185,00	36,10	$ 1.004.302,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29,41	$ 19.147,00	$ 563.113,00	43,00	$ 823.321,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,09	$ 16.230,00	$ 309.831,00	290,23	$ 4.710.433,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,11	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,48	$ 13.335,00	$ 339.776,00	93,78	$ 1.250.556,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 58.609,00	$ 1.816.879,00	31,00	$ 1.816.879,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 80.521,00	$ 1.288.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,14	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 329.549,00	$ 1.318.196,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 140.295,00	$ 140.295,00	2,00	$ 280.590,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4,00	$ 160.779,00	$ 643.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø3" UM	UN	3,00	$ 128.088,00	$ 384.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,18	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 23.548,00	$ 188.384,00	75,00	$ 1.766.100,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,19	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 11.595,00	$ 243.495,00	22,00	$ 255.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,20	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 6.038,00	$ 114.722,00	15,00	$ 90.570,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,21	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 3.781,00	$ 151.240,00	109,00	$ 412.129,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,22	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 43.830,00	$ 87.660,00	15,00	$ 657.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 26.080.021,00**		**$ 22.041.201,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP24.23	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 56.277,00		166,56	$ 9.373.497,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.24	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 61.795,00		46,00	$ 2.842.570,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.25	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 271.632,00		4,00	$ 1.086.528,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.26	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 166.961,00		1,00	$ 166.961,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.27	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 52.435,00		4,00	$ 209.740,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.28	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 35.864,00		2,00	$ 71.728,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°**	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.29	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 70.543,00		8,00	$ 564.344,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.30	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 129.483,00		16,00	$ 2.071.728,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.31	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=88 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 8 HP, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN		$ 119.331.452,00		1,00	$ 119.331.452,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 135.718.548,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS RCI													
NP24.32	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2		$ 5.457,00		69,00	$ 376.533,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00		177,33	$ 6.852.031,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.34	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		$ 643.591,00		3,45	$ 2.220.389,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.35	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.082.950,00		20,70	$ 22.417.065,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML		$ 64.244,00		41,00	$ 2.634.004,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3		$ 1.465.859,00		31,61	$ 46.335.803,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.38	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2		$ 301.244,00		69,00	$ 20.785.836,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.39	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG		$ 8.544,00		8.410,60	$ 71.860.166,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.40	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2		$ 53.902,00		23,69	$ 1.276.938,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.41	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 26.628,00		23,69	$ 630.617,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.42	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 36.215,00		23,69	$ 857.933,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.382.134,00		0,34	$ 469.926,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.44	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.343.430,00		0,41	$ 550.806,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.991.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2		$ 722.824,00		7,65	$ 5.529.604,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2		$ 228.360,00		13,20	$ 3.014.352,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.47	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 12.171,00		23,69	$ 288.331,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.48	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 13.992,00		23,69	$ 331.470,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 186.432.004,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED DE SUMINISTRO				**$ 68.051.282,00**		**$ 399.206.744,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
25	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													
25,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	625,57	$ 5.542,00	$ 3.466.909,00	303,63	$ 1.682.717,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.466.909,00**		**$ 1.682.717,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	466,7306	$ 68.927,00	$ 33.548.880,00	119,82	$ 8.258.833,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	105,46	$ 248.800,00	$ 26.238.448,00	21,00	$ 5.224.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 59.787.328,00**		**$ 13.483.633,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
25,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	117,9278	$ 120.260,00	$ 14.181.997,00	49,52	$ 5.955.275,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	300,1972	$ 63.830,00	$ 19.161.587,00	66,77	$ 4.261.929,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 33.343.584,00**		**$ 10.217.204,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
25,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	490,04	$ 101.390,00	$ 49.685.156,00	34,30	$ 3.477.677,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,66	$ 97.184,00	$ 3.562.765,00	63,00	$ 6.122.592,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,92	$ 47.055,00	$ 1.784.326,00	129,85	$ 6.110.092,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,78	$ 38.469,00	$ 1.107.138,00	25,72	$ 989.423,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,17	$ 26.191,00	$ 842.564,00	50,76	$ 1.329.455,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 36.633,00	$ 1.758.384,00	80,00	$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 21.249,00	$ 1.041.201,00	50,00	$ 1.062.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 11.935,00	$ 393.855,00	50,00	$ 596.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 88.703,00	$ 1.685.357,00	22,00	$ 1.951.466,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 33.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
25,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 69.525,00	$ 278.100,00	5,00	$ 347.625,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	9,00	$ 70.518,00	$ 634.662,00	10,00	$ 705.180,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	6,00	$ 86.037,00	$ 516.222,00	6,00	$ 516.222,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 86.965,00	$ 1.478.405,00	19,00	$ 1.652.335,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 64.768.135,00**		**$ 27.791.907,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
25,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	7,00	$ 4.963.385,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 871.930,00	$ 3.487.720,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	4,00	$ 957.772,00	$ 3.831.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	4,00	$ 515.579,00	$ 2.062.316,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	4,00	$ 504.165,00	$ 2.016.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 14.234.004,00**		**$ 4.963.385,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP25.24	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.276.962,00		15,00	$ 19.154.430,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.25	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN		$ 1.104.693,00		5,00	$ 5.523.465,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.26	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN		$ 1.366.427,00		5,00	$ 6.832.135,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 0,00**		**$ 31.510.030,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TOTAL RED SANITARIA				**$ 175.599.960,00**		**$ 89.648.876,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
26	**RED AGUAS LLUVIAS**													
	PRELIMINARES													

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.401,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.094,63	$ 5.542,00	$ 6.066.439,00	1.311,56	$ 7.268.666,00	70,32	$ 389.713,00		$ 0,00	70,32	$ 389.713,00	5,36%
	EXCAVACIONES													
26,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	594,5592	$ 68.927,00	$ 40.981.182,00	1.164,07	$ 80.235.853,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,82	$ 248.800,00	$ 32.050.416,00	206,00	$ 51.252.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES													
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	156,8364	$ 120.260,00	$ 18.861.145,00	652,00	$ 78.409.520,00	72,66	$ 8.738.092,00		$ 0,00	72,66	$ 8.738.092,00	11,14%
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	164,2796	$ 63.830,00	$ 10.485.967,00	634,43	$ 40.495.667,00	122,01	$ 7.787.898,00		$ 0,00	122,01	$ 7.787.898,00	19,23%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
26,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297,64	$ 219.723,00	$ 65.398.354,00	302,38	$ 66.439.841,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	184,61	$ 101.390,00	$ 18.717.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	137,38	$ 47.055,00	$ 6.464.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,9	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,00	$ 36.633,00	$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CANAL DE CONCRETO													
26,10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	33,25	$ 643.591,00	$ 21.399.401,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	80,75	$ 1.082.648,00	$ 87.423.826,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11.237,17	$ 8.544,00	$ 96.010.360,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,13	REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	475,00	$ 212.973,00	$ 101.162.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
26,14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00X 1,00 X 1,00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 871.930,00	$ 5.231.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X 0,60 X 0,60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 709.055,00	$ 3.545.275,00	12,00	$ 8.508.660,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.260,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
26,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1,22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	177,84	$ 201.753,00	$ 35.879.754,00	286,10	$ 57.721.533,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,17	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,00	$ 27.276,00	$ 6.655.344,00	244,00	$ 6.655.344,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1,50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML		$ 1.276.962,00		7,50	$ 9.577.215,00	7,50	$ 9.577.215,00		$ 0,00	7,50	$ 9.577.215,00	100,00%
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND		$ 1.104.693,00		3,00	$ 3.314.079,00	3,00	$ 3.314.079,00		$ 0,00	3,00	$ 3.314.079,00	100,00%
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1,90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND		$ 1.366.427,00		3,00	$ 4.099.281,00	3,00	$ 4.099.281,00		$ 0,00	3,00	$ 4.099.281,00	100,00%
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 2.592.849,00		76,99	$ 199.623.445,00	65,82	$ 170.661.321,00		$ 0,00	65,82	$ 170.661.321,00	85,49%
NP26.22	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X45 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 375.835,00		725,95	$ 272.837.418,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML		$ 201.786,00		240,00	$ 48.428.640,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.24	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 114.271,00		323,76	$ 36.996.379,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML		$ 197.323,00		238,32	$ 47.026.017,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.26	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN		$ 1.363.601,00		17,00	$ 23.181.217,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.27	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML		$ 142.619,00		237,20	$ 33.829.227,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 99.459,00		15,00	$ 1.491.885,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 167.272,00		472,11	$ 78.970.784,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 326.717,00		112,82	$ 36.860.212,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.148.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP26.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 312.236,00		73,36	$ 22.905.633,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL RED AGUAS LLUVIAS				**$ 559.263.902,00**		**$ 1.216.129.316,00**		**$ 204.567.599,00**		**$ 0,00**		**$ 204.567.599,00**	
	RED CONTRA INCENDIOS													
	PRELIMINARES													
27,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	540,72	$ 5.542,00	$ 2.996.670,00	766,66	$ 4.248.830,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.996.670,00**		**$ 4.248.830,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	EXCAVACIONES													
27,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	197,7696	$ 68.927,00	$ 13.631.665,00	337,41	$ 23.256.659,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	42,85	$ 248.800,00	$ 10.661.080,00	58,00	$ 14.430.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 24.292.745,00**		**$ 37.687.059,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	RELLENOS Y BASES													
27,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,7644	$ 120.260,00	$ 7.307.527,00	128,11	$ 15.406.509,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	166,0643978772	$ 63.830,00	$ 10.599.891,00	200,78	$ 12.815.787,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 17.907.418,00**		**$ 28.222.296,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
27,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	60,84	$ 64.779,00	$ 3.941.154,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	178,88	$ 40.469,00	$ 7.239.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 21/2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	244,69	$ 29.417,00	$ 7.198.046,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,31	$ 65.587,00	$ 3.693.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 34.400,00	$ 206.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 2.467.874,00	$ 4.935.748,00	5,00	$ 12.339.370,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.110,00	$ 323.540,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 14.638,00	$ 29.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,1	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 11.636,00	$ 46.544,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.613.007,00**		**$ 12.339.370,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP27.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML		$ 411.068,00		662,83	$ 272.468.202,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP27.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML		$ 605.164,00		40,11	$ 24.273.128,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.17	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND		$ 3.364.647,00		23,00	$ 77.386.881,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.18	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND		$ 4.608.586,00		3,00	$ 13.825.758,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 333.256,00		7,46	$ 2.486.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 209.394,00		43,33	$ 9.073.042,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML		$ 141.454,00		56,26	$ 7.958.202,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 214.225,00		4,00	$ 856.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 107.193,00		25,00	$ 2.679.825,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND		$ 97.210,00		35,00	$ 3.402.350,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.25	ACCESORIO TEE MECANICA 3x1 RANURADA SUMINISTRO E INSTALACION	UND		$ 137.360,00		22,00	$ 3.021.920,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.26	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 127.920,00		22,00	$ 2.814.240,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.27	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 3.187.998,00		10,00	$ 31.879.980,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.28	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 7.898.518,00		1,00	$ 7.898.518,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.29	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CHEQUE 4"	UND		$ 3.132.258,00		2,00	$ 6.264.516,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.30	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 3.195.312,00		3,00	$ 9.585.936,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Valvulas y accesorios)	UND		$ 5.036.186,00		1,00	$ 5.036.186,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.32	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND		$ 286.178,00		16,00	$ 4.578.848,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.33	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UND		$ 130.763.945,00		1,00	$ 130.763.945,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.34	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3		$ 703.962,00		8,70	$ 6.124.469,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 622.378.936,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				$ 72.809.840,00		$ 704.876.491,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE SIKUANY INCLUYE AIU(31%)				$ 25.198.385.768,00		$ 37.940.069.899,00		$ 10.305.486.844,00		$ 8.632.507.315,00		$ 18.937.994.159,00	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	964 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1 de mayo de 2024 a 20 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.149.591.491,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 38.225.146.280,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 de 2023
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	N. A.	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N. A.
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N. A.
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	21 de junio de 2024

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	VALOR	ACUMULADO CANT.	VALOR	%
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI													
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.													
	RETIE USO FINAL	GLB	1,0	$ 7.735.000,00	$ 7.735.000,00		$ 7.735.000,00							
	CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	279,0	$ 113.050,00	$ 31.540.950,00		$ 31.540.950,00							
	PMA	UN	1,0	$ 245.800.431,00	$ 245.800.431,00		$ 245.800.431,00		$ 171.859.588,00				$ 171.859.588,00	
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI				$285.076.381,00		$285.076.381,00		$171.859.588,00		$0,00		$171.859.588,00	
	ADMINISTRACIÓN (%)	26,00%												
	IMPREVISTOS (%)	1,00%								%		%		%
	UTILIDAD (%)	4,00%												
	VALOR COSTOS INDIRECTOS													
	VALOR TOTAL OBRA				$25.483.462.149,00		$38.225.146.280,00		$10.477.346.432,00	27,41%	$8.632.507.315,00	22,58%	$19.109.853.747,00	49,99%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 25.483.462.149,00
VALOR ADICIONAL		$ 12.741.684.131,00
VALOR TOTAL		$ 38.225.146.280,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 38.225.146.280,00
ANTICIPO	30,00%	$ 11.467.543.884,00
PRESENTE ACTA		$ 8.632.507.315,00
ACUMULADO		$ 19.109.853.747,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50
ACTA 1	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90
ACTA 2	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50
TOTALES	$ 19.109.853.747,00	$ 5.732.956.124,10	$ 13.376.897.622,90

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 19.109.853.747,00	49,99%
POR EJECUTAR	$ 19.115.292.533,00	50,01%
POR AMORTIZAR	$ 5.734.587.759,90	15,00%
TOTALES	$ 38.225.146.280,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 11.467.543.884,00			$ 11.467.543.884,00
ACTA PARCIAL 01	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90	$ 11.641.520.999,90
ACTA PARCIAL 02	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50	$ 18.801.686.386,40
PRESENTE ACTA PARCIAL 03	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50	$ 24.844.441.506,90
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 19.115.292.533,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901666597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **21 de junio de 2024**

Firma

JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma

FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma

ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090337 CND

MEMORIA DE CANTIDADES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50 NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	PLANO	PESO KG	CANT TORNILLOS	LARGO	CANTIDAD	
AN-326 PERNO ANCLAJE VD 1-1/8 ASTM F1554 Gr105 (PEDESTAL D1)		3,670	16,00	730MM	16,00	939,52
AN-326 PERNO ANCLAJE VD 1-1/8 ASTM F1554 Gr105 (PEDESTAL D2 Y D3)		3,670	24,00	730MM	8,00	704,64
AN-321 PERNO ANCLAJE VD 5/8 ASTM F1554 Gr105		0,810	4,00	520MM	28,00	90,72
A563 DH ARANDELA PL 12*76 ASTM A572 Gr105		0,540	448,00		1,00	241,92
TUERCA 2H (1-1/8) ASTM A563 DH (3 TUERCAS X TORNILLO)		0,240	448,00		3,00	322,56
TUERCA 2H (5/8) ASTM A563 DH (3 TUERCAS X TORNILLO)		0,050	112,00		3,00	16,80
TUERCA 2H (1-1/8) ASTM A563 DH (1 TUERCA X TORNILLO) ENCIMA DE LA PLATINA PEDESTALES D1-D2 Y D3	01 y 02	0,240	448,000		1,00	107,52
A563 DH ARANDELA PL 12*76 ASTM A572 Gr105 (ENCIMA Y DEBAJO DE LA PLATINA) PEDESTALES D1-D2 Y D3	01 y 02	0,540	448,000		2,00	483,84
TUERCA 2H (5/8) ASTM A563 DH (1 TUERCA X TORNILLO) ENCIMA DE LA PLATINA PEDESTALES D4-D5-D6 Y D7	01 y 02	0,050	112,00		1,00	5,60
ARANDELA PL 6*50 ASTM A572 Gr105 (ENCIMA Y DEBAJO DE LA PLATINA) PEDESTALES D4-D5-D6 Y D7	01 y 02	0,12	112,00		2,00	26,88
VIENEN:					SUBTOTAL	2.940,00
PASAN:	2.940,00				TOTAL	2.940,00

OBSERVACIONES:		
estos elementos son los que se instalan con el izaje de la estructura metalica.	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

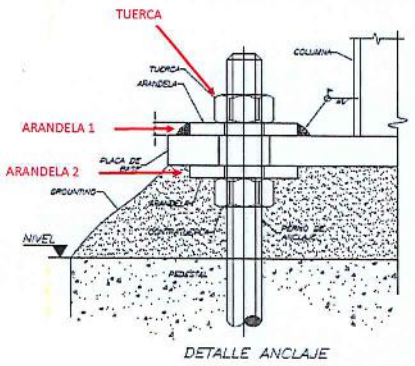

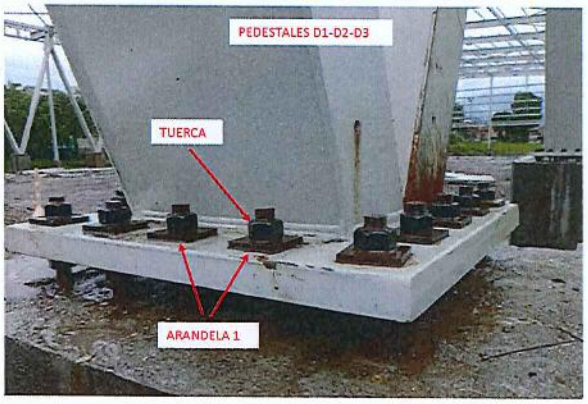

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022		PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023		FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50 NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	PLANO	PESO KG	CANT TORNILLOS	LARGO	CANTIDAD	
VIENEN:					SUBTOTAL	0,00
PASAN:	0,00				TOTAL	2.940,00

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA


PEDESTALES D1-D2-D3

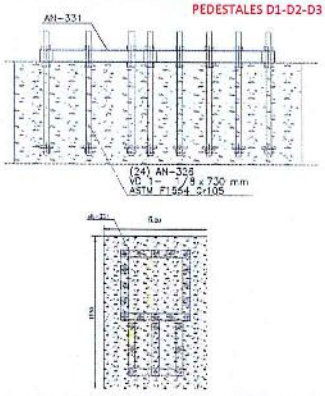



PEDESTALES D4-D5-D6-D7





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

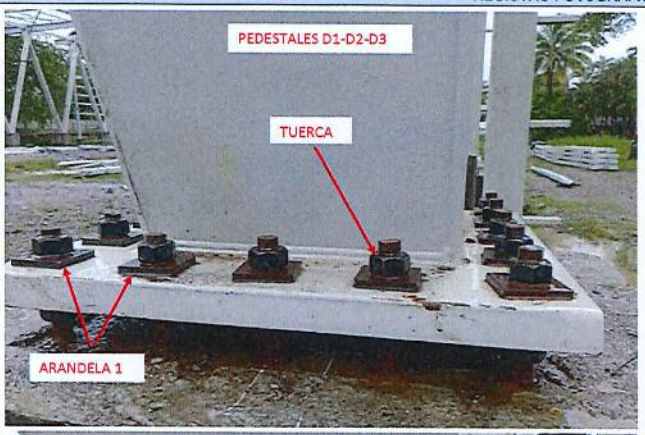



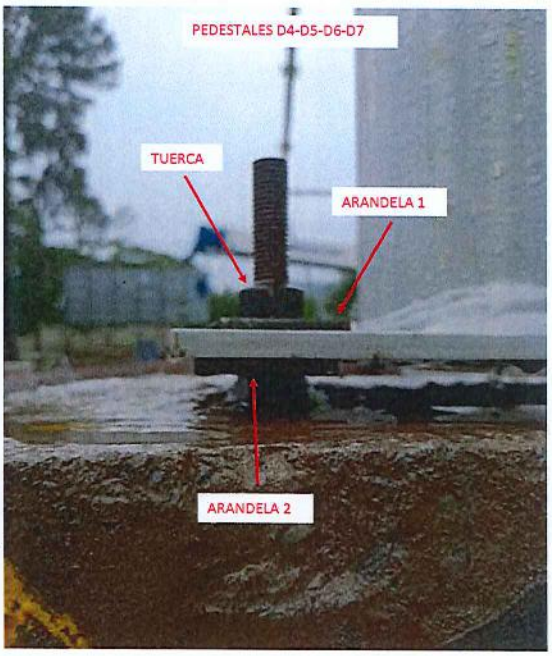

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-690337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS					
EJE I					
K-328 EJE 1	17 Y 25	1961,13	11773MM	1,00	1961,13
K-330 EJE 1-EJE 2-EJE 3-EJE 4-EJE 5-EJE 6-EJE 7-EJE 8-EJE 9-EJE 10-EJE 11	17 Y 27	937,82	7663MM	11,00	10316,02
K-333 EJE2-EJE 3-EJE 4-EJE 9-EJE 10-EJE 11	17 Y 30	2103,14	11773MM	6,00	12618,84
K-334 EJE 5-EJE 6-EJE 7-EJE 8	17 Y 31	2265,48	11773MM	4,00	9061,92
K-343 EJE 12	17 Y 39	2103,14	11773MM	1,00	2103,14
K-344 EJE 12		1735,99	11587MM	1,00	1735,99
VIENEN:	2940,00			SUBTOTAL	37.797,04
PASAN:	40.737,04			TOTAL	40.737,04

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

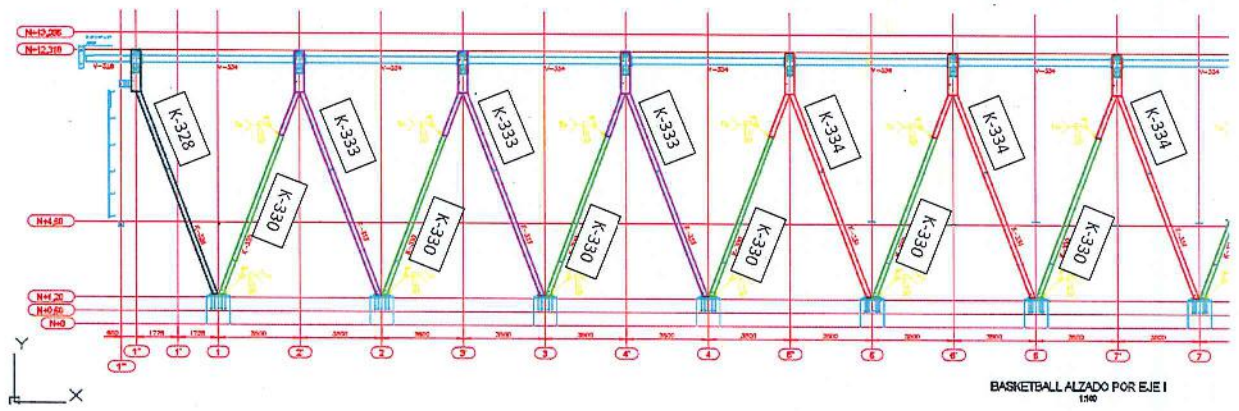

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

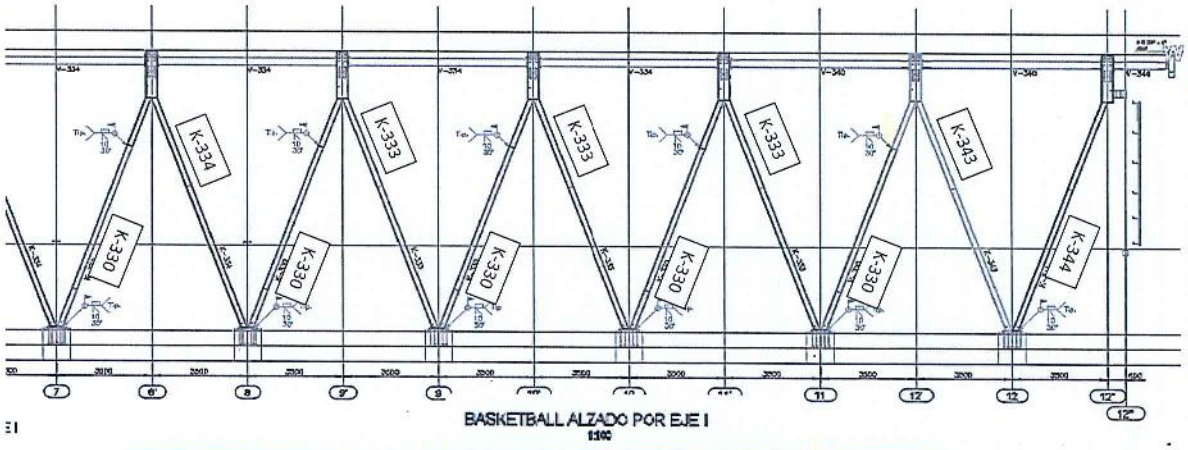

BASKETBALL ALZADO POR EJE I



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE I





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-76650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
COLUMNAS					
EJE A					
K-329 EJE 1	15 Y 26	1961,13	11773 MM	1,00	1961,13
K-330 EJE 1-EJE 2-EJE 3-EJE 4-EJE 5-EJE 6-EJE 7-EJE 8-EJE 9-EJE 10-EJE 11	15 Y 27	937,82	7663MM	11,00	10316,02
K-333 EJE2-EJE 3-EJE 4-EJE 9-EJE 10-EJE 11	15 Y 30	2103,14	11773MM	6,00	12618,84
K-335 EJE 5-EJE 6-EJE 7-EJE 8	15 Y 32	2265,48	11773MM	4,00	9061,92
K-343 EJE 12	15 Y 38	2103,14	11773MM	1,00	2103,14
K-345 EJE 12	15 Y 40	1735,99	11587MM	1,00	1735,99
VIENEN:	40.737,04			SUBTOTAL	37.797,04
PASAN:	78.534,08			TOTAL	78.534,08

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

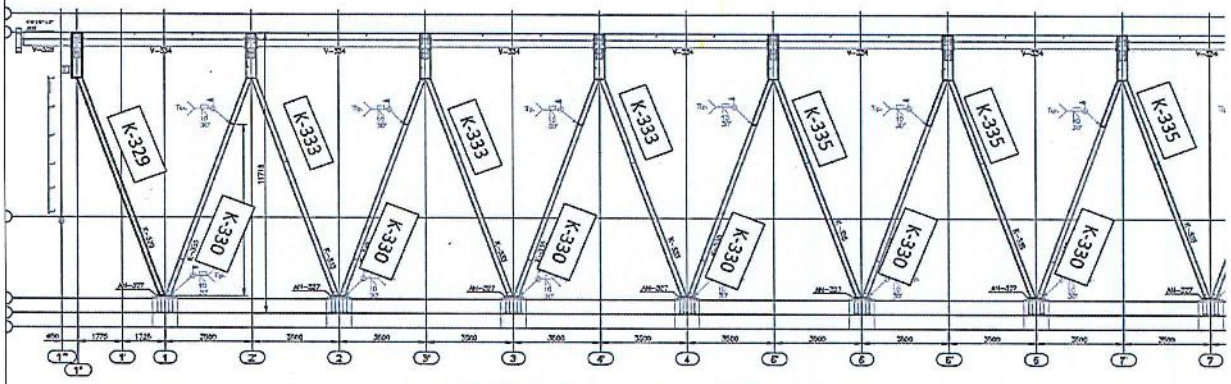

BASKETBALL ALZADO POR EJE A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

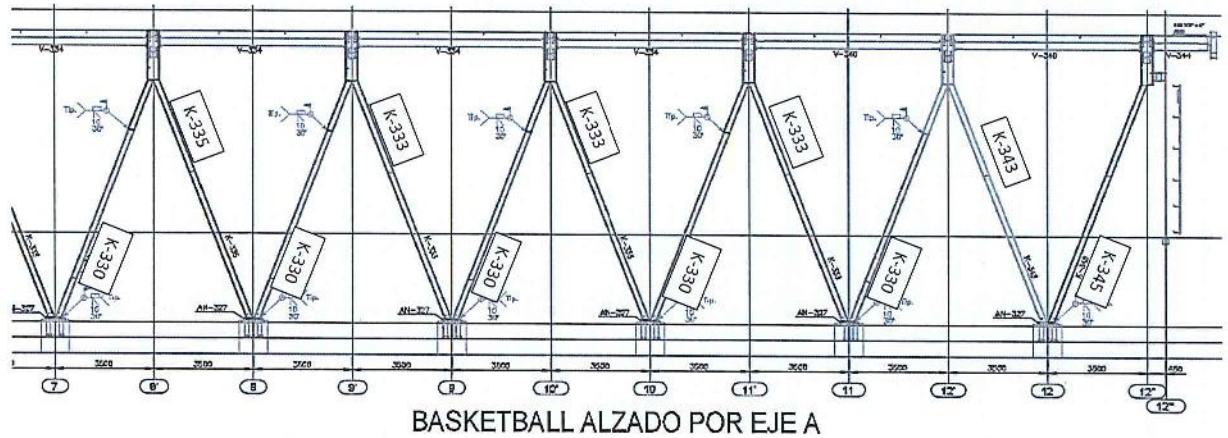

BASKETBALL ALZADO POR EJE A



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE A





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORT VOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 1" (ARCO)					
VC-321	6 - 7 Y 45	483,27	2196MM	1,00	483,27
VC-322	6 - 7 Y 46	2274,66	12076MM	1,00	2274,66
VC-323	6 - 7 Y 47	1325,32	6065MM	1,00	1325,32
VC-324	6 - 7 Y 48	615,35	2595MM	1,00	615,35
VC-325	6 - 7 Y 49	1325,18	6064MM	1,00	1325,18
VC-326	6 - 7 Y 50	2274,66	12076MM	1,00	2274,66
VC-327	6 - 7 Y 51	483,27	2196MM	1,00	483,27
VIENEN:	78.534,08			SUBTOTAL	8.781,71
PASAN:	87.315,79			TOTAL	87.315,79

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

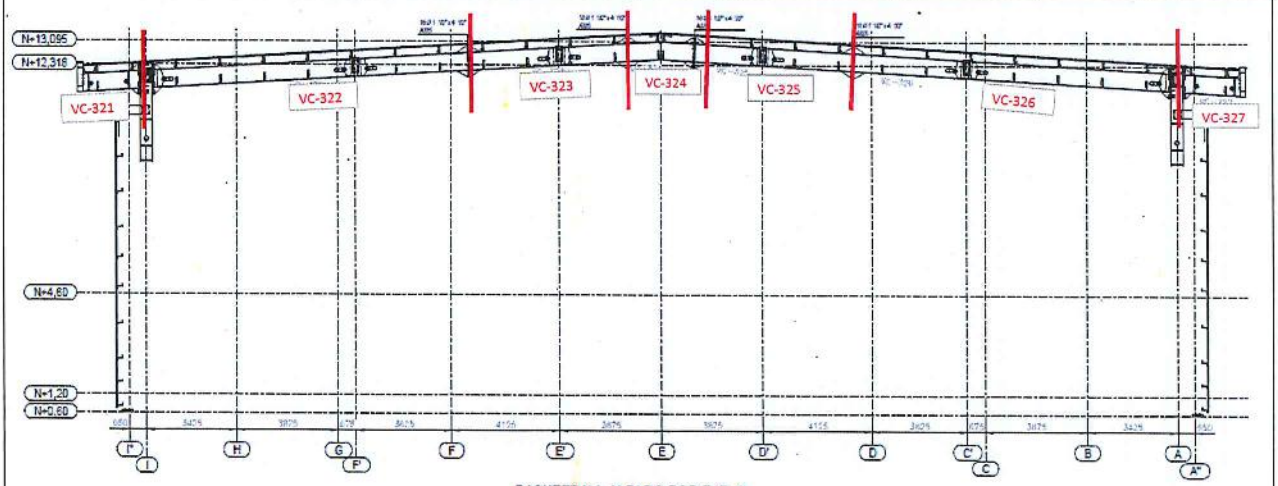

BASKETBALL ALZADO POR EJE 1"
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 1´



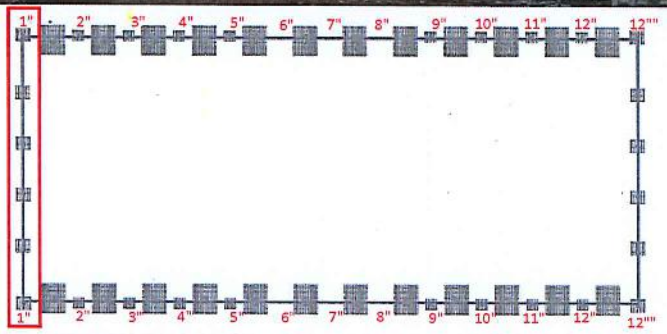

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 2' (ARCO)					
VC-328	6 - 7 Y 52	485,14		1,00	485,14
VC-329	6 - 7 Y 53	2204,36		1,00	2204,36
VC-330	6 - 7 Y 54	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 7 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-331	6 - 7 Y 55	1217,36		1,00	1217,36
VC-332	6 - 7 Y 56	2204,36		1,00	2204,36
VC-333	6 - 7 Y 57	485,14		1,00	485,14
VIENEN:	87.315,79			SUBTOTAL	8.429,20
PASAN:	95.744,99			TOTAL	95.744,99

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

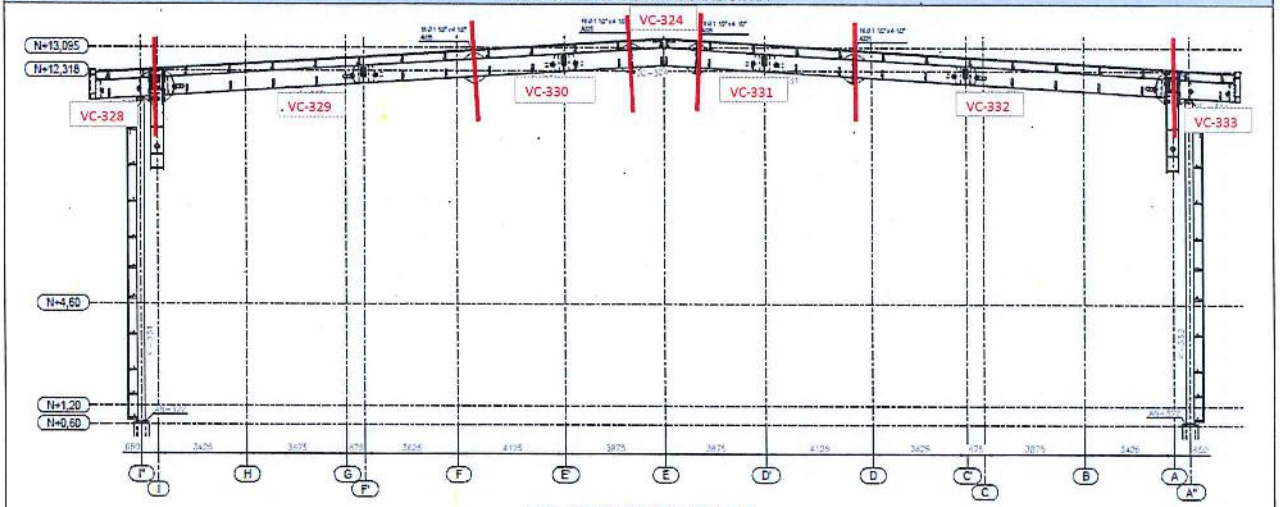

BASKETBALL ALZADO POR EJE 2'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilicad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 2´





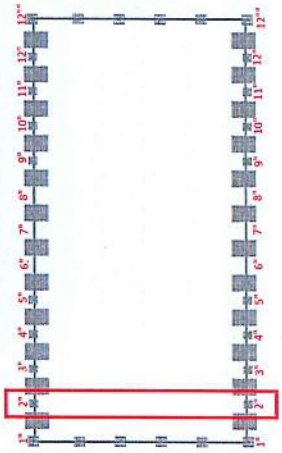

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-190337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 3' (ARCO)					
VC-334	6 - 8 Y 58	485,46		1,00	485,46
VC-335	6 - 8 Y 59	2204,36		1,00	2204,36
VC-336	6 - 8 Y 60	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 8 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-337	6 - 8 Y 61	1217,36		1,00	1217,36
VC-338	6 - 8 Y 62	2204,36		1,00	2204,36
VC-339	6 - 8 Y 63	485,46		1,00	485,46
VIENEN:	95.744,99			SUBTOTAL	8.429,84
PASAN:	104.174,83			TOTAL	104.174,83

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

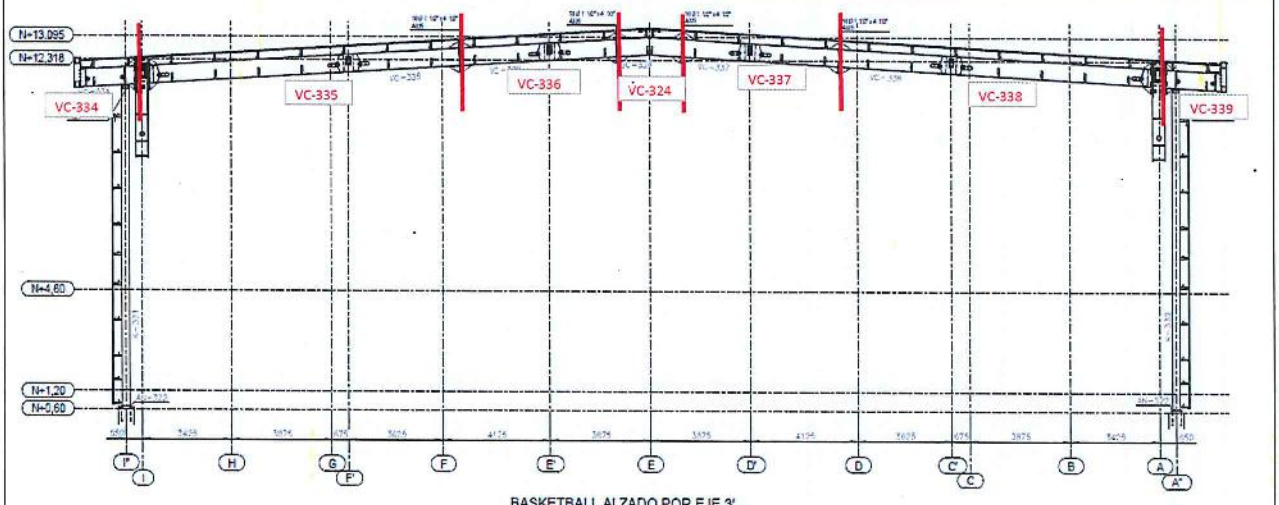

BASKETBALL ALZADO POR EJE 3'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090367 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 3´





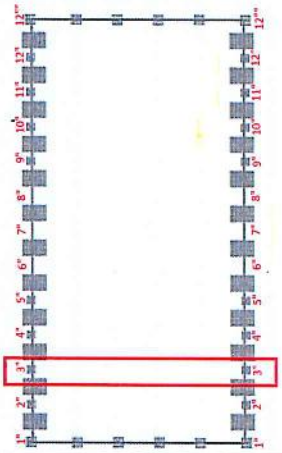

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-990337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 4' (ARCO)					
VC-328	6 - 8 Y 52	485,14		1,00	485,14
VC-329	6 - 8 Y 53	2204,36		1,00	2204,36
VC-330	6 - 8 Y 54	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 8 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-331	6 - 8 Y 55	1217,36		1,00	1217,36
VC-332	6 - 8 Y 56	2204,36		1,00	2204,36
VC-333	6 - 8 Y 57	485,14		1,00	485,14
VIENEN:	104.174,83			SUBTOTAL	8.429,20
PASAN:	112.604,03			TOTAL	112.604,03

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

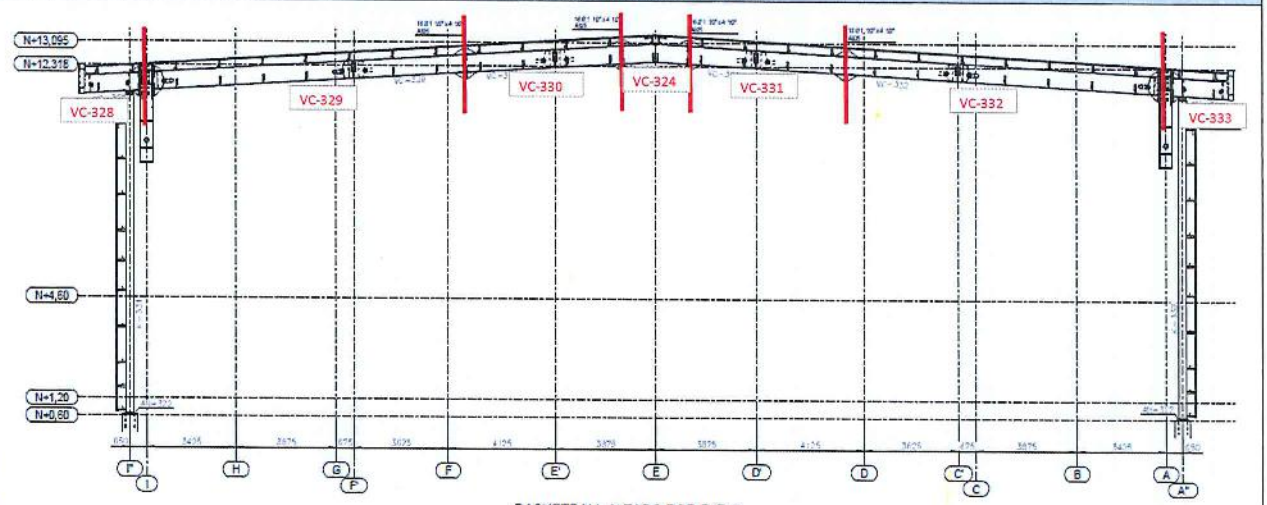

BASKETBALL ALZADO POR EJE 4'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 4´





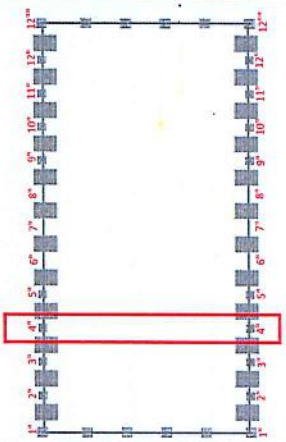

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 5' (ARCO)					
VC-334	6 - 8 Y 58	485,46		1,00	485,46
VC-335	6 - 8 Y 59	2204,36		1,00	2204,36
VC-336	6 - 8 Y 60	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 8 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-337	6 - 8 Y 61	1217,36		1,00	1217,36
VC-338	6 - 8 Y 62	2204,36		1,00	2204,36
VC-339	6 - 8 Y 63	485,46		1,00	485,46
VIENEN:	112.604,03			SUBTOTAL	8.429,84
PASAN:	121.033,87			TOTAL	121.033,87

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

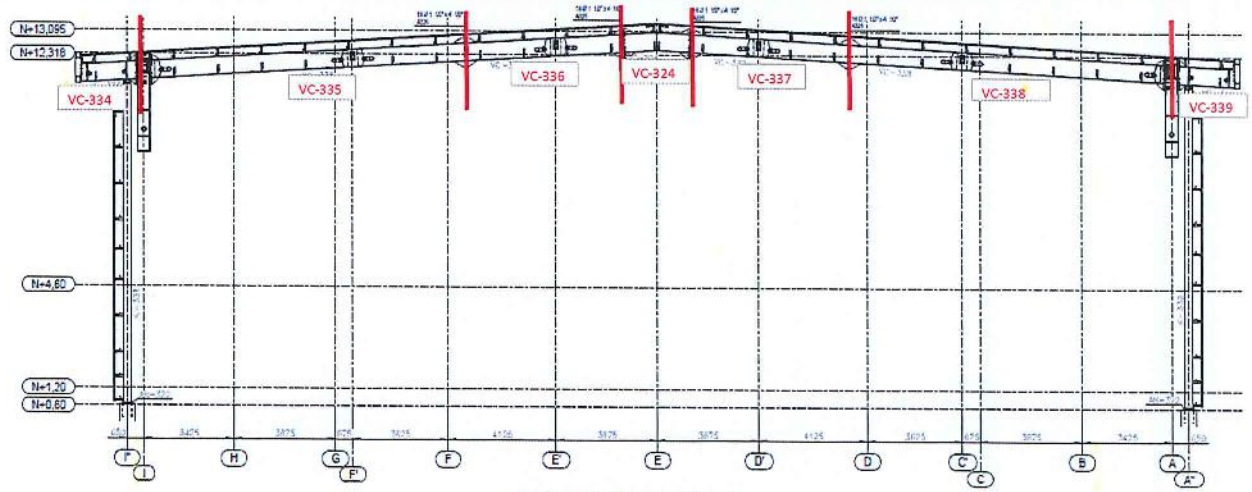

BASKETBALL ALZADO POR EJE 5'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 5´





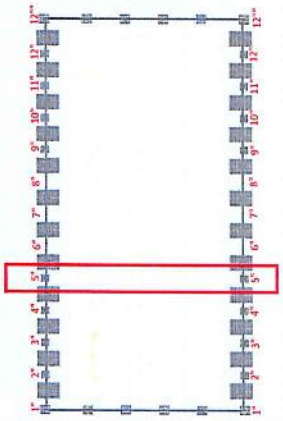

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-080337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 6° (ARCO)					
VC-328	6 - 9 Y 52	485,14		1,00	485,14
VC-329	6 - 9 Y 53	2204,36		1,00	2204,36
VC-330	6 - 9 Y 54	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 9 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-331	6 - 9 Y 55	1217,36		1,00	1217,36
VC-332	6 - 9 Y 56	2204,36		1,00	2204,36
VC-333	6 - 9 Y 57	485,14		1,00	485,14
VIENEN:	121.033,87			SUBTOTAL	8.429,20
PASAN:	129.463,07			TOTAL	129.463,07

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

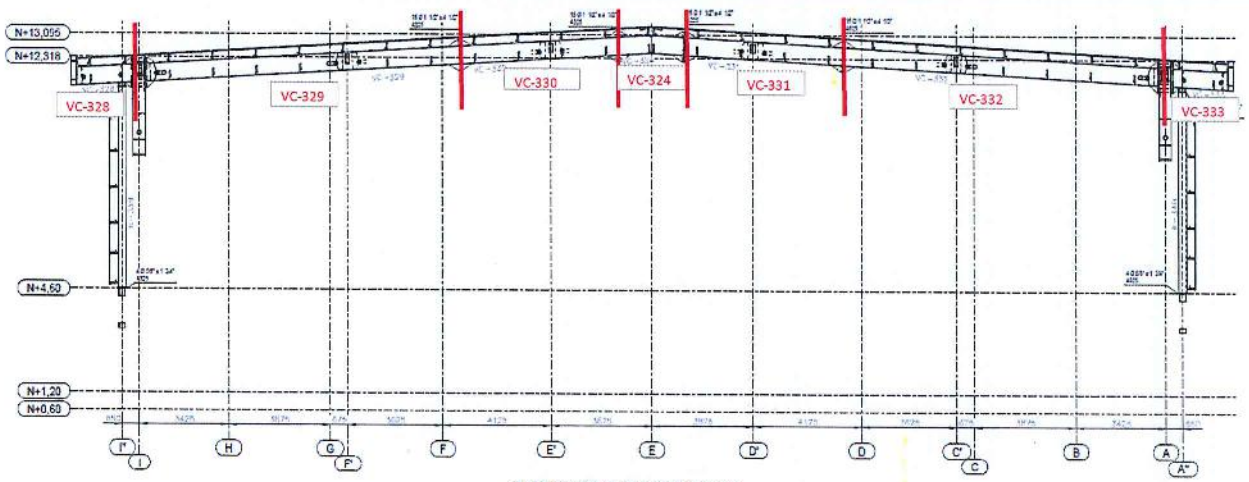

BASKETBALL ALZADO POR EJE 6°
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 6´





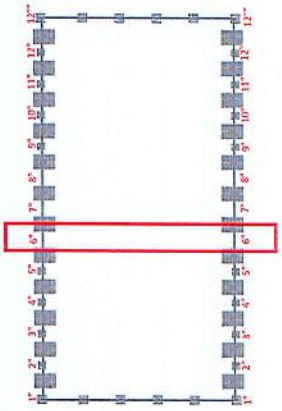

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 7' (ARCO)					
VC-340	6 - 9 Y 64	459,28		1,00	459,28
VC-341	6 - 9 Y 65	2185,59		1,00	2185,59
VC-342	6 - 9 Y 66	1180,89		1,00	1180,89
VC-324	6 - 9 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-343	6 - 9 Y 67	1180,75		1,00	1180,75
VC-344	6 - 9 Y 68	2185,59		1,00	2185,59
VC-345	6 - 9 Y 69	459,28		1,00	459,28
VIENEN:	129.463,07			SUBTOTAL	8.266,73
PASAN:	137.729,80			TOTAL	137.729,80

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

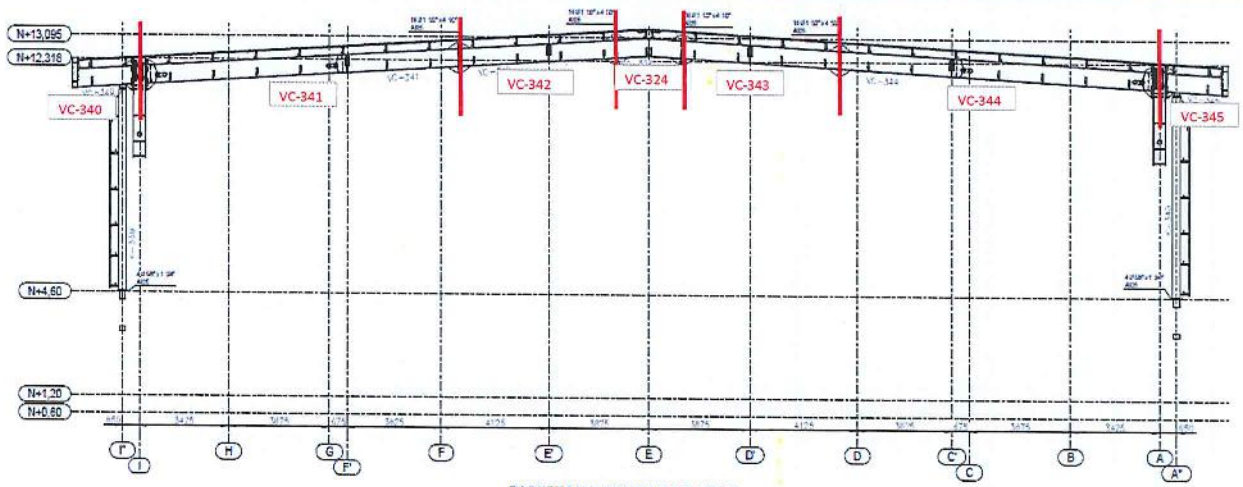

BASKETBALL ALZADO POR EJE 7'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79630147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090331 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 7´





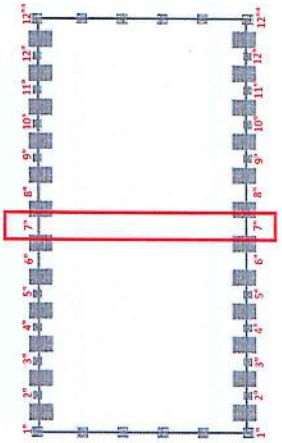

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 8´ (ARCO)					
VC-334	6 - 9 Y 58	465,46		1,00	485,46
VC-335	6 - 9 Y 59	2204,36		1,00	2204,36
VC-336	6 - 9 Y 60	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 9 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-337	6 - 9 Y 61	1217,36		1,00	1217,36
VC-338	6 - 9 Y 62	2204,36		1,00	2204,36
VC-339	6 - 9 Y 63	485,46		1,00	485,46
VIENEN:	137.729,80			SUBTOTAL	8.429,84
PASAN:	146.159,64			TOTAL	146.159,64

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

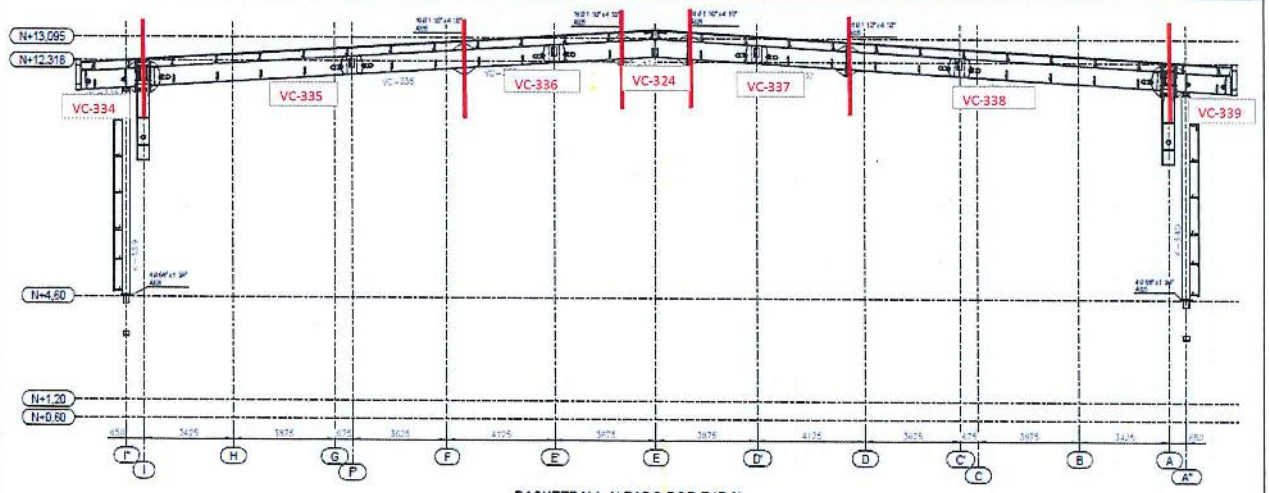

BASKETBALL ALZADO POR EJE 8'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79660147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090937 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 8´





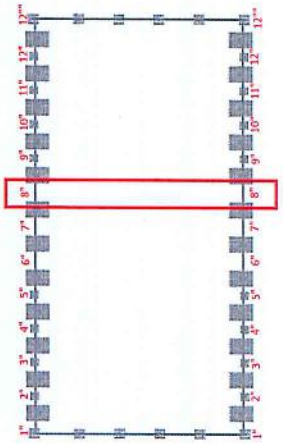

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 9´ (ARCO)					
VC-328	6 - 10 Y 52	485,14		1,00	485,14
VC-329	6 - 10 Y 53	2204,36		1,00	2204,36
VC-330	6 - 10 Y 54	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 10 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-331	6 - 10 Y 55	1217,36		1,00	1217,36
VC-332	6 - 10 Y 56	2204,36		1,00	2204,36
VC-333	6 - 10 Y 57	485,14		1,00	485,14
VIENEN:	146.159,64			SUBTOTAL	8.429,20
PASAN:	154.588,84			TOTAL	154.588,84

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	-
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

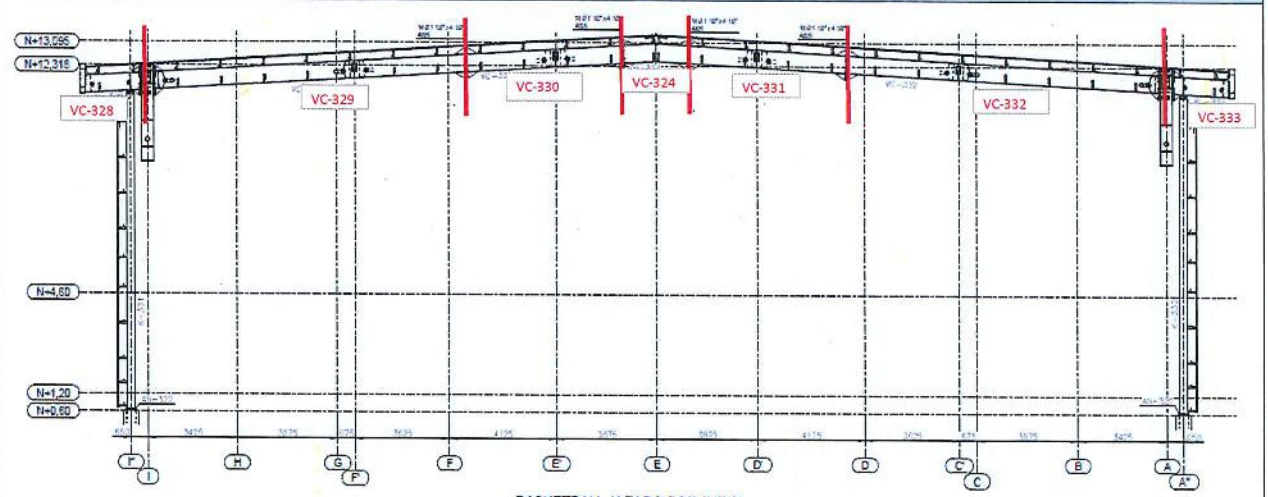

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 9'





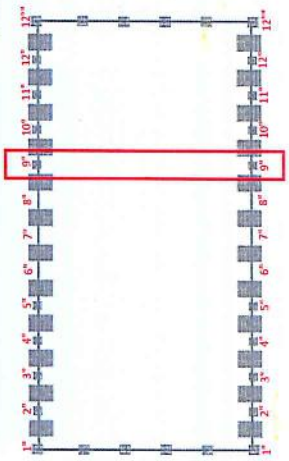

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A25072000-79650747

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 10´ (ARCO)					
VC-334	6 - 10 Y 58	485,46		1,00	485,46
VC-335	6 - 10 Y 59	2204,36		1,00	2204,36
VC-336	6 - 10 Y 60	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 10 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-337	6 - 10 Y 61	1217,36		1,00	1217,36
VC-338	6 - 10 Y 62	2204,36		1,00	2204,36
VC-339	6 - 10 Y 63	485,46		1,00	485,46
VIENEN:	154.588,84			SUBTOTAL	8.429,84
PASAN:	163.018,68			TOTAL	163.018,68

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

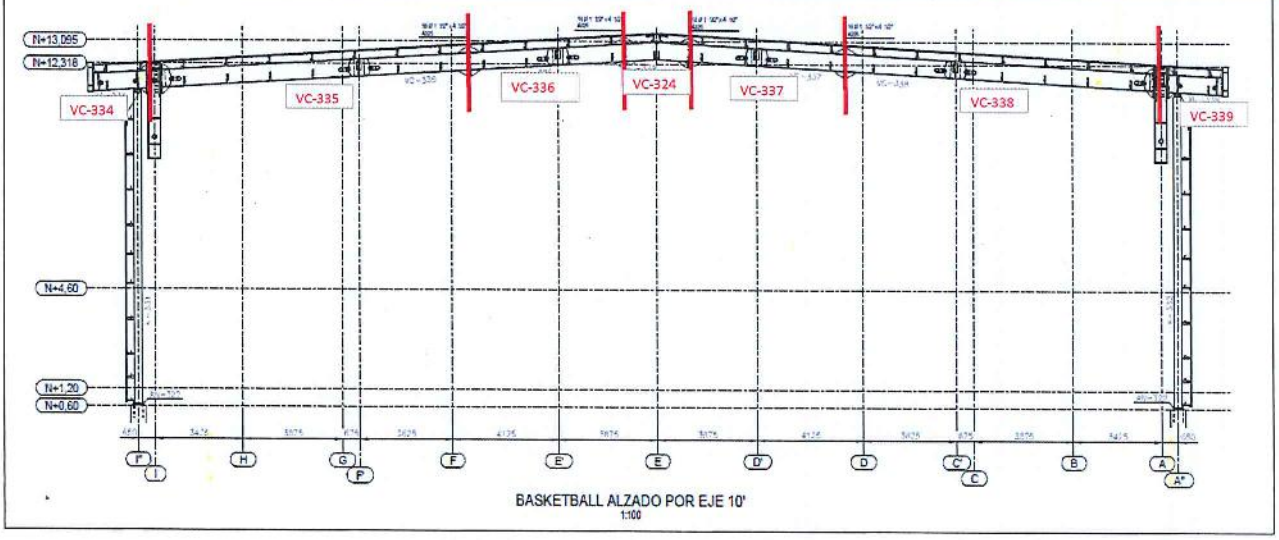

BASKETBALL ALZADO POR EJE 10'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79658147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO


ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 10'





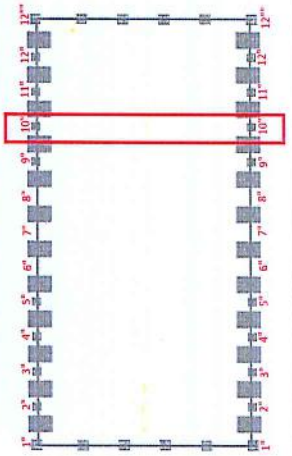

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 11' (ARCO)					
VC-328	6 - 10 Y 52	485,14		1,00	485,14
VC-329	6 - 10 Y 53	2204,36		1,00	2204,36
VC-330	6 - 10 Y 54	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 10 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-331	6 - 10 Y 55	1217,36		1,00	1217,36
VC-332	6 - 10 Y 56	2204,36		1,00	2204,36
VC-333	6 - 10 Y 57	485,14		1,00	485,14
VIENEN:	163.018,68			SUBTOTAL	8.429,20
PASAN:	171.447,88			TOTAL	171.447,88

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

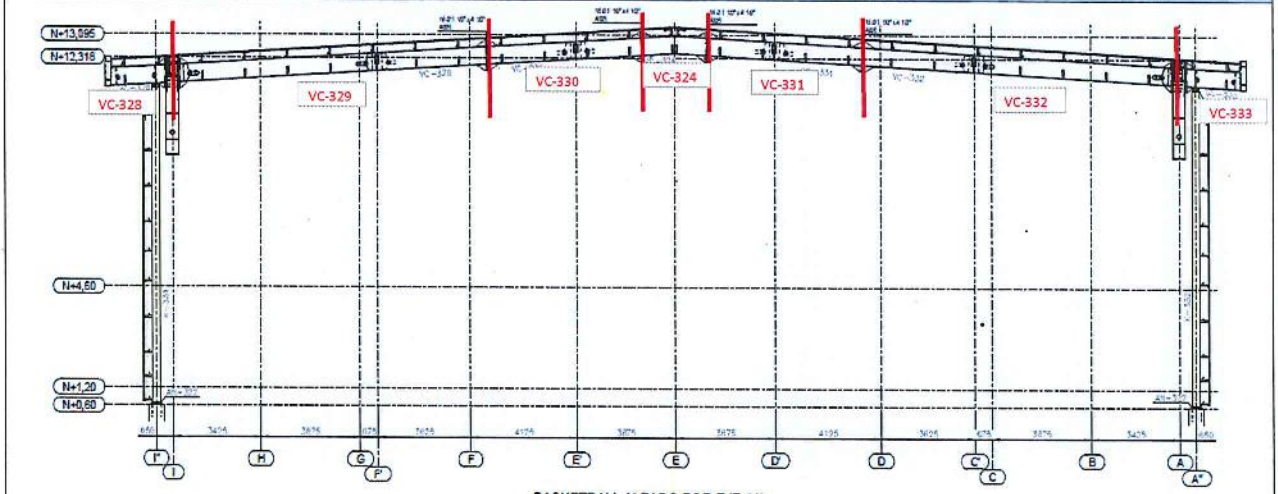

BASKETBALL ALZADO POR EJE 11'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 11´

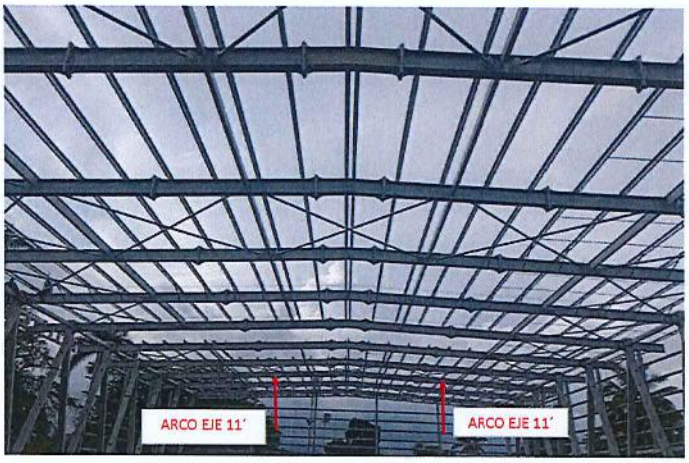

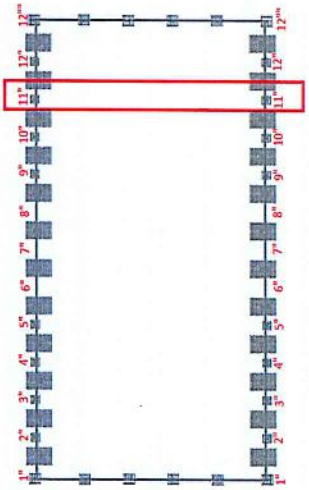



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 12' (ARCO)					
VC-334	6 - 13 Y 58	485,46		1,00	485,46
VC-335	6 - 13 Y 59	2204,36		1,00	2204,36
VC-336	6 - 13 Y 60	1217,49		1,00	1217,49
VC-324	6 - 13 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-337	6 - 13 Y 61	1217,36		1,00	1217,36
VC-338	6 - 13 Y 62	2204,36		1,00	2204,36
VC-339	6 - 13 Y 63	485,46		1,00	485,46
VIENEN:	171.447,88			SUBTOTAL	8.429,84
PASAN:	179.877,72			TOTAL	179.877,72

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

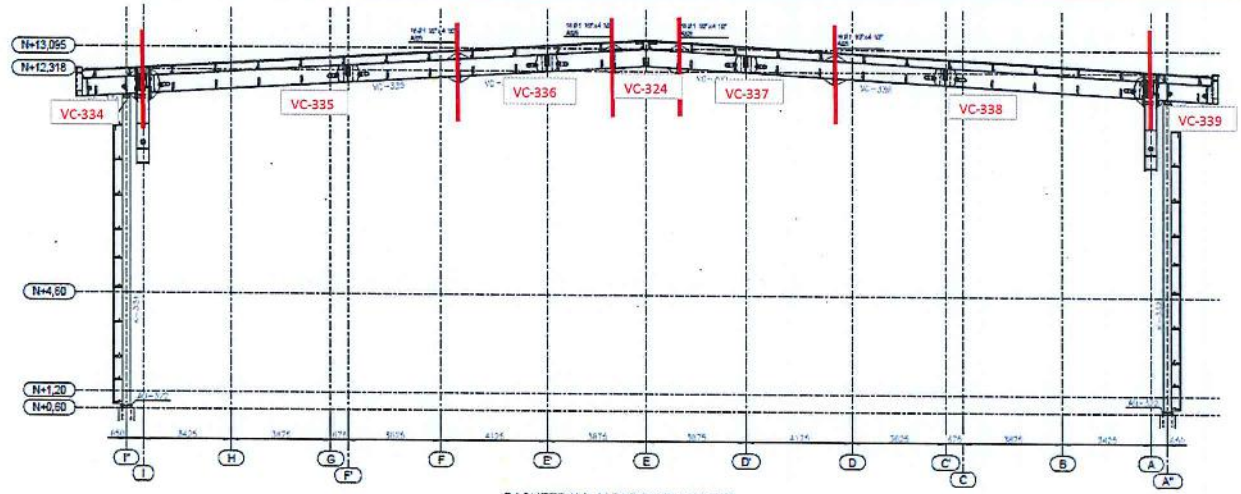

BASKETBALL ALZADO POR EJE 12'
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE 12´

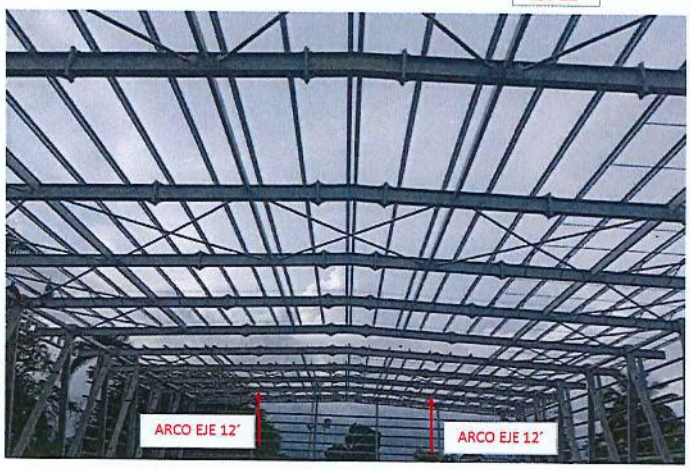

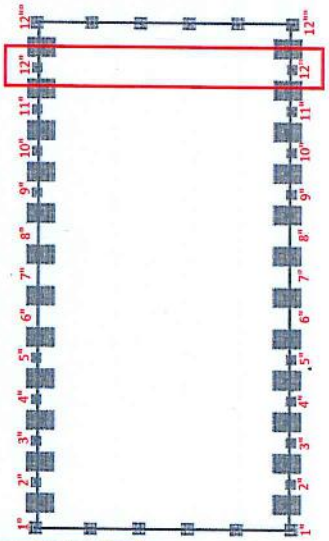



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE 12'' (ARCO)					
VC-346	6 - 14 Y 72	482,95		1,00	482,95
VC-347	6 - 14 Y 70	2274,66		1,00	2274,66
VC-348	6 - 14 Y 71	1325,32		1,00	1325,32
VC-324	6 - 14 Y 48	615,35		1,00	615,35
VC-349	6 - 14 Y 73	1325,18		1,00	1325,18
VC-350	6 - 14 Y 74	2274,66		1,00	2274,66
VC-351	6 - 14 Y 75	482,95		1,00	482,95
VIENEN:	179.877,72			SUBTOTAL	8.781,07
PASAN:	188.658,79			TOTAL	188.658,79

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

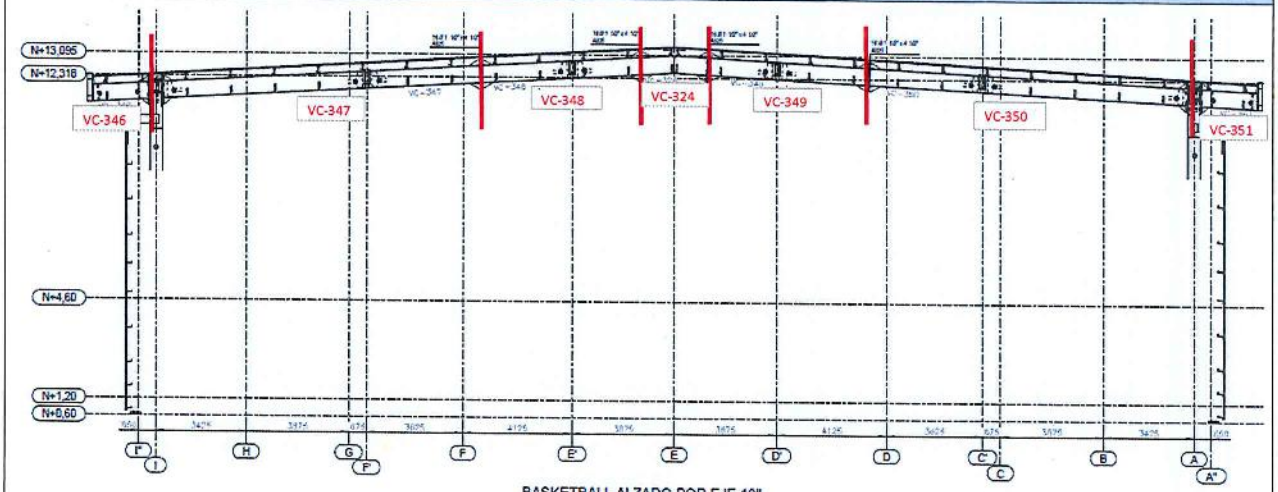

BASKETBALL ALZADO POR EJE 12"
1:100

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200079650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F´554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

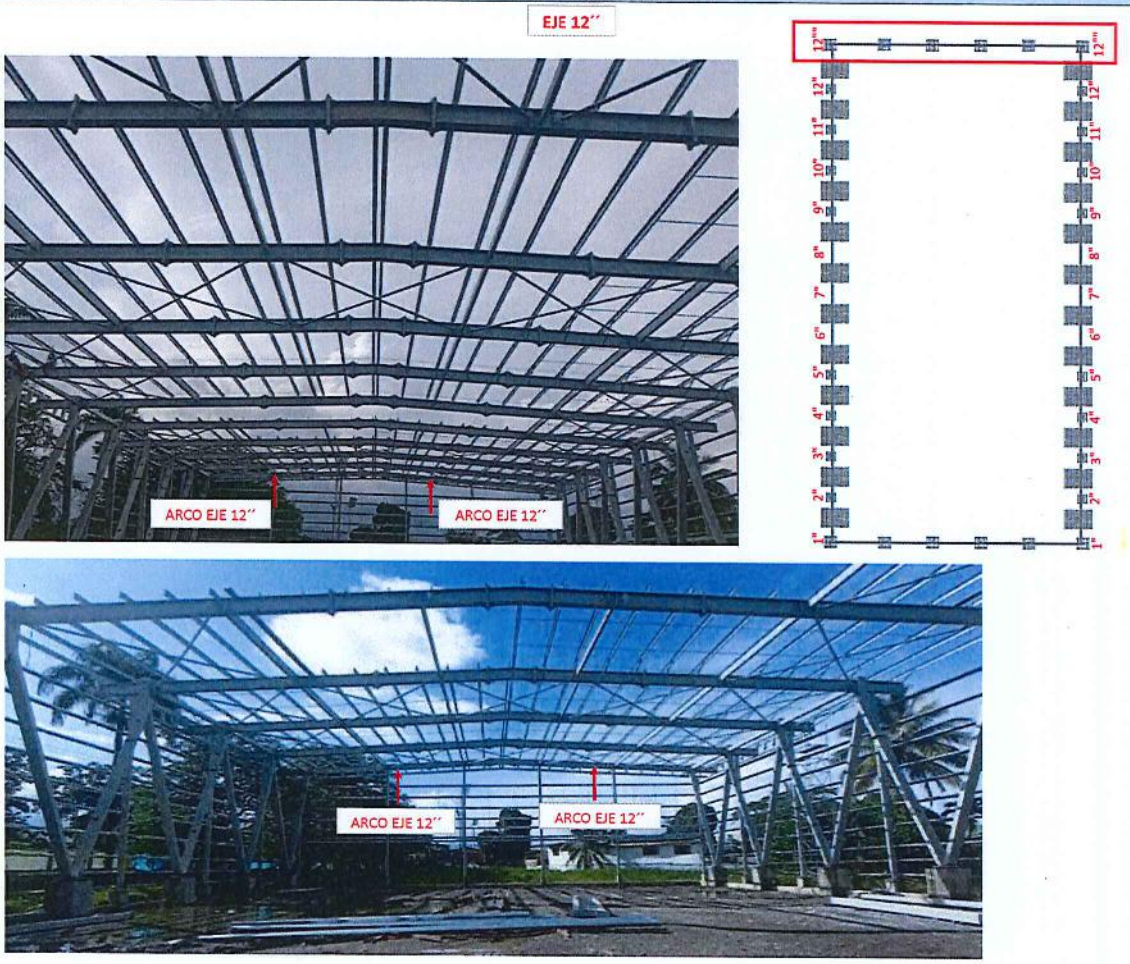

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE A					
V-344 EJE 12''	15 Y 99	221,24	2049MM	1,00	221,24
V-340 ENTRE EJES 12'' Y 12 '	15 Y 95	631,38	6617MM	1,00	631,38
V-340 ENTRE EJES 12' Y 11 '	15 Y 95	631,38	6617MM	1,00	631,38
V-334 ENTRE EJES 11' Y 10 '	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 10' Y 9'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 9' Y 8'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 8' Y 7'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 7' Y 6'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 6' Y 5'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 5' Y 4'	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
VIENEN:	188.658,79			SUBTOTAL	5.397,91
PASAN:	194.056,70			TOTAL	194.056,70

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

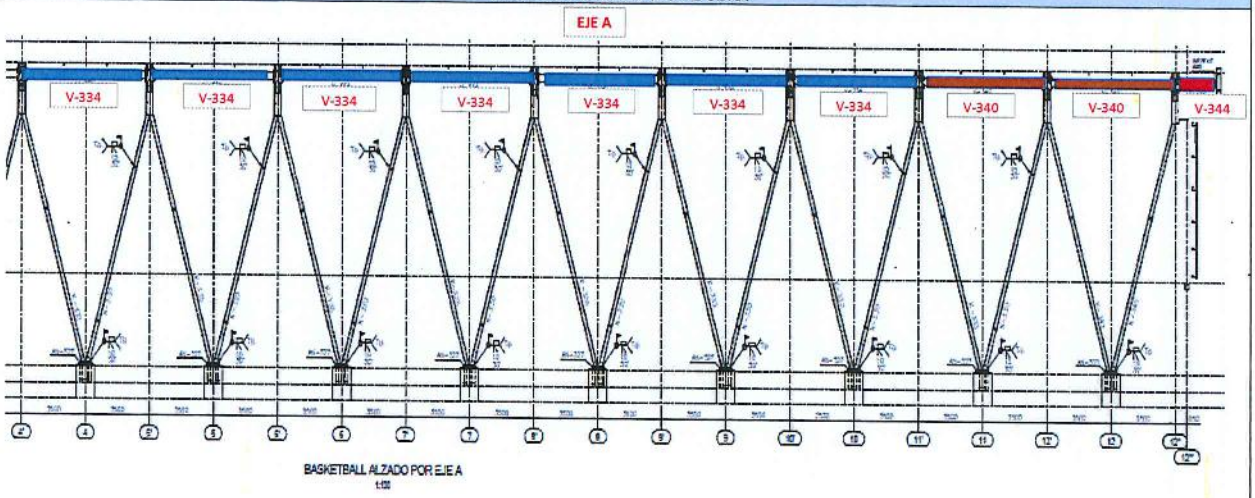

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276


INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

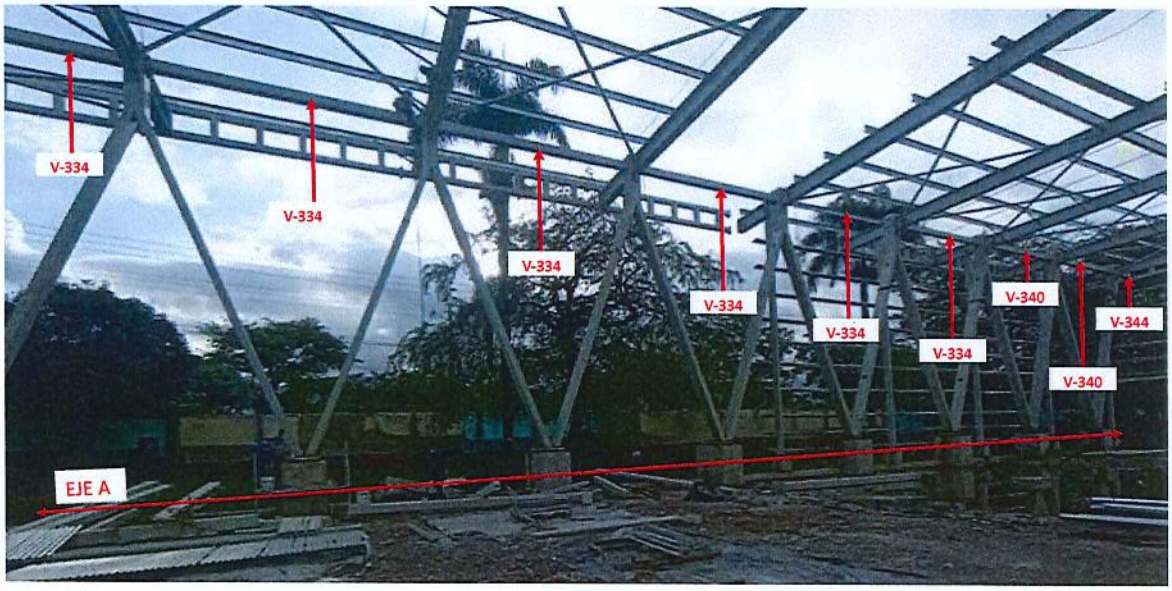

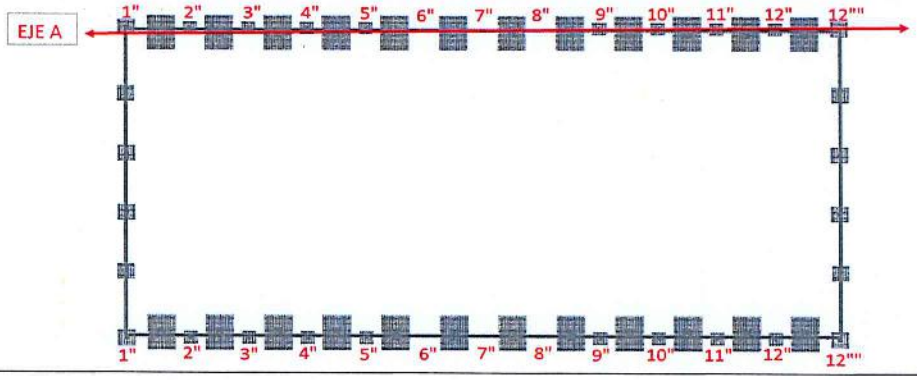

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE A					
V-334 ENTRE EJES 4´ Y 3´	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 3´ Y 2´	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 2´ Y 1´´	15 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-328 EJE 1´´	15 Y 83	221,24	2049MM	1,00	221,24
VIENEN:	194.056,70			SUBTOTAL	1.898,63
PASAN:	195.955,33			TOTAL	195.955,33

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

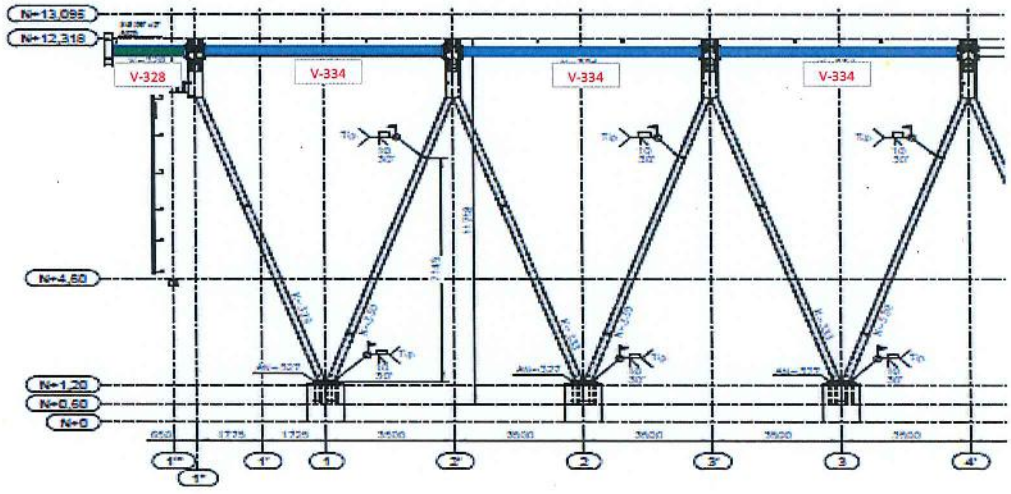

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE A



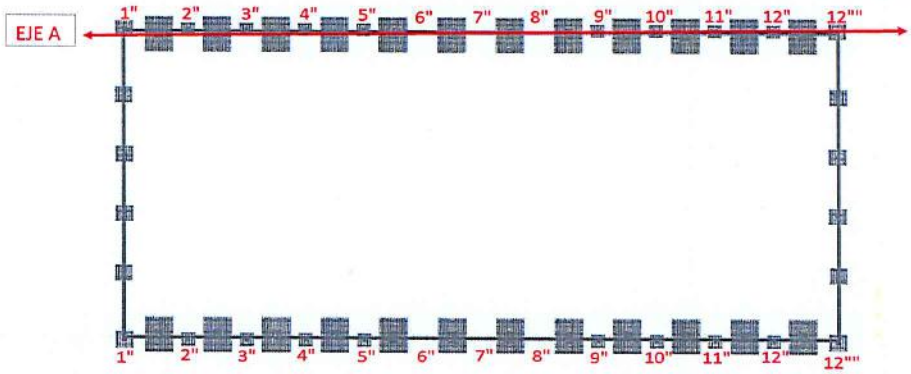

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE I					
V-344 EJE 12''	17 Y 99	221,24	2049MM	1,00	221,24
V-340 ENTRE EJES 12'' Y 12 '	17 Y 95	631,38	6617MM	1,00	631,38
V-340 ENTRE EJES 12' Y 11 '	17 Y 95	631,38	6617MM	1,00	631,38
V-334 ENTRE EJES 11' Y 10 '	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 10' Y 9'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 9' Y 8'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 8' Y 7'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 7' Y 6'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 6' Y 5'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 5' Y 4'	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
VIENEN:	195.955,33			SUBTOTAL	5.397,91
PASAN:	201.353,24			TOTAL	201.353,24

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

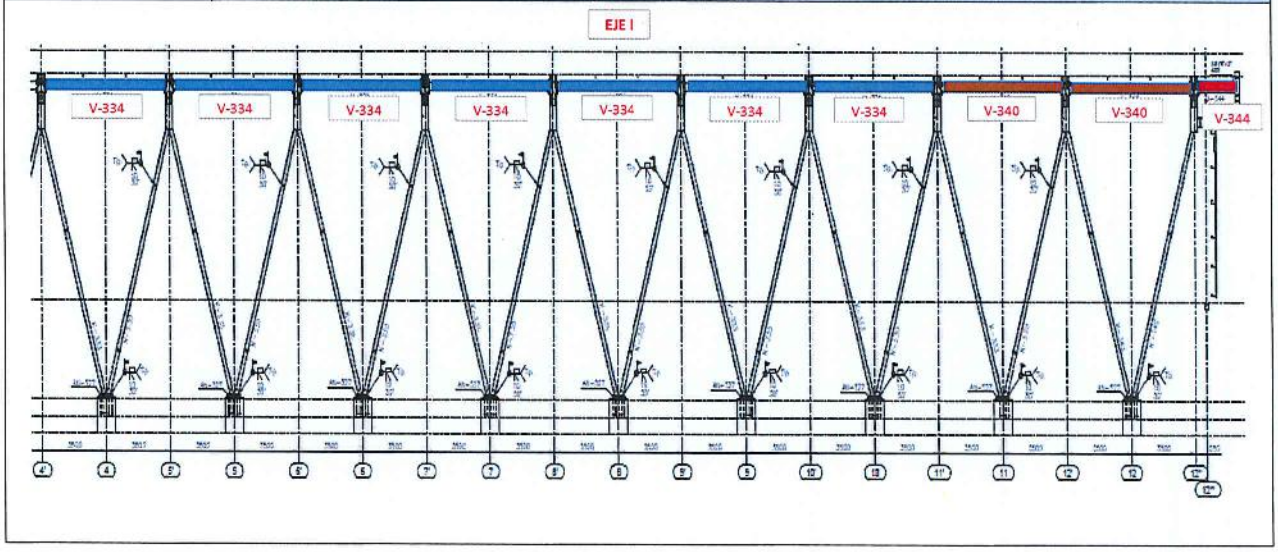

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090397 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE I





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-76650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LORERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE I

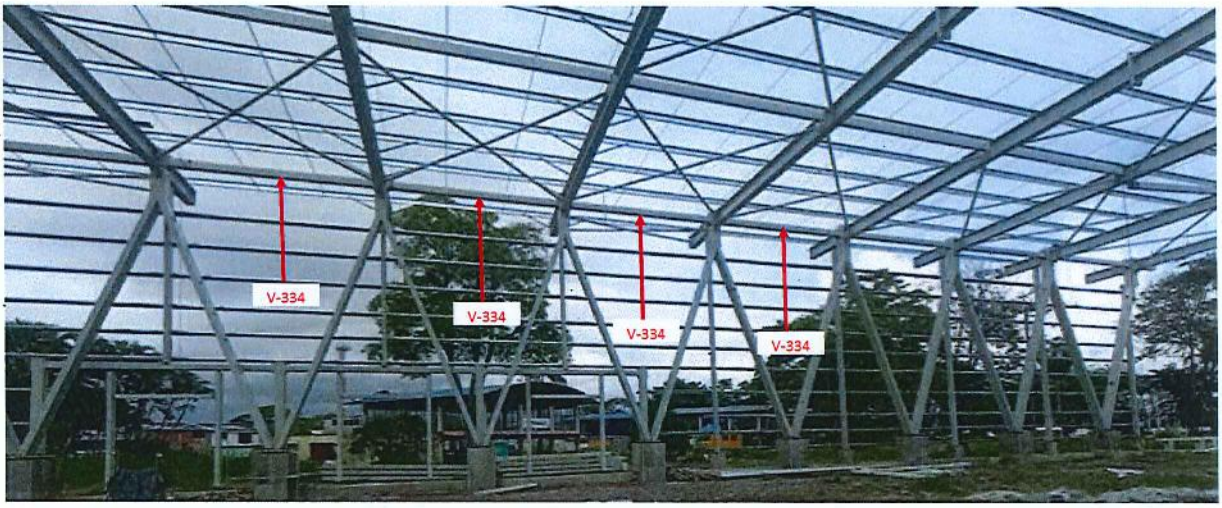

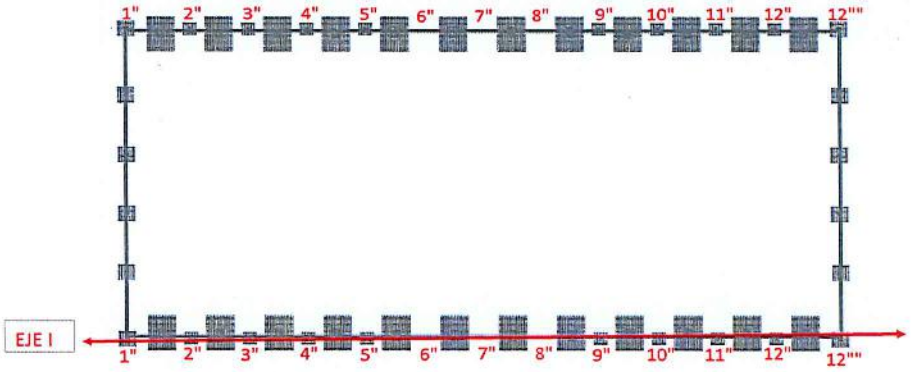

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
EJE I					
V-334 ENTRE EJES 4´ Y 3´	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 3´ Y 2´	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-334 ENTRE EJES 2´ Y 1´´	17 Y 89	559,13	6617MM	1,00	559,13
V-328 EJE 1´´	17 Y 83	221,24	2049MM	1,00	221,24
VIENEN:	201.353,24			SUBTOTAL	1.898,63
PASAN:	203.251,87			TOTAL	203.251,87

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

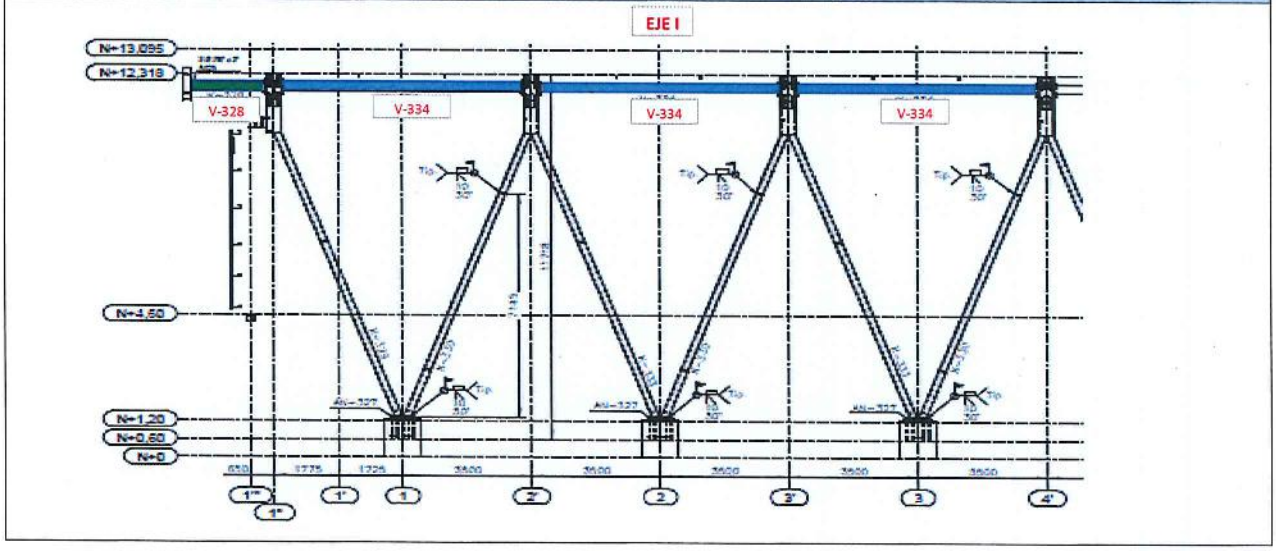

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090837 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LOBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

EJE I



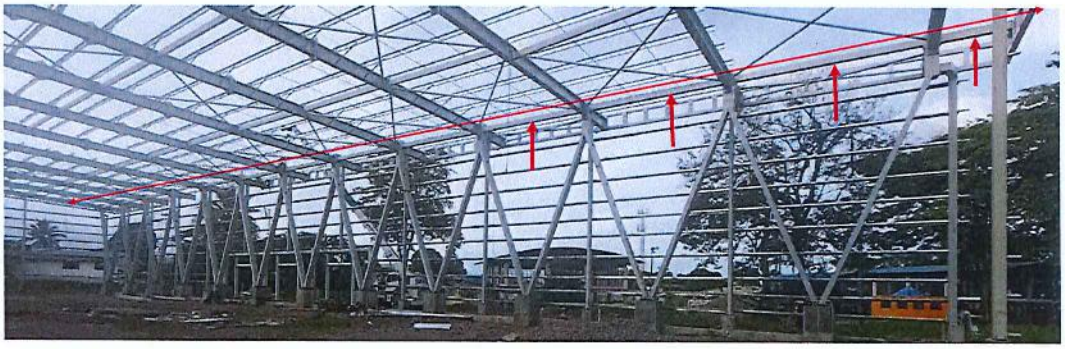

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79660147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 12´´-12´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 12´´-12´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 12´´-12´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 12´´-12´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 12´´-12´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 12´´-12´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 12´´-12´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 12´´-12´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 12´´-12´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 12´´-12´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	203,251,87			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	203,952,32			TOTAL	203.952,32

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

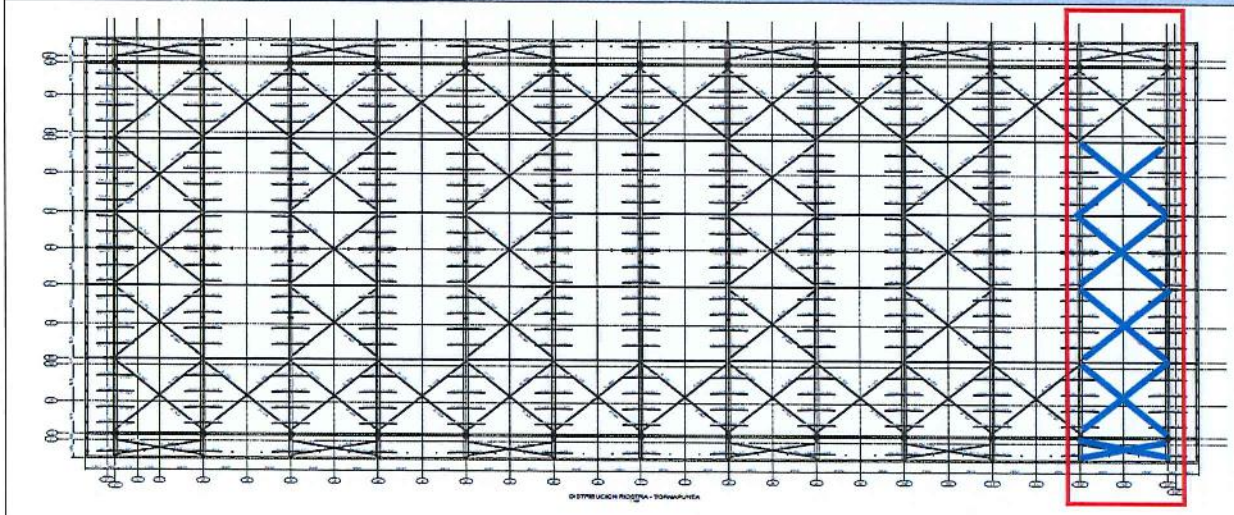

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650127

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LURERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03


CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



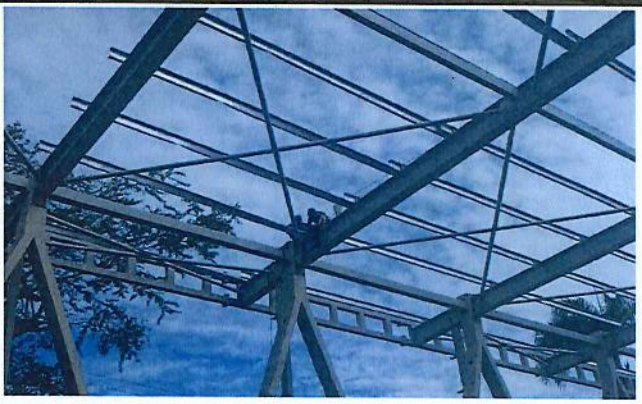

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072008-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 12''-12' ENTRE C'-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 12''-12' ENTRE C'-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 12''-12' CON A''	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 12''-12' CON A''	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	203.952,32			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	204.210,54			TOTAL	204.210,54

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

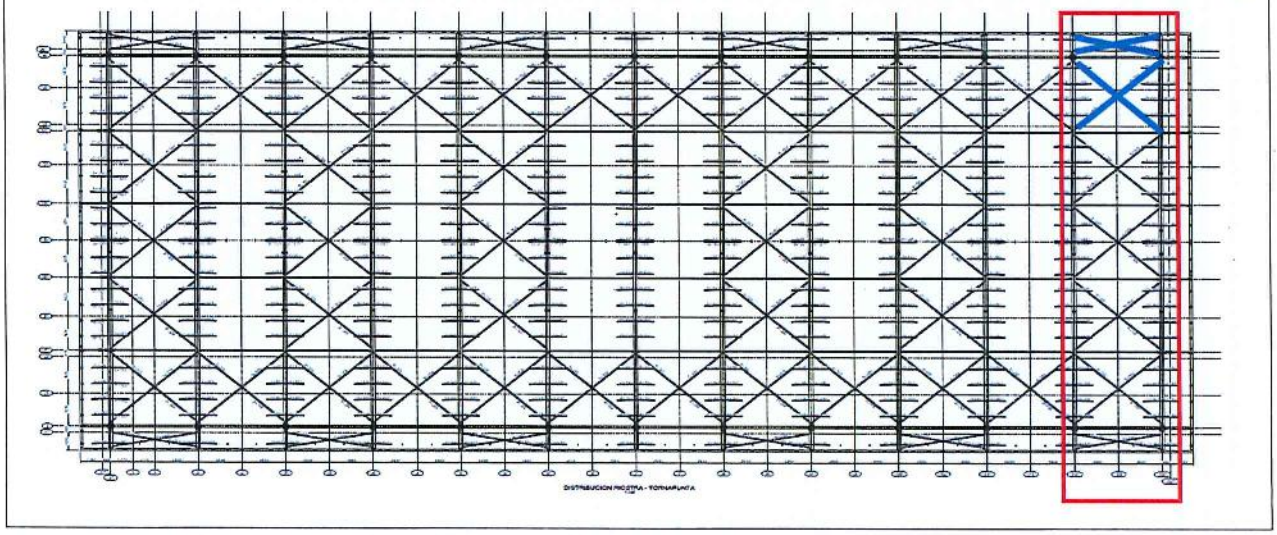

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25872000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LOPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCION	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 12´-11´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 12´-11´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 12´-11´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 12´-11´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	204.210,54			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	204.505,36			TOTAL	204.505,36

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

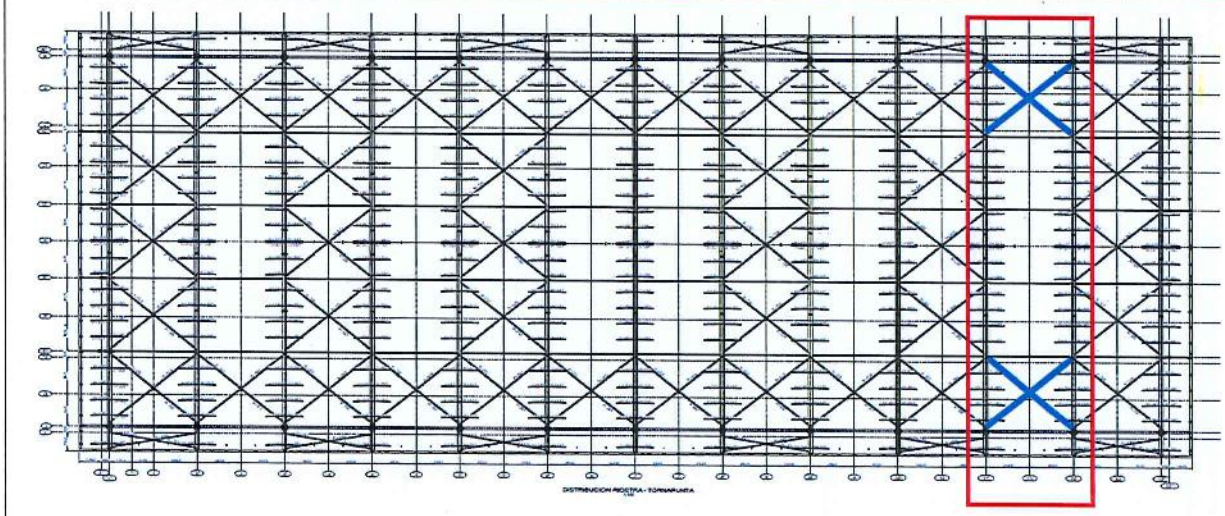

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072080-79650147

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090537 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma

Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79850141

Firma

Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma

Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 11´-10´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 11´-10´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 11´-10´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 11´-10´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 11´-10´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 11´-10´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 11´-10´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 11´-10´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 11´-10´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 11´-10´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	204.505,36			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	205.205,81			TOTAL	205.205,81

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

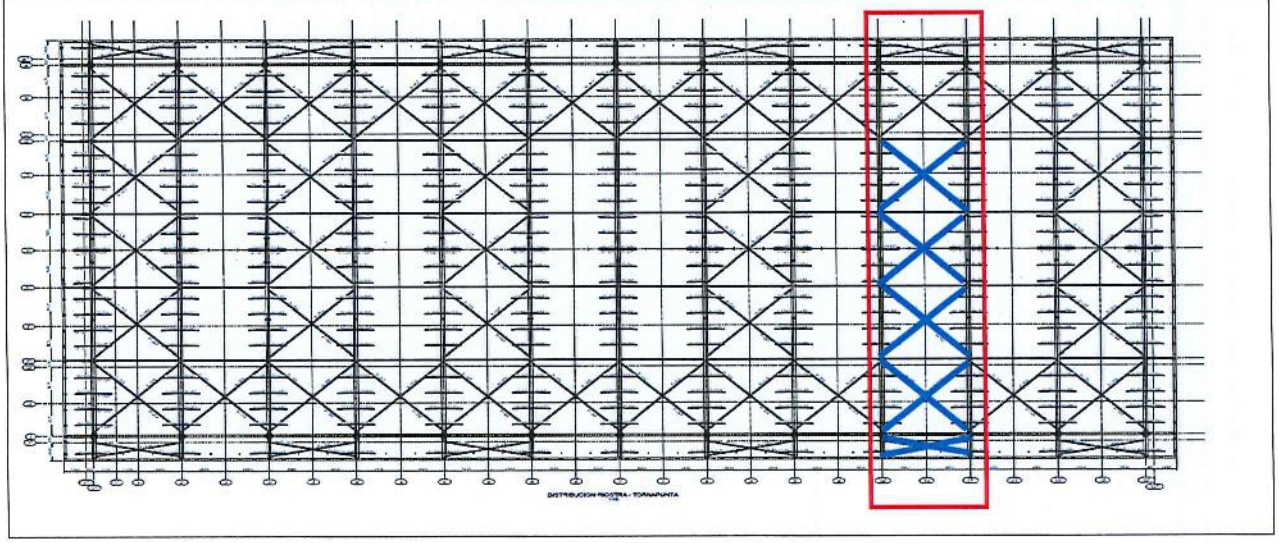

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: A23072000-7985014

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 11´-10´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 11´-10´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 11´-10´ CON A´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 11´-10´ CON A´´	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	205.205,81			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	205.464,03			TOTAL	205.464,03

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

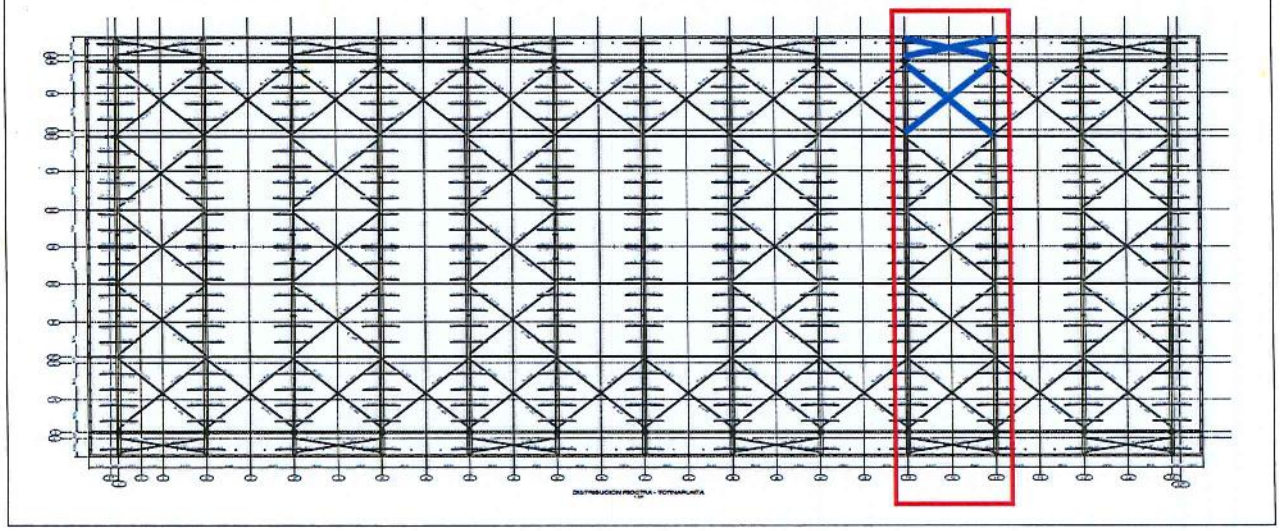

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072020-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND B..ASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 10´-9´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 10´-9´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 10´-9´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 10´-9´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	205.464,03			SUBTOTAL	294,82
PASAN:	205.758,85			TOTAL	205.758,85

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

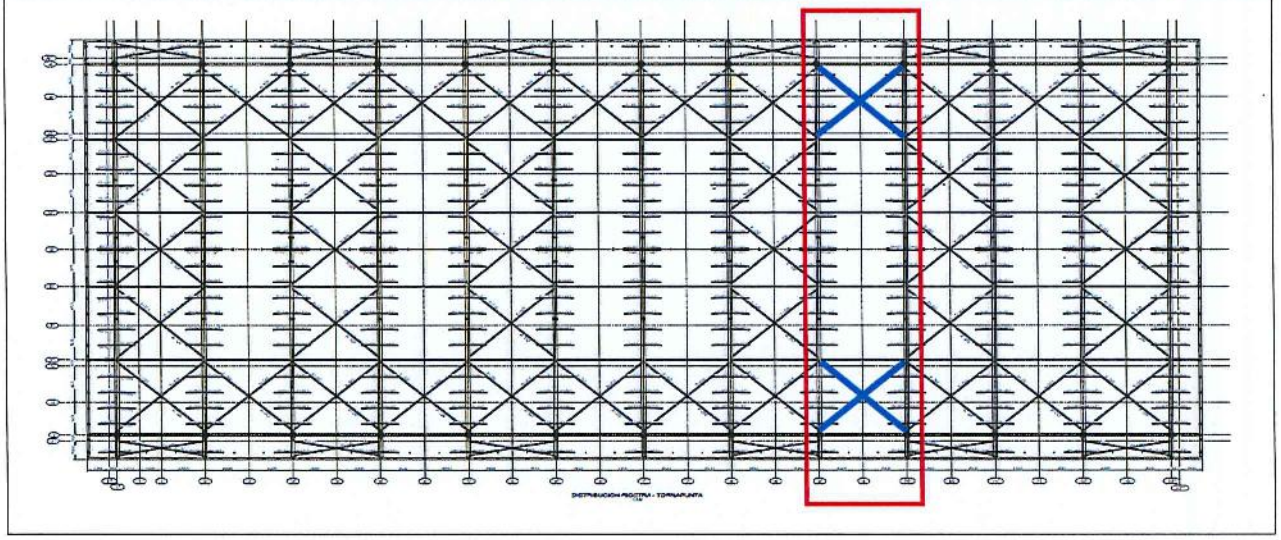

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A2507200-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-7965017

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090387 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUBERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-325 EJE 9´-8´ CON I´´	6 Y 109	60,25	6914MM	1,00	60,25
R-321 EJE 9´-8´ CON I´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-322 EJE 9´-8´ ENTRE I-F´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 9´-8´ ENTRE I-F´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 9´-8´ ENTRE F´-E´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 9´-8´ ENTRE F´-E´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 9´-8´ ENTRE E´-D´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-323 EJE 9´-8´ ENTRE E´-D´	6 Y 107	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-322 EJE 9´- 8´ ENTRE D´-C´	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 9´- 8´ ENTRE D´-C´	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
VIENEN:	205.758,85			SUBTOTAL	700,45
PASAN:	206.459,30			TOTAL	206.459,30

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

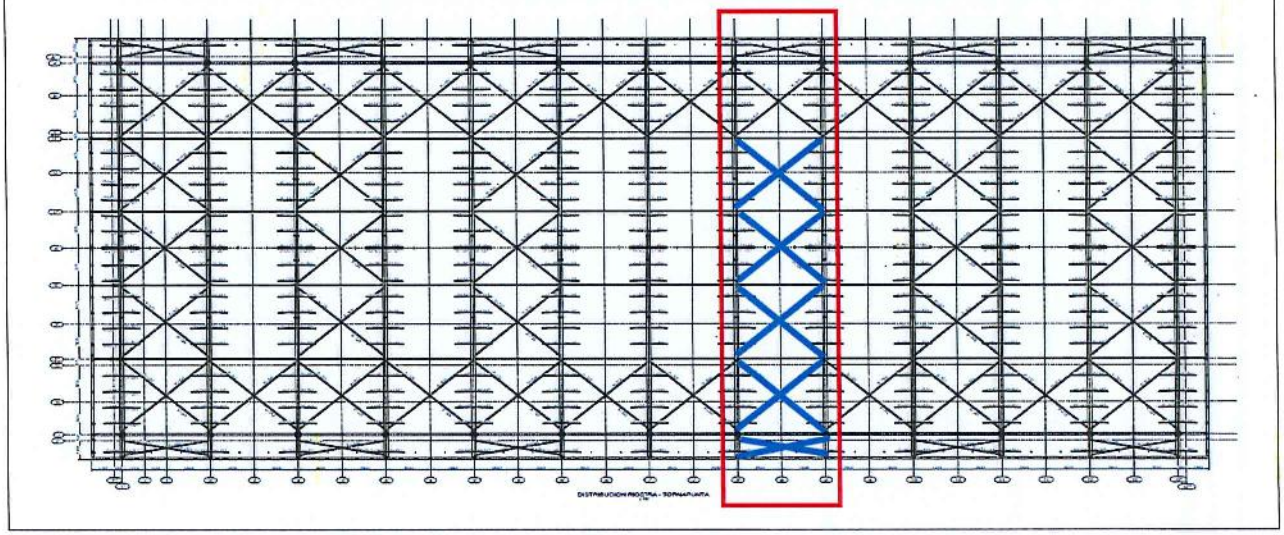

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHÓRQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ALVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79690147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-030337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025


OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	PLANO	PESO KG	LARGO	CANTIDAD	
RIOSTRAS					
R-322 EJE 9´-8´ ENTRE C´-A	6 Y 106	36,28	4767MM	2,00	72,56
R-324 EJE 9´- 8´ ENTRE C´-A	6 Y 108	74,85	9695MM	1,00	74,85
R-321 EJE 9´- 8´ CON A´´	6 Y 105	25,28	3171MM	2,00	50,56
R-326 EJE 9´- 8´ CON A´´	6 Y 110	60,25	6914MM	1,00	60,25
VIENEN:	206.459,30			SUBTOTAL	258,22
PASAN:	206.717,52			TOTAL	206.717,52

OBSERVACIONES:		
	CANTIDAD ACTUALIZADA (MODIFICACIÓN No. 1)	328.828,18
	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	CANTIDAD PAGADA ACUMULADA EN ACTAS ANTERIORES	
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	
	CANTIDAD DE OBRA POR EJECUTAR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

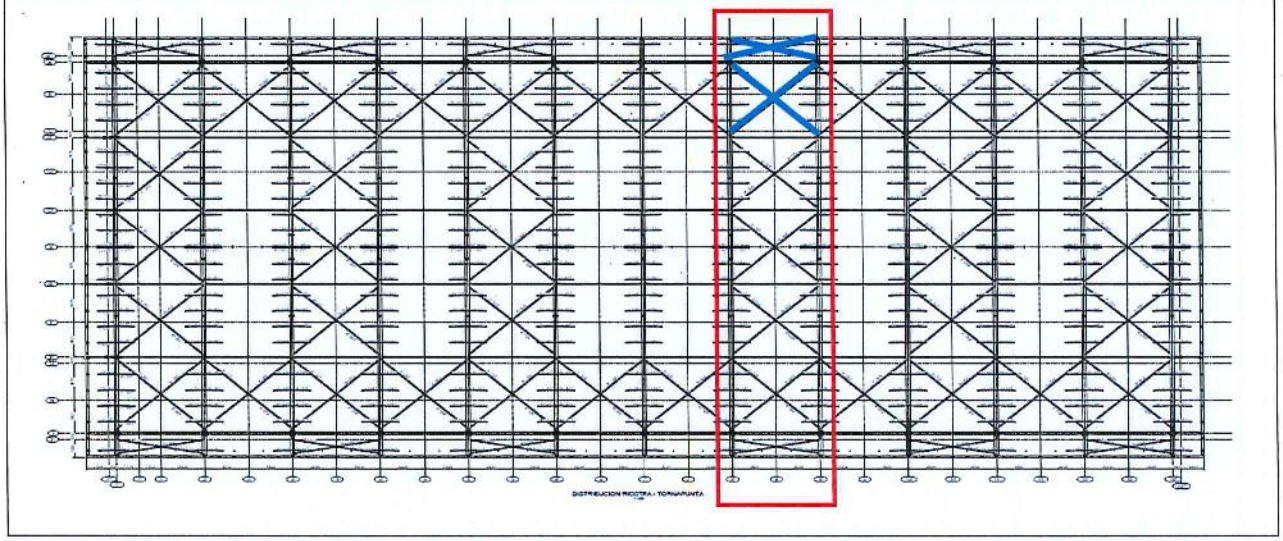

Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090337 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LORERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META		
	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-19
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071
FECHA DE INICIO:	01/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/02/2025

OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
CONTRATISTA :	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	001 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACTA	PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS EN ACERO	UNIDAD
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	KG
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Para constancia de lo anterior, se firma la presente memoria de cantidad bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día: 21 de junio de 2024

Firma
Nombre: ÁLVARO GABRIEL ARÉVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A25072000-79650147

Firma
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-090537 CND

Firma
Nombre: GIOVANNI ALEXANDER OLIVEROS
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-153996 CND

Firma
Nombre: LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: A50202005-86070276
