FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	20	MES	1	AÑO	2024

SEMANA N°	7	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	sábado, 20 de enero de 2024
FECHA INICIO :	15/01/2024	FECHA TERMINO :	20/01/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1,4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	100,00%	7,00%		
2,11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	17,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	17,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	17,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%	17,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%	19,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,51 Pintura y resanes cielo raso y muros exteriores: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a el	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	15.118.769,23	**1.008.547.897,44**		1,48%	20,05%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	20	MES	1	AÑO	2024

SEMANA N°	7	DEL	lunes, 15 de enero de 2024	AL	sábado, 20 de enero de 2024

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

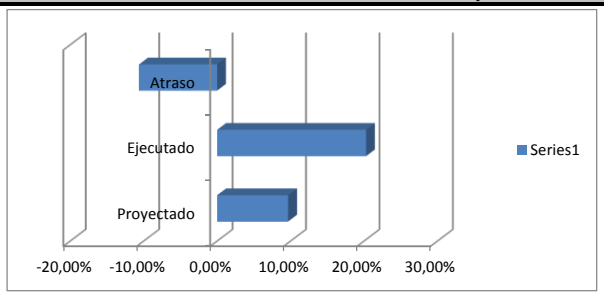

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL	
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**	
SEMANA N°	7	**DEL**	lunes, 15 de enero de 2024				**AL**	sábado, 20 de enero de 2024	
FECHA INICIO :	**15/01/2024**		**FECHA TERMINACION :**	**20/01/2024**					
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO									
INTERVENTOR	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS**				**NIT O C.C.**	**901.202.489-3**	**CONTRATO N°**	**317**	
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S**				**NIT O C.C.**	**820.004.462-2**	**CONTRATO N°**	**284**	

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral**






UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral**

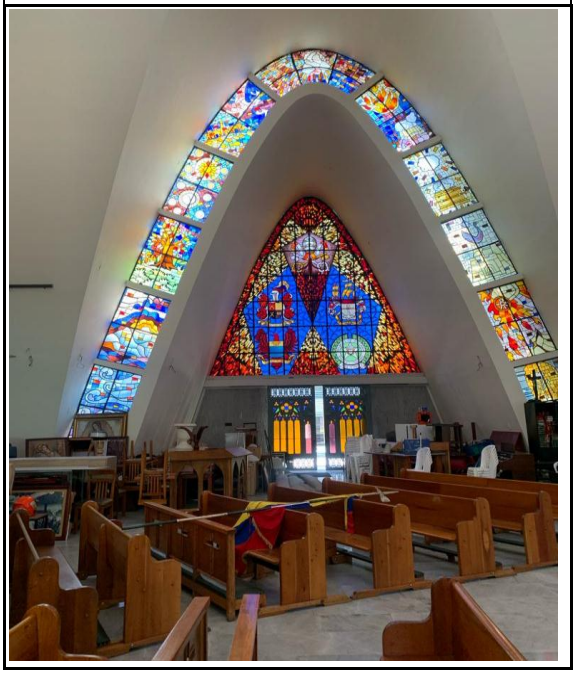

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de regatas generadas por el Padre de la Catedral**

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resane en la catedral.**




UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Excavacion de terreno hacia el tercer sendero peatonal**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Material sobrante de exvacaion.**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resanes en techo en el pasillo de la casa cural**

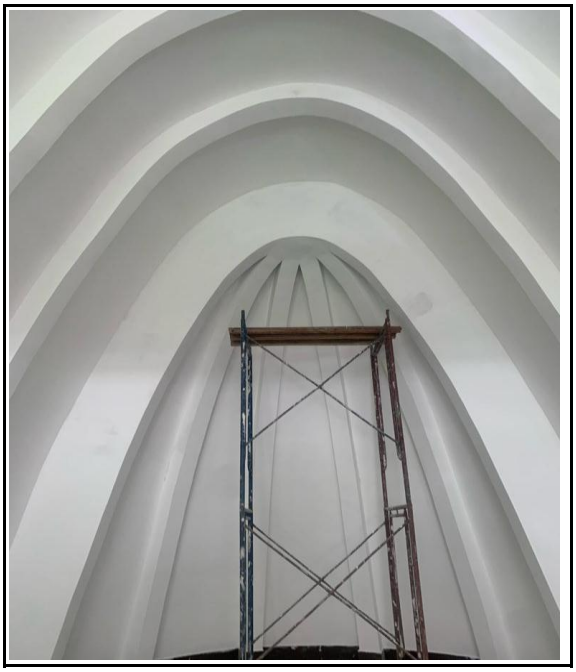

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Pintura en capilla en la casa cural**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Estuco y pintura**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Estuco y pintura**
