FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	3	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	9	DEL	lunes, 29 de enero de 2024	AL	sábado, 03 de febrero de 2024
FECHA INICIO :	29/01/2024	FECHA TERMINO :	03/02/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1,4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	100,00%	3,00%		
1,11 Retiro de sobrantes: Cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.	100,00%	10,00%	Se realiza recogida de sobrantes de excavacion	
2,11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%	1,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	2.834.769,23	**1.020.831.897,44**		0,28%	21,53%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	3	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	9	DEL	lunes, 29 de enero de 2024	AL	sábado, 03 de febrero de 2024

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

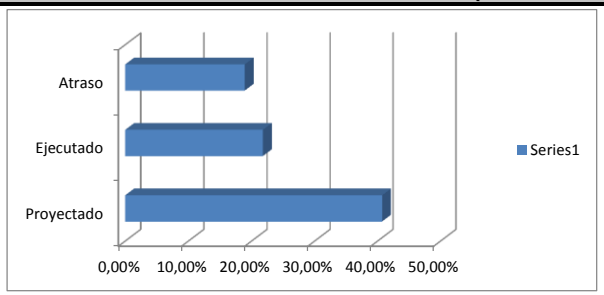

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:	
SEMANA N°	9	DEL	lunes, 29 de enero de 2024	AL	sábado, 03 de febrero de 2024		
FECHA INICIO :	29/01/2024	FECHA TERMINACION :	03/02/2024				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO							
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS			NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S			NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284


VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Avance de impermeabilizacion de cubierta de casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Avance de impermeabilizacion de cubierta de casa cural

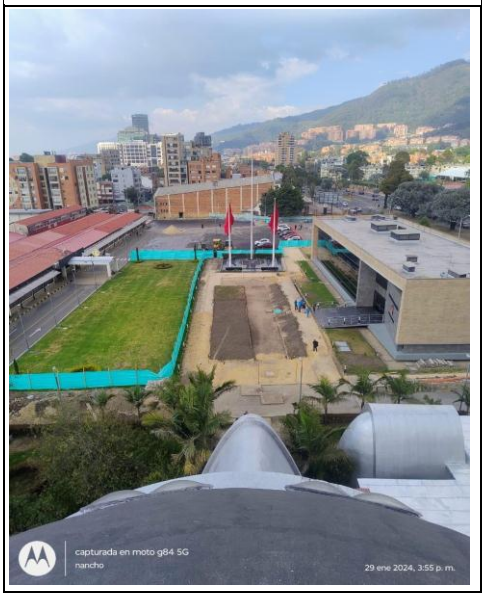

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Panoramica de trabajos en senderos peatonales



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se inicia resane y pintura en la catedral.



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se inicia resane y pintura en la catedral, Resanes de acometida electrica para iluminacion interna de catedral



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se inicia resane y pintura en la catedral.



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resane y pintura en la catedral, Resanes de acometida electrica para iluminacion interna de catedral**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se inicia resane y pintura en la catedral, Resanes de acometida electrica para iluminacion interna de catedral**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Desmonte de puntos electricos en senderos peatonales**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Desmonte de puntos electricos en senderos peatonales**
