FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	30	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	17	DEL	lunes, 25 de marzo de 2024	AL	sábado, 30 de marzo de 2024
FECHA INICIO :	25/03/2024	FECHA TERMINO :	30/03/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
ILUMINACION Lámparas de 50cm: Para las luminarias de iluminación exterior o perimetral, se instalarán las salidas en tubería PVC enterrada a no menos de 60 cm del piso terminado, de acuerdo con la norma de la E.E.P y al RETIE. Suministro de luminaria tipo	100,00%	10,00%		
Arreglo Vitrales: Limpieza detallada y cuidadosa de cada vitral. Identificar los vidrios sueltos, desportillados, fisurados o rotos. Levantar al detalle cada vitral que se va a reparar con papel calcante, cuidando de no quebrar los vidrios sueltos. A los	100,00%	20,00%		
Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	100,00%	2,00%		
DESPACHO PARROQUIAL Organización de cableados eléctrico y datos: Suministro e instalación de bandeja metálica con tapa, color blanco de 20cm. Organizar los cables y conexiones que se encuentren en la zona del mueble dentro de la bandeja metálica. Instalar	100,00%	37,00%		
Reparación, mantenimiento y remodelación de mueble con puertas: Desmonte de puertas, entrepaños móviles y cajones. Lijar todos los elementos fijos y los que se desmontaron, con lija de grano muy fino (230). Aplicar barniz, pintura o aceite (cliente define	100,00%	2,00%		
Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	100,00%	2,00%		
SALÓN DE CATEQUESÍS No.1 PEQUEÑO Demolición de jardinera existente y retiro de escombros: Retiro de plantas y tierra, demolición manual de muro en mampostería con retiro a botadero certificado de escombros.	100,00%	0,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	30	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	17	DEL	lunes, 25 de marzo de 2024	AL	sábado, 30 de marzo de 2024

Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	5,00%		
Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	7,00%		
BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	100,00%	2,00%		
Mantenimiento piso: Consiste en las siguientes actividades: Aseo detallado del piso para detectar baldosas que deban cambiarse. Sustitución de las baldosas en mal estado, por baldosas de las mismas características de las que ya se encuentran instaladas.	100,00%	7,00%		
CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	100,00%	2,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	30	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	17	DEL	lunes, 25 de marzo de 2024	AL	sábado, 30 de marzo de 2024

Suministro e instalación de iluminación (incluye salida eléctrica para iluminación): Suministro de luminaria industrial tipo hermética LED difusor en policarbonato, 2X18W T8 PC DL, de alta eficiencia. Las salidas se construirán en tubería EMT cuando es in	100,00%	37,00%		
Suministro e instalación de combo sanitario laguna color blanco (lavamanos e inodoro, accesorios).	100,00%	17,00%		
Suministro e instalación de enchape color blanco para muro y piso.	100,00%	5,00%		
Pintura y resanes cielo raso y muros exteriores: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a el	100,00%	2,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	30	MES	3	AÑO	2024

SEMANA N°	17	DEL	lunes, 25 de marzo de 2024	AL	sábado, 30 de marzo de 2024

Dilatación en concreto, incluye corte y relleno con sikapavement o similar	100,00%	8,43%		
TOTALES		1,93%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.535.397.633,34	1.441.313.700,68	**94.083.932,66**		1,93%	91,95%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

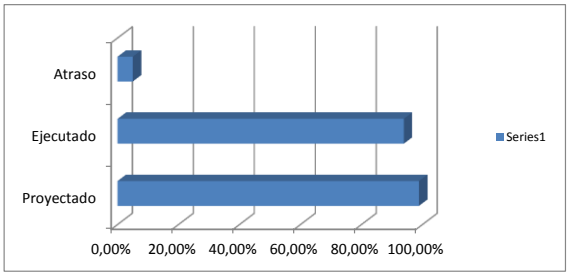

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	17	DEL	lunes, 25 de marzo de 2024		AL	sábado, 30 de marzo de 2024	
FECHA INICIO :	25/03/2024		FECHA TERMINACION :	30/03/2024			

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284



UBICACIÓN:	SENDEROS
COMENTARIOS:	Instalación de puntos electricos en denderos




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Arreglo de muebles en madera




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Arreglo de pintura de cielo raso en casa cural




UBICACIÓN:	CASA CURAL
COMENTARIOS:	Instalación de inodoros

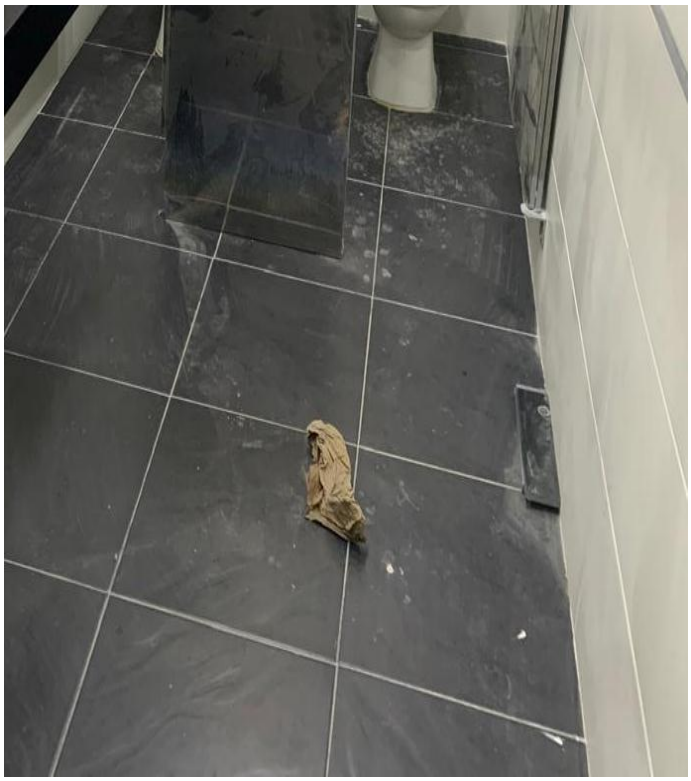

UBICACIÓN:	CASA CURAL
	Instalación de porcelanato en balos casa cural
COMENTARIOS:	

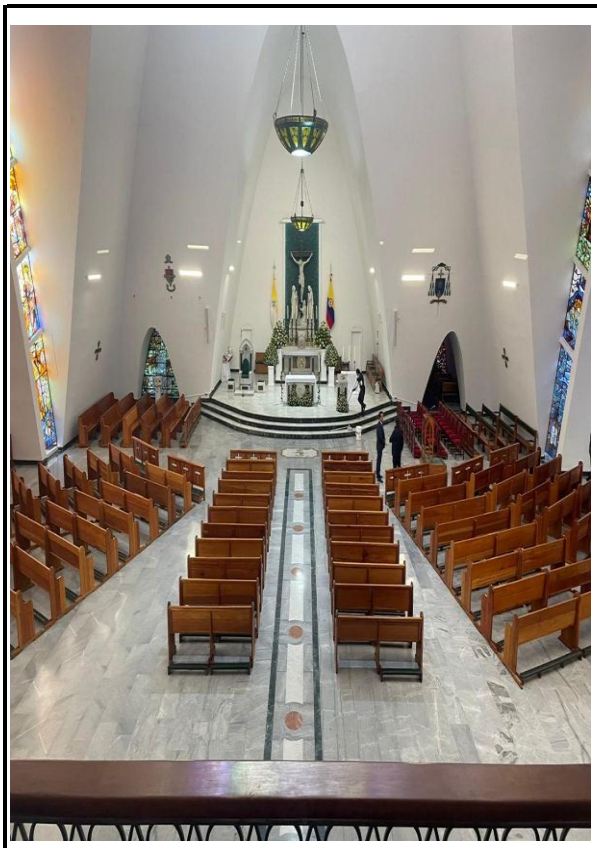

UBICACIÓN:	CATEDRAL
	Iluminacion general catedral
COMENTARIOS:	

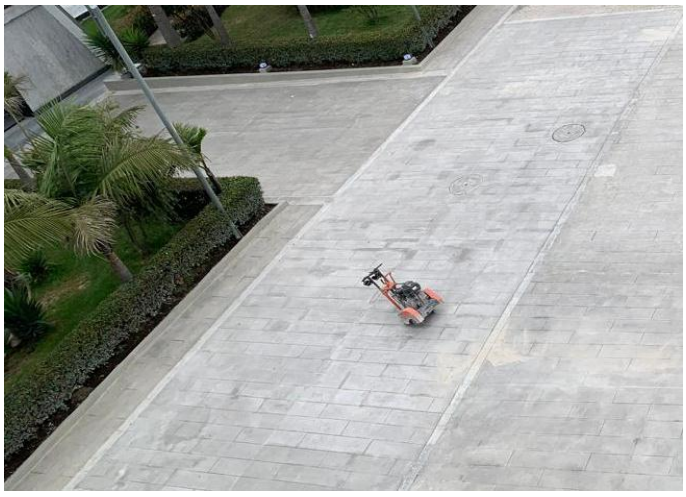

UBICACIÓN:	SENDEROS
	Dilatacion en piso de concreto
COMENTARIOS:	

UBICACIÓN:
COMENTARIOS:
