



COMITES OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

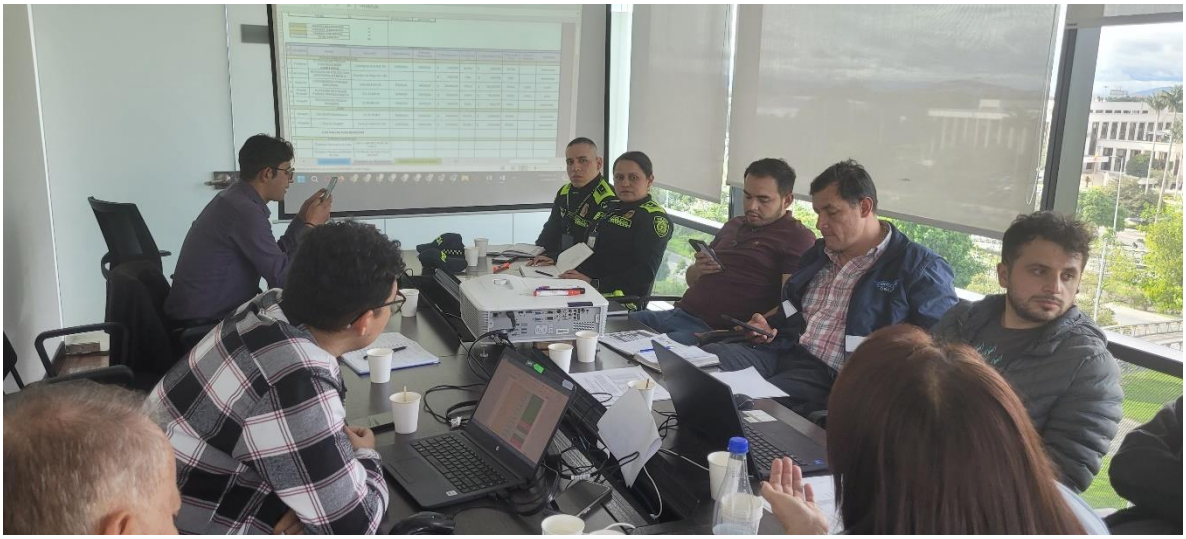

ANALISIS DE AVANCES DE OBRA, OBSERVACIONES DE PROGRAMACION, OBRAS DE EMERGENCIA, REQUERIMIENTOS NUVOS, CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, COMPROMISOS DE ENTREGA.

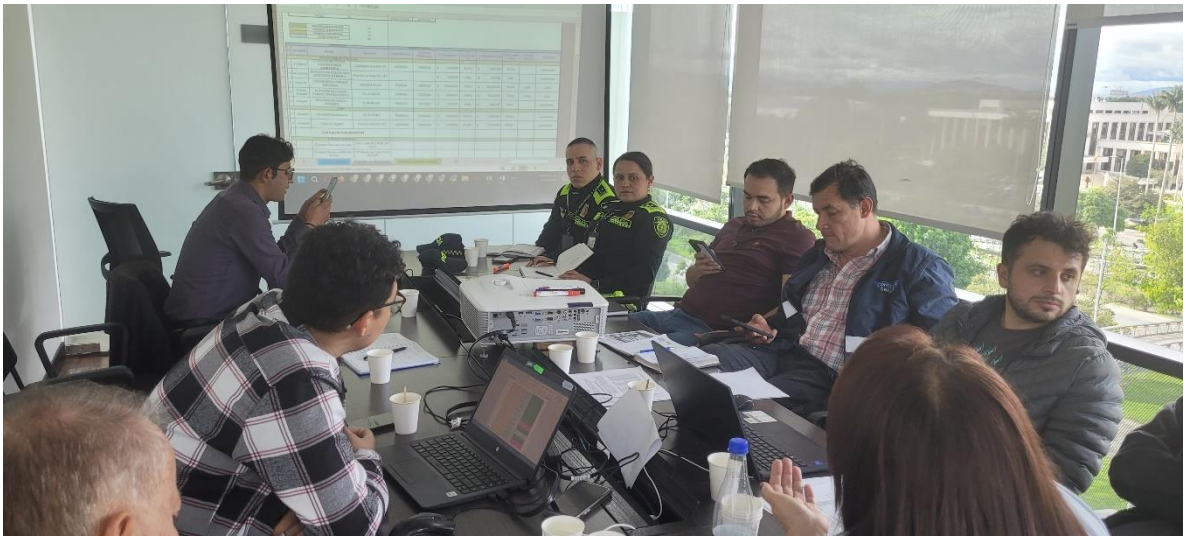

FASE DE CIMENTACION CAI LA LIBERTA, SE DISPONEN EL ACERO DE REFUERZO DE LA CIMENTACION Y VIGAS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL, SE VERIFICA RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA, PERSONAL DE OBRA, PROGRAMACION Y EVALUACIONES DE OBRA, COMPROMISOS DE ENTREGA



SE VERIFICA MATERIALES, FORMALETA DE ESTRUCTURA, DEL CAI, CONDICIONES DE FLUJO DE MATERIALES, CALIDADES DE LOS MISMO, CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIO DE MATERIALES.



PANORAMICA DEL LOTE, MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR A DEMOLER, TODA VEZ QUE SE DEBE GENERAR ACCESO POR AMBOS COSTADOS, CAMPAMENTO DE OBRA, ACTIVIDES DE URBANISMO



OTRA SECUENCIA DEL ARMADO DE LA CIMENTACION, DISPUESTA SOBRE RELLENO COMPACTADO, EN MATERAL SELECCIONADO, ESTO DE CONFORMIDAD AL DISEÑO, PARA LOGRAR COTAS ARQUITECTONICAS



OTRA PANORAMICA DE OBRAS DE CIMENTACION.



PANORAMICA, DE LA VALLA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO.



PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA, COMITÉ DE OBRA, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOCALIDAD DE BOSA.

AVANCE DEL COMITÉ 13, CON UN 16 % DE AVANCE, SE REFLEJA ATRASO DE ACUERDO AL PROGRAMADO, EN UN 8 % APROXIMADAMENTE, SE REPROGRAMA ENTREGA PARA EL MES DE AGOSTO. ALTERAND FECHA PREVISTA DE ENTREGA EN CUARENTA DIAS APROXIMADAMENTE,



OTRA VISTA DEL PERSONAL.

SE ARMAN COLUMNAS Y PANTALLAS, PARA FUNDIR Y ALISTAR PLACA DE CUBIERTA.

SE REVISARON CADA UNO DE LOS DISEÑOS , ELECTRICOS, TEMATICA E HIDROSANITARIOS, GENERANDO MEJORAS, TODA VEZ QUE SE HAN GENERADO OBSERVACIONES DENTRO DE LOS FUNCIONAMIENTOS, LO CUAL HACE QUE SE DEN MANTENIMIENTO PERIODICOS



ARAMDO DEL SISTEMA ELECTRICO, REDES DE AGUAS NEGRA, SISTEMA DE SUMINISTRO.

SE SOLICITO PRUBAS DE PRESION A LA RED HIDRAULICA, INCREMENTO DE DIAMETROS.

ESTA PANORAMICA PREVIA LA FUNDIDA DE LA PLACA DE CONTRAPISO



PLACA DE CONTRAPISO FUNDIDA, COLUMNAS Y PANTALLAS




PANORAMICA DE PANTALLAS Y COLUMNAS, ESTRUCTURAS, AVANZA DE MANERA SATISFACTORIA, QUEDANDO ELEMENTOS DE CUMBIERA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

OBSERVACIONES ZONA DE ARCHIVO NUEVO COMANDO



LA CAPACIDAD DISPUESTA, NO FUE SUFICIENTE Y SE ALMACENA EN LA ZONA DE CORREDORES, DADA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LO QUE OBLIGO A GENERAR COMUNICADO A LA SECRERTARIA, PARA LA VERIFICACION DE CAPACIDAD DE CARGA Y DISPONER ZONA DE AMPLIACION

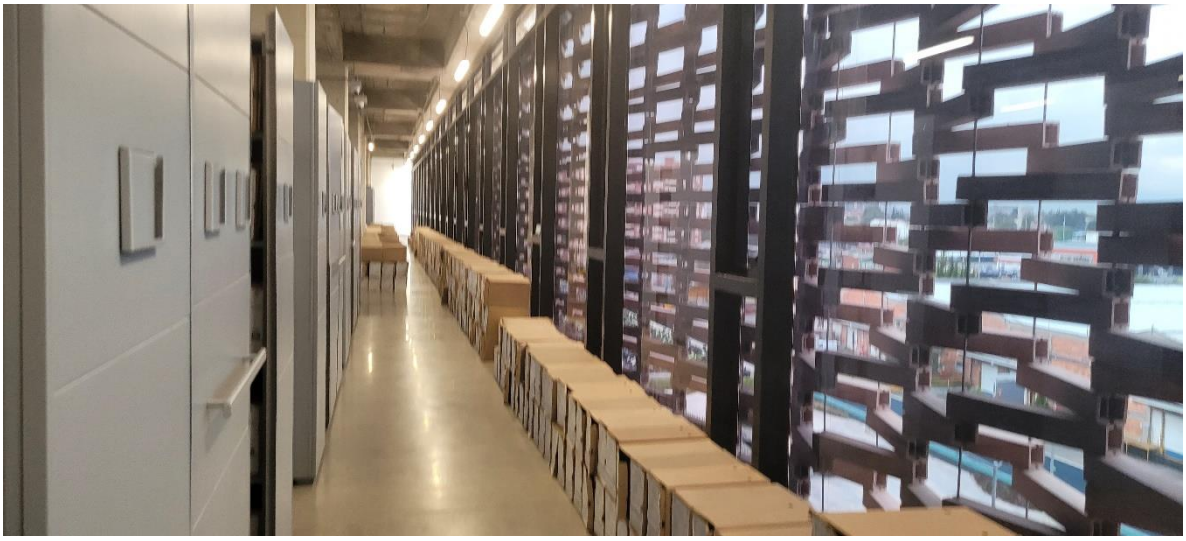

OTRA VISTA, COLOCACION EN ZONA DE CORREDO, SOBRE LA FACHADA, GENERANDO INCONVENIENTE POR LLUVIA QUE PENETRA, POR LAS VENTANILLAS CON BASCULANTES, ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA BIOCLIMATICO



DAÑOS, REPORTE POR CALIDAD, MURO SECO, DE LA ZONA DE ARCHIVO, DESPRENDIMIENTO DEL SUPERBOARD, EN LA ZONA DE MURO DIVISORIO



SE REPORTO LA NOVEDAD A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD., DADA QUE ES UNA AFECTACION, SE TRATA DE ELEMENTO POR ESTABILIDAD, CALIDAD, EN ZONA DONDE NO HAY CIRCULACION, DETERIORO PREMATURO

MODELO DE ARCHIVOS CON MAYOR CAPACIDAD



ELEMENTOS CON MAYOR ALTURA, PARA UNA POSIBLE PROPUESTA DE AMPLIACION, POR NECESIDADES DEL SERVICIO



ELEMENTOS CON MAYOR ALTURA, PARA UNA POSIBLE PROPUESTA DE AMPLIACION, POR NECESIDADES DEL SERVICIO



VISTA DEL ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



DISPOSICION Y ARMADO DE UN SISTEMA DE ESTOS ARCHIVADORES



SE REQUIEREN ESPACIOS TIPO BODEGA, DADA LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS ARCHIVADORES, LOS CUALES TIENE MAS CAPACIDAD.



SE REQUIEREN ESPACIOS TIPO BODEGA, DADA LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS ARCHIVADORES, LOS CUALES TIENE MAS CAPACIDAD.

REPARACION CELDAS USAQUEN

ARREGLO CELDAS ESTACION DE POLICIA USAQUEN



RECORRDO AL INTERIOR, DE LOS TRABAJOS QUE CURSAN EN LA ACTUALIDAD, DE ARREGLO DE CELDAS



CAMBIO DE VENTANAS, ZONA DE FACHADA



TRABAJOS DE ADECUACION DE CELDAS, BAÑOS Y ZONA DE SERVICIO, DONDE SE GENERARON RECOMENDACIONES,



COMITÉ POSTERIOR AL RECORRDIO DE OBRA, CONTRATISA, INTERVENTORIA, PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.



COMITÉ POSTERIOR AL RECORRDIO DE OBRA, CONTRATISA, INTERVENTORIA, PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

TEMAS DE AVANCES DE EJECUCIO, RECOMENDACIONES DE ASEO, CALIDA DE LOS TRABAJOS, ASPECTOS DE SEGURIDAD.
