ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 18

FECHA: Jueves 6 de junio de 2024

HORA: 10: 00 pm.

LUGAR: VIRTUAL

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 17.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Ingreso de personal a santo domingo y/o movimiento de personal para continuar con actividades relacionadas al mantenimiento de los pozos sépticos.
- Se solicita al contratista realizar el ingreso de material accesorios de tubería a las PTAR para mejorar el rendimiento de las actividades.
- Se solicita al contratista agilizar actividades lo más pronto posible antes del 18 de julio, ya que no se realizaran más prorrogas.
- Se solicita abrir los frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso o rotación de personal para iniciar labores en las PTAR.
- Del 29 de mayo al 6 de mayo de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:
  PTAR Nueva granada:
- Se realiza muro interno del tanque de espesor de lodos que contienen las válvulas de apertura rápida, se realiza relleno con material de excavación donde se instaló tubería en PVC., en obra un maestro y dos ayudantes.
  PTAR La Unión:
- Se realiza remates y ciclópeos, se realiza formaleta y fundida de caja que va al final del tanque que se va a convertir en humedal, se realiza instalación de tubería PVC del tanque FAFA, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.
  Pozos Santo Domingo:
- Se realizó almacenamiento de lodos y solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ingreso de personal para continuar con las actividades en los Pozos sépticos de santo domingo. | Contratista | 14/06/2024 |
| Traslado de personal Nueva Granada para iniciar actividades en los Pozos sépticos de Betania. | Contratista | 13/06/2024 |
| Ingreso de material a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR. | Contratista | 10/06/2024 |

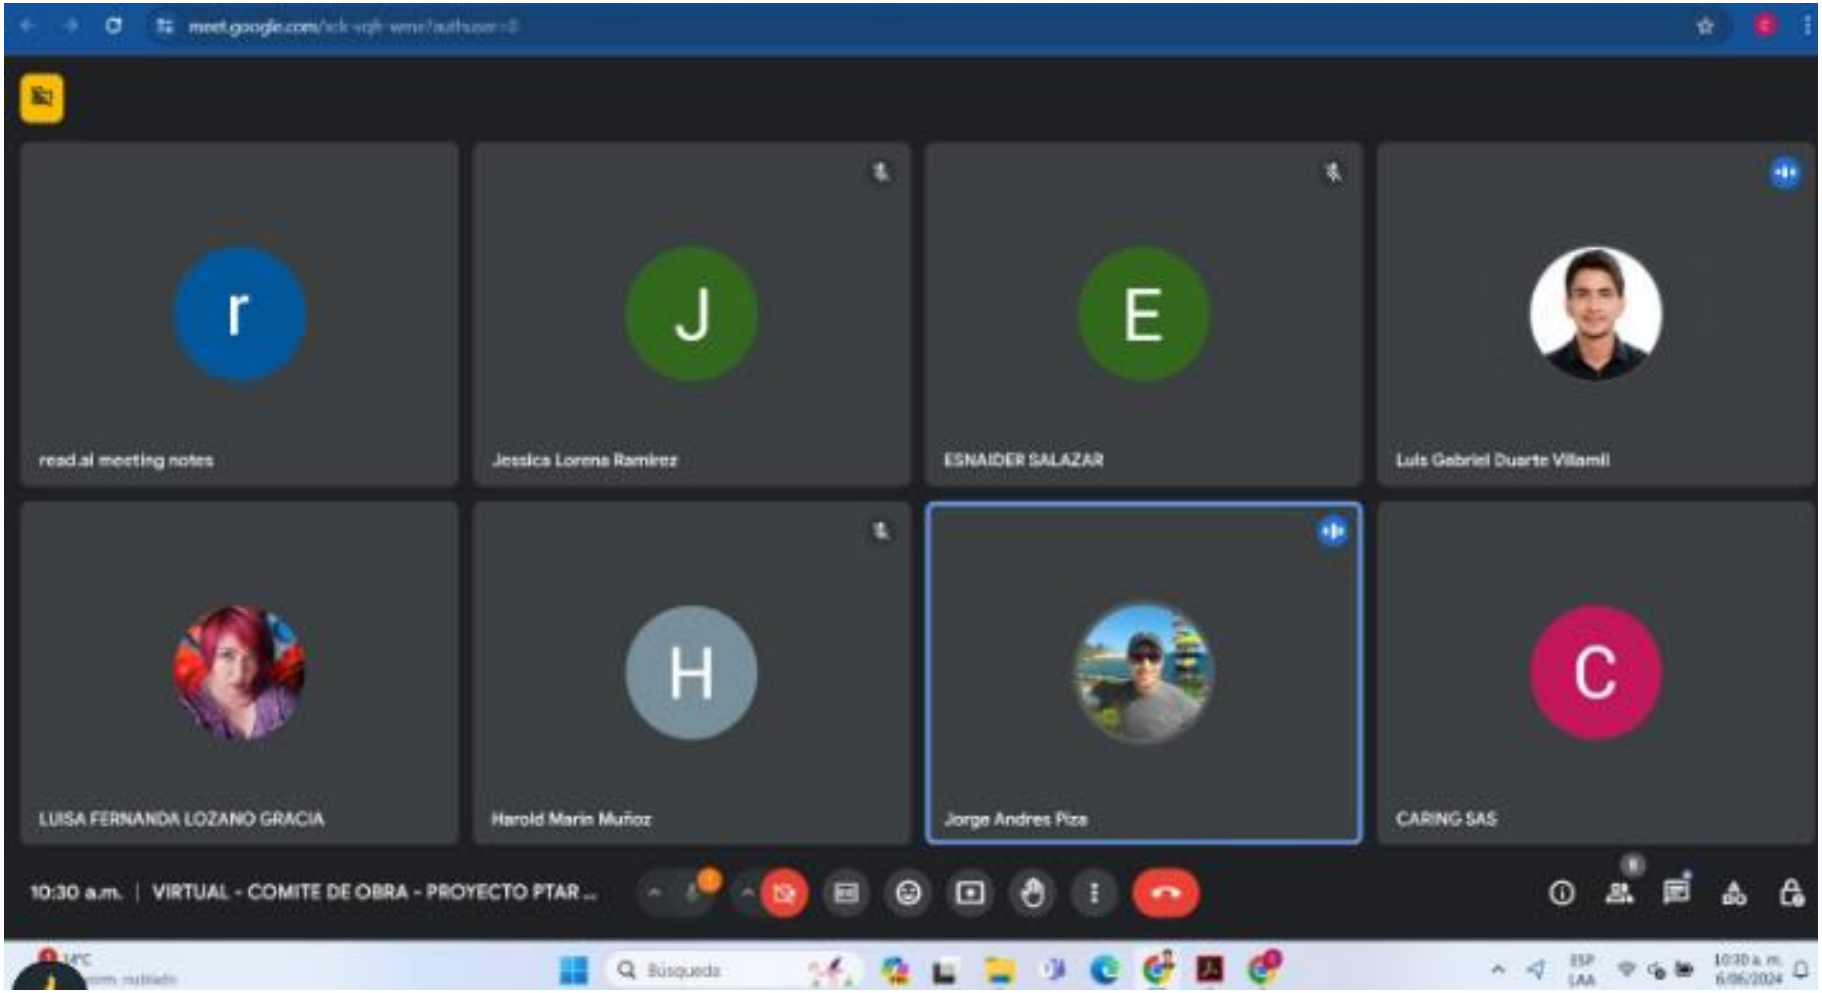
CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:


r
read.ai meeting notes
J
Jessica Lorena Ramirez
E
ESNAIDER SALAZAR
Luis Gabriel Duarte Villamil
LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA
H
Harold Marin Muñoz
Jorge Andres Piza
C
CARING SAS
10:30 a.m. | VIRTUAL - COMITE DE OBRA - PROYECTO PTAR ...

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 19.

FECHA: Martes 11 de junio de 2024

HORA: 10: 00 am.

LUGAR: Ptar La Union.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 18.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Se solicita abrir los frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso o rotación de personal para iniciar labores en las PTAR.
- Se solicita al contratista realizar el ingreso de material accesorios de tubería a las PTAR para mejorar el rendimiento de las actividades.
- Ingreso de personal a santo domingo y/o movimiento de personal para continuar con actividades relacionadas al mantenimiento de los pozos sépticos.
- Se solicita al contratista agilizar actividades lo más pronto posible antes del 18 de julio, ya que no se realizaran más prorrogas.
- Del 7 de junio al 11 de junio de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:
  PTAR Nueva granada:
- Se inician actividades de figuración de acero para cubiertas de tanque séptico, se instaló tubería en PVC al final del tanque fafa., en obra un maestro y dos ayudantes.
  PTAR La Unión:
- Se realiza remate de la caja que va al final del tanque que se va convertir en humedal se realiza instalación de tubería PVC del tanque FAFA, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.
  Pozos Santo Domingo:
- Se realizó almacenamiento de lodos y solado del piso del canal de entrada al pozo séptico, desde el lunes 6 de mayo no se encuentra personal realizando actividades.

COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ingreso de personal para continuar con las actividades en los Pozos sépticos de santo domingo. | Contratista | 14/06/2024 |
| Ingreso de material, tapas de tanques y rosetones a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR. | Contratista | 17/06/2024 |
| Terminación de obra en la ptar nueva granada y la unión, para continuar obras en san juan y Betania. | Contratista | 28/06/2024 |

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO O EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/NÓ LOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Jorge Andrés Piza Becerra | | | X | | | | | | X | Consorcio GHW | residente. sumapaz obra@gmail.com | 3016457722 | |
| Luisa F. Lozano Garcia | | | x | | | | | | x | FDOS. | luisa.lozano@gobiernobogota.gov.co | 3003654460 | |
| Luis Gabriel Duarte Villamil | | | x | | | | | | x | Consorcio Inter 1 | luisduarteo207@gmail.com | 3105686177 | |
| Guido Omar Haya D | | | x | | | | | | x | Consorcio GHW | Post hidraulico | 3022057722 | |
| Eduardo A. Salazar Garcia | | | x | | | | | | x | Consorcio Inter 1 | eduardo.salazar@hotmail.com | 3227156770 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 20.

FECHA: Martes 18 de junio de 2024

HORA: 10: 00 am.

LUGAR: Pozos Santo Domingo.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 19.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Se realiza re ingreso de personal a los pozos sépticos de santo domingo para continuar con actividades relacionadas a su mantenimiento.
- Se solicita abrir los frentes de obra (san juan y Betania) para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso o rotación de personal para iniciar labores en las PTAR.
- Se solicita al contratista realizar el ingreso de material como mixto, rosetones y accesorios de tubería a las PTAR para mejorar el rendimiento de las actividades.
- Se solicita al contratista agilizar actividades lo más pronto posible antes del 18 de julio.
- Se realizo la entrega correspondiente del PAC (Programa Anual de Caja).
- Del 12 de junio al 18 de junio de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:
  PTAR Nueva granada:
- Se continua con figuración e instalación de acero para fundida de cubiertas del tanque séptico y tanque FAFA, se realiza excavación manual para instalación de tubería de desagüe del área de secado de, en obra un maestro y dos ayudantes.
  PTAR La Unión:
- Se realiza figuración e instalación de acero para fundida de cubiertas del tanque FAFA, se realiza excavación manual para instalación de tubería de desagüe del área de secado de lodos, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.
  Pozos Santo Domingo:
- Se realizó inicio de actividades de figuración de acero para canal de entrada a los pozos sépticos, se realiza excavación manual para realizar la estructura de secado de lodos. En obra un maestro dos oficiales y 2 ayudantes.

COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ingreso de material, mixto y rosetones a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR. | Contratista | 18/06/2024 |
| Terminación de obra en la ptar nueva granada y la unión, para continuar obras en las ptar de san juan y Betania. | Contratista | 28/06/2024 |

CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO O EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/NÓ LOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Jorge Andrés Piza Becerra | | | X | | | | | | X | Consorcio GHW | residente. sumapaz obra@gmail.com | 3016457222 | |
| Luisa F. Lozano Garcia | | | X | | | | | | X | FDGS. | luisa.lozano@gobiernobogota.gov.co | 3003658460 | |
| Luis Gabriel Duarte Villamil | | | X | | | | | | X | Consorcio Inter 1 | luisduarte0207@gmail.com | 3105686127 | |
| Guido Omar Haya D | | | X | | | | | | X | Consorcio GHW | Psot. hidraulico | 3022057722 | |
| Esneider A. Salazar Garcia | | | X | | | | | | X | Consorcio Inter 1 | esneiderarm@hotmail.com | 3227156770 | |
| Johanna Ramirez | | | X | | | | | | X | Consorcio GHW | residente.sumapaz obra@gmail.com | 3506965 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

ACTA COMITÉ No. 21.

FECHA: Martes 25 de junio de 2024

HORA: 4: 00 Pm.

LUGAR: Virtual.

ASISTENTES: anexo 1. listado de asistencia a comité.

ORDEN DEL DÍA

1. Pendientes y compromisos del acta No. 20.
2. Avance de obra PTAR la unión, nueva granda y santo domingo.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

- Se da cumplimiento al compromiso del acta No. 20 de ingreso de material, mixto y rosetones a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR.
- Se solicita abrir los frentes de obra (san juan y Betania) el día 2 de julio de 2024 para cumplir con los tiempos contractuales, el contratista expone que se realizara el ingreso de personal en las PTAR sin ningún contratiempo.
- Se realiza la inscripción de la empresa para fallar los testigos de concreto, se espera obtener los resultados el día 3 de julio.
- Al finalizar las obras realizar tomas de medición en las PTAR para dar conformidad al mejoramiento de agua.
- Se planea realizar el próximo comité de obra el 2 de julio de 2024 en la PTAR nueva granada con todos los profesionales de obra e interventoría.
- Se solicita al contratista agilizar actividades lo más pronto posible antes del 18 de julio.
- Del 19 de junio al 25 de junio de 2024 se realizaron las siguientes actividades en las PTAR:

PTAR Nueva granada:

- Se realiza fundida de cubiertas del tanque séptico y tanque FAFA, se realiza instalación de tubería de desagüe del área de secado de lodos, en obra un maestro y dos ayudantes.

PTAR La Unión:

- Se realiza fundida de cubiertas del tanque FAFA, se realiza instalación de tubería de desagüe del área de secado de lodos, se funden las tapas de inspección que van ubicadas en las cajas de válvulas, tanque fafa y tanque séptico, en obra un maestro un oficial y tres ayudantes.

Pozos Santo Domingo:

- Se realizó figuración de acero para canal de entrada a los pozos sépticos con su correspondiente formaleta para fundir concreto, se finaliza excavación manual de secado de lodos para figuración e instalación de acero de refuerzo, En obra un maestro dos oficiales y 2 ayudantes.

COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Ingreso de material como pasamuros a las obras para seguir adelantando actividades en las PTAR. | Contratista | 2/07/2024 |
| Terminación de obra de la Ptar nueva granada y la unión. | Contratista | 28/06/2024 |
| Entrega de ensayos de laboratorio de los testigos en concreto. | Contratista | 3/07/2024 |
| Dar Inicio de actividades de obra en las Ptar de san juan y Betania. | Contratista | 2/07/2024 |
| Ingreso de estructura en perfilería metálica para cubierta del área de secado de lodos, en los pozos de santo domingo, Ptar La Unión y nueva granada. | Contratista | 28/06/2024 |

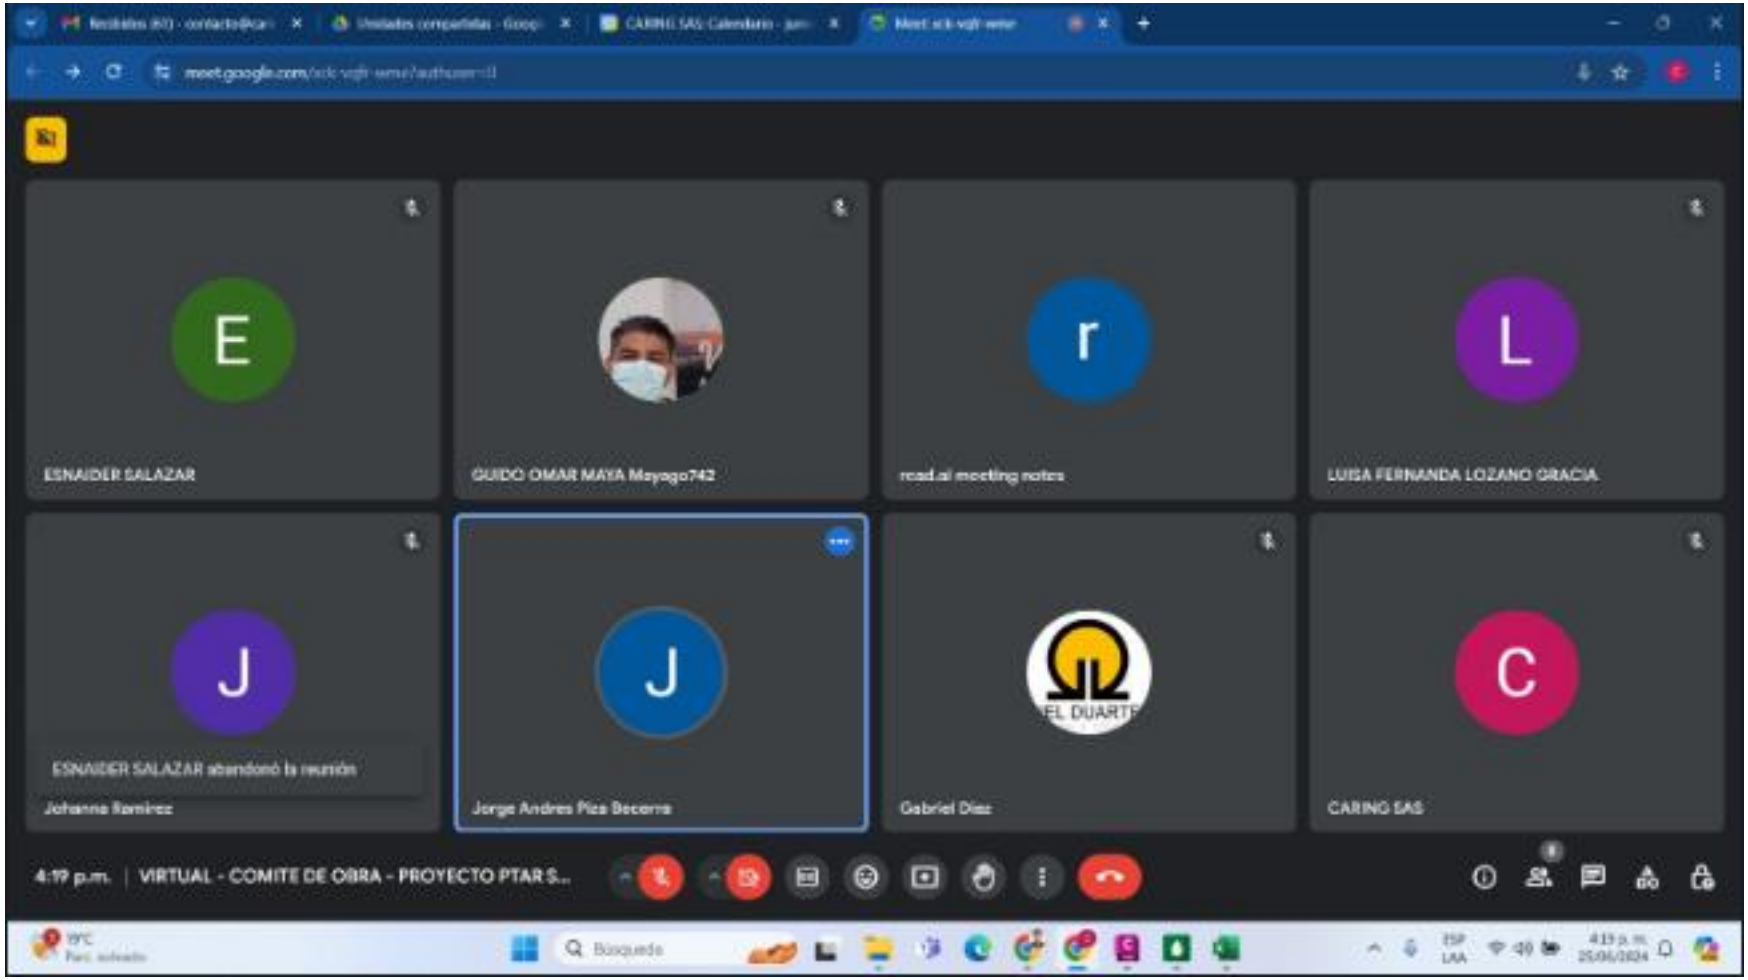
CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
secretario técnico comité

Anexo: Si aplica.

Elaboró:


E
ESNAIDER SALAZAR
GUIDO OMAR MAYA Mayago742
r
read.ai meeting notes
L
LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA
J
ESNAIDER SALAZAR abandonó la reunión
Johanna Ramirez
J
Jorge Andres Pico Becerra
Gabriel Diaz
C
CARING SAS
4:19 p.m. | VIRTUAL - COMITE DE OBRA - PROYECTO PTAR S...
