		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	
MUNICIPIO: Sumapaz		REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DÍA: 173**	**DE: 240**	**CONTRATO No.** CIN-456-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GHW SUMAPAZ	

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**	**domingo, 18 de agosto de 2024**



Se realiza la instalación correspondiente de tuberia de 4" entre el tanque FAFA (PTAR LA UNION)



Se realiza la instalación que conecta la caja de valvulas del tanque séptico con la tuberia de 4" entre el tanque FAFA (PTAR LA UNION)




Se ingresa material petreo para continuar con actividades de mezcla de concreto (PTAR LA UNION).



Se realiza la instalación de formaleta para la caja que va al final del tanque que se va a converti en humedal. (PTAR LA UNION).



Se realiza almacenamiento de lodos en obra y se cubren para evitar malos olores y mal aspecto en la obra (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).

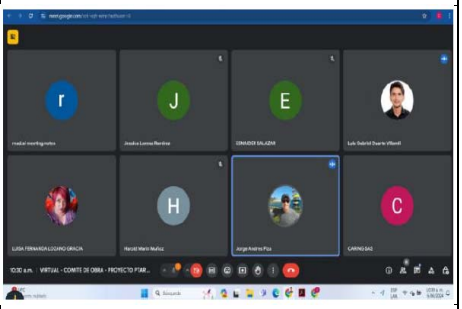

Se realiza comité de obra virtual con todos los profesionales de la PTAR, como evidencia se realiza el acta No. 18, (VIRTUAL).



Se realiza fundida de caja que contiene las valvulas de apertura rapida del tanque séptico, (PTAR LA UNION).



Se realizan anclajes para la cubierta del tanque séptico, (PTAR LA UNION)



Se realizan perforaciones a la tuberia pvc de 4" que va elevada en el tanque FAFA, (PTAR LA UNION).



Se realiza caja que va al final del tanque que se va a convertir en humedal, (PTAR LA UNION).



Se realizo la instalación de pasamuro, y tuberia de PVC para la caja que va al final del tanque humedal, (PTAR LA UNION).



Se realiza el ingreso de piedra rajon para intalacion en los ciclopeos que van entre el tanque séptico y el tanque que sera un humedal, (PTAR LA UNION).

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	
MUNICIPIO: Sumapaz		REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	DÍA: 180	DE: 240	CONTRATO No. CIN-456-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 18 de agosto de 2024



Se realiza intalación de tuberia que conecta el tanque FAFA con la caja de desague, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realizo ingreso de material de acero y materiales petreos para realizar las cubiertas de los tanques, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se finaliza la construción del tanque de lecho de secados con sus correspondientes muros internos, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza instalación de tuberia y valvulas de apertura rapida en el tanque de lecho de secados, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza instalación y atraques de madera para la fundida de cubierta del tanque séptico (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza inspección visual entre el tanque séptico donde se evidencia el correspondiente ciclopeo y valvula de cheque, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza intalación de tuberia PVC de 4" que va entre el tanque FAFA (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza ingreso de marcos metálicos para tapas de inspección (PTAR LA UNION).



Se realiza excavación manual para instalación de tuberia de desague del area de secado de lodos, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realiza ciclopeo interno en el tanque que se va convertir en el futuro humedal, (PTAR LA UNION).



Se realiza figuración e instalación de acero para cubierta del tanque FAFA, (PTAR LA UNION).



Se ingresa piedra rajon para realizar los ciclopeos internos del tanque que se va a convertir en un humedal,(PTAR LA UNION).

			Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		Código:
			Fecha:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".		REVISIÓN:
MUNICIPIO: Sumapaz			

FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DÍA: 187**	**DE: 240**	**CONTRATO No.** CIN-456-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GHW SUMAPAZ	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023			**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:**	**domingo, 18 de agosto de 2024**



Se realiza ingreso de cemento a la obra para continuar con actividades en los pozos, (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realiza ingreso de varillas de acero y repisas en madera para continuar con actividades en los pozos, (POZOS SEPTICOS SANTO DOMINGO).



Se realiza ingreso de tuberia PVC de 2" para instalación en el tanque FAFA, (PTAR LA UNION).



Se realiza figuración e instalación de acero para la cubierta del tanque FAFA. (PTAR LA UNION).



Se realiza instalación de marcos en acero para tapas de inspección en la cubierta del tanque FAFA. (PTAR LA UNION).



Se realiza instalación de marcos en acero para tapas de inspección en la cubierta del tanque séptico. (PTAR LA UNION).



Se realiza comité de obra con todos los profesionales en la PTAR, como evidencia se realiza el acta No. 20,(POZOS SANTO DOMINGO).



Se realiza figuración e intalación de acero para el canal de entrada a los pozos, (POZOS SANTO DOMINGO).



Se realiza excavación manual para el tanque de area de secado de lodos, (POZOS SANTO DOMINGO).



Se realiza fundida en concreto de la cubierta del tanque séptico y tanque FAFA, (PTAR NUEVA GRANADA).



Se realizan ciclopeos internos en el tanque que se va a convertir en el futuro humedal, (PTAR LA UNION).



Se ingresan rosetones plasticos a la PTAR para su proxima instalación, (PTAR LA UNION).

		Versión: 0
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código:
		Fecha:
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".	
MUNICIPIO: Sumapaz		REVISIÓN:

FECHA DE CORTE DEL INFORME	DÍA: 194	DE: 240	CONTRATO No. CIN-456-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: LUNES, 19 de diciembre de 2023			FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	domingo, 18 de agosto de 2024



Se realiza fundida de tapas de inspección que seran instaladas en cajas de valvulas y cubiertas de los tanques, (PTAR LA UNION).



Se realiza corte de tuberaia PVC de 2" para instalación en el tanque FAFA, (PTAR LA UNION).



Accesorios para tuberia PVC de 2" en el tanque FAFA, (PTAR LA UNION).



Se realiza fundida en concreto de la cubierta del tanque séptico (PTAR LA UNION).



Se realiza instalación de tuberia PVC de 4" en el area de secado de lodos, (PTAR LA UNION).



Se realiza fundida de los ciclopeos que van entre el tanque que se va convertir en un futuro humedal, (PTAR LA UNION).



Se continua con excavación manual para el tanque de area de secado de lodos, (POZOS SANTO DOMINGO).



Se continua con actividades en obra, (POZOS SANTO DOMINGO).



Se realiza instalación de tapas de inspección a la cubierta del tanque séptico (PTAR LA UNION).



Se realiza ingreso de tejado para cubiertas de la estructura del área de secado de lodos, (PTAR LA UNION).



Se realiza instalación de tapas de inspección a las cajas de válvulas de apertura rápida (PTAR LA UNION).



Se realiza instalación de tapas de inspección a las cajas de válvulas del área de secado de lodos (PTAR LA UNION).
