CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No.10:

PERIODO: 01/05/2024 AL 30/06/2024

San Juan de Pasto, julio de 2024

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	4/07/2024	CON CORTE :	30/06/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023
REGISTRO No:	2023061065	FECHA:	26/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACION No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	Detalle: Ajuste de clausulas, sin afectar alcance, valor o plazo de ejecución.	
MODIFICACION No.:	2 DEL 28 de noviembre de 2023	Detalle: Prorroga hasta el 31 de julio de 2024	
CONTRATISTA DE OBRA:	CAMINAR INGENIERIA S.A.S		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ		
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Lorena Elixa Arturo Delgado		
META FISICA	22 alcantarillas		
VALOR DEL CONVENIO:	657.016.814,72		
APORTTE DEPARTAMENTO	655.016.814,72		
APORTE MUNICIPIO	2.000.000,00		
FECHA DE INICIACION:	miércoles, 19 de julio de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
MODIFICACION 2	martes, 28 de noviembre de 2023		
FECHA DE TERMINACION SEGUN MOD 2:	miércoles, 31 de julio de 2024		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	miércoles, 31 de julio de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$		262.006.725,89
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	262.006.725,89		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
Póliza No.:	436-47-994000059011		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	71,00%	% EJECUTADO: 73%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	82,60%	% EJECUTADO 40,00%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	15	

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-3 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.
La meta física es la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.
El convenio inicia suscribe acta de inicio el día 19 de julio de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.
El día 8 de agosto, se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza un ajuste a las clausulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.
Actualmente el municipio cuenta con los contratos derivados de obra e interventoría adjudicados.
El contrato de obra por medio de la LP003-2023 es adjudicado el día 24 de noviembre de 2023.
El contrato de interventoría por medio del CMA003-2023 es adjudicado el día 28 de noviembre de 2023.
de acuerdo a solicitud del municipio, el cual manifiesta requerir el plazo para la ejecución física de la obra una vez se establezca orden de inicio. el día 28 de noviembre de se suscribe modificatorio 2, el cual prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.
El contrato de obra actualmente ha detenido su ejecución física a espera de aprobación del balance de cantidades contractuales, obra de mas, obra de menos e ítems no previstos correspondientes a disipadores y mejoramiento de cimentación en concreto ciclópeo.
El proyecto presenta una ejecución física del 73%, según información del Municipio.
Los contratos derivados se encuentran suspendidos hasta definir la aprobación del balance de obra sin afectar el valor del contrato.
El convenio tiene actualmente fecha de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.

ASPECTOS FINANCIEROS : El Departamento hace el desembolso del anticipo el día 15 de abril de 2024 mediante comprobante de egreso Número 2024001841. El municipio a la fecha no ha girado recursos al Contratista de obra.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
Fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023.
Fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023.
Fecha de suscrición modificatorio 1: 8 de agosto de 2023.
Fecha de suscrición modificatorio 2: 28 de noviembre de 2023.

ASPECTOS LEGALES :
Convenio legalizado 24 de julio de 2023.
Modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023.
Modificatorio 2 legalizado 19 de febrero de 2024.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El convenio se encuentra en ejecución, el Municipio suscribió los contratos derivados de obra e interventoría; estos se encuentran actualmente suspendidos en espera de revisión de balance de cantidades de obra de mas, obra de menos e ítems no previstos. A la fecha, el Municipio no ha realizado pagos al contratista de obra

Proyectó: Lorena Elixa Arturo Delgado
Contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

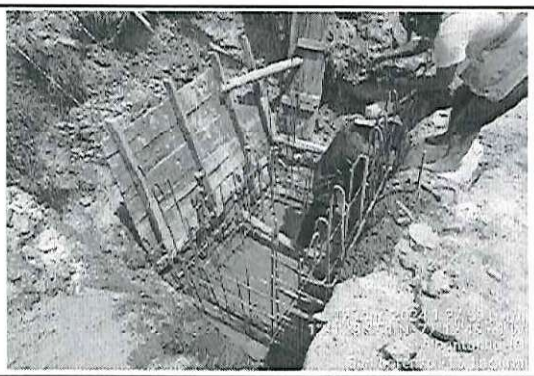


Foto1: armado acero de refuerzo encole alcantarilla

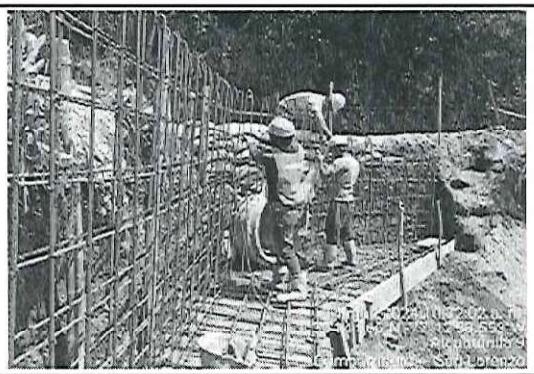


Foto2: armado de refuerzo aletas alcantarilla



Foto3: fundición de encoles concreto clase D

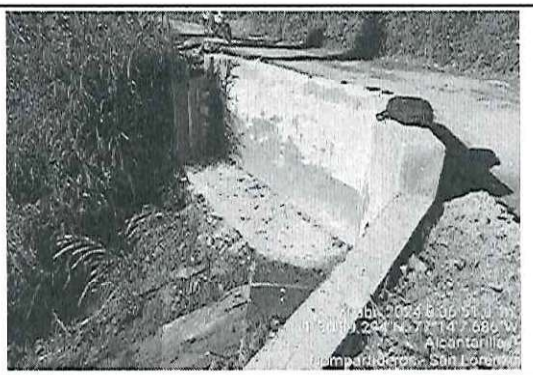


Foto4: fundición de aletas concreto clase D

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**3253-2023**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/04/2024	$ 262.006.725,89	$ 262.006.725,89	0	$ 262.006.725,89	$ 262.006.725,89	$ 0,00	2024001841	15/04/2024
TOTAL		**$ 262.006.725,89**		**$ 0,00**	**$ 262.006.725,89**		**$ 0,00**		

AVANCE FISICO	73%
AVANCE FINANCIERO	40%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL PÓLIZAS

CONTRATO No 3253-2023

GARANTIAS:	aseguradora solidaria
Póliza No.:	436-47-994000059011

ANEXO 0 -CONVENIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	7/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	25-jun-23	25-jun-24		(8)
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726	40%	25-jun-23	25-jun-24		(8)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	26/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	16
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	16

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 2			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	212
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	212
