INFORME DE OBRA No. 07

INFORME DE AVANCE DE OBRA

FINAL [ ] **PARCIAL** [X] **No. 7**

Periodo: del 24 de mayo al 23 de junio de 2024.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	159 de 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA
VALOR INICIAL	$ 3.204.000.004,00
PLAZO	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
ANTICIPO 40%:	$ 1.281.600.002,00
CONTRATISTA	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
SUPERVISOR	ING. YESID ROJAS PEÑA
CONTRATANTE	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL SAS
OTRO SI 18 DE JUNIO DE 2024	ADICION VALOR: $ 113.338.444,00 ADICION PLAZO: DOS (2) MESES
FECHA FINAL TERMINACION	23 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tabla No. 1 Relación de Pólizas de contrato de Obra – Legalización.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	18-10-2023	18-12-2024	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	18-10-2023	18-08-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	18-10-2023	18-08-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 2 Relación de Pólizas de contrato de Obra – Acta de inicio.

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 961.200.002,00**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.281.600.002,00**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 640.800.001,00**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 961.200.002,00**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 464.000.000,00**

Tabla No. 2 Relación de Pólizas de contrato de Obra Otro si No 01

Amparos	No. Póliza	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**995.201.534,40**
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	11-44-101209782	24-11-2023	24-01-2025	**$ 1.326.935.379,20**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101209782	24-11-2023	24-09-2027	**$ 663.467.689,60**
Estabilidad y Calidad de la Obra	11-44-101209782	24-09-2024	24-09-2029	**$ 995.201.534,40**
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	11-40-101056110	24-11-2023	24-11-2024	**$ 520.000.000,00**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Este informe tiene como objetivo general dejar constancia del desarrollo de las acciones y actividades de obra que se han realizado durante el periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2024, de acuerdo a la ejecución del contrato de obra No. 159 de 2023.

Se detallan a continuación las actividades realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en progreso de la ejecución de las labores realizadas para la "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA".

Se describen los detalles de las actividades contractuales realizadas por CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA, en cada uno de los componentes técnicos, administrativos, de seguridad y salud en el trabajo, sociales y ambientales correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de mayo al 23 de junio de 2024. Igualmente se relacionan los hechos y sucesos más relevantes de las actividades ejecutadas durante el periodo.

En este informe también se describe el estado y avance físico del contrato de obra y consecutivamente se relaciona la información financiera programada versus la inversión financiera ejecutada de acuerdo a la programación del cronograma de obra y con el avance físico real.

El día 30 de Mayo de 2024, 9:00 am, se presenta visita programada a la obra por parte de: veeduría ciudadana representada por el señor Jhonny Vargas, Roser Cuellar y Héctor Pérez, supervisión del contrato, representado por el Ing. Yesid Rojas Peña de Aguas del Huila S.A. E.S.P., Interventoría representada por la representante legal Ing. Jessika Escobar y el director de interventoría el Ing. Sergio Gómez de Incoin Ltda., empresas públicas de Altamira representada por la Ing. María Camila Yusty, contratista de obra representado por el Ing. Luis Iván Luna profesional de Ingeniería y proyectos, quienes por medio del recorrido observaron el avance de obra, las especificaciones técnicas y constructivas de las actividades ejecutadas, las particularidades del proyecto y actividades proyectadas a futuro a desarrollar o ejecutar. Se visitaron los diferentes frentes de obra, así como las instalaciones como el depósito o acopio de la tubería y accesorios, suministrados y adquiridos respectivamente.

En esta visita se señaló que a la fecha continúan todavía pendiente por escrito los permisos de servidumbre de los siguientes propietarios que por su extensión de propiedad son de gran in importancia para el correcto desarrollo y avance del proyecto.

- Flor María Ruiz
- Héctor Vargas
- Isleny Infante
- Hernando Cuellar

A su vez se solicita comedidamente a la gerencia de Empresas públicas del Municipio de Altamira - Huila, la agilización de dicho proceso para la adquisición de los respectivos permisos de servidumbre, que como se indicó anteriormente son de gran importan para el correcto desarrollo del proyecto y objetivo a alcanzar.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS AL 23/06/2024	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	24/11/2023	**210 DÍAS**		24/09/2024
Socialización	27/02/2024			
Otro Si No 01	18/06/2024			23/11/2024

Avance físico de las Obras

En el periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2024, en referencia al corte, se ha estado trabajando en las actividades contractuales, que se relacionan a continuación:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta excavación manual en material conglomerado, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+580.00 a K1+620.00, K2+330.00 a K3+380.00 y K3+400.00 a K3+670.00.

2.03 Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.
Se ejecuta excavación mecánica en material conglomerado, desde la Abs K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.06 Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material de arena lavada o similar fondo excavación para cama desde la K0+600.00 a K1+130.00 y K1+540.00 a K1+670.00.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+343.00, K3+405.04 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+390.00, K3+410.00 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material conglomerado proveniente de excavación manual y mecánica no apto para relleno, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+390.00, K3+410.00 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

NP 2.11 Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.

Se Excava manualmente en roca con compresor, desde la Abs K2+190.00 a K2+240.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.04 Instalación tubería PVC para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-8" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).
Se instala tubería PVC para acueductos de 8" RDE 21, desde la Abs K0+610.00 a K1+140.00 y K2+750.14 a K2+776.09.

3.06 Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).
Se instala tubería HD 8" C40, desde la Abs K2+776.09 a K3+343.00, K3+390.00 a K3+670.00, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

3.11 Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 45° (RDE 21 - 200 PSI) PVC 8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K1+180.00, K1+450.00, K1+550.00 y K2+637.24.

3.12 Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K3+091.76, K3+390.00, K3+513.71 y K4+399.25.

3.14 Suministro e Instalación de Codo PVC Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 8".
Se suministra e instala accesorio Codo PVC JH D=8" en las Abs: K1+215.00, K1+265.00, K1+365.00, K1+448.81, K1+592.50, K1+595.00, K1+640.02, K1+645.00, K1+690.00, K1+740.00, K1+740.41, K1+840.00, K1+890.00, K1+940.00, K1+942.08, K2+085.00, K2+135.00, K2+280.00, K2+280.20, K2+328.73, K2+574.94, K2+607.30, K2+654.37 y K2+685.03.

3.15 Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".

Se suministra e instala accesorio Codo PVC D=8" x 22.5 en las siguientes Abs: K2+752.35, K2+773.16, K2+774.50, K2+870.00, K2+890.00, K2+892.65, K2+910.00, K2+917.39, K2+920.00, K3+005.55, K3+010.00, K3+087.43, K3+148.49, K3+195.48, K3+200.00, K3+305.50, K3+420.00, K3+445.15, K3+455.26, K3+515.00, K4+468.16, K4+485.00, K4+500.00, K4+510.00, K4+520.00, K4+530.00, K4+540.00, K4+550.00, K4+634.68 y K4+635.00.

CAPITULO 6 – VIADUCTOS

6.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta la excavación Manual de las obras civiles correspondiente a viaductos para sus elementos estructurales de la zapata y pedestal ubicados en las Abs K1+130.00.

6.03 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira el material sobrante no apto para relleno de la excavación a botadero autorizado por el Municipio de Altamira – Huila, que se encuentra a menos de 10 km de obra, correspondiente a la excavación Manual de las obras civiles de los viaductos ubicados Aprox. Abs. K1+130.00, para los elementos estructurales de la zapata y pedestal.

6.04 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena el excedente de la excavación con material seleccionado de la misma, con compactación cada 20 cm aproximadamente de las obras civiles de los viaductos ubicados en las Abs K1+130.00, K4+530.00 a K4+544.00, K5+158.00 a K5+170.00, K5+249.00 a K5+261.00 y K9+536.00 a K9+548.00, así como las cajas de lanzamiento del 1 al 4, para los pasos sin zanja.

6.13 Acero de Refuerzo 60000 PSI (Inc. Amarre y Figuración).
Se corta, figura y amarra el acero de refuerzo de 60000 PSI, para las obras civiles ubicadas en las Abs. K1+130.00, de los elementos estructurales de la zapata y pedestal.

6.14 Concreto 3000 PSI (Inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).
Se ejecuta fundición concreto 3000 PSI, según dosificación, especificaciones y dimensiones, para los elementos estructurales de las zapatas y pedestales, ubicadas en las Abs. K1+130.00.

NP 6.16 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 6 a 12 m de 0.8 x 0.4 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 x 1/8", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/8", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 12m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K1+130.00 y K5+740.00.

NP 6.17 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 13 a 18 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 1/2" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 3/16", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 19m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K3+390.00.

NP 6.18 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 19 a 24 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 3" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/4", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 22.5m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K5+940.00.


NP 6.19 Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.30 m. x 0.4 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.
Se ejerce instalación de Platina para anclaje cercha metálica tipo Howe en las obra civiles embebida previamente en el pedestal de los viaductos de 12m, ubicados en las Abs K1+130.00, K1+142, K5+740.00 y K5+752.

NP 6.20 Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.50 m x 0.6 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.
Se ejerce instalación de Platina para anclaje cercha metálica tipo Howe en las obra civiles embebida previamente en el pedestal de los viaductos de 12m, ubicados en las Abs K3+390.00, K3+409.00, K5+940.00 y K5+963.00.

NP 6.21 Suministro e instalación Lamina de anclaje HR A36 - 9 mm, con Viga IPE A572 G50 120 mm x 0.35 m, 4 pernos de B7 3/4" x 0.15 m con Tuerca negra 2H 3/4" Arandela industrial 1/2" y Epoxico, Abrazadera en platina NTC1920 de 2 x 3/16" con 2 Tornillo 1/2" grado 5 y Arandela de seguridad, pintada con anticorrosivo y epoxica para estructuras metálicas, para apoyo paso elevado tubería HD 8" C40. Paso Rio Suaza.
Se ejerce suministro e instalación de láminas de anclaje para apoyo paso elevado tubería HD 8" C40, sobre el Rio Suaza, cada 1.3m entre las Abs. Aprox. K4+400 a K4+471.5.

En concordancia con lo estipulado contractualmente las obras se construyeron según las especificaciones técnicas avaladas por los estudios y diseños del proyecto siguiendo las normatividades vigentes para tal fin.

Imagen 1. Actividades programadas del 24 de mayo al 23 de junio de 2024.

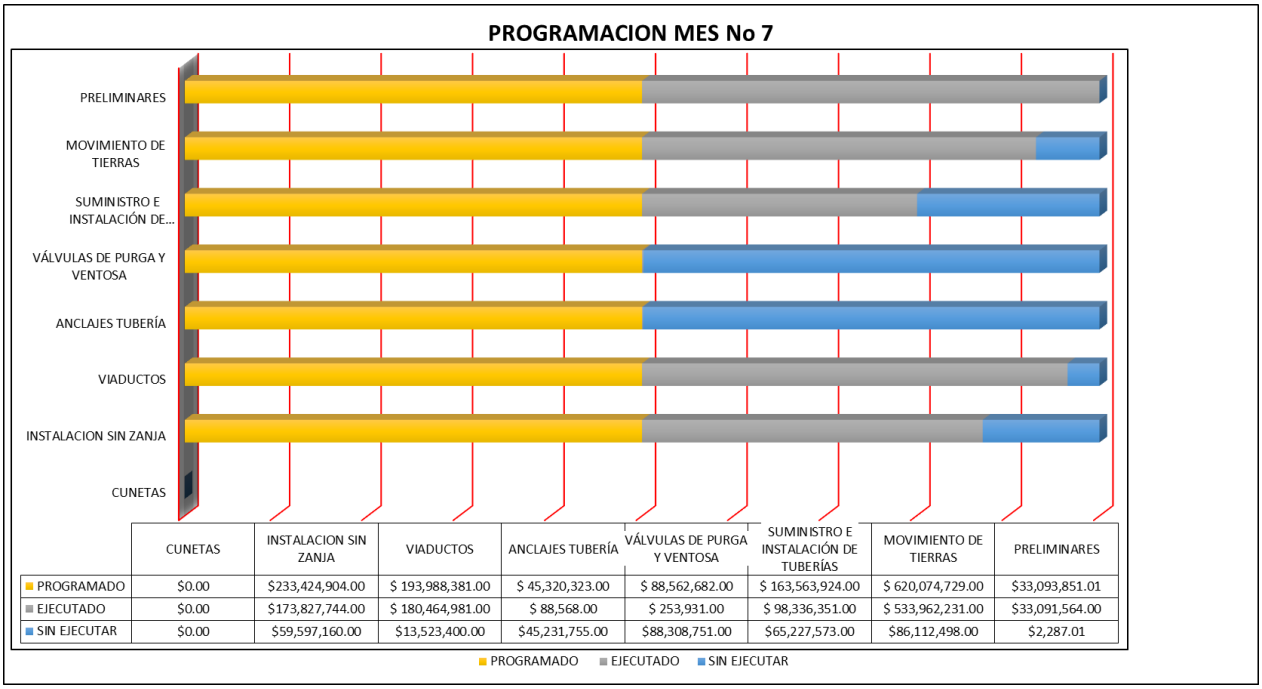

	CUNETAS	INSTALACION SIN ZANJA	VIADUCTOS	ANCLAJES TUBERÍA	VÁLVULAS DE PURGA Y VENTOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS	PRELIMINARES
PROGRAMADO	$0.00	$233,424,904.00	$ 193,988,381.00	$ 45,320,323.00	$ 88,562,682.00	$ 163,563,924.00	$ 620,074,729.00	$33,093,851.01
EJECUTADO	$0.00	$173,827,744.00	$ 180,464,981.00	$ 88,568.00	$ 253,931.00	$ 98,336,351.00	$ 533,962,231.00	$33,091,564.00
SIN EJECUTAR	$0.00	$59,597,160.00	$13,523,400.00	$45,231,755.00	$88,308,751.00	$65,227,573.00	$86,112,498.00	$2,287.01

Según la programación de las actividades de obra y flujo de inversión, el porcentaje programado acumulado para el periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2024, es de **49.01 %** y el ejecutado acumulado es de **39.97 %.**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	01	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE MODIFICACION	01	18 DE JUNIO DE 2024
ACTA PARCIAL	01	19 DE JUNIO DE 2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... **$ 3.204.00.004,00**
VALOR DEL ANTICIPO.....**$ 1.281.600.001,60**
PORCENTAJE DE ANTICIPO.....**40 %**

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Adición Otro Si No 01 .....**30 días**
Tiempo Total de Obra.....**360 días**

Tiempo Total Transcurrido .....**210 días**
Tiempo Total Restante..... **150 días**

Avance Porcentual según plazo inicial.....**58.33 %**
Porcentaje restante en tiempo .....**41.67 %**

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA

Inversión Contratada..... **$ 3.204.000.004,00**
Inversión Adicional Otro Si No 01 ..... **$ 113.338.444,00**
Inversión Total Contratada..... **$ 3.317.338.448,00**

Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 01) ..... **$ 33.766.176,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 02) ..... **$ 39.068.820,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 03) ..... **$ 24.989.959,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 04) ..... **$ 382.299.883,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 05) ..... **$ 213.419.942,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 06) ..... **$ 393.445.120,00**
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 06) ..... **$ 239.033.081,00**

Porcentaje Avance Físico Mensual Ejecutado .....**7.21 %**
Inversión Total Ejecutada..... **$ 1.326.032.981,00**

Porcentaje Avance Físico Ejecutado Acumulado .... **39.97 %**
Saldo por Ejecutar **.....$ 1.991.305.467,00**
Porcentaje por Ejecutar.....**60.03 %**

De acuerdo a la programación de obra para este periodo se tenía estimado un avance del **18.62 %,** pero el avance físico ejecutado para este periodo fue del **7.21 %,** lo cual indica un atraso del **11.41 %** para el periodo**.** Este atraso se presenta por las continuas precipitaciones de la zona que no permiten ejecutar o desarrollar las actividades continuamente, ya que por seguridad del recurso humano, maquinaria y equipos estos deben parar hasta presentarse un clima adecuado para ejecutar las labores u actividades a realizar, según el objetó y alcance del contrato de 159 de 2023.

A continuación, se indica el avance ejecutado mensualmente.

% Avance mensual	PERIODO 1 24 NOV AL 23 DIC	PERIODO 2 24 DIC AL 23 ENE	PERIODO 3 24 ENE AL 23 FEB	PERIODO 4 24 FEB AL 23 MAR	PERIODO 5 24 MAR AL 23 ABR	PERIODO 6 24 ABR AL 23 MAY	PERIODO 7 24 MAY AL 23 JUN	PERIODO 8 24 JUN AL 23 JUL	PERIODO 9 24 JUL AL 23 AGO	PERIODO 10 24 AGO AL 23 SEP	PERIODO 11 25 SEP AL 23 OCT	PERIODO 12 26 OCT AL 23 NOV	TOTAL
PROGRAMADO	1.07%	3.50%	6.21%	7.21%	5.93%	6.47%	18.62%						49.01%
EJECUTADO	1.02%	1.18%	0.75%	11.52%	6.43%	11.86%	7.21%						39.97%

CONTROL FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla, se puede observar el flujo de inversión financiero ajustado según acta modificatoria y seguimiento del avance programado financiero, con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en referencia.


Tabla 3. Control de inversión programada y ejecutada del 24 de mayo al 23 de junio de 2024.

INVERCIÓN FINANCIERA PROGRAMADO				INVERCIÓN FINANCIERA EJECUTADA		
AÑO	PERIODO	VR PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO	PERIODO	VR EJECUTADO MENSUAL	% PROGRAMADO
2023	24 NOV- 23 DIC	$ 35,336,945	1.07%	24 NOV- 23 DIC	$ 33,776,176	1.02%
	24 DIC- 23 ENE	$ 116,112,924	3.50%	24 DIC- 23 ENE	$ 39,068,820	1.18%
2024	24 ENE- 23 FEB	$ 206,160,922	6.21%	24 ENE- 23 FEB	$ 24,989,959	0.75%
	24 FEB- 23 MAR	$ 239,152,134	7.21%	24 FEB- 23 MAR	$ 382,299,883	11.52%
	24 MAR- 23 ABR	$ 196,765,797	5.93%	24 MAR- 23 ABR	$ 213,419,942	6.43%
	24 ABR - 23 MAY	$ 214,657,949	6.47%	24 ABR - 23 MAY	$ 393,445,120	11.86%
	24 MAY- 23 JUN	$ 617,581,388	18.62%	24 MAY- 23 JUN	$ 239,033,081	7.21%
	24 JUN- 23 JUL	$ 438,411,556		24 JUN- 23 JUL		
	24 JUL - 23 AGO	$ 344,010,456		24 JUL - 23 AGO		
	24 AGO - 23 SEP	$ 303,994,655		24 AGO - 24 SEP		
	25 SEP - 23 OCT	$ 294,852,807		25 SEP - 23 OCT		
	26 OCT - 23 NOV	$ 310,300,914		26 OCT - 23 NOV		
		$ 3,317,338,448	49.01%		$ 1,326,032,981	39.97%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

A continuación, se presentan las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada del 24 de mayo al 23 de junio de 2024. En estas curvas se puede evidenciar que el valor financiero programado (línea verde) está levemente por encima del valor financiero ejecutado (línea azul). Estas curvas corroboran e indican que se presenta un leve atraso en las actividades que hacen parte del presupuesto financiero de obra.

Imagen 3. Curvas de Avance Financiero Programado vs. Valor Ejecutado Acumulado.

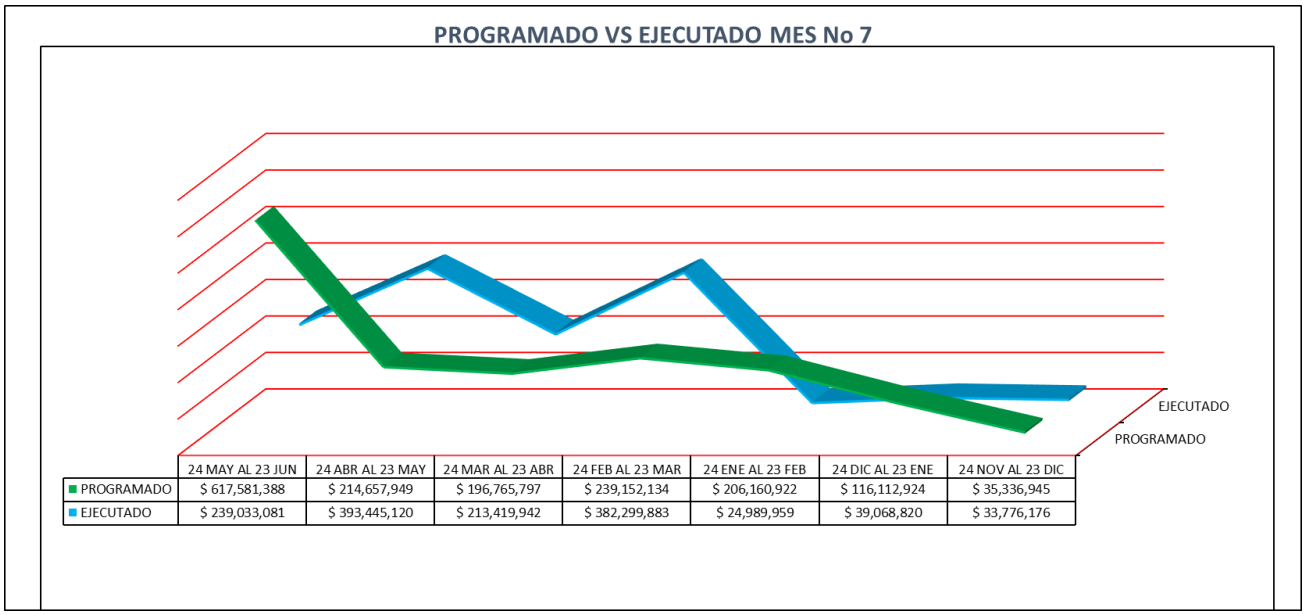

	24 MAY AL 23 JUN	24 ABR AL 23 MAY	24 MAR AL 23 ABR	24 FEB AL 23 MAR	24 ENE AL 23 FEB	24 DIC AL 23 ENE	24 NOV AL 23 DIC
PROGRAMADO	$ 617,581,388	$ 214,657,949	$ 196,765,797	$ 239,152,134	$ 206,160,922	$ 116,112,924	$ 35,336,945
EJECUTADO	$ 239,033,081	$ 393,445,120	$ 213,419,942	$ 382,299,883	$ 24,989,959	$ 39,068,820	$ 33,776,176

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de Obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Actas	Amortización	Valor
Anticipo (40%)				$ 1.281.600.002,00
ACTA PARCIAL 1	19/06/2024	$ 1.155.971.156,00	$ 462.388.462,00	$ 693.582.694,00
ACTA PARCIAL 2				
ACTA PARCIAL 3				
ACTA PARCIAL 4				
TOTALES		**$ 1.155.971.156,00**	**$ 462.388.462,00**	**$ 693.582.694,00**

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Facturado	Valor No Facturado
$ 3.204.000.004,00	**$ 113.338.444.00**	**$ 3.317.338.448,00**	**$ 1.155.971.156,00**	**$ 2.161.367.292,00**

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

El equipo y personal que se presenta al contrato de obra 159 de 2023, es netamente operativo y administrativo, determinado como calificado y no calificado, con toda la idoneidad para el amplio desarrollo de las ejecuciones de obra y la administración del mismo.

En la siguiente tabla, se relaciona el personal mínimo requerido que ha estado vinculado al proyecto durante el periodo de ejecución No. 7, comprendido entre el 24 de mayo al 23 de junio de 2024.

Tabla 4. Relación de personal mínimo requerido dispuesto en obra.

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN
Representante legal	NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR	-	Ingeniero Electricista
Asesor Estructural	WILLIAN PARRA OLAYA	30%	Ingeniero Civil y Esp. En Estructuras
Residente de Obra	DIEGO ANDRES CARRERA OSOSRIO	100%	Ingeniero Civil
Asistente de ingeniería y proyectos	LUIS IVAN LUNA GASCA	100%	Ingeniero Civil
Profesional Siso	VALENTINA POLANCO PARRA	100%	Administradora en gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Maestro de Obra	ALEXANDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Maestro de Obra
Oficial de Obra	JAIDER RODRIGUEZ LOZADA	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JHOAN ALEXIS RODRIGUEZ CUELLAR	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JEFERSON GOMEZ CAPIZ	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	ALBERTO DE JESUS ACUÑA AGUILERA	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	GERMAN EDUARDO CASTRO JIMENEZ	100%	Bachiller
Ayudante de Obra	JOSE ALONSO RAMIREZ PLAZAS	100%	Bachiller

En el ***anexo 1*** se adjunta la planilla de pago de seguridad social del mes de Mayo de 2024 del personal de mano de obra calificada y no calificada vinculada a la ejecución de las actividades de obra.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta excavación manual en material conglomerado, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+580.00 a K1+620.00, K2+330.00 a K3+380.00 y K3+400.00 a K3+670.00.

2.03 Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.
Se ejecuta excavación mecánica en material conglomerado, desde la Abs K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.06 Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material de arena lavada o similar fondo excavación para cama desde la K0+600.00 a K1+130.00 y K1+540.00 a K1+670.00.

2.07 Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material Recebo, compactado en capas cada 20 cm hasta cota terreno, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+343.00, K3+405.04 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.08 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena con material seleccionado de la misma excavación, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+390.00, K3+410.00 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

2.10 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira y transporta material conglomerado proveniente de excavación manual y mecánica no apto para relleno, desde la Abs K0+600.00 a K1+130.00, K1+540.00 a K1+670.00, K2+772.00 a K3+390.00, K3+410.00 a K3+452.50, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

NP 2.11 Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.
Se Excava manualmente en roca con compresor, desde la Abs K2+190.00 a K2+240.00.

CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

3.04 Instalación tubería PVC para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-8" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).
Se instala tubería PVC para acueductos de 8” RDE 21, desde la Abs K0+610.00 a K1+140.00 y K2+750.14 a K2+776.09.

3.06 Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).
Se instala tubería HD 8" C40, desde la Abs K2+776.09 a K3+343.00, K3+390.00 a K3+670.00, K4+400.79 a K4+473.00 y K4+832.00 a K4+930.00.

3.11 Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 45° (RDE 21 - 200 PSI) PVC 8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K1+180.00, K1+450.00, K1+550.00 y K2+637.24.

3.12 Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"
Se suministra e instala accesorio Codo HD JR D=8" en las Abs: K3+091.76, K3+390.00, K3+513.71 y K4+399.25.

3.14 Suministro e Instalación de Codo PVC Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 8".
Se suministra e instala accesorio Codo PVC JH D=8" en las Abs: K1+215.00, K1+265.00, K1+365.00, K1+448.81, K1+592.50, K1+595.00, K1+640.02, K1+645.00, K1+690.00, K1+740.00, K1+740.41, K1+840.00, K1+890.00, K1+940.00, K1+942.08, K2+085.00, K2+135.00, K2+280.00, K2+280.20, K2+328.73, K2+574.94, K2+607.30, K2+654.37 y K2+685.03.

3.15 Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".

Se suministra e instala accesorio Codo PVC D=8" x 22.5 en las siguientes Abs: K2+752.35, K2+773.16, K2+774.50, K2+870.00, K2+890.00, K2+892.65, K2+910.00, K2+917.39, K2+920.00, K3+005.55, K3+010.00, K3+087.43, K3+148.49, K3+195.48, K3+200.00, K3+305.50, K3+420.00, K3+445.15, K3+455.26, K3+515.00, K4+468.16, K4+485.00, K4+500.00, K4+510.00, K4+520.00, K4+530.00, K4+540.00, K4+550.00, K4+634.68 y K4+635.00.

CAPITULO 6 – VIADUCTOS

6.02 Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).
Se ejecuta la excavación Manual de las obras civiles correspondiente a viaductos para sus elementos estructurales de la zapata y pedestal ubicados en las Abs K1+130.00.

6.03 Retiro de sobrantes de excavación Autorizado por el Municipio el cual se encuentra a 10 km de la obra.
Se retira el material sobrante no apto para relleno de la excavación a botadero autorizado por el Municipio de Altamira – Huila, que se encuentra a menos de 10 km de obra, correspondiente a la excavación Manual de las obras civiles de los viaductos ubicados Aprox. Abs. K1+130.00, para los elementos estructurales de la zapata y pedestal.

6.04 Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.
Se rellena el excedente de la excavación con material seleccionado de la misma, con compactación cada 20 cm aproximadamente de las obras civiles de los viaductos ubicados en las Abs K1+130.00, K4+530.00 a K4+544.00, K5+158.00 a K5+170.00, K5+249.00 a K5+261.00 y K9+536.00 a K9+548.00, así como las cajas de lanzamiento del 1 al 4, para los pasos sin zanja.

6.13 Acero de Refuerzo 60000 PSI (Inc. Amarre y Figuración).
Se corta, figura y amarra el acero de refuerzo de 60000 PSI, para las obras civiles ubicadas en las Abs. K1+130.00, de los elementos estructurales de la zapata y pedestal.

6.14 Concreto 3000 PSI (Inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).
Se ejecuta fundición concreto 3000 PSI, según dosificación, especificaciones y dimensiones, para los elementos estructurales de las zapatas y pedestales, ubicadas en las Abs. K1+130.00.

NP 6.16 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 6 a 12 m de 0.8 x 0.4 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 x 1/8", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/8", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 12m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K1+130.00 y K5+740.00.

NP 6.17 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 13 a 18 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 1/2" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 3/16", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 19m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K3+390.00.

NP 6.18 Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 19 a 24 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 3" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/4", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.
Se ejerce instalación de cercha metálica tipo Howe para viaducto de 22.5m sobre obras civiles construidas previamente en las Abs K5+940.00.

NP 6.19 Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.30 m. x 0.4 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.
Se ejerce instalación de Platina para anclaje cercha metálica tipo Howe en las obra civiles embebida previamente en el pedestal de los viaductos de 12m, ubicados en las Abs K1+130.00, K1+142, K5+740.00 y K5+752.

NP 6.20 Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.50 m x 0.6 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.
Se ejerce instalación de Platina para anclaje cercha metálica tipo Howe en las obra civiles embebida previamente en el pedestal de los viaductos de 12m, ubicados en las Abs K3+390.00, K3+409.00, K5+940.00 y K5+963.00.

NP 6.21 Suministro e instalación Lamina de anclaje HR A36 - 9 mm, con Viga IPE A572 G50 120 mm x 0.35 m, 4 pernos de B7 3/4" x 0.15 m con Tuerca negra 2H 3/4" Arandela industrial 1/2" y Epoxico, Abrazadera en platina NTC1920 de 2 x 3/16" con 2 Tornillo 1/2" grado 5 y Arandela de seguridad, pintada con anticorrosivo y epoxica para estructuras metálicas, para apoyo paso elevado tubería HD 8" C40. Paso Rio Suaza.
Se ejerce suministro e instalación de láminas de anclaje para apoyo paso elevado tubería HD 8" C40, sobre el Rio Suaza, cada 1.3m entre las Abs. Aprox. K4+400 a K4+471.5.

En el ***anexo 2*** se puede evidenciar en el registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el periodo en cuestión.

3.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se reporta ningún daño ni perjuicio a terceros.

3.3 Modificaciones Realizadas en Obra

Durante el periodo del 24 de mayo al 23 de junio de 2024, no se han presentado modificaciones realizadas en obra.

3.4. Comité de Obra - Actas de reunión

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité – Reunión (Describir)

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe se presentaron se han tomado las siguientes muestras relacionadas a continuación:

ABSCISA	VIADUCTO (ML)	FECHA MUESTRA
K3+440.00	19.00	29/01/2024
K5+820.00	12.00	8/02/2024
K6+000.00	22.50	20/02/2024

Las muestras relacionadas, fueron enviadas para el respectivo ensayo a la compresión de probetas de concreto hidráulico según las ASTM C31, C39A, C-143M, INV E 410-22 y NTC 673, normatividad vigente para dichos ensayos.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

A la fecha del presente informe, el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND, mediante el informe 202404-08, presenta los siguientes resultados de las muestras tomadas relacionadas a continuación:

ABSCISA	VIADUCTO (ML)	FECHA MUESTRA	VALOR PROYECTADO PSI	OBSERVACION
K3+440.00	19.00	29/01/2024	3516.07	ZAPATA
K5+820.00	12.00	8/02/2024	3017.95	ZAPATA
K6+000.00	22.50	20/02/2024	3496.73	ZAPATA

En el ***anexo 4*** se puede evidenciar el certificado de resultados de pruebas a cilindros de concreto de 3000 PSI, emitido por el Laboratorio certificado SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. – SEND.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral del presente informe mensual de avance de obra No 7, correspondiente al periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio de 2024.

- *Anexo 1. Planilla Seguridad Social Mayo 2024.pdf*
- *Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo No 7.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 7. 24 de Mayo al 23 de Junio de 2024.pdf*
- *Anexo 4. Anexos: Certificados Laboratorio y Formato INVIAS FR-84.pdf*

Presentado por:

NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR
RL/ CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
Correo: conenergia-ltda@hotmail.com
Celular: 3187865568
Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Neiva - Huila


CONTROL DE REVISIÓN		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diego Andrés Carrera Osorio Residente de Obra **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Nelson Gutiérrez Cuéllar** Representante Legal **CONENERGIA LTDA – CONCRETO Y ENERGIA LTDA**	**Sergio Ernesto Gómez Zambrano** Director de interventoría **INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S**

Anexo 1. Planilla Seguridad Social Mayo 2024.pdf

Anexo 2: Registro Fotográfico Periodo 7.pdf

Anexo 3. Bitácora Periodo No 7. 24 de Mayo al 23 de Junio de 2024.pdf

Anexo 4. Anexos: Certificados Laboratorio y Formato INVIAS FR-84.pdf

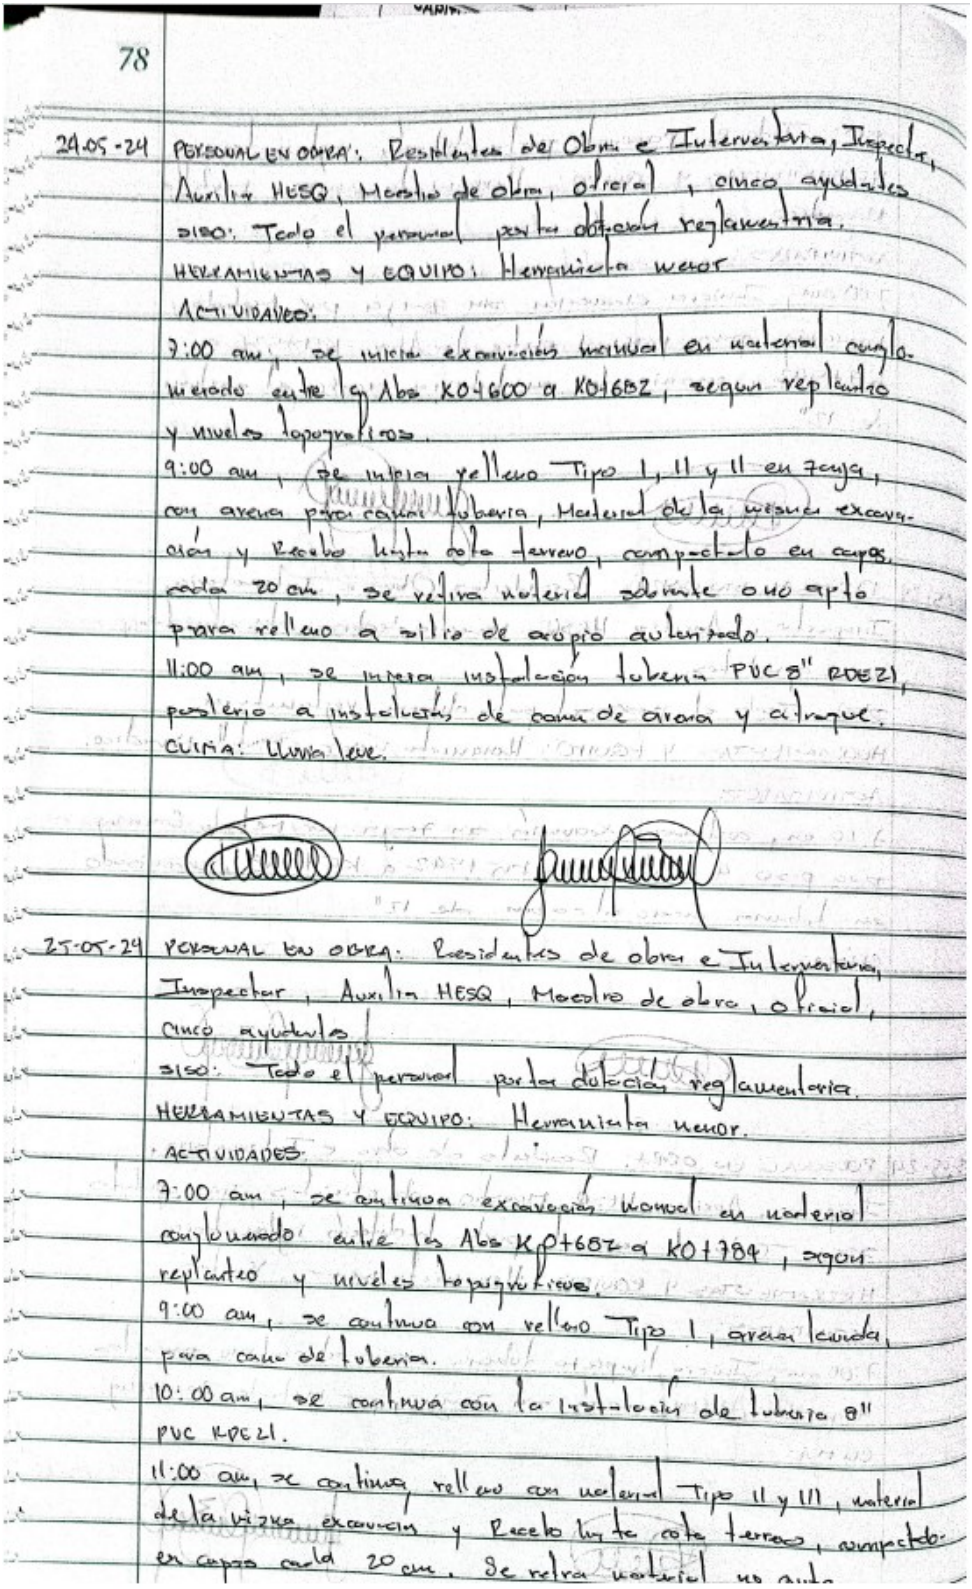


78


24-05-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes
DISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES:
7:00 am, se inicia excavación manual en material conglomerado entre las Abs K0+600 a K0+682, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, se inicia relleno Tipo I, II y III en zanja, con arena para cama tubería, Material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas, cada 20 cm, se retira material sobrante ono apto para relleno a sitio de acopio autorizado.
11:00 am, se inicia instalación tubería PVC 8" RDE21, posterio a instalación de cama de arena y atraque.
CLIMA: Lluvia leve.

25-05-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes
DISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se continua excavación manual en material conglomerado entre las Abs K0+682 a K0+784, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, se continua con relleno Tipo I, arena lavada, para cama de tubería.
10:00 am, se continua con la instalación de tubería 8" PVC RDE21.
11:00 am, se continua relleno con material Tipo II y III, material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material no apto



a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Nublado

26-05-24 Sin Novedades.

27-05-24 PERSONAL EN OBRA: Residente de obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HESQ, maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
0130: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se continua con la excavación manual en material conglomerado entre los Abs K0+784 + K0+846, según replanteo y niveles topográficos.
10:00 am, se continua con el relleno Tipo I, arenilla para cama tubería
11:00 am, se continua con la instalación tubería PVC 8" RDE21
1:00 pm, se continua con el relleno Tipo II y III, material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, se compactan en capas cada 20cm. Se retira material no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Parcialmente soleado





28-05-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar, HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
0130: Todo el personal porta dotación reglamentaria.

80

2 HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua la excavación manual en material conglomerado entre los ejes K0+816 a K0+928, según replanteo y niveles topográficos.
9:00 am, se continua instalando relleno tipo I, arena lavada para cama y atraque tubería.
11:00am, continua instalación tubería PVC 8" RDE 21.
1:00 pm, se continua con relleno con material Tipo II y III, material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20cm. Se retira material sobrante a sitio de apoyo autorizado.
CLIMA: Lluvia intensa


29-05-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, dos ayudantes.
OBJETO: Todo el personal vierte obtención reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continuar excavación manual en material conglomerado en los ejes K0+928 a K1+010, según replanteo y niveles topográficos.
9:00 am, se continua con relleno Tipo I, arena lavada para cama y atraque tubería.
11:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE 21
1:00 pm, continua relleno con material Tipo II y III, material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20cm. De retira material sobrante a otro apto a sitio de apoyo autorizado
CLIMA: Lluvia precipitación intensa

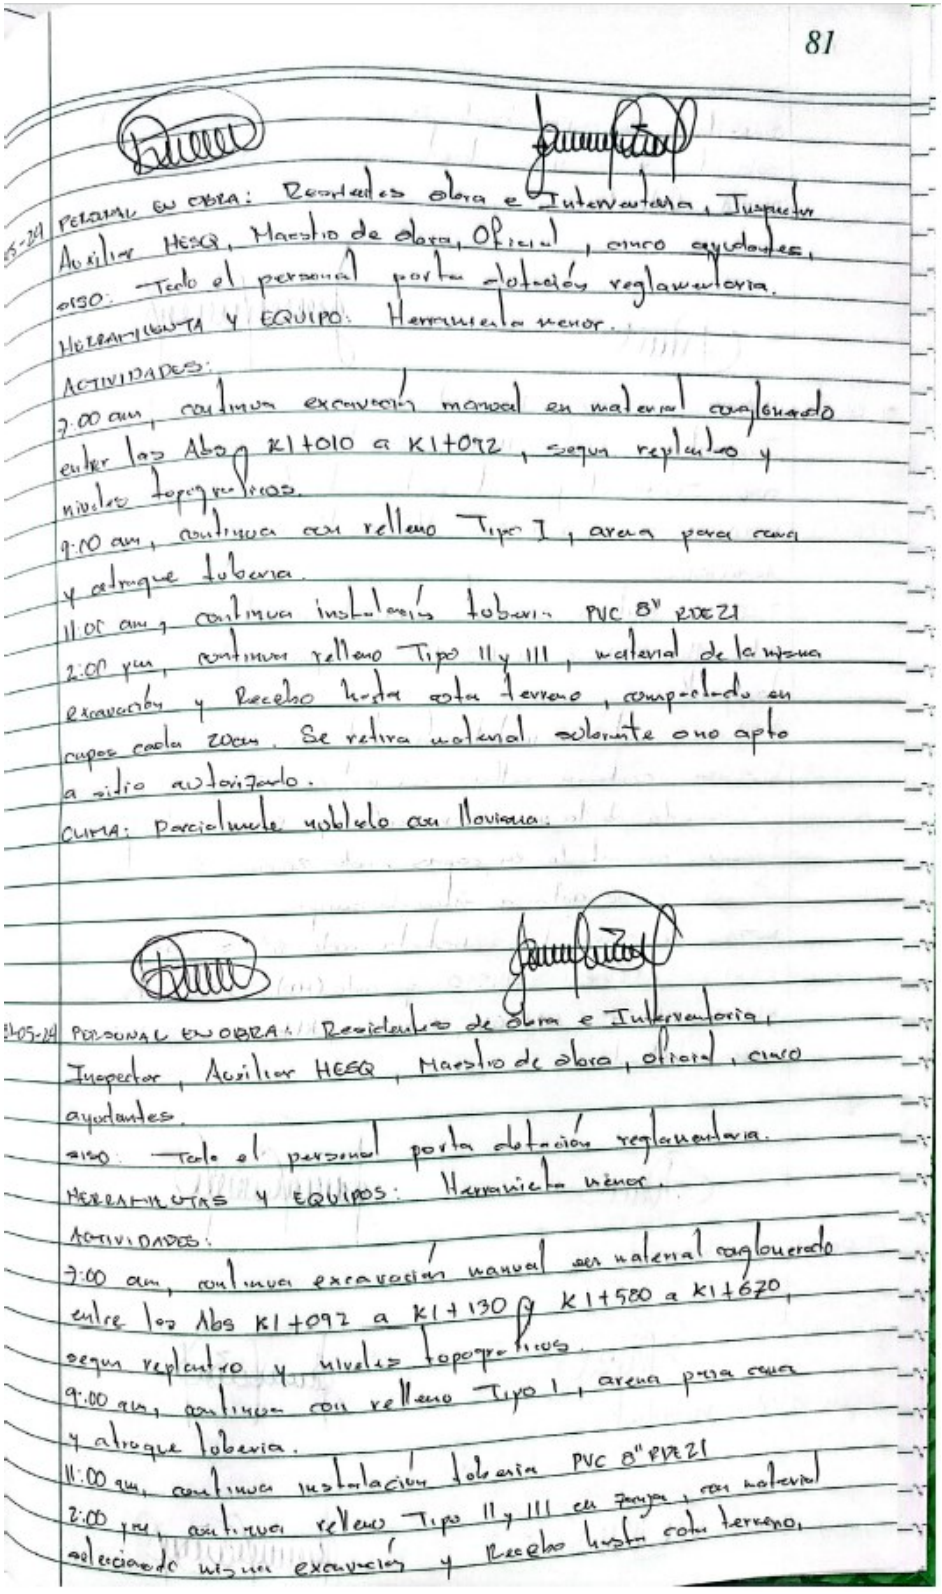

81

5-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes obra e Interventoria, Inspector Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, Oficial, cinco ayudantes.
ASO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre los Abs K1+010 a K1+092, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, continua con relleno Tipo I, arena para cama y atraque tubería.
11:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE21
2:00 pm, continua relleno Tipo II y III, material de la misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20cm. Se retira material sobrante no apto a sitio autorizado.
CLIMA: Parcialmente nublado con lluvias.

5-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
ASO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual en material conglomerado entre los Abs K1+092 a K1+130 y K1+580 a K1+670, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, continua con relleno Tipo I, arena para cama y atraque tubería.
11:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE21
2:00 pm, continua relleno Tipo II y III en zanja, con material adecuado mismas excavación y Recebo hasta cota terreno,

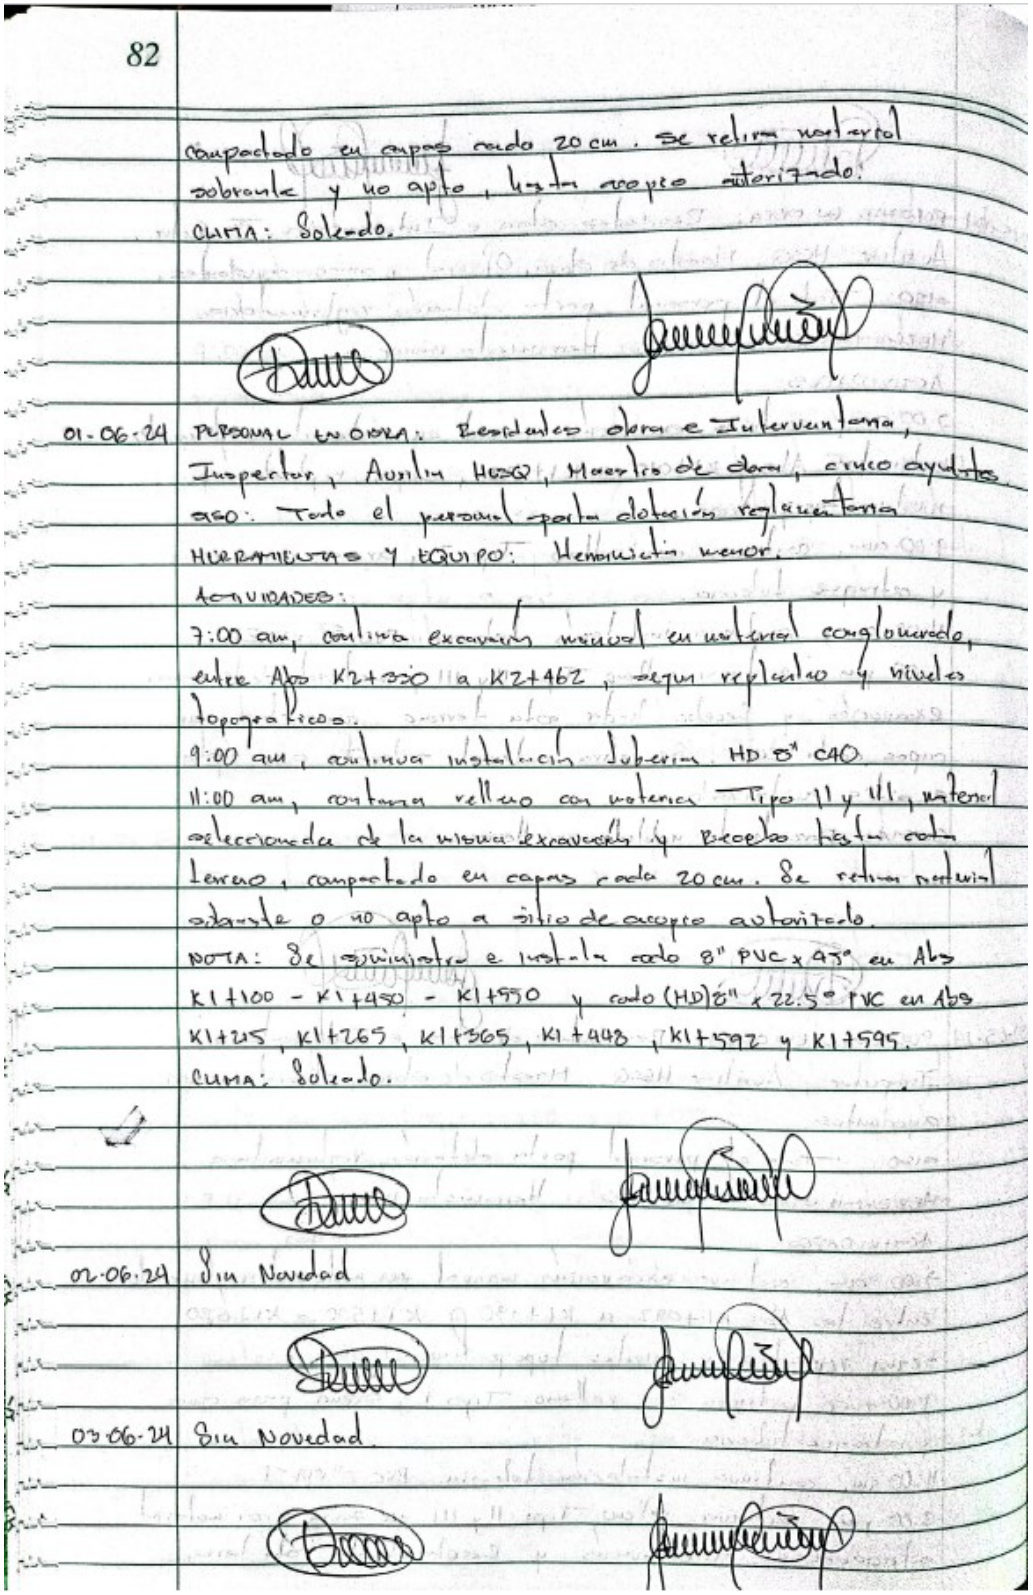

82

compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante y no apto, hasta acopio autorizado.
CUBA: Soleado.


01-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, cinco ayudantes. ASO: Todo el personal aporta planillas reglamentarias
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramientas menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado, entre Abs K2+330 a K2+462, según replanteo y niveles topográficos.
9:00 am, continua instalación tubería HD 8" CAO
11:00 am, continua relleno con material Tipo II y III, material seleccionado de la misma excavación y acopiado hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
NOTA: Se suministra e instala codo 8" PVC x 45° en Abs K1+100 - K1+450 - K1+550 y codo (HD) 8" x 22.5° PVC en Abs K1+225, K1+265, K1+365, K1+443, K1+592 y K1+595.
CUBA: Soleado.

02-06-24 Sin Novedad

03-06-24 Sin Novedad

04-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre Abs K2+962 a K2+994, según replanteo y niveles topográficos.
9:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE21.
1:00 pm, continua relleno con material tipo II y III, material misma excavación seleccionado y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado
NOTA: 1. Se instala y suministran codo PVC 8" x 22.5° en K2+574.
2. Se instalaron y suministraron previamente codos PVC 8" 22.5° en K1+690, K1+695, K1+670, K1+790, K1+741, K1+840, K1+896 K1+940, K1+942, K2+005, K2+135, K2+280, K2+280 y K2+320.
CLIMA: Parcialmente lluvioso.

05-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoría, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre Abs K2+994 a K2+980, según replanteo y niveles topográficos.
9:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE21.
1:00 pm, continua relleno con material tipo II y III, material seleccionado misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira

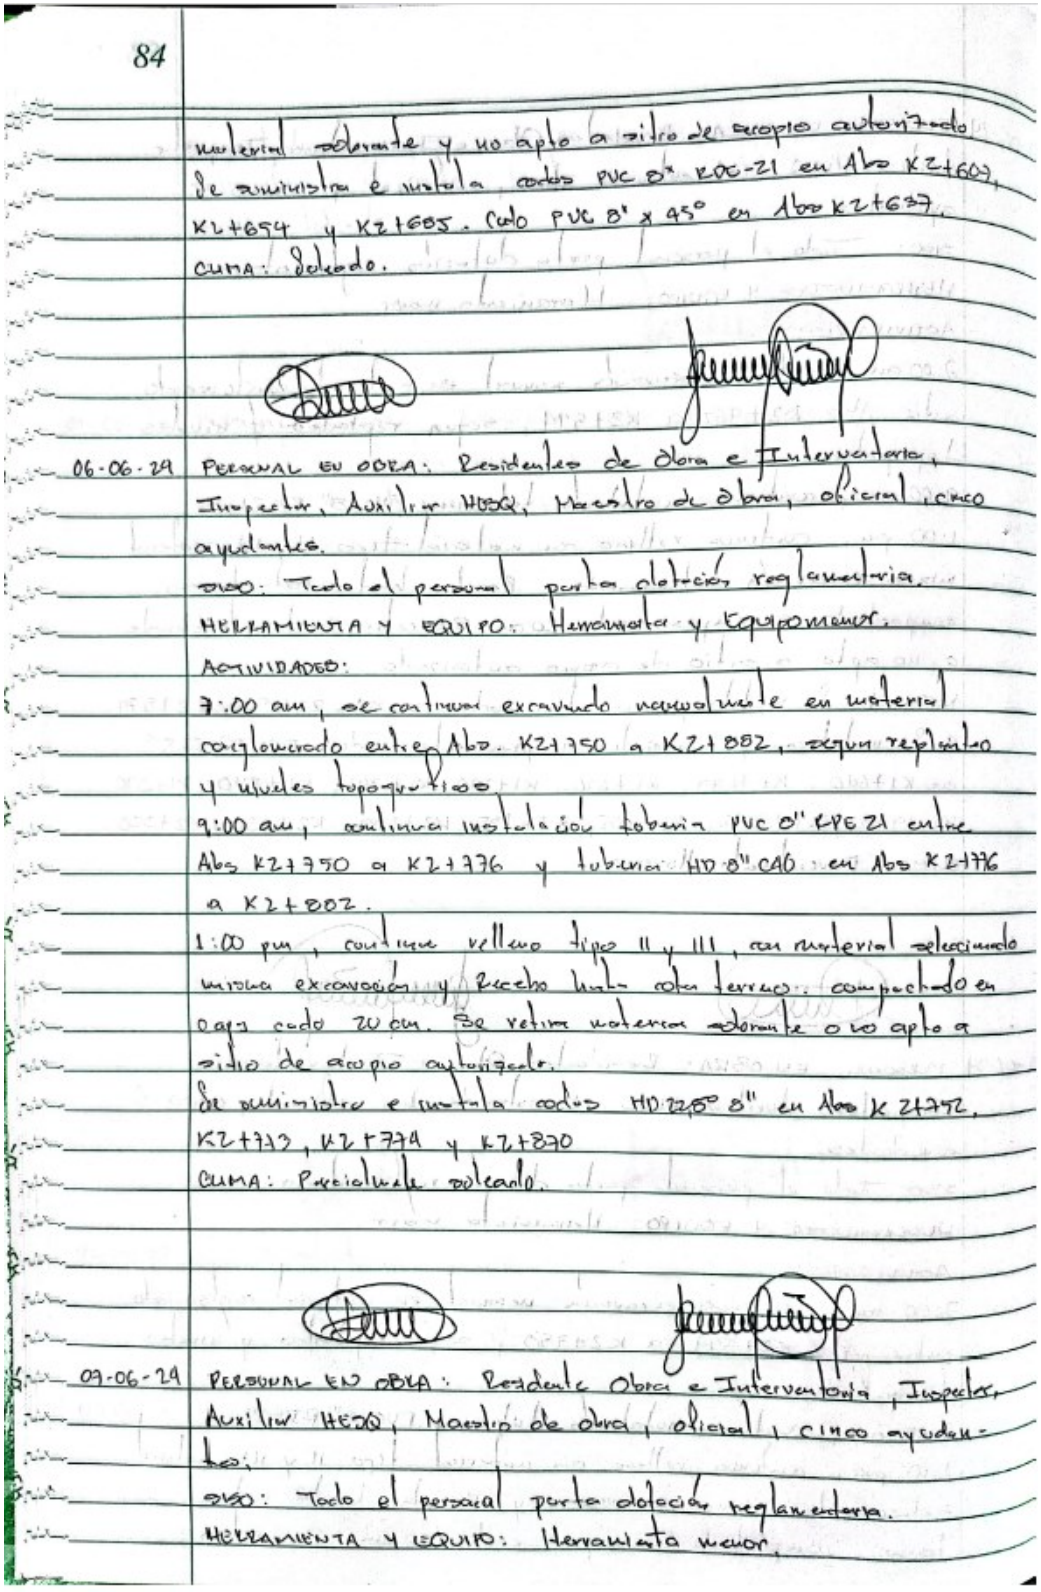

84


material adecuado y no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codos PVC 8" RDE-21 en Abs KZ+607, KZ+654 y KZ+685. Codo PVC 8" x 45° en Abs KZ+637.
CUMA: Soleado.

06-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de Obra, oficial, cinco ayudantes.
DXO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta y Equipo menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, se continua excavando manualmente en material conglomerado entre Abs. KZ+750 a KZ+802, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, continua instalación tubería PVC 8" RDE 21 entre Abs KZ+750 a KZ+776 y tubería HD 8" CAD en Abs KZ+776 a KZ+802.
1:00 pm, continua relleno tipo II y III, con material seleccionado misma excavación y Recebo hasta cota terreno. compactado en capas cada 20 cm. Se retira material adecuado a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codos HD 22,5° 8" en Abs KZ+772, KZ+773, KZ+779 y KZ+870
CUMA: Parcialmente soleado.

09-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residente Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
DXO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.

ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre Abs K2+882 a K3+014, segun replanteo y niveles topograficos.
9:00 am, continua instalación tuberia HD8" C40
2:00 pm, continua relleno tipo II y III, con material seleccionado misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactado cada 20 cm en capas. Se retira material sobrante y no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codos 8" HD x 22,5° en Abs K2+890, K2+897, K2+910, K2+917, K2+920, K3+005 y K3+010. Asi como codo HD 45° 8" en Abs K3+092.
CLIMA: Parcialmente lluvioso.

9-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
DIA: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre Abs K3+019 a K3+145, segun replanteo y niveles topograficos.
10:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.
12:00 pm, continua relleno material tipo II y III, material misma excavación seleccionado y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobra y no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codo HD 8" x 22.5° en Abs K3+089.
CLIMA: Soleado.

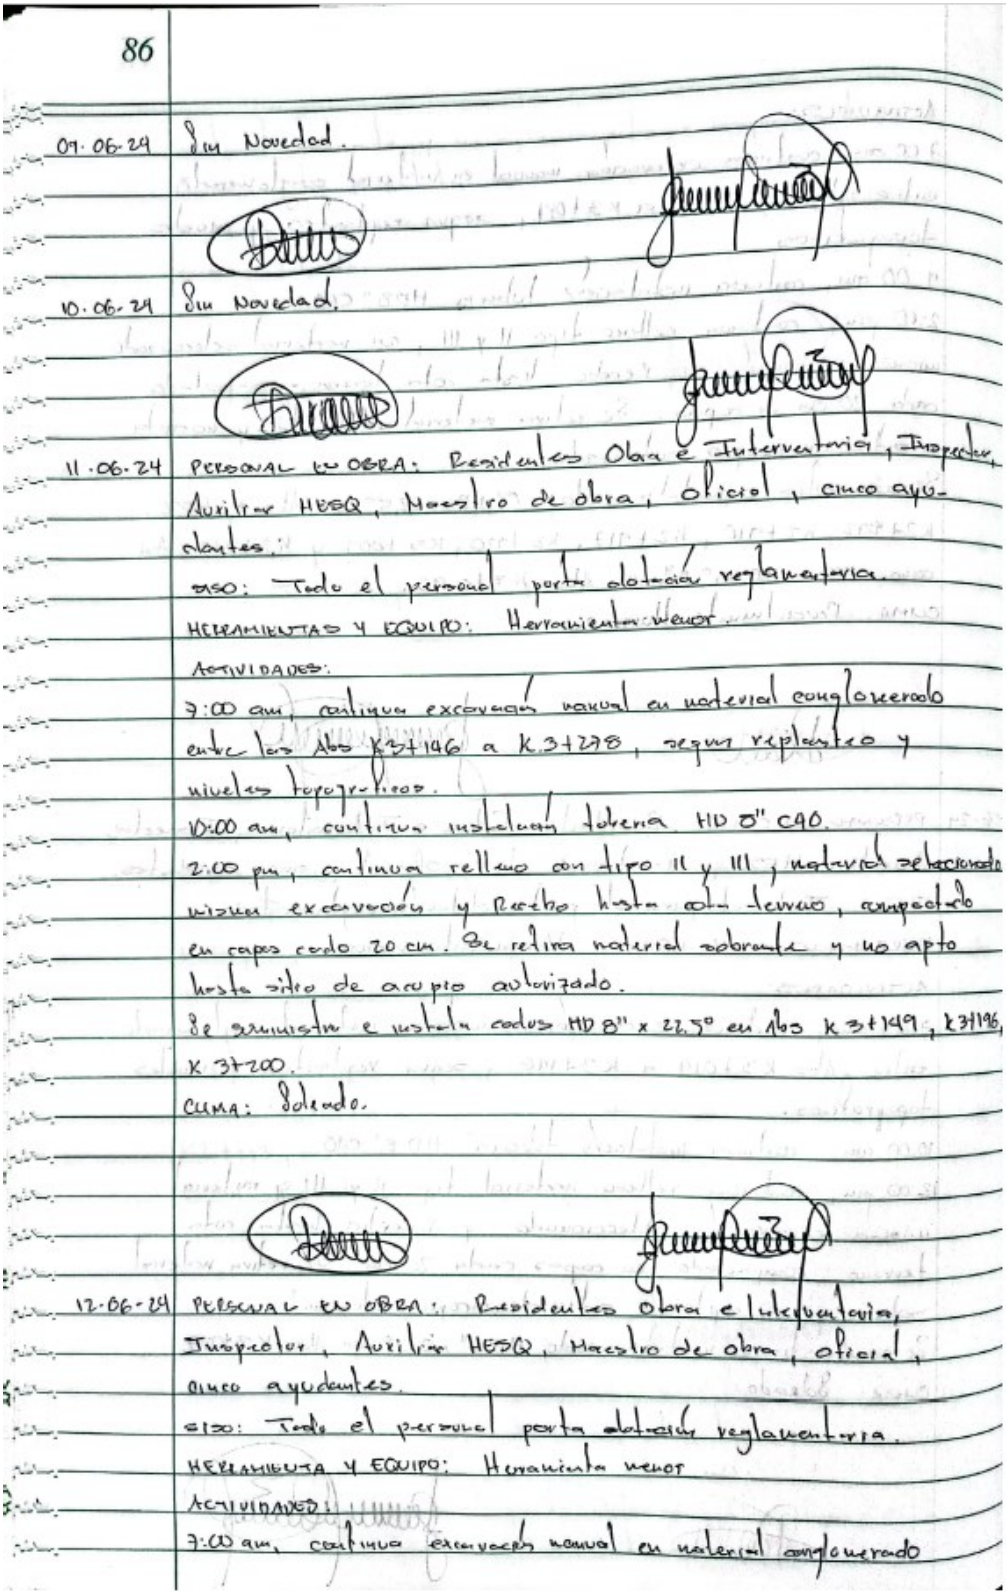

86

09.06.24 Sin Novedad.

10.06.24 Sin Novedad.


11.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual en material conglomerado entre los Abs K3+146 a K3+198, segun replanteo y niveles topograficos.
10:00 am, continua instalacion tuberia HD 8" C90.
2:00 pm, continua relleno con tipo II y III, material seleccionado mismas excavacion y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante y no apto hasta sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codos HD 8" x 22.5° en Abs K3+149, K3+196, K3+200.
CLIMA: Soleado.

12.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HESQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual en material conglomerado

entre los Abs K3+278 a K3+370, segun replanteo y niveles topograficos.
10:00am, continua instalacion tuberia HD 8" CAO.
2:00pm, continua relleno tipo II y III, material seleccionado, misma excavacion y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codo HD 8" x 45° Abs K3+340 y codo HD 8" x 22,5 Abs 3+305.
CLIMA: Lluvia intermitente

13-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
USO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual en material conglomerado entre los Abs K3+400 a K3+490, segun replanteo y niveles topograficos.
10:00 am, continua instalacion tuberia HD 8" CAO.
2:00 pm, continua relleno tipo II y III, con material seleccionado misma excavacion y Recebo hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. Se retira material sobrante y no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codo 8" HD x 45° en Abs K3+519 y codos HD 8" x 22,5° en Abs K3+420, K3+445 y K3+455.
CLIMA: Parcialmente Nuboso.

14.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial,

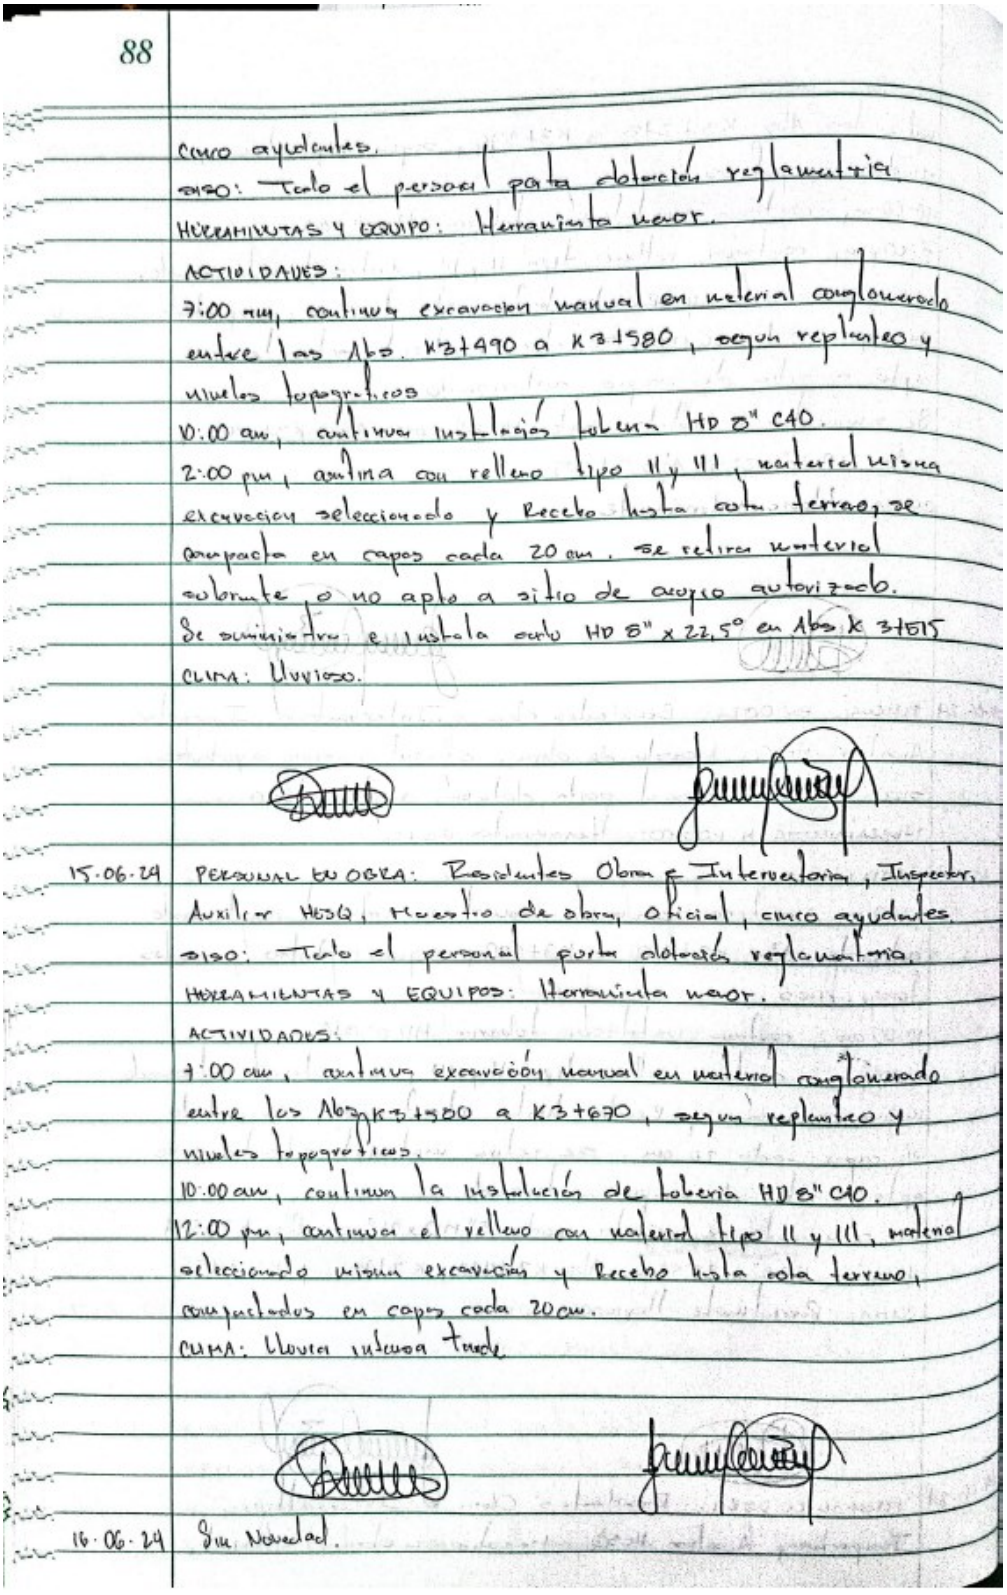

88


cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta elementos reglamentarios.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavacion manual en material conglomerado entre las Abs. K3+490 a K3+580, segun replanteo y niveles topograficos
10:00 am, continuar instalacion tuberia HD 8" C40.
2:00 pm, continua con relleno tipo II y III, material misma excavacion seleccionado y Recebo hasta cota terreno, se compacta en capas cada 20 cm. se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministro e instala codo HD 8" x 22,5° en Abs K 3+515
CLIMA: Lluvioso.

15.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
EPP: Todo el personal porta elementos reglamentarios.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua excavación manual en material conglomerado entre los Abs K3+500 a K3+670, segun replanteo y niveles topograficos.
10:00 am, continuan la instalación de tuberia HD 8" C40.
12:00 pm, continuan el relleno con material tipo II y III, material seleccionado misma excavación y Recebo hasta cota terreno, compactados en capas cada 20cm.
CLIMA: Lluvia intensa todo

16.06.24 Sin Novedad.

17-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
OBRA: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Retroexcavadora
ACTIVIDADES:
7:00 am, Inicia excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K4+400 a K4+493, segun replanteo y niveles topograficos.
Continuan tambien excavación manual para zapata viaducto tipo cercha en la Abs K1+150, segun especificaciones.
10:00 am, continua instalación tuberia HD 8" C40.
2:00 pm, continua relleno con material tipo II y III zonga, con material seleccionado misma excavación y Relleno hasta cota terreno, compactado en capas cada 20 cm. se retira material sobrante a 40 apto a sitio de acopio autorizado.
Se suministra e instala codo 8" HD x 22,5° en Abs K4+465.
y codo HD 8" x 45° en Abs K4+400.
CLIMA: Soleado.

18-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes.
OBRA: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor, Retroexcavadora
ACTIVIDADES:
7:00 am, se continua con la excavación mecanica en material conglomerado entre las Abs K4+032 a K4+930, segun niveles topograficos y replanteo.
7:00 am, Inicia corte, figuración y amarre acero de refuerzo para elementos estructurales para viaducto tipo

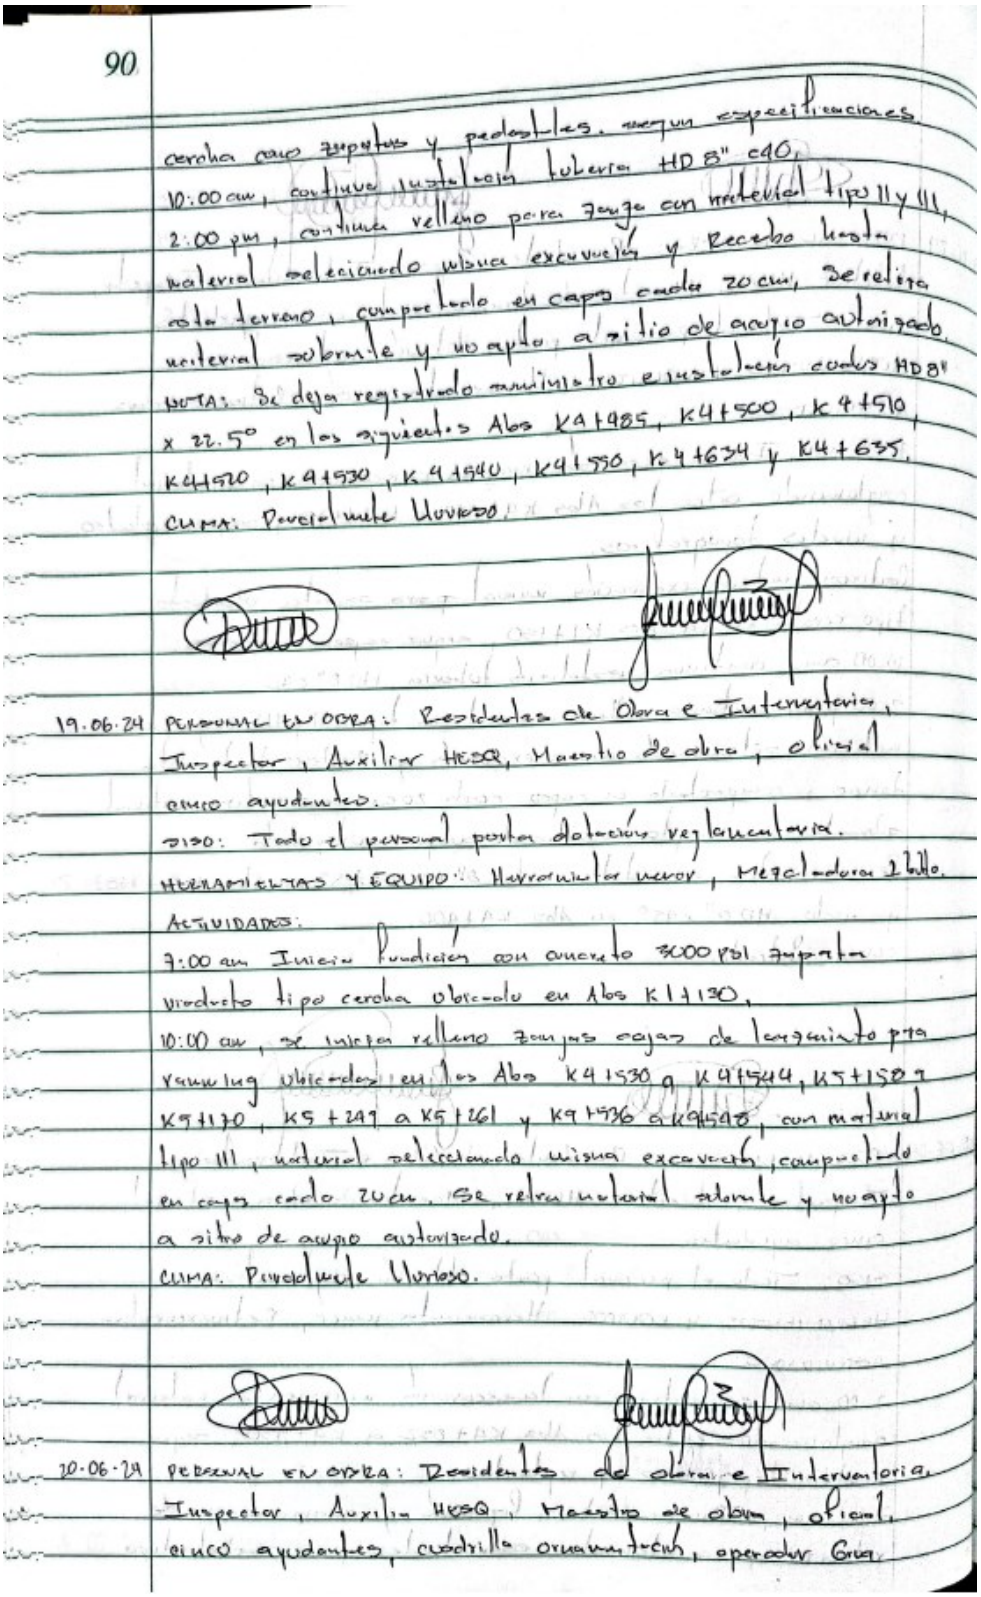

90


cercha cajas zapatas y pedestales, segun especificaciones
10:00 am, continua instalacion tuberia HD 8" c40,
2:00 pm, continua relleno para zanja con material tipo II y III,
material seleccionado misma excavacion y Recebo hasta
cota terreno, compactado en capas cada 20 cm, Se retira
material sobrante y no apto a sitio de acopio autorizado
NOTA: Se deja registrado suministro e instalacion codos HD 8"
x 22.5° en los siguientes Abs K4+485, K4+500, K4+510,
K4+520, K4+530, K4+540, K4+550, K4+634 y K4+635.
CLIMA: Parcialmente Lluvioso.

19.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria,
Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial
cinco ayudantes.
DISO: Todo el personal porta dotacion reglamentaria.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramientas menor, Mezcladora 1 bulto.
ACTIVIDADES:
7:00 am Inicia fundicion con concreto 3000 psi zapata
producto tipo cercha ubicado en Abs K1+130,
10:00 am, se inicia relleno zanjas cajas de lavamiento pta
running ubicadas en los Abs K4+530 a K4+544, K5+150 a
K5+170, K5+249 a K5+261 y K4+536 a K4+548, con material
tipo III, material seleccionado misma excavacion, compactado
en capas cada 20cm. Se retira material sobrante y no apto
a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Parcialmente Lluvioso.

20.06.24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de obra e Interventoria
Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial,
cinco ayudantes, cuadrilla ornamentacion, operador Grua

SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Motosoldador, oxicorte, Grua
ACTIVIDADES:
7:00 am, Inicia suministro e instalación laminas de anclaje paso elevado Rio Suaza, entre Abs K4+400 a K4+425, diecinueve (19) anclajes.
10:00 am, Inicia suministro e instalación laminas HE para anclaje cercha metalica viaducto Abs K5+940 y K5+963.
1:00 pm Inicia instalación cercha metalica tipo Howe de 22,5m en la Abs K5+940.
3:00 pm, se retira formaleta zapata e instala pedestal viaducto Tipo cercha Abs K1+130.
CLIMA: Llovia intermitente.

21-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial, cinco ayudantes, cuadrilla arquitectonica, operador Grua
SISO: Todo el personal porta dotación reglamentaria y curso de alturas para trabajadores en paso elevado.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Herramienta menor, Hidrolavadora 2 bultos, Motosoldador, oxicorte, Grua, planta electrica
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua suministro e instalación laminas de anclaje paso elevado Rio Suaza, entre Abs K4+425 a K4+450, diecinueve (19) anclajes.
7:00 am, Inicia fundición pedestales viaducto tipo cercha Abs K1+130, con concreto 3000 PSI, segun dosificación, se anclan lamina HE para anclaje cercha metalica.
10:00 am, continua instalacion lamina HE para anclaje cercha metalica viaducto, Abs K5+940 a K5+952
2:00 pm, continua instalacion cercha tipo Howe de 19m, en la Abs K3+390.
NOTA: Se tomaron muestras concreto 3000 PSI en 4 cilindros

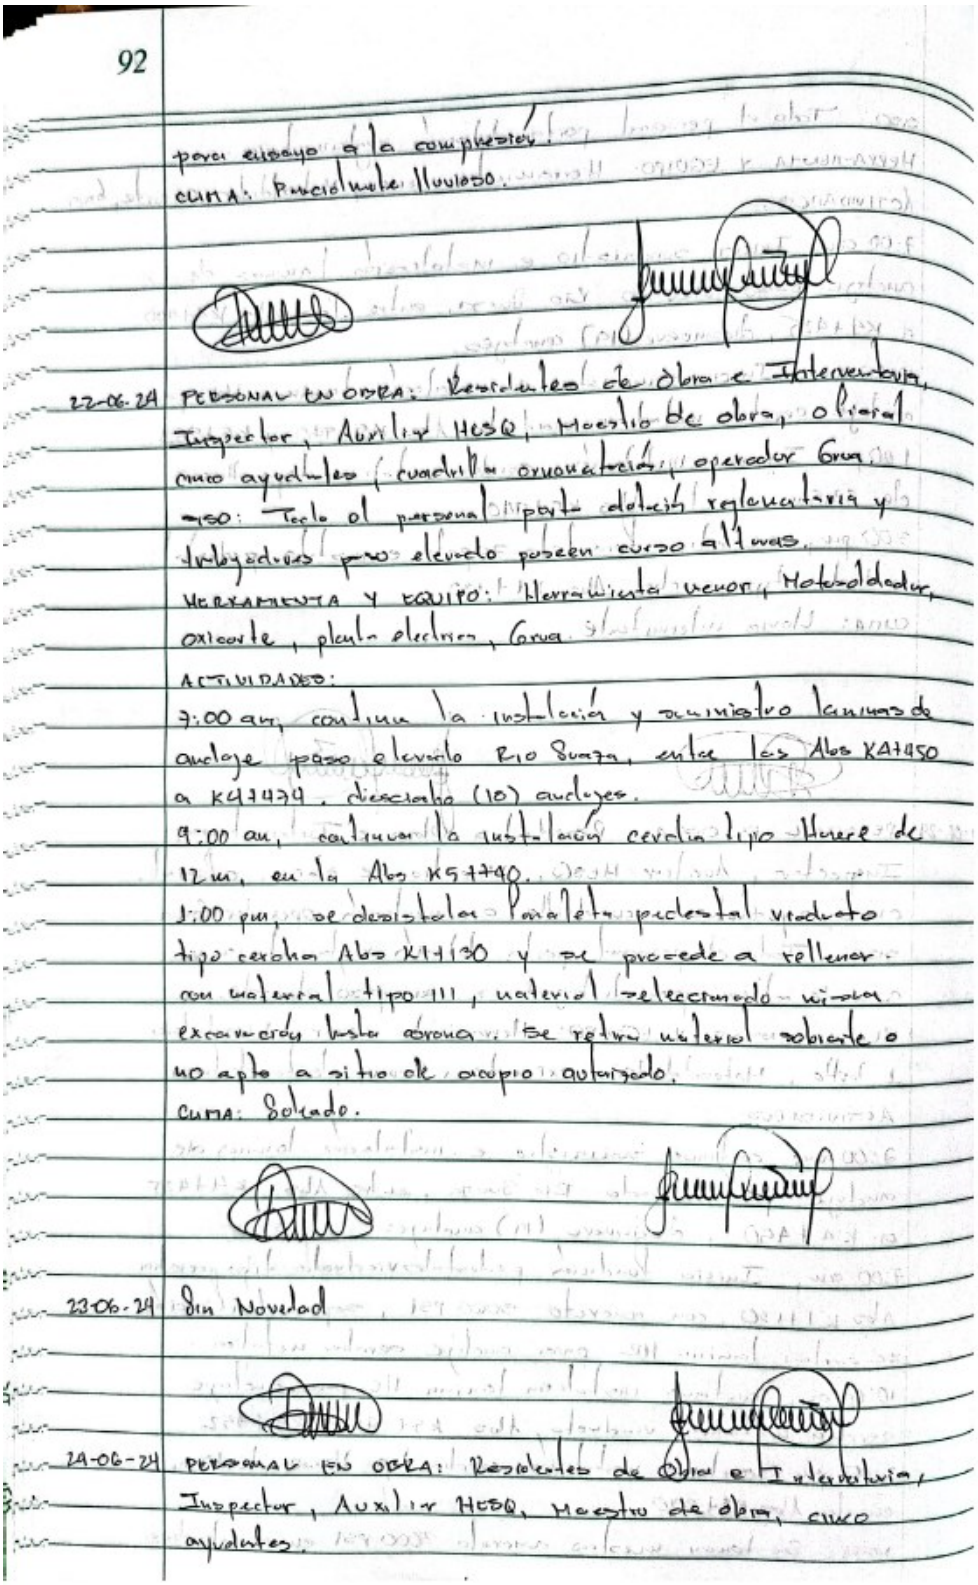

92

para ensayo a la completar.
CLIMA: Parcialmente Nuvloso.

22-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, oficial cinco ayudantes (cuadrilla ornamentadores), operador Grua.
HSEQ: Todo el personal cuenta dotación reglamentaria y trabajadores que elevado poseen curso alturas.
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor, Motosoldadora, oxicorte, planta electrica, Grua
ACTIVIDADES:
7:00 am, continua la instalación y suministro tuberias de anclaje paso elevado Rio Suaza, entre los Abs K47+450 a K47+474, diecisiete (10) anclajes.
9:00 am, continuar la instalación cerchas tipo Howe de 12 m, en la Abs K57+740.
1:00 pm, se desistalan Pentalete pedestal viaducto tipo cercha Abs K14+130 y se procede a rellenar con material tipo III, material seleccionado minas excavación hasta corona. Se retira material sobrante o no apto a sitio de acopio autorizado.
CLIMA: Soleado.

23-06-24 Sin Novedad

24-06-24 PERSONAL EN OBRA: Residentes de Obra e Interventoria, Inspector, Auxiliar HSEQ, Maestro de obra, cinco ayudantes.

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS

Registro fotográfico 01. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).





Registro fotográfico 02. Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.





Registro fotográfico 03. Relleno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar, a todo factor incluye: equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 04. Relleno tipo II: Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 05. Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 07. Excavación manual a todo costo en roca con compresor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.





CAPITULO 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Registro fotográfico 08. Instalación tubería PVC para acueductos - Presión Trabajo 200PSI-8" (Inc. Unión e Instalación Accesorio).





Registro fotográfico 09. Instalación Tubería HD 8 " (unión por enchufe y caña).





Registro fotográfico 10. Suministro e Instalación de Codo Gran Radio 45° (RDE 21 - 200 PSI) PVC 8"





Registro fotográfico 11. Suministro e Instalación de Codo HD Extremo Brida 45° D=8"



Registro fotográfico 12. Suministro e Instalación de Codo PVC Gran Radio 22.5° (RDE 21 - 200 PSI) (Unión Platino) D= 8".





Registro fotográfico 13. Suministro e Instalación de Codo HD 22.5 x 8".





CAPITULO 6 – VIADUCTOS

Registro fotográfico 14. Excavación Manual (0.00 - 2.00) m (Inc. Cualquier material - excepto roca, seco o bajo agua).





Registro fotográfico 16. Relleno tipo III: tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.





Registro fotográfico 17. Acero de Refuerzo 60000 PSI (Inc. Amarre y Figuración).





Registro fotográfico 18. Concreto 3000 PSI (Inc. Formaleta 1/4 usos y colocación).





Registro fotográfico 19. Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 6 a 12 m de 0.8 x 0.4 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 x 1/8", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/8", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.



Registro fotográfico 20. Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 13 a 18 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 2 1/2" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 3/16", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.



Registro fotográfico 21. Cercha metálica tipo Howe para viaducto de 19 a 24 m de 1.0 x 0.5 m, cordones superiores e inferiores en ángulos de 3" x 1/4", con Bahía cada 1.0 m, celosías horizontales, verticales y diagonales en ángulo de 1 1/2"x 1/4", para tubería de 6"-8". Incluye: mano de obra, platina y perno de anclaje, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación.



Registro fotográfico 22. Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.30 m. x 0.4 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.





Registro fotográfico 23. Platina de anclaje en lámina HR A-36 0.50 m x 0.6 m. (e = 12 mm.) Incluye perforaciones para perno 5/8" x 24", pernos y arandelas.





Registro fotográfico 24. Suministro e instalación Lamina de anclaje HR A36 - 9 mm, con Viga IPE A572 G50 120 mm x 0.35 m, 4 pernos de B7 3/4" x 0.15 m con Tuerca negra 2H 3/4" Arandela industrial 1/2" y Epoxico, Abrazadera en platina NTC1920 de 2 x 3/16" con 2 Tornillo 1/2" grado 5 y Arandela de seguridad, pintada con anticorrosivo y epoxica para estructuras metálicas, para apoyo paso elevado tubería HD 8" C40. Paso Rio Suaza.





Registro fotográfico 25. Visita comité veeduría ciudadana conformada por resolución 011 de 2024







PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29795188
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER RODRIGUEZ LOSADA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83057718	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 N 8A 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GUADALUPE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4799	CORREO ELECTRÓNICO	NECA_LUNA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8321097
FAX	8321097	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29795188

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83057718	03	No	No	No	41	319	0	Salario	RODRIGUEZ LOSADA ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83057718																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83057718	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83057718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83057718	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$370.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29963539
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	32	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 23 ACU FASE II ALTAMIRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$4.000.000		29963539

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7714850	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	LUNA GASCA LUIS IVAN	$2.700.000
CC-1082129987	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	POLANCO PARRA VALENTINA	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7714850																													0		
CC - 1082129987																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7714850	COLPENSIONES	30	$2.700.000	0.1600000	$432.000	$0	$0	$432.000	$0	$0	$0
CC - 1082129987	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7714850	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.700.000	5	0.0696000	$188.000
CC - 1082129987	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7714850	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082129987	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 – 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
COLPENSIONES	1	$432.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$432.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$108.000	$0	0	$0	0	$0	$108.000	0	$0	$0	$108.000	$0	0	$0	$0	$108.000	$0	$0	$108.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$278.500	0	$0	$0	$278.500	0	$0	$278.500	0	$0	$0	$278.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$160.000	0	$0	$160.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$160.000
PENSIONES	2	$640.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$278.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$160.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.238.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30026476
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	39	NOMBRE SUCURSAL	CTO 159 ACU ALTAMIRA FASE II OPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.933.334		30026476

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1007616948	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	ACUÑA AGUILERA ALBERTO DE JESUS	$1.300.000
CC-83239835	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	CASTRO JIMENEZ GERMAN EDUARDO	$1.300.000
CC-1110586146	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	GOMEZ CAPIZ JEFFERSON	$1.300.000
CC-83058468	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RAMIREZ PLAZAS JOSE ALONSO	$1.300.000
CC-1082124660	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ CUELLAR JHOAN ALEXIS	$1.300.000
CC-83058277	01	No	No	No	41	26	5422001	Fijo	RODRIGUEZ LOSADA JAIDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1007616948																													0		
CC - 83239835																													0		
CC - 1110586146																													0		
CC - 83058468																													0		
CC - 1082124660	X	2024-05-21																											0		
CC - 83058277																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1007616948	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83239835	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1110586146	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83058468	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082124660	PROTECCION	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 83058277	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007616948	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83239835	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1110586146	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83058468	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 1082124660	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	5	0.0696000	$30.200
CC - 83058277	EPS-S EMSSANAR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1007616948	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83239835	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110586146	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058468	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082124660	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83058277	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$69.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$69.400
PORVENIR	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$173.400	$0	0	$0	0	$0	$173.400	0	$0	$0	$173.400	$0	0	$0	$0	$173.400	$0	$0	$173.400
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
EPS-S EMSSANAR	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$482.700	0	$0	$0	$482.700	0	$0	$482.700	0	$0	$0	$482.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$277.400	0	$0	$277.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$277.400
PENSIONES	3	$1.109.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$482.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$277.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.146.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30054762
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	TALENTOHUMANO@CONENERGIA.CO	TELÉFONO	8716478
FAX	8716478	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	solo arl
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		30054762

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7711864	59	No	No	No	41	1	5711001	Salario	MONTEALEGRE PERDOMO WILLINTON	$1.300.000
CC-83057718	59	4	No	No	41	26	5711001	Salario	RODRIGUEZ LOSADA ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7711864			R	2024-05-30																									0		
CC - 83057718																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7711864	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 83057718	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7711864	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 83057718	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7711864	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83057718	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$0
PENSIONES	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$181.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29966105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM PARRA OLAYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12123891	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 6 52	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3153217351
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	obras
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29966105

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12123891	59	No	No	No	41	1	1711001	Salario	PARRA OLAYA WILLIAM	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12123891																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12123891	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$377.300
