CONSOLIDADO: INFORME DE AVANCE QUINCENAL

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Informe No.	4	**Fecha del informe:**	11/12/2023	**Periodo del informe:**	27/11/2023	AL	9/12/2023
Valor:	$ 373.911.004,42	**Valor ejecutado periodo:**		$ 186.441.978,09	% avance financiero:		52,85%
					% avance técnico:		50,20%

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Objeto:	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA		
Contrato No.	035 - 2023	**Contratista:**	ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
Nit No.	901.503.062-4	**Representante legal:**	NELSON YESID RUBIO GARZÓN
Fecha suscripción:	11 de septiembre de 2023	**Plazo:**	2,5 meses
Valor del proyecto:	$		373.911.004,42
Fecha de inicio:	11 de septiembre 2023	**Fecha terminación:**	22 de diciembre de 2023

DATOS DEL PROYECTO

Objeto:	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA				
Valor:	$ 253.806.267,42	**Departamento:**	TOLIMA	**Municipio**	MELGAR
fecha de inicio:	11/9/2023	**Fecha de terminación:**	27/11/2023		

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA INICAL REAL DE CUMPLIMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN PROGRAMADA	FECHA FINAL REAL DE CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRAZO A LA FECHA
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	11/9/2023	3/10/2023	18/9/2023	10/10/2023	-22
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	11/9/2023	17/10/2023	18/9/2023		-36
1,03	Demolición de piso cerámico existente.	13/9/2023	3/10/2023	15/9/2023	10/10/2023	-20
1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas	18/9/2023	3/10/2023	21/9/2023	10/10/2023	-15
1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.	11/9/2023	18/10/2023	13/11/2023	20/10/2023	-37
1,06	Retiro de cableado UTP y electrico	11/9/2023	3/10/2023	14/11/2023	10/10/2023	-22
1,07	Desmonte de salidas de voz y datos	14/9/2023		18/9/2023		no iniciado
1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas	14/9/2023	3/10/2023	18/9/2023	10/10/2023	-19
1,09	Construcción de muro en bloque #4	18/9/2023	21/10/2023	22/9/2023	24/10/2023	-33
1,1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	22/9/2023	9/11/2023	28/9/2023	10/11/2023	-48
1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	20/9/2023		22/9/2023		no iniciado
1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	6/10/2023		13/10/2023		no iniciado
1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	22/9/2023	20/11/2023	28/9/2023		-59
1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	18/9/2023	3/11/2023	6/10/2023		-46
1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2	11/9/2023	8/11/2023	31/09/2023		-58
1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	6/10/2023	9/11/2023	13/10/2023		-34
1,17	Cortinas enrollables screen	14/10/2023		22/10/2023		no iniciado
1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	31/10/2023	20/11/2023	14/10/2023		-20
1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	6/10/2023	9/11/2023	11/10/2023		-34
1,2	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22/10/2023		27/10/2023		no iniciado
1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22/10/2023		31/10/2023		no iniciado
1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	11/10/2023	9/11/2023	25/10/2023		-29
1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	6/10/2023		11/10/2023		no iniciado
1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico	6/10/2023		10/10/2023		no iniciado

1,25	Suministro e Instalación breaker X30A	25/10/2023		30/10/2023		no iniciado
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	31/10/2023	4/12/2023	9/11/2023		-34
1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	11/10/2023		20/10/2023		no iniciado
1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	11/10/2023	9/11/2023	19/10/2023		-29
1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	22/11/2023		27/11/2023		no iniciado
NP	OBRA NO PREVISTA					
NP-01	Suministro e instalacion de ceramica piso / pared	22/11/2023	23/11/2023	25/11/2023		-1
NP-02	Suministro e instalación sanitario	24/11/2023		27/11/2023		no iniciado
NP-03	Suministro e instalación lavamanos con pedestal incluye griferia	24/11/2023		24/11/2023		no iniciado
NP-04	Construcción placa en metaldeck incluye cargue o alistado de piso	31/11/2023	31/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	0
NP-05	Mantenimiento filtraciones en cubierta, incluye cambio de tejas en mal estado y ajuste de entramado de las mismas	1/11/2023	2/11/2023	4/11/2023	15/11/2023	-1
NP-06	Suministro e instalación bandeja porta cable	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-1
NP-07	Suministro e instalación tablero de 42 circuitos	20/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	-3
NP-08	Alimentador eléctrico 3x1/0F + 1x2/0N+1x4T	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-09	Protección tipo totalizador 3x150A para tablero contadores y tablero distribución	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-10	Protección enchufable 3x40/60A para tablero distribución	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-11	Protección enchufable 2x20A	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-12	Adecuación y mantenimiento correctivo de tablero Piso 1, distribución eléctrica, incluye barrajes en lámina de cobre con codigo de colores acorde a la carga	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-13	Sistema de puesta a tierra compuesto por 3 varillas Cu/Fe y cable desnudo No.4 incluye conector y conexión hasta piso 2	28/11/2023				no iniciado
NP-14	Tramites, suministro de contador trifásico de 3/100A certificado según comercializador eléctrico. Incluye mantenimiento general con cambio de barrajes de fases (R-S-T) y neutro.	19/12/2023				no iniciado
NP-15	Suministro e instalación de puerta principal de acceso incluye cerradura y todo el material para su correcto funcionamiento	19/12/2023				no iniciado
Plazo del proyecto en días				**77**		


IINDICADORES

No.	**DESCRIPCIÓN DEL HITO**	**VALOR**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 183.719.370,98	52,08%	**0,77%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Supervisión.	$ 186.441.978,09	52,85%	

EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATO OBRA		
VALOR INICIAL	$	373.911.004,42
VALOR FACTURADO	$	123.487.182,55
SALDO	$	250.423.821,87

FECHA	**AVANCE PROGRAMADO (%)**	**AVANCE EJECUTADO(%)**
25/10/2023	9,36%	8,92%
8/11/2023	25,31%	24,26%
25/11/2023	40,71%	39,00%
9/12/2023	50,88%	51,73%

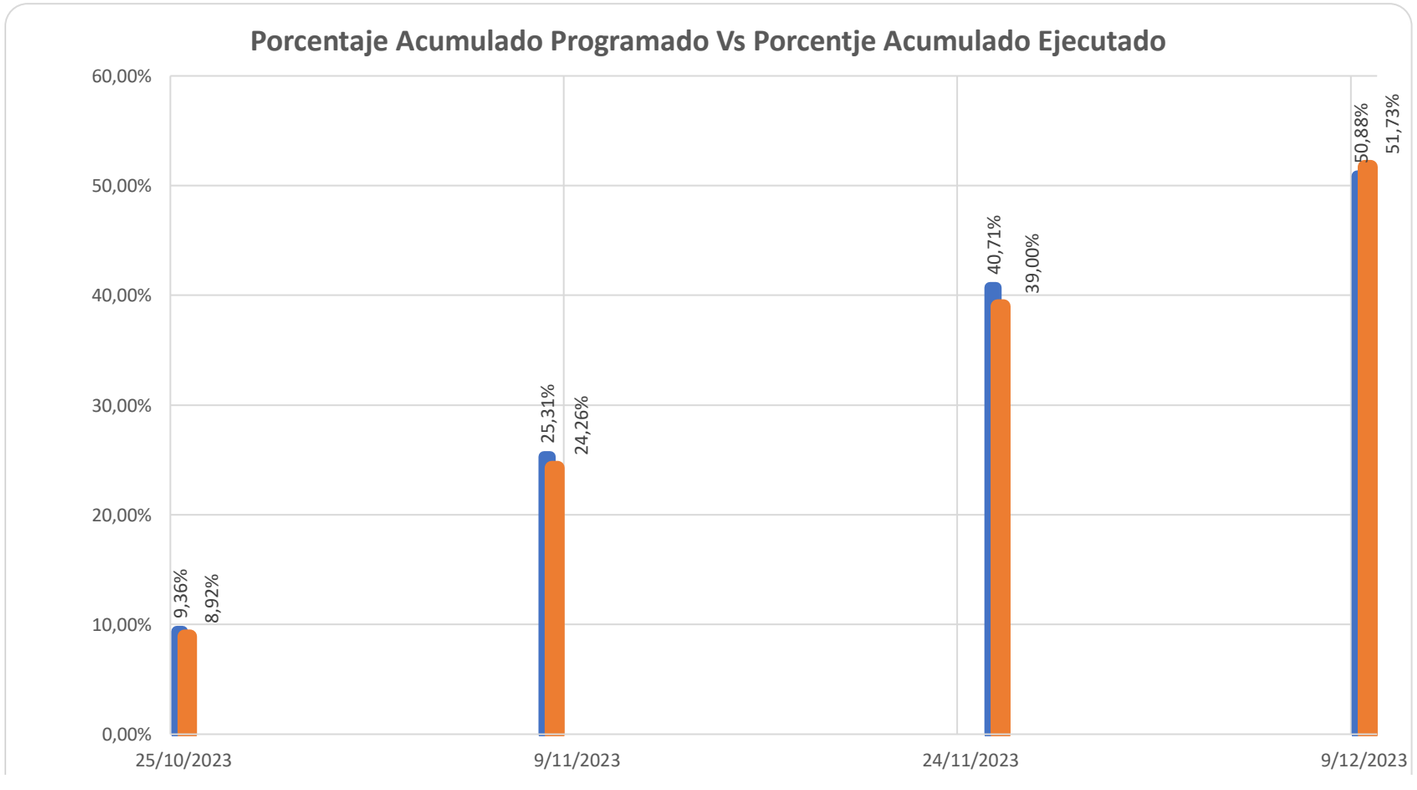

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	VALOR INICIAL	VR PROGRAMADO ACUMULADO ACTUAL	VR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% SOBRE EL VR TOTAL PROGRAMADO ACTUAL	% SOBRE EL VR TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA ADELANTO (+) ATRASO (-)
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	$ 5.186.832,0	$ 5.186.832,00	$ 7.467.086,84	100,00%	143,96%	43,96%
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	$ 5.641.620,00	$ 5.641.620,00	$ 4.637.633,99	100,00%	82,20%	-17,80%
1,03	Demolición de piso cerámico existente.	$ 217.126,00	$ 217.126,00	$ 2.094.034,49	100,00%	964,43%	864,43%
1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas	$ 1.319.940,00	$ 1.319.940,00	$ 1.818.584,00	100,00%	137,78%	37,78%
1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.	$ 215.357,28	$ 215.357,28	$ 322.895,47	100,00%	149,93%	49,93%
1,06	Retiro de cableado UTP y electrico	$ 2.531.520,00	$ 2.531.520,00	$ 6.750.720,00	100,00%	266,67%	166,67%
1,07	Desmonte de salidas de voz y datos	$ 1.133.685,00	$ 1.133.685,00	$ 0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas	$ 1.263.500,00	$ 1.263.500,00	$ 1.407.900,00	100,00%	111,43%	11,43%
1,09	Construcción de muro en bloque #4	$ 1.658.804,00	$ 1.658.804,00	$ 977.509,50	100,00%	58,93%	-41,07%
1,1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	$ 1.768.320,00	$ 1.768.320,00	$ 972.576,00	100,00%	55,00%	-45,00%
1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	$ 1.467.406,44	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	$ 6.339.010,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	$ 1.369.500,00	$ 1.369.500,00	$ 1.076.997,63	100,00%	78,64%	-21,36%
1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	$ 15.572.748,00	$ 15.572.748,00	$ 20.171.222,50	100,00%	129,53%	29,53%
1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2	$ 12.683.360,00	$ 6.341.680,00	$ 8.426.221,79	50,00%	66,44%	16,44%
1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	$ 4.205.058,00	$ 4.205.058,00	$ 5.199.569,00	100,00%	123,65%	23,65%
1,17	Cortinas enrollables screen	$ 24.489.696,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	$ 3.464.923,00	$ 3.464.923,00	$ 7.316.361,68		211,16%	211,16%
1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	$ 1.522.025,00	$ 1.522.025,00	$ 922.025,00	100,00%	60,58%	-39,42%

1,2	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 16.321.813,20	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 60.011.055,36	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	$ 709.663,00	$ 709.663,00		100,00%	0,00%	-100,00%
1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	$ 407.316,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico	$ 613.815,00	$ 0,00	$ 0,00		0,00%	0,00%
1,25	Suministro e Instalación breaker X30A	$ 1.021.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	$ 15.635.580,00	$ 15.635.580,00	$ 11.106.295,00	100,00%	71,03%	-28,97%
1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ 12.447.450,00	$ 8.713.215,00	$ 0,00	70,00%	0,00%	-70,00%
1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	$ 4.594.941,00	$ 4.594.941,00	$ 4.594.941,00	100,00%	100,00%	0,00%
1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	$ 951.692,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
NP	**OBRA NO PREVISTA**						
NP-01	Suministro e instalacion de ceramica piso / pared	$ 9.707.310,82	$ 9.707.310,82	$ 9.707.310,82	100,00%	100,00%	0,00%
NP-02	Suministro e instalación sanitario	$ 2.158.173,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
NP-03	Suministro e instalación lavamanos con pedestal incluye griferia	$ 2.099.973,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
NP-04	Construcción placa en metaldeck incluye cargue o alistado de piso	$ 16.910.902,66	$ 16.910.902,66	$ 16.910.902,66	100,00%	100,00%	0,00%
NP-05	Mantenimiento filtraciones en cubierta, incluye cambio de tejas en mal estado y ajuste de entramado de las mismas	$ 4.229.689,00	$ 4.229.689,00	$ 4.229.689,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-06	Suministro e instalación bandeja porta cable	$ 14.500.265,64	$ 14.500.265,64	$ 14.500.265,64	100,00%	100,00%	0,00%
NP-07	Suministro e instalación tablero de 42 circuitos	$ 2.046.344,00	$ 2.046.344,00	$ 2.046.344,00	100,00%	100,00%	0,00%

NP-08	Alimentador eléctrico 3x1/0F+1x2/0N+1x4T	$ 4.390.000,00	$ 4.390.000,00	$ 4.390.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-09	Protección tipo totalizador 3x150A para tablero contadores y tablero distribución	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-10	Protección enchufable 3x40/60A para tablero distribución	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-11	Protección enchufable 2x20A	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-12	Adecuación y mantenimiento correctivo de tablero Piso 1, distribución eléctrica, incluye barrajes en lámina de cobre con codigo de colores acorde a la carga	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-13	Sistema de puesta a tierra compuesto por 3 varillas Cu/Fe y cable desnudo No.4 incluye conector y conexión hasta piso 2	$ 6.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
NP-14	Tramites, suministro de contador trifásico de 3/100A certificado según comercializador eléctrico. Incluye mantenimiento general con cambio de barrajes de fases (R-S-T) y neutro.	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-15	Suministro e instalación de puerta principal de acceso incluye cerradura y todo el material para su correcto funcionamiento	$ 4.416.344,00			0,00%	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL	**$ 284.594.042,40**	**$ 148.220.549,40**	**$ 150.417.086,00**			
	Administración (13%)	$ 36.997.225,51	$ 19.268.671,42	$ 19.554.221,18			
	Imprevistos (5%)	$ 14.229.702,12	$ 7.411.027,47	$ 7.520.854,30			
	Utilidad (5%)	$ 14.229.702,12	$ 7.411.027,47	$ 7.520.854,30			
	IVA/Utilidad (19%)	$ 2.703.643,40	$ 1.408.095,22	$ 1.428.962,32			
	VALOR TOTAL	**$ 352.754.315,55**	**$ 183.719.370,98**	**$ 186.441.978,09**	**52,08%**	**52,85%**	**0,77%**

GESTIÓN DEL PROYECTO

Avance General del periodo

GESTIÓN DEL PROYECTO

Para el Informe Quincenal No. 4, Se establece un porcentaje ejecutado acumulado financiero del 52,85% que corresponde a un valor que ascendente a los $ 186.441.978,09 con respecto al costo basico total.

Alcance Proyecto "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA "
Demoliciones y desmontes. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones eléctricas. Porcentaje de avance 80%.
Instalaciones estructura liviana. Porcentaje de avance 95%.
Instalaciones de enchape. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones vidrieria. Porcentaje de avance 0%.
Instalaciones carpinteía. Porcentaje de avance 0%.
Instalaciones aparatos hidrosanitarios. Porcentaje de avance 0%.

En las presentes semanas, se continuaron con las siguientes actividades:
- Macilla y pintura en muros en drywall.
- Cableado eléctrico.
- Instalación de enchape en escaleras y baños.
- Pintura en muros.

Durante las presentes semanas llego material pintura tipo 1 y tipo2, canecas supermastick, cable No. 10, aparatos sanitarios.

Comunicaciones enviadas
ANX-035-2023-UAEJPM P-016-2023 Solicitud inclusión item´s no previstos.
ANX-035-2023-UAEJPM P-017-2023 Solicitud de adición y prorroga.

Comunicaciones recibidas
No se presentaron

Componente SST

Se realizó charla de capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal antes del comienzo de actividades.

Actividades a realizar la siguiente semana:

se tiene programado para la siguientes semanas continuar con las actividad de : Intalación de puertas en madera, enchape placa metaldeck, instalación divisiones, puertas en vidrio, instalación de tableros y acometida eléctrica .

Registro fotográfico

Fotografía; No.1. Enchape baños




Fotografía; No.2. Instalación Luminarias



Fotografía No. 3 Pintura en muros



Fotografía No. 4. Enchape escaleras

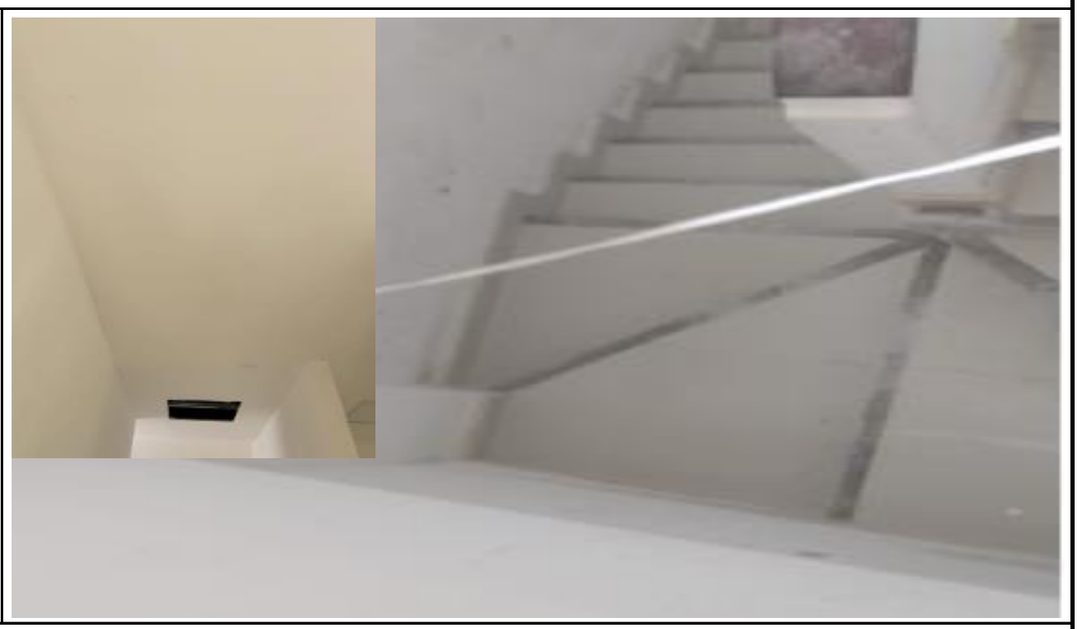


Fotografía No. 3 Instalación de techo en drywall



Actividades críticas del periodo

SE HAN PRESENTADO APAGONES DE LUZ INTERMITENTES EN EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS



Firma: Ing.Res. YONATAN YESID MOTTA PEÑUELA

Firma: Supervisor. NIXON LÓPEZ PEDIGÓN
