CONSOLIDADO: INFORME DE AVANCE QUINCENAL

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

Informe No.	4	**Fecha del informe:**	22/12/2023	**Periodo del informe:**	11/12/2023	AL	22/12/2023
Valor:	$ 373.911.004,42	**Valor ejecutado periodo:**		$ 373.911.004,42	% avance financiero:		100,00%
					% avance técnico:		50,20%

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

Objeto:	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA		
Contrato No.	035 - 2023	**Contratista:**	ANX INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
Nit No.	901.503.062-4	**Representante legal:**	NELSON YESID RUBIO GARZÓN
Fecha suscripción:	11 de septiembre de 2023	**Plazo:**	2,5 meses
Valor del proyecto:	$		373.911.004,42
Fecha de inicio:	11 de septiembre 2023	**Fecha terminación:**	22 de diciembre de 2023

DATOS DEL PROYECTO

Objeto:	ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA				
Valor:	$ 253.806.267,42	**Departamento:**	TOLIMA	**Municipio**	MELGAR
fecha de inicio:	11/9/2023	**Fecha de terminación:**	22/12/2023		

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA INICAL REAL DE CUMPLIMIENTO	FECHA FINALIZACIÓN PROGRAMADA	FECHA FINAL REAL DE CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRAZO A LA FECHA
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	11/9/2023	3/10/2023	18/9/2023	10/10/2023	-22
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	11/9/2023	17/10/2023	18/9/2023		-36
1,03	Demolición de piso cerámico existente.	13/9/2023	3/10/2023	15/9/2023	10/10/2023	-20
1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas	18/9/2023	3/10/2023	21/9/2023	10/10/2023	-15
1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.	11/9/2023	18/10/2023	13/11/2023	20/10/2023	-37
1,06	Retiro de cableado UTP y electrico	11/9/2023	3/10/2023	14/11/2023	10/10/2023	-22
1,07	Desmonte de salidas de voz y datos	14/9/2023		18/9/2023		no iniciado
1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas	14/9/2023	3/10/2023	18/9/2023	10/10/2023	-19
1,09	Construcción de muro en bloque #4	18/9/2023	21/10/2023	22/9/2023	24/10/2023	-33
1,1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	22/9/2023	9/11/2023	28/9/2023	10/11/2023	-48
1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	20/9/2023	19/12/2023	22/9/2023	22/12/2023	-90
1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	6/10/2023	19/12/2023	13/10/2023	22/12/2023	-74
1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	22/9/2023	20/11/2023	28/9/2023	22/12/2023	-59
1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	18/9/2023	3/11/2023	6/10/2023	22/12/2023	-46
1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2	11/9/2023	8/11/2023	31/09/2023	22/12/2023	-58
1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	6/10/2023	9/11/2023	13/10/2023	22/12/2023	-34
1,17	Cortinas enrollables screen	14/10/2023	21/12/2023	22/10/2023	22/12/2023	-68
1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	31/10/2023	20/11/2023	14/10/2023	22/12/2023	-20
1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	6/10/2023	9/11/2023	11/10/2023	22/12/2023	-34
1,2	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22/10/2023	19/12/2023	27/10/2023	22/12/2023	-58
1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22/10/2023	19/12/2023	31/10/2023	22/12/2023	-58
1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	11/10/2023	19/12/2023	25/10/2023	22/12/2023	-69
1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	6/10/2023	19/12/2023	11/10/2023	22/12/2023	-74
1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico	6/10/2023	21/12/2023	10/10/2023	22/12/2023	-76

1,25	Suministro e Instalación breaker X30A	25/10/2023	21/12/2023	30/10/2023	22/12/2023	-57
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	31/10/2023	4/12/2023	9/11/2023	22/12/2023	-34
1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	11/10/2023	19/12/2023	20/10/2023	22/12/2023	-69
1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	11/10/2023	9/11/2023	19/10/2023	22/12/2023	-29
1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	22/11/2023	22/12/2023	27/11/2023	22/12/2023	-30
NP	OBRA NO PREVISTA					
NP-01	Suministro e instalacion de ceramica piso / pared	22/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	18/12/2023	-1
NP-02	Suministro e instalación sanitario	24/11/2023	18/12/2023	27/11/2023	20/12/2023	-24
NP-03	Suministro e instalación lavamanos con pedestal incluye griferia	24/11/2023	19/12/2023	24/11/2023	20/12/2023	-25
NP-04	Construcción placa en metaldeck incluye cargue o alistado de piso	31/11/2023	31/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	0
NP-05	Mantenimiento filtraciones en cubierta, incluye cambio de tejas en mal estado y ajuste de entramado de las mismas	1/11/2023	2/11/2023	4/11/2023	15/11/2023	-1
NP-06	Suministro e instalación bandeja porta cable	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-1
NP-07	Suministro e instalación tablero de 42 circuitos	20/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	-3
NP-08	Alimentador eléctrico 3x1/0F + 1x2/0N+1x4T	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-09	Protección tipo totalizador 3x150A para tablero contadores y tablero distribución	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-10	Protección enchufable 3x40/60A para tablero distribución	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-11	Protección enchufable 2x20A	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-12	Adecuación y mantenimiento correctivo de tablero Piso 1, distribución eléctrica, incluye barrajes en lámina de cobre con codigo de colores acorde a la carga	28/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-1
NP-13	Sistema de puesta a tierra compuesto por 3 varillas Cu/Fe y cable desnudo No.4 incluye conector y conexión hasta piso 2	28/11/2023	18/12/2023	30/11/2023	20/12/2023	-20
NP-14	Tramites, suministro de contador trifásico de 3/100A certificado según comercializador eléctrico. Incluye mantenimiento general con cambio de barrajes de fases (R-S-T) y neutro.	19/12/2023	21/12/2023	30/11/2023	21/12/2023	-2
NP-15	Suministro e instalación de puerta principal de acceso incluye cerradura y todo el material para su correcto funcionamiento	19/12/2023	18/12/2023	30/11/2023	18/12/2023	1
Plazo del proyecto en días				**77**		


IINDICADORES

No.	**DESCRIPCIÓN DEL HITO**	**VALOR**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO**
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 352.754.315,55	100,00%	**0,00%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Supervisión.	$ 373.911.004,42	100,00%	

EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATO OBRA		
VALOR INICIAL	$	373.911.004,42
VALOR FACTURADO	$	123.487.182,55
SALDO	$	250.423.821,87

FECHA	**AVANCE PROGRAMADO (%)**	**AVANCE EJECUTADO(%)**
25/10/2023	9,36%	8,92%
8/11/2023	25,31%	24,26%
25/11/2023	40,71%	39,00%
9/12/2023	50,88%	51,73%
22/12/2023	100,00%	100,00%

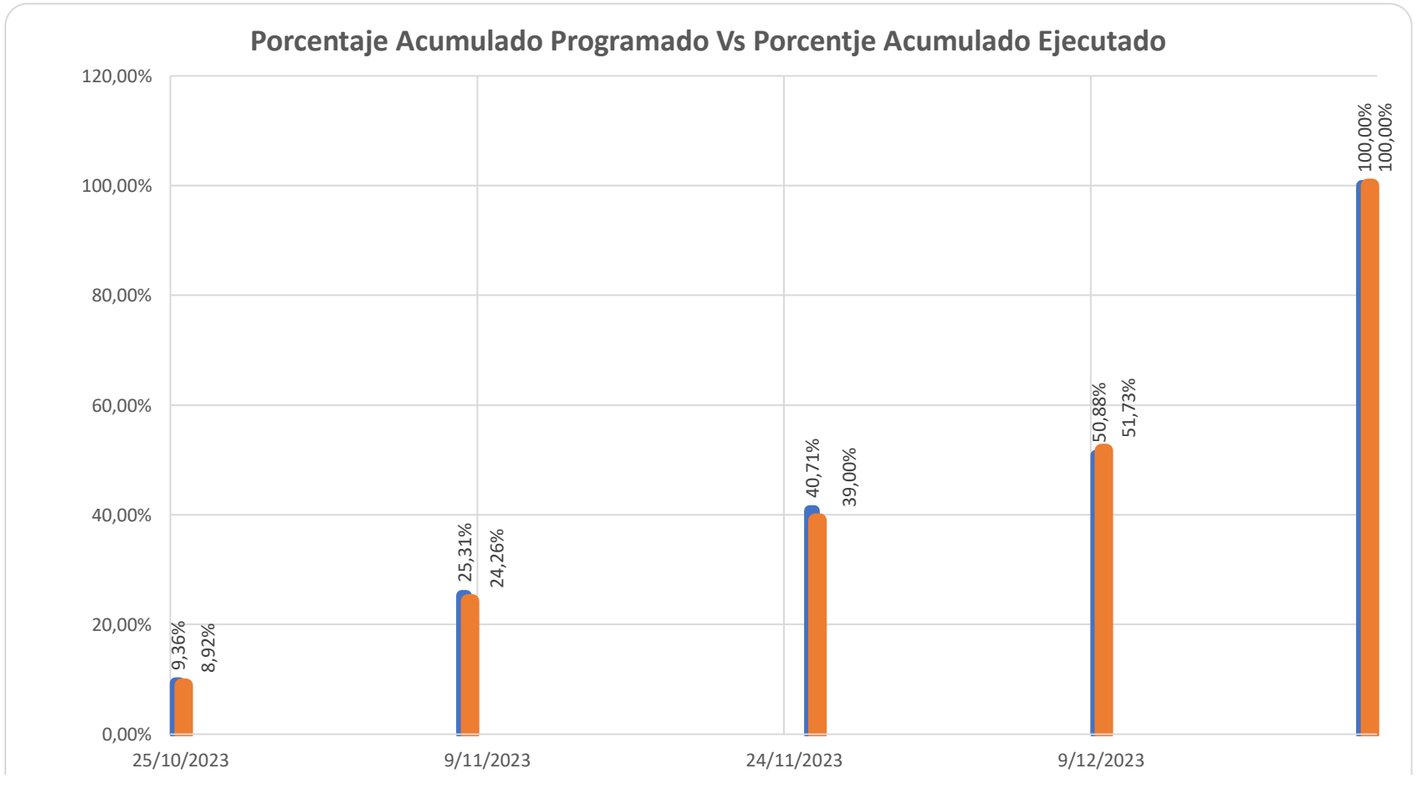

No.	DESCRIPCIÓN DEL HITO	VALOR INICIAL	VR PROGRAMADO ACUMULADO ACTUAL	VR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	% SOBRE EL VR TOTAL PROGRAMADO ACTUAL	% SOBRE EL VR TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA ADELANTO (+) ATRASO (-)
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	$ 5.186.832,0	$ 5.186.832,00	$ 7.467.086,84	100,00%	143,96%	43,96%
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	$ 5.641.620,00	$ 5.641.620,00	$ 4.637.633,99	100,00%	82,20%	-17,80%
1,03	Demolición de piso cerámico existente.	$ 217.126,00	$ 217.126,00	$ 2.094.034,49	100,00%	964,43%	864,43%
1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas	$ 1.319.940,00	$ 1.319.940,00	$ 1.818.584,00	100,00%	137,78%	37,78%
1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.	$ 215.357,28	$ 215.357,28	$ 322.895,47	100,00%	149,93%	49,93%
1,06	Retiro de cableado UTP y electrico	$ 2.531.520,00	$ 2.531.520,00	$ 6.750.720,00	100,00%	266,67%	166,67%
1,07	Desmonte de salidas de voz y datos	$ 1.133.685,00	$ 1.133.685,00	$ 0,00	100,00%	0,00%	-100,00%
1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas	$ 1.263.500,00	$ 1.263.500,00	$ 1.407.900,00	100,00%	111,43%	11,43%
1,09	Construcción de muro en bloque #4	$ 1.658.804,00	$ 1.658.804,00	$ 977.509,50	100,00%	58,93%	-41,07%
1,1	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	$ 1.768.320,00	$ 1.768.320,00	$ 972.576,00	100,00%	55,00%	-45,00%
1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	$ 1.467.406,44	$ 1.467.406,44	$ 5.662.983,74	100,00%	385,92%	285,92%
1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	$ 6.339.010,00	$ 6.339.010,00	$ 10.769.514,16	100,00%	169,89%	69,89%
1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	$ 1.369.500,00	$ 1.369.500,00	$ 1.076.997,63	100,00%	78,64%	-21,36%
1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	$ 15.572.748,00	$ 15.572.748,00	$ 20.171.222,50	100,00%	129,53%	29,53%
1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2	$ 12.683.360,00	$ 12.683.360,00	$ 10.426.221,79	100,00%	82,20%	-17,80%
1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	$ 4.205.058,00	$ 4.205.058,00	$ 7.199.569,00	100,00%	171,21%	71,21%
1,17	Cortinas enrollables screen	$ 24.489.696,00	$ 24.489.696,00	$ 27.829.200,00	100,00%	113,64%	13,64%
1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	$ 3.464.923,00	$ 3.464.923,00	$ 10.316.361,68		297,74%	297,74%
1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	$ 1.522.025,00	$ 1.522.025,00	$ 1.522.025,00	100,00%	100,00%	0,00%

1,2	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 16.321.813,20	$ 16.321.813,20	$ 14.714.361,90	100,00%	90,15%	-9,85%
1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 60.011.055,36	$ 60.011.055,36	$ 60.473.097,00	100,00%	100,77%	0,77%
1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	$ 709.663,00	$ 709.663,00	$ 709.663,00	100,00%	100,00%	0,00%
1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	$ 407.316,00	$ 407.316,00	$ 407.316,00	100,00%	100,00%	0,00%
1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico	$ 613.815,00	$ 613.815,00	$ 0,00		0,00%	0,00%
1,25	Suministro e Instalación breaker X30A	$ 1.021.284,00	$ 1.021.284,00	$ 2.382.996,00	100,00%	233,33%	133,33%
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	$ 15.635.580,00	$ 15.635.580,00	$ 13.106.295,00	100,00%	83,82%	-16,18%
1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$ 12.447.450,00	$ 12.447.450,00	$ 3.070.371,00	100,00%	24,67%	-75,33%
1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	$ 4.594.941,00	$ 4.594.941,00	$ 4.594.941,00	100,00%	100,00%	0,00%
1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	$ 951.692,00	$ 951.692,00	$ 951.692,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP	**OBRA NO PREVISTA**						
NP-01	Suministro e instalacion de ceramica piso / pared	$ 9.707.310,82	$ 9.707.310,82	$ 9.707.310,82	100,00%	100,00%	0,00%
NP-02	Suministro e instalación sanitario	$ 2.158.173,00	$ 2.158.173,00	$ 2.158.173,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-03	Suministro e instalación lavamanos con pedestal incluye griferia	$ 2.099.973,00	$ 2.099.973,00	$ 2.099.973,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-04	Construcción placa en metaldeck incluye cargue o alistado de piso	$ 16.910.902,66	$ 16.910.902,66	$ 16.910.902,66	100,00%	100,00%	0,00%
NP-05	Mantenimiento filtraciones en cubierta, incluye cambio de tejas en mal estado y ajuste de entramado de las mismas	$ 4.229.689,00	$ 4.229.689,00	$ 4.229.689,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-06	Suministro e instalación bandeja porta cable	$ 14.500.265,64	$ 14.500.265,64	$ 14.500.265,64	100,00%	100,00%	0,00%
NP-07	Suministro e instalación tablero de 42 circuitos	$ 2.046.344,00	$ 2.046.344,00	$ 2.046.344,00	100,00%	100,00%	0,00%

NP-08	Alimentador eléctrico 3x1/0F+1x2/0N+1x4T	$ 4.390.000,00	$ 4.390.000,00	$ 4.390.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-09	Protección tipo totalizador 3x150A para tablero contadores y tablero distribución	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-10	Protección enchufable 3x40/60A para tablero distribución	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-11	Protección enchufable 2x20A	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-12	Adecuación y mantenimiento correctivo de tablero Piso 1, distribución eléctrica, incluye barrajes en lámina de cobre con codigo de colores acorde a la carga	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-13	Sistema de puesta a tierra compuesto por 3 varillas Cu/Fe y cable desnudo No.4 incluye conector y conexión hasta piso 2	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-14	Tramites, suministro de contador trifásico de 3/100A certificado según comercializador eléctrico. Incluye mantenimiento general con cambio de barrajes de fases (R-S-T) y neutro.	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%
NP-15	Suministro e instalación de puerta principal de acceso incluye cerradura y todo el material para su correcto funcionamiento	$ 4.416.344,00	$ 4.416.344,00	$ 4.416.344,00	100,00%	100,00%	0,00%
	SUBTOTAL	**$ 284.594.042,40**	**$ 284.594.042,40**	**$ 301.662.770,81**			
	Administración (13%)	$ 36.997.225,51	$ 36.997.225,51	$ 39.216.160,20			
	Imprevistos (5%)	$ 14.229.702,12	$ 14.229.702,12	$ 15.083.138,54			
	Utilidad (5%)	$ 14.229.702,12	$ 14.229.702,12	$ 15.083.138,54			
	IVA/Utilidad (19%)	$ 2.703.643,40	$ 2.703.643,40	$ 2.865.796,32			
	VALOR TOTAL	**$ 352.754.315,55**	**$ 352.754.315,55**	**$ 373.911.004,42**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

GESTIÓN DEL PROYECTO

Avance General del periodo

GESTIÓN DEL PROYECTO

Para el Informe Quincenal No. 5, Se establece un porcentaje ejecutado acumulado financiero del 100,00% que corresponde a un valor que ascendente a los $ 373.911.004,42 con respecto al costo basico total.

Alcance Proyecto "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA "
Demoliciones y desmontes. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones eléctricas. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones estructura liviana. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones de enchape. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones vidrieria. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones carpinteía. Porcentaje de avance 100%.
Instalaciones aparatos hidrosanitarios. Porcentaje de avance 100%.

En las presentes semanas, se continuaron con las siguientes actividades:
- Instalación de puertas en madera.
- Instalación de guardaescobas.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Instalación de cortinas enrollables.
- Instalación de puerta principal en acero.

Durante las presentes semanas llego material pintura tipo 1, puertas en mader, cortinas enrollables, perfiles y ventaneria, puerta principal en acero.

Comunicaciones enviadas
No se presentaron

Comunicaciones recibidas
No se presentaron

Componente SST

Se realizó charla de capacitación sobre el buen uso de los elementos de protección personal antes del comienzo de actividades.

Actividades a realizar la siguiente semana:

se tiene programado para la siguientes semanas continuar con las actividad de : Aseo general de remate de obra

Registro fotográfico

Fotografía; No.1. Instalación de aparatos sanitarios



Fotografía; No.2. Instalación de cortinas enrollables tipo screen



Fotografía No. 3 Instalación de puertan en madera



Fotografía No. 4. Instalación de puerta principal en acero



Actividades críticas del periodo

SE HAN PRESENTADO APAGONES DE LUZ INTERMITENTES EN EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS



Firma: Ing.Res. YONATAN YESID MOTTA PEÑUELA

Firma: Supervisor. NIXON LÓPEZ PEDIGÓN
