MONACO INGENIERIAS	**INFORME DE ACTIVIDADES No. 3**	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
Fecha: 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024		

ASUNTO: INFORME DE CONTRATAR EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.

INTERESADO (S):

CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S.

SUPERVISOR (E): DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO

CONTRATO DE SUMINSTRO No.: 085 DEL 15 DE ABRIL DE 2024

CONTENIDO:

INFORME DE EJECUCION DEL 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. 3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..... 3
2. OBJETIVO..... 4
3. LOCALIZACIÓN GENERAL..... 4
4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO..... 6
5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE SUMINISTRO..... 7
6. EJECUCIÓN..... 10
7. REGISTRO FOTOGRAFICO..... 15

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico corresponde al informe N°3 del contratista que muestra el avance de las actividades ejecutadas durante el periodo del mes de JUNIO, del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024.

Este contrato tiene por objeto SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.

2. OBJETIVO

El objetivo al generar este informe es socializar y entregar informe de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato de Suministro No.085 del 15 de abril de 2024.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL

Huila es uno de los treinta y dos departamentos que junto con Bogotá, Distrito Capital, conforman la República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Neiva. Está ubicado al suroeste del país, en la región andina, limitando al norte con Tolima y Cundinamarca, al este con Meta, al sur con Caquetá y al oeste con Cauca.

Su organización territorial compren de cuatro Subregiones: Subnorte, Subcentro, Subsur y Suboccidente. Cuenta con 37 municipios, y 128 centros poblados.[7] Su economía genera el 1.74 % del PIB colombiano.[8] De acuerdo con el DANE, posee una población estimada (2020) de 1.122.622 habitantes.[9]

Fue creado por la Ley 46 del 29 de abril de 1905, constituido por la provincia de Neiva y la del sur, pertenecientes al antiguo Estado Soberano del Tolima. El 15 de junio del mismo año, inició su vida independiente bajo la administración de Rafael Puyo Perdomo

Fuente: *https://es.wikipedia*

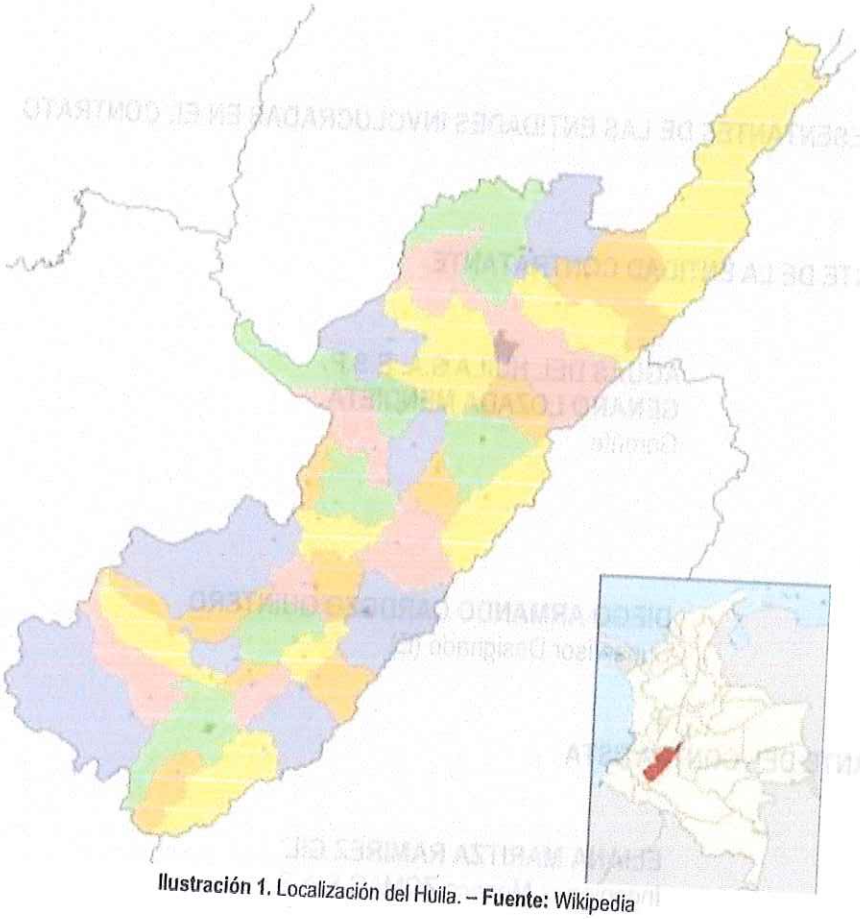

Ilustración 1. Localización del Huila. – **Fuente:** Wikipedia

El **Departamento de Huila** está situado en la parte sur de la región andina; localizado entre los **01°33'08"** y **03°47'32"** de latitud norte y los **74°28'34"** y **76°36'47"** de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 19.890 km2 lo que representa el 1.75 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y Cauca, y por el Oeste con Cauca y Tolima.

4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente

SUPERVISOR:

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
Supervisor Designado (E)

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL
Ingenierías Mónaco ZOMAC S.A.S.

5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**GENARO LOZADA MENDIETA.** GERENTE
SUPERVISOR DE CONTRATO (E)	**DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATISTA

NÚMERO DEL CONTRATO	**085**
OBJETO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.
NOMBRE CONTRATISTA	INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S.

FECHA DEL CONTRATO	DE 15 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el acta de inicio hasta el 01 de noviembre de 2024
VALOR INICIAL	$ 420.000.000
VALOR TOTAL	$ 420.000.000
VALOR DEL ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE INICIO	19 de abril de 2024
Valor Avance	$31,458,366.oo
% ejecución	28.69 %

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZAS CONTRACTUAL:

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	15/04/2024	05/03/2025	126.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	15/04/2024	01/11/2027	84.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	15/04/2024	01/11/2025	84.000.000

POLIZAS ACTA DE INICIO:

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	19/04/2024	04/04/2025	126.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	19/04/2024	01/12/2027	84.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	Aseguradora Solidaria	560 – 47 – 994000177 594	19/04/2024	01/12/2025	84.000.000

6. EJECUCION

6.1 AVANCE DE CONTRATO

Durante este período al vehículo tipo **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU 253**, presento bajo nivel de líquido refrigerante por fisura en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación del líquido refrigerante, dejando así el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período al vehículo tipo **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU 254** se le realizó mantenimiento preventivo por kilometraje cumplido de trabajo en los fluidos (aceite y filtros), se había realizado cambio de aceite y filtros en el mes de octubre con KM cumplido de trabajo de 126.790 y se realiza nuevamente cambio de fluidos el día 27-06-24 con un km recorrido de 131268, por lo cual el vehículo trabajo 4478 KM.

En este mantenimiento se cambia aceite y filtros al motor, quedando el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período al vehículo tipo **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU 255**, presentó bajo nivel del líquido refrigerante por ruptura en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación del líquido refrigerante, dejando así el vehículo en condiciones normales para su funcionamiento.

Para este período el vehículo tipo **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700P de placas ODU 259,** se le realizó mantenimiento preventivo por kilometraje cumplido de trabajo en los fluidos (aceite y filtros), se había realizado cambio de aceite y filtros en el mes de agosto (02-12 -23) con KM cumplido de trabajo de 114.484 y se realiza nuevamente cambio de fluidos el día 20-06-24 con un km recorrido de 119734, por lo cual el vehículo trabajo 5250 KM.

En este mantenimiento se cambia aceite y filtros al motor, quedando el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período el vehículo tipo **VOLQUETA MERCEDES / DOBLE TROQUE de placas ODU 321,** se le realizó mantenimiento preventivo por kilometraje cumplido de trabajo en los fluidos (aceite y filtros), se había realizado cambio de aceite y filtros en el mes de octubre del 2023 (05-10-23) con KM cumplido de trabajo de 41.610 y se realiza nuevamente cambio de fluidos el día 25-06-24 con un KM recorrido de 48004, por lo cual el vehículo trabajo 6.394 KM. Vehículo con bajo nivel del fluido de la transmisión por fuga en retenedor.

En este mantenimiento se cambia aceite y filtros al motor, nivelación del fluido de la transmisión, quedando el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Para este período el vehículo tipo **VOLQUETA MERCEDES / DOBLE TROQUE de placas ODU 322,** presentó bajo nivel del fluido de la transmisión por fuga en retenedor.

Se procedió a realizar la nivelación del fluido de la transmisión, quedando así el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Para este período el vehículo tipo **TRACTOCAMIÓN INTER 7600 CON CAMA BAJA de placas ODU 256,** presentó bajo nivel del fluido en el sistema hidráulico por fuga en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación de fluido en el sistema hidráulico, dejando así al vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período el vehículo tipo **CARROTANQUE CHEVROLET FVR de placas ODU 257,** se le realizó mantenimiento preventivo por kilometraje cumplido de trabajo en los fluidos (aceites y filtros), se había realizado cambio el día 08/08/2023 con 40.850 KM cumplido de trabajo y se realiza nuevamente cambio de fluidos el día 11/06/2024 con un KM recorrido de 47476, por lo cual el vehículo trabajo 6626 KM.

En este mantenimiento se cambió aceite y filtros motor, quedando el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

La máquina tipo **MOTONIVELARDORA CATERPILLAR - CTA120KTSZN01492,** durante este período presentó bajo nivel del líquido refrigerante por ruptura en manguera y bajo nivel del fluido hidráulico por fuga en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación del líquido refrigerante y el fluido hidráulico, quedando el vehículo en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período al vehículo tipo **MOTONIVELARDORA CATERPILLAR - CTA120KCSZNO1488**, presentó bajo nivel del líquido refrigerante por ruptura en manguera, bajo nivel del aceite motor por consumo del mismo, bajo nivel del fluido hidráulico por fuga en manguera y bajo nivel del fluido del TANDEM por daño en retenedor.

Se procedió a realizar la nivelación del líquido refrigerante, aceite motor, fluido hidráulico y fluido del TANDEM, dejando así la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

La máquina tipo **EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210 - LBX210QSNDHEX2113,** para este período se le realizó mantenimiento preventivo por horas cumplidas de trabajo en los fluidos (aceites y filtros), se había realizado cambio en el mes de febrero (06-02-24) con horas cumplidas 6480.8 y se realiza nuevamente el día 05-06-24 este mantenimiento con horas de trabajo cumplidas de 6728,5 por lo cual la maquina trabajo 247.7 horas. Máquina para cambio del fluido en mandos finales por contaminación con agua y bajo nivel del líquido refrigerante por fisura en manguera.

En este mantenimiento se cambia aceite y filtros al motor, filtro A/C, cambio del fluido de los mandos finales, nivelación del líquido refrigerante, quedando la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Maquina presenta consumo constante del fluido hidráulico, por lo que en varias ocasiones (11 de junio con horas: 6773,7 y 24 de junio con horas 6844), se procedió a realizar la nivelación del mismo.

Durante este período la maquina tipo **EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210 - LBX210QSNDHEX2095**, se le realizó mantenimiento preventivo por horas cumplidas de trabajo en los fluidos (aceites y filtros) del motor, se había realizado cambio el día 05/02/2024 con horas cumplidas de 8769,4, y se realiza nuevamente este mantenimiento el día 05/06/2024 con horas de trabajo cumplidas de 9011,1, por lo cual la maquina trabajo 241.7 horas. Máquina para cambio de fluido de los mandos finales por contaminación con agua y bajo nivel del líquido refrigerante por fisura en manguera.

Se procedió a realizar cambio de aceite y filtros al motor, filtro A/C, cambio del fluido de los mandos finales, nivelación del líquido refrigerante, dejando la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento. Se suministró balde de grasa para mantenimiento de engranaje de la misma.

La máquina tipo **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F - CAT0416EKMFG06501** para este período presentó bajo nivel del fluido hidráulico por fisura en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación del fluido hidráulico, dejando de esta manera la maquina en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento. Se suministró balde de grasa para mantenimiento de engranajes de la máquina.

Durante este período la maquina tipo **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F - CAT0416EPMFG06500**, se le realizó mantenimiento preventivo por horas cumplidas de trabajo en los fluidos (aceites y filtros), se había realizado cambio el día 20-02-24 con horas cumplidas 9128.6 y se realiza nuevamente este mantenimiento el día 04-06-24 con horas de trabajo cumplidas de 9293 por lo cual la maquina trabajo 165 horas. Maquina con bajo nivel del fluido hidráulico por ruptura en manguera.

El hodómetro de esta máquina dejo de marcar desde el mes de mayo de 2024. Los tiempos de trabajo los calcula el operador de la máquina.

En este mantenimiento se cambia aceite y filtros al motor, nivelación del fluido hidráulico, quedando la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Para este período la maquina tipo **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F2 - CAT0416FPLBF05794,** se encontraba en taller para revisiones varias, máquina para revisión de las catalinas, maquina con bajo nivel del fluido hidráulico por revisión en empaquetaduras de gatos.

Se procedió a realizar la nivelación del fluido de las catalinas, nivelación de la transmisión y mandos delanteros, y nivelación del fluido hidráulico, dejando de esta manera la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período la máquina **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX - SMFH44TC0EDHM3672**, presentó bajo nivel del fluido hidráulico por ruptura en manguera.

Se procedió a realizar la nivelación del fluido hidráulico, dejando así la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período la máquina **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX - SMFH44TC0EDHM3675**, se encontraba en taller para cambio de mangueras de presión hidráulica, lo que genero perdida de todo el fluido hidráulico. Máquina para cambio del fluido de la transmisión delantera.

Se procedió a realizar el cambio del fluido hidráulico y cambio del fluido de la transmisión delantera, dejando la maquina en adecuadas condiciones para un normal funcionamiento.

La máquina tipo **VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR – CATCS44BARGE00146**, durante este período presentó filtros de combustible obstruidos por partículas de suciedad. Maquina con bajo nivel del fluido hidráulico por ruptura en manguera.

Se procedido a realizar el cambio de los filtros de combustible y a realizar la nivelación del fluido hidráulico dejando así la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

Durante este período la maquina **VIBROCOMPACTADOR BOMAG – 101584101003**, presentó bajo nivel del fluido hidráulico por ruptura en manguera.

Se procedido a realizar la nivelación del fluido hidráulico, dejando así la maquina en adecuadas condiciones para su normal funcionamiento.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

✓ **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU-253**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU-254**

SOPORTE FOTOGRAFICO

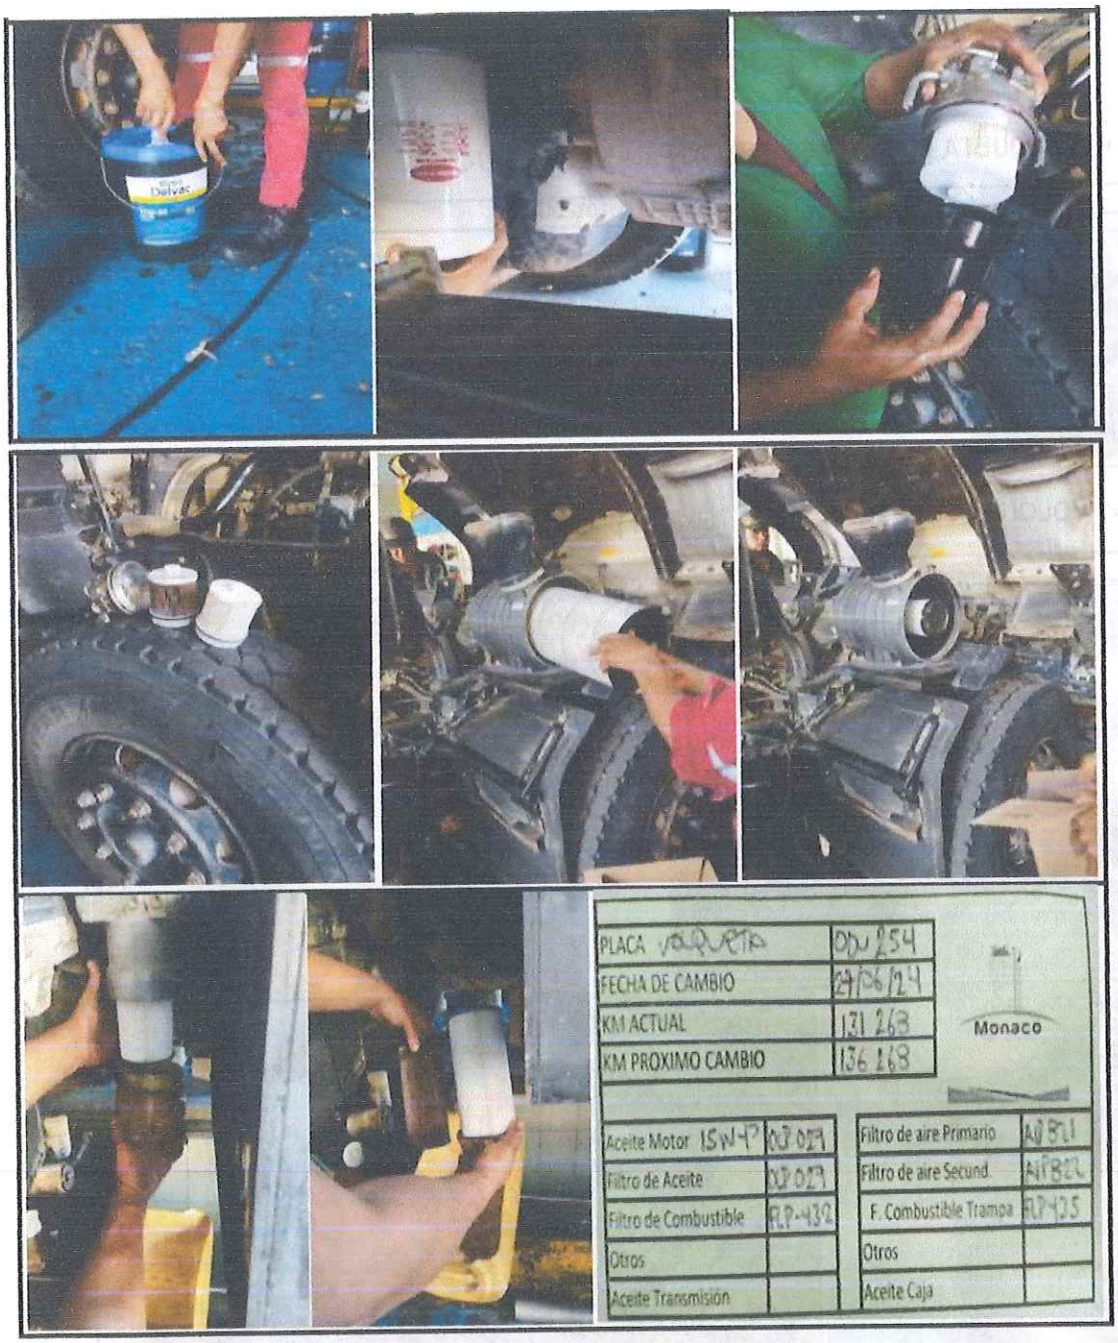
PLACA VOLQUETA ODU 254
FECHA DE CAMBIO 29/06/24
KM ACTUAL 131 263
KM PROXIMO CAMBIO 136 168
Monaco
Aceite Motor 15W-40 03 029
Filtro de Aceite 03 029
Filtro de Combustible RP-430
Otros
Aceite Transmisión
Filtro de aire Primario AP 861
Filtro de aire Secund AP 862
F. Combustible Trampa RP 425
Otros
Aceite Caja

✓ **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU-255**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **VOLQUETA CHEVROLET FTR 700 P de placas ODU 259**

SOPORTE FOTOGRAFICO

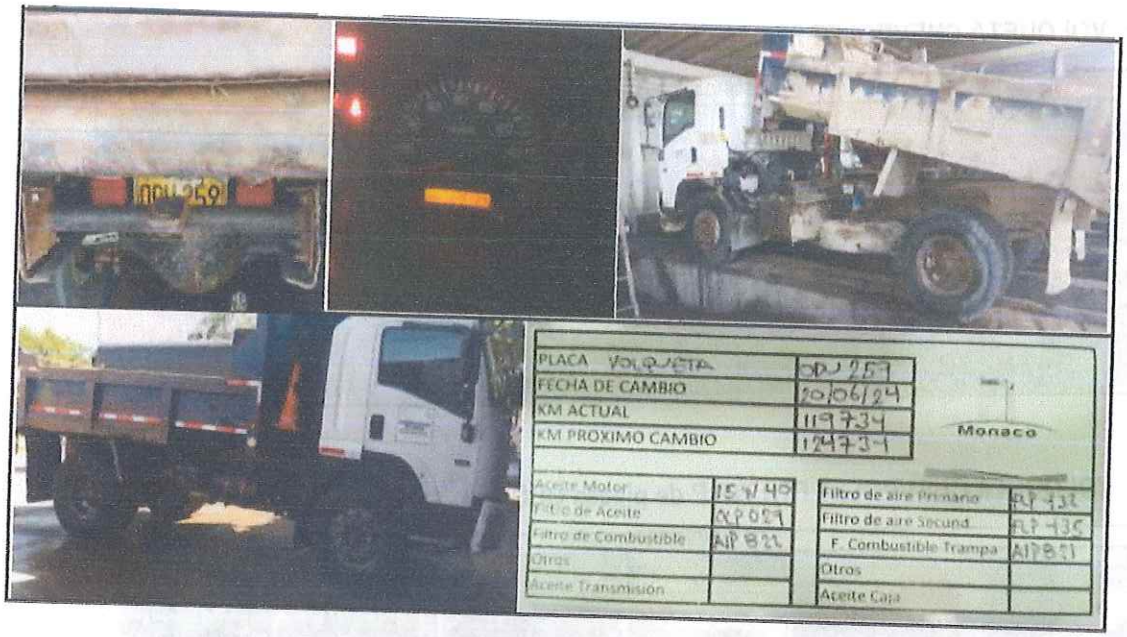

✓ **VOLQUETA MERCEDEZ BENZ / DOBLE TROQUE de placas ODU 321**

PLACA VEHICULO PRESTADO	ODV 221
FECHA DE CAMBIO	25/06/22
KM ACTUAL	180094
KM PROXIMO CAMBIO	54.094

✓ **VOLQUETA MERCEDEZ BENZ / DOBLE TROQUE de placas ODU 322**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **TRACTOCAMIÓN INTER 7600 CON CAMA BAJA – ODU 256**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **CARROTANQUE CHEVROLET FVR – ODU 257**

SOPORTE FOTOGRAFICO

PLACA CARROTANQUE	TDJ 259
FECHA DE CAMBIO	11/26/21
KM ACTUAL	49776
KM PROXIMO CAMBIO	52-776

Monaco

Aceite Motor	15w40	Filtro de aire Primario	
Filtro de Aceite	LF 023	Filtro de aire Secund	
Filtro de Combustible	FF-426	F. Combustible Trampa	FH 426
Otros		Otros	
Aceite Transmisión		Aceite Caja	

✓ **MOTONIVELARDORA CATERPILLAR - CAT0120KTSZN01492**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **MOTONIVELARDORA CATERPILLAR - CAT0120KCSZN01488**

SOPORTE FOTOGRAFICO

351-7150
HOURS
CAT

✓ **EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210 - LBX210QSNDHEX2113**

PLACA ORUGA 213
FECHA DE CAMBIO 5/06/24
KM ACTUAL Horas 6728
KM PROXIMO CAMBIO Horas 6.978
Monaco
Aceite Motor 15 w40
Filtro de Aceite ✓
Filtro de Combustible ✓
Otros Mallas finales ✓
Aceite Transmisión
Filtro de aire Primario ✓
Filtro de aire Secund. ✓
F. Combustible Trampa ✓
Otros Filtro AC ✓
Aceite Caja
Mobil Delvac

Mobil
Delvac
4gls

✓ **EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LINK BELT 210 - LBX210QSNDHEX2095**

SOPORTE FOTOGRAFICO

PLACA	QRU60A	2095	
FECHA DE CAMBIO		5/06/24	
KM ACTUAL	Horas	9011	
KM PROXIMO CAMBIO	Horas	9261	
Aceite Motor	15w40	Filtro de aire Primario	✓
Filtro de Aceite	✓	Filtro de aire Secund.	✓
Filtro de Combustible	✓	F. Combustible Trampa	✓
Otros Hordas Rotulas	✓	Otros filtro A/C	✓
Aceite Transmisión		Aceite Caja	

✓ **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F - CAT0416EKMFG06501**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F - CAT0416EPMFG06500**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416F2 - CAT0416FPLBF05794**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX - SMFH44TC0EDHM3672**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX - SMFH44TC0EDHM3675**

SOPORTE FOTOGRAFICO

✓ **VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR – CATCS44BARGE00146**

✓ **VIBROCOMPACTADOR BOMAG – 101584101003**

SOPORTE FOTOGRAFICO

ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL
R.L.

Centro de Servicios
LUBRIFIL

LA SUSCRITA GERENTE

CERTIFICA QUE:

Hemos recibido de la Empresa **INGENIERÍAS MÓNACO ZOMAC SAS**, identificada con **NIT. 901.159.195-1** los aceites usados y filtros de los cambios realizados a la maquinaría asistida dentro del contrato No. 085 del 15 de abril de 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 649 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P", durante el mes de junio de 2024.

Igualmente se informa que CENTRO DE SERVICIOS LUBRIFIL envía dichos residuos a disposición final a la Empresa Engineers SAS con NIT. 901.181.872-1, ubicada en el Municipio de Neiva – Huila.

La presente se expide a solicitud del interesado.

Gladys Bonilla R

GLADY BONILLA RUÍZ
Gerente

Carrera 7 No. 12 – 85 Sur
Zona Industrial
Tel: 867 9651 - Cel: 317 510 7803
Email: lubrifilneiva@hotmail.com
lubrifilneivacomercial@hotmail.com
Neiva – Huila, Colombia

A&E ENGINEERS S.A.S
Nit. 901 181 872-1

Fecha de Expedición 17/06/2024

RTP- N- 2212

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

A&E ENGINEERS SAS. certifica recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento y/o disposición final de residuos líquidos, en conformidad a licencia ambiental numero 3824 y oficio No. 20221020007001 del 27 de diciembre de 2021 emitido por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM.

TIPO DE EMPRESA	GENERADOR
NOMBRE EMPRESA	LUBRIFIL - LA SEPTIMA
NIT/CC	7702749
DIRECCION	CRA 7 # 12-85
TELEFONO	3175107803
E-MAIL	lubrifilneiva@hotmail.com

FECHA DEL SERVICIO	6/13/2024
HORA DEL SERVICIO	9:00:00 AM
LUGAR DEL SERVICIO	NEIVA

CLASIFICACION DE RESIDUO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GALONES	PESO KILOGRAMOS	REMISION DE RECOLECCION	DISPOSITOR FINAL
Y8	ACEITES USADOS	220	732,60	5144	A&E ENGINEERS SAS

El aceite recibido, fue debidamente tratado cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio de Ambiente establecido en el Art. 1 de la resolución No. 1446 el 5 de octubre de 2005; a través del proceso de sedimentación, filtración y centrifugación. Su tratamiento fue 15/junio/2024 -13:04 Horas. El aceite contaminado entregado, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

El presente certificado se expide y entrega por única vez de manera física o digital por lo que la copia o réplica del mismo generara un costo adicional

LUIS FELIPE PUENTES MEDINA
INGENIERO DE CALIDAD

PLANTA
Km 8 Vía Rivera - Huila
Email: operaciones@ayeingenieros.com
Teléfono: 3105760142

OFICINA PRINCIPAL
Calle 68 No. 5-30 Neiva - Huila
Email: gerencia@ayeingenieros.com
Teléfono: 311 8736858
