ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA"

FECHA	20 de diciembre 2023.
LUGAR	Instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en el Centro Comercial Zulia segundo piso Fuerte Militar Tolemaida Nilo - Cundinamarca.
HORA	2:00 P.M
INTERVIENEN	NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN Profesional de defensa Supervisor de contrato de obra No. 035-2023 NELSON YESID RUBIO GARZON Representante Legal ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
ASUNTO	Recibo Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Tolemaida

DATOS GENERALES:

- Número del contrato: 035-2023
- Objeto del contrato**:** Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Tolemaida.
- Valor incluida adición: $373.911.004,42
- Contratista: ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
- Fecha de aprobación de garantías: 11 de septiembre y 20 de diciembre de 2023
- Plazo de ejecución: Hasta 22 de diciembre de 2023
- Supervisor: Nixon Hernando López Perdigón


ÍTEMS CONTRATADOS

CONDICIONES CONTRACTUALES			ACUMULADA
NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANT.
1,01	Demolición de muros en drywall, incluye empaque y disposición final certificada.	m2	241,86
1,02	Desmonte de cielo raso, ajuste de estructura con tensores a estructura superior y modulación con perfileria adicional y laminas adicionales para el cielo raso que no se desinstala.	m2	139,75
1,03	Demolición de piso cerámico existente.	m2	67,51
1,04	Desmonte de lámparas LED instaladas	un	62,00
1,05	Demolición de mamposteria. Incluye cargue y retiro con disposición final certificada.	m2	8,28
1,06	Retiro de cableado UTP y electrico	m	320,00
1,07	Desmonte de salidas de voz y datos	un	0,00
1,08	Desmonte de salidas normales y reguladas	un	39,00
1,09	Construcción de muro en bloque #4	m2	16,50
1,10	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	33,00
1,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	15,98
1,12	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	m	348,28
1,13	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	47,19
1,14	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	178,75
1,15	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24, lámina de panel yeso de 1/2"; acabado con tratamiento para juntas indicado; con una capa de pintura vinílica tipo 2	m2	139,75
1,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	113,00
1,17	Cortinas enrollables screen	m2	120,00
1,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	556,77

1,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	25,00
1,20	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	17,85
1,21	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	89,00
1,22	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución, ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
1,23	Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm)	un	3,00
1,24	Tablero de 6 circuitos monofásico	un	0,00
1,25	Suministro e Instalación breaker X30A	un	42,00
1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED CUADRADA DE 60X60 CMS DE 45VA/120V IP 22 CON FLUJO LUMINOSO DE 3200 LM, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	57,00
1,27	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	37,00
1,28	Adecuación eléctrica para la instalción de 18 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
1,29	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00
NP	**OBRA NO PREVISTA**		
NP-01	Suministro e instalacion de ceramica piso / pared	m2	58,93
NP-02	Suministro e instalación sanitario	un	3,00
NP-03	Suministro e instalación lavamanos con pedestal incluye griferia	un	3,00
NP-04	Construcción placa en metaldeck incluye cargue o alistado de piso	m2	15,55
NP-05	Mantenimiento filtraciones en cubierta, incluye cambio de tejas en mal estado y ajuste de entramado de las mismas	GL	1,00
NP-06	Suministro e instalación bandeja porta cable	m	36,83
NP-07	Suministro e instalación tablero de 42 circuitos	un	1,00
NP-08	Alimentador eléctrico 3x1/0F+1x2/0N+1x4T	m	20,00
NP-09	Protección tipo totalizador 3x150A para tablero contadores y tablero distribución	un	1,00

NP-10	Protección enchufable 3x40/60A para tablero distribución	un	2,00
NP-11	Protección enchufable 2x20A	m	18,00
NP-12	Adecuación y mantenimiento correctivo de tablero Piso 1, distribución eléctrica, incluye barrajes en lámina de cobre con codigo de colores acorde a la carga	un	1,00
NP-13	Sistema de puesta a tierra compuesto por 3 varillas Cu/Fe y cable desnudo No.4 incluye conector y conexión hasta piso 2	ml	1,00
NP-14	Tramites, suministro de contador trifásico de 3/100A certificado según comercializador eléctrico. Incluye mantenimiento general con cambio de barrajes de fases (R-S-T) y neutro.	un	1,00
NP-15	Suministro e instalación de puerta principal de acceso incluye cerradura y todo el material para su correcto funcionamiento	un	1,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

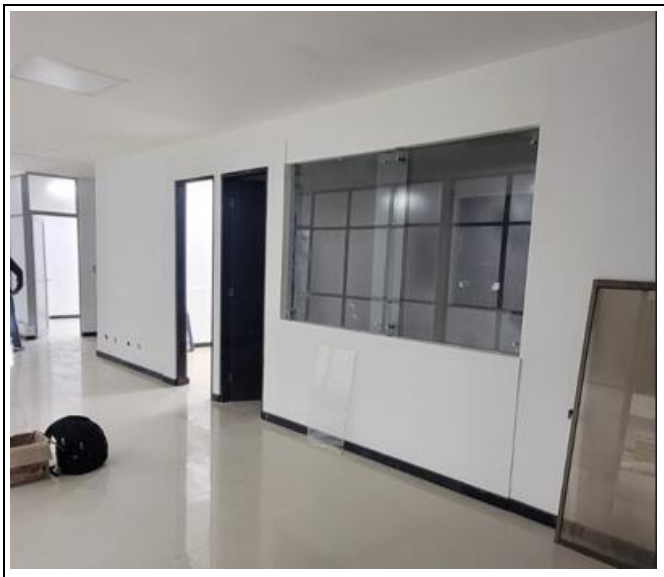















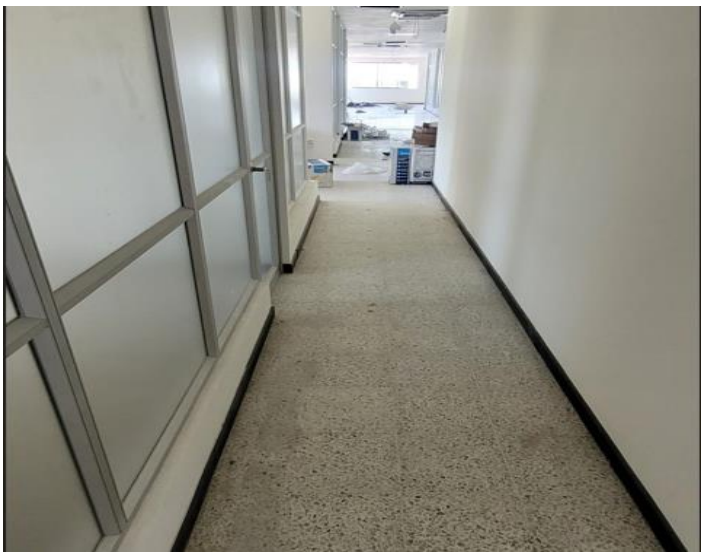



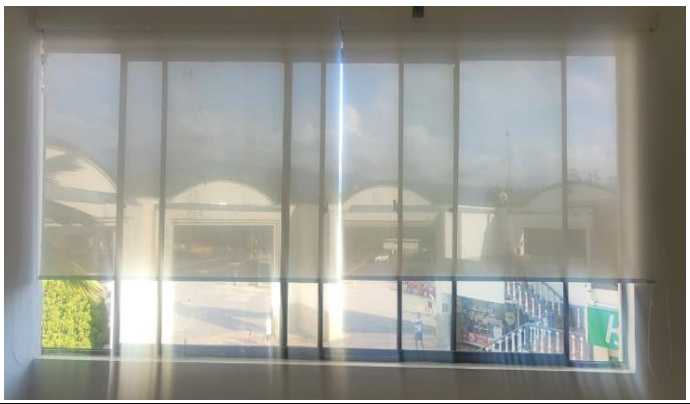

No siendo otro el objeto de la presente acta para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 20 de diciembre de 2023.

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor de contrato No. 035-2023

ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
NIT 901.503.062-4
NELSON YESID RUBIO GARZON
Representante legal.
