Corpoboyacá
Región Estratégica para la Sostenibilidad

INFORME No.11
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CNV 2023 021

Fecha: 01 al 31 de mayo de 2024.

CONVENIO:	CNV 2023-021		
INTEGRANTES DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE TOTA CORPOBOYACA		
EJECUTOR DEL CONVENIO:	MUNICIPIO DE TOTA		
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, ENTRE CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE TOTA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE , AHORRO DEL AGUA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO", EN MARCO DE LA LÍNEA DEL PLAN DE ACCIÓN "CONSERVACIÓN, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA" EN EL PROGRAMA "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "USO EFICIENTE DEL AGUA" DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.		
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	28 de junio de 2023		
SUPERVISOR CORPOBOYACA	Amílcar Iván Piña Montañez	**Fecha Delegación**	03/05/2024
SUPERVISOR MUNICIPIO	Johan Sebastián Gualdron Riaño	**Fecha Delegación**	02/01/2024
FECHA ACTA DE INICIO	21 de Julio de 2023		
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cuatro (04) meses, a partir de la firma de FGC-03 acta de iniciación.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 de noviembre de 2023		
FECHA SOLICITUD DE PRÓRROGA 1	15 de noviembre de 2023		

TIEMPO DE PRORROGA 1	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACION	20 de diciembre de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO	Cinco (5) meses
FECHA SOLICITUD DE PRÓRROGA 2	14 de diciembre de 2023
TIEMPO DE PRÓRROGA 2	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACION	20 de enero de 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO	Seis (6) meses
FECHA SOLICITUD DE PRÓRROGA 3	16 de enero de 2024.
SUSPENSIÓN 1	A partir del 19 de enero de 2024.
TIEMPO REAL DE SUSPENSIÓN 1	Trece (13) días
ACTA DE REINICIO	01 de febrero de 2024
FECHA MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3	01 de febrero de 2024
TIEMPO DE PRÓRROGA 3	Tres (3) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 de mayo de 2024
FECHA SOLICITUD DE PRORROGA 4	29 De abril de 2024
TIEMPO PRORROGA 4	Dos (2) meses
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO	once (11) meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN REAL	2 de julio de 2024

INFORMACIÓN FINANCIERA

APORTANTE	VALOR
APORTE CORPOBOYACÁ	$176.876.453
APORTE MUNICIPIO DE TOTA	$59.642.154
VALOR INICIAL CONVENIO	**$236.518.607**
DESEMBOLSO N°1 CORPOBOYACA – 20%	$ 35.375.291
DESEMBOLSO N°2 CORPOBOYACA – 30%	$ 53.062.936
DESEMBOLSO N°3 CORPOBOYACA – 40%	$ 70.750.581
DESEMBOLSO N°4 CORPOBOYACA – 10%	$ 17.687.645

DESEMBOLSOS CORPOBOYACÁ	VALOR
DESEMBOLSO N°1 CORPOBOYACA – 20%	$ 35.375.291
DESEMBOLSO N°2 CORPOBOYACA – 30%	$ 0
DESEMBOLSO N°3 CORPOBOYACA – 40%	$ 0
DESEMBOLSO N°4 CORPOBOYACA – 10%	$ 0
SALDO POR PAGAR RECURSOS CORPOBOYACÁ – 80%	$141.501.162

INFORMACIÓN TÉCNICA

% AVANCE	
% de Avance ejecutado	80%
Estado Actual	EJECUCIÓN

El porcentaje de avance ejecutado es según lo informado por parte del Municipio en el Comité Técnico correspondiente al mes de mayo de 2024.

OBLIGACIONES DEL CONVENIO	AVANCES	FUENTE DE VERIFICACION
1. Firmar el convenio de conformidad con lo establecido en los documentos de contratación de la Corporación y presentar la documentación requerida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que sea entregado el convenio para su firma.	100%	Convenio interadministrativo CNV 2023-021.
2. Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la		No Aplica

Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Segundad Social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales, según el caso.		
3. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por Corpoboyacá, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del convenio.		No aplica
4. Informar oportunamente al comité técnico, las novedades administrativas, técnicas, jurídicas, legales y/o financieras que se puedan llegar a presentar con ocasión a la ejecución del convenio, así como allegar la información correspondiente que se requiera para trámites en atención al debido proceso.		No aplica
5. De manera autónoma e independiente, bajo sus propios medios se obliga a ejecutar a cabalidad el objeto del convenio, las actividades previstas para su desarrollo y cumplir con las derivadas del mismo.	80%	Proceso Número: MTSUB-007-2023. Reinicio 19-02-2024
6. Tramitar en atención al debido proceso, todos los requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto del convenio.		No aplica
7. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del convenio y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando dilataciones innecesarias.		No aplica
8. Defender en todas sus actuaciones los intereses de CORPOBOYACA y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales guardando la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás información que le sean suministrados por la entidad.		No aplica
9. Cumplir con el objeto del convenio en		Contrato MTSUB-007-2023. En

términos legales, jurídicos, presupuestales, técnicos y administrativos, con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad.		ejecución
10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto del convenio, que garanticen su cabal y oportuna ejecución y/o que sean determinadas por el supervisor.		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO DE TOTA.		No aplica
1 Garantizar el uso de los recursos del convenio para su respectiva ejecución, de conformidad las condiciones jurídicas, técnicas, presupuesto, lugar de ejecución, cantidades, especificaciones técnicas, cronograma y demás componentes contractuales debidamente formalizados en atención al debido proceso.	100%	Proceso Número: MTSUB-007-2023. Reinicio 19-02-2024
2 Constituir las garantías pactadas en el convenio. El municipio deberá garantizar que las garantías estén vigentes durante toda la ejecución del convenio, para ello, deberá prever que la sociedad aseguradora que garantice el convenio no limite el tiempo asegurado a la vigencia del contrato de seguro.	100%	Póliza N. 3002320 de LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DESEGUROS – NIT 860.002.400-2.
3 Cumplir con el objeto del convenio de manera responsable e idónea, realizándolo de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio.	35%	No aplica
4 Realizar el aporte en especie por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS **($59.642.154).**	100%	Aporte en especie, mano de obra y vehículo para trasportar los materiales.
5 Abrir una cuenta bancaria a nombre		BANCO DE BOGOTA – Cuenta de ahorros **No.596566299** - MUNICIPIO DE TOTA –

	del convenio para uso exclusivo de los recursos girados por CORPOBOYACÁ y aportar certificación bancaria antes de que se suscriba el acta de inicio correspondiente.	100%	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CNV 2023-021 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOTA. Con fecha de apertura el 04/07/2023.
6	Todas las acciones relacionadas con el gasto de estos recursos deben ser informadas al supervisor del presente convenio.		NA
7	Garantizar la ejecución del proyecto y objeto del convenio, de conformidad con el presupuesto, lugar, especificaciones técnicas.	90%	Proceso Número: MTSUB-007-2023. SECOP I.
8	Adelantar los procesos de contratación necesarios para la ejecución del proyecto aprobado por la Corporación, bajo los lineamientos del estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y especialmente lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política que dispone: "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad".	100%	Detalle del Proceso Número: MTSUB-007-2023. Objeto a contratar: SUMINISTRO DE PAQUETES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE, AHORRO DEL AGUA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE TOTA BOYACÁ", EN EL MARCO DEL CONVENIO CNV 021 DEL 2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE TOTA - Cuantía a contratar $ 176,876,453.
9	Realizar la supervisión del convenio y de los contratos derivados del mismo, atendiendo el debido proceso en atención a las funciones establecidas en el manual de supervisión e interventoría que aplique según disposición del municipio y/o la corporación, así como las demás normas pertinentes de acuerdo a la naturaleza de sus funciones; así mismo, debe allegar el acto administrativo a través del cual se		Los supervisores del presente convenio por parte de CORPOBOYACÁ y el Municipio de Tota se encuentran relacionados en el encabezado de la presente acta en la casilla SUPERVISOR

delega la supervisión.		
10 Rendir informes mensuales de ejecución del convenio en todas sus etapas y con los soportes técnicos, jurídicos, legales, financieros, ambientales y administrativos requeridos, en los cuales se refleje el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio, de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos de CORPOBOYACÁ y/o el comité técnico y/o los entes de control o cualquier otra entidad que los requiera. Dichos informes deberán ser entregados dentro de los CINCO (05) primeros días calendario de cada mes a la corporación para archivo y fines pertinentes. De igual manera, presentar informes extraordinarios en caso de ser requeridos, facilitando la vigilancia del convenio y/o de los contratos derivados.		A la fecha no se ha dado cumplimiento por parte del Municipio en la entrega de los informes, la supervisión lo requirió mediante el oficio No. 160-7247 del 14 de mayo de 2024, y mediante comité técnico correspondiente al mes de mayo.
11 Aportar y/o gestionar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminación y cumplimiento del alcance del presente convenio cuando se requieran ajustes o actividades no programadas, costos adicionales originados por causas no atribuibles a las partes o se requiera cualquier otro valor adicional no establecido en el presupuesto del proyecto presentado por el municipio y legalizar las modificaciones y/o ajustes correspondientes en atención al debido proceso.		NA
12 Garantizar que durante la ejecución del convenio se ejecuten las buenas prácticas de ingeniería para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.	90%	
13 Garantizar el uso, operatividad y funcionamiento de los kits, de acuerdo a los estudios y diseños, una vez entregadas y recibidas a satisfacción.	90%	Proceso Número: MTSUB-007-2023. I Reinicio 19-02-2024

		MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 al convenio 2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024. Plazo 3 meses
14 Asumir junto con los contratistas seleccionados para la ejecución de convenio, la responsabilidad en cuanto a calidad de materiales, cantidades, cumplimiento a los diseños y especificaciones técnicas, en atención a sus competencias, librando a CORPOBOYACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecución y/o posterior al recibo de los productos. El municipio deberá señalar la anterior anotación en cada acta parcial, acta de recibo final, acta de liquidación y en cada informe.		NA
15 Asumir en su calidad de ejecutor, la responsabilidad de cualquier proceso de tipo legal que se pueda generar con ocasión a la ejecución de los contratos derivados del convenio y de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ellos cause perjuicio a CORPOBOYACA o a terceros.		NA
16 Ejercer la secretaría del comité técnico del convenio actuando como nexo entre las partes, en atención a sus funciones: elaborar el plan operativo y cronograma del convenio y socializarlo para aprobación; realizar convocatorias, asistir a mesas de trabajo, visitas y/o comités; elaborar actas e informes que surjan durante la ejecución del convenio; realizar seguimiento y gestión al cumplimiento de compromisos; resguardar el archivo correspondiente, todo en atención al debido proceso.	90%	En el mes de mayo, se realizó comité técnico el día 21 de mayo de 2024 en el municipio de Tota.
17 Efectuar en tiempo real el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del convenio y/o de los contratos derivados y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes con el fin de garantizar la calidad de los trabajos y/u ordenar las correcciones a que haya lugar dentro de los términos establecidos para tal	90%	Acta de reinicio de fecha 19 -02-2024, contrato derivado Proceso Número: MTSUB-007-2023

	fin.		
18	Imponer sanciones de apremio, con observancia y atención al debido proceso, de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o total de las obligaciones de los contratos que se suscriban para la ejecución del convenio y si es el caso, adelantar las acciones prejudiciales y judiciales a que haya lugar y/o la recuperación de los recursos y al resarcimiento de los perjuicios irrogados, informando a la CORPORACIÓN toda acción que se adelante al respecto.		NA
19	Estudiar las sugerencias, reclamaciones, consultas e indicadores que surjan en virtud de la ejecución de los contratos derivados, sobre aspectos técnicos, y resolver oportunamente en atención a sus competencias.		SECOP I Proceso Número: MTSUB-007-2023, Acta de reinicio de fecha 19 -02-2024
20	Autorizar los pagos a los contratistas derivados del convenio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos.		NA
21	Entregar para cada desembolso, enumeración, descripción y certificación de cumplimiento parcial y/o total de cada una de las obligaciones adquiridas por el municipio como ejecutor con ocasión al convenio. De igual manera, y en su calidad de supervisor, certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones adquiridas por los contratistas resultantes de los procesos derivados del convenio, junto con los respectivos soportes.		NA
22	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro de acuerdo a las actas parciales y forma de pago definida en la minuta del convenio	20%	El municipio radicó ante Corpoboyacá cuenta de cobro primer desembolso por el 20% del aporte al convenio. Egreso No. 2023004096 de 30/10/2023
23	Garantizar la operación, mantenimiento,		MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 al convenio

	funcionalidad y sostenibilidad del proyecto una vez se formalice la terminación del convenio, de acuerdo a certificado de sostenibilidad.		2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024.
24	En caso de que el municipio no ejecute los recursos económicos estos deben ser reintegrados a CORPOBOYACÁ con sus rendimientos financieros previo a la liquidación del convenio.		NA
25	Requerir a los contratistas resultantes de los procesos de contratación, que cumplan en caso de ser necesario las medidas de bioseguridad y garantizar el cuidado y la protección tanto del personal contratista como de los beneficiarios del proyecto.		NA
26	Facilitar la vigilancia de las entidades de control y entregar la información que estas requieran en los términos establecidos.		Informes Convenio 2023-021
27	Participar a través del supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se realicen para el seguimiento del presente convenio.		Los supervisores del presente convenio por parte de CORPOBOYACÁ y el Municipio de Tota se encuentran relacionados en el encabezado de la presente acta en la casilla SUPERVISOR.
28	Concurrir oportunamente para la liquidación del convenio en cumplimiento de la normatividad vigente.		NA
29	Solicitar modificaciones, adición y/o prórroga al convenio en caso de ser necesario, atendiendo el debido proceso.		MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 al convenio 2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024. Plazo: 02-05-2024
30	Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las actividades del convenio y demás compromisos		MODIFICATORIO No. 1 Y

	adquiridos debidamente planeados, a fin de compararlos con las presentadas en el proyecto aprobado por el banco de proyectos de la Corporación. En caso de discrepancia el supervisor por parte del Municipio notificará a las Entidades que hacen parte del convenio las modificaciones requeridas y establecerá su incidencia en la planeación y el presupuesto del proyecto.		PRÓRROGA No. 3 al convenio 2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024.
31	Poner a disposición de los contratistas que resulten seleccionados, la documentación de tipo técnico, legal, jurídico, presupuestal, financiero, ambiental, licencias, permisos y/o servidumbres y/o los bienes o lugares que se requieran para el desarrollo del proyecto. Así mismo, gestionar las acciones respecto de similares, en caso de que por razones extraordinarias se requieran, previo a la suscripción de las actas de inicio de los contratos derivados del mismo.		NA
32	Articular con quién competa las actuaciones correspondientes para gestión y/o uso de los permisos de servidumbre y/o permisos ambientales y/o demás actuaciones a las que haya lugar, teniendo en cuenta terceros tales como: comunidad, CMGRD, municipio, corporación, juntas y/u otros, en el marco de la ejecución del convenio.		NA
33	Socializar del proyecto con la comunidad e invitar para que se constituyan en veeduría ciudadana.	100%	NA
34	Garantizar la ejecución física del convenio durante el plazo contractual de acuerdo al control y seguimiento de		MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 al convenio

	la programación de las actividades establecidas, en caso que se requieran planes de acción y/o contingencia tales como prórrogas debidamente argumentadas, el municipio debe poner en conocimiento de CORPOBOYACÁ y adelantar las acciones legales correspondientes en atención al debido proceso, mínimo con quince (15) días hábiles de anticipación a la terminación del plazo contractual.		2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024
35	Atender los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones que realice CORPOBOYACÁ dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicado de la petición y/o de acuerdo a la fecha establecida para tal fin, entendiendo que estos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos.		NA
36	Formalizar con el ordenador del gasto y/o la Subdirección de Planeación y sistemas de información (Banco de Proyectos) de la Corporación, cuando aplique, y en atención al debido proceso, las solicitudes de modificación, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevea la normatividad vigente.		MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 3 al convenio 2023-021 de fecha 01 de febrero de 2024.
37	Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentación derivada de la contratación y ejecución del convenio y garantizar su disponibilidad a CORPOBOYACÁ., como para los organismos de control. Esto incluye la información relacionada con los procesos de contratación, informes de visita y de seguimiento del proyecto, facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de	90%	Se cuenta con carpeta en física, donde se archiva todos los documentos relacionados con el convenio No aplica

gestión, soportes de autorización de pago, entre otros.		

PRODUCTOS A ENTREGAR	AVANCES	FUENTE DE VERIFICACION
1. Informe de selección sobre la cantidad de beneficiarios de los kits de recolección de aguas lluvias, Encuestas, Visitas e información general sobre la vivienda a instalar el kit de recolección de aguas lluvia.		Para el 31 de mayo no se han entregado informes por parte del municipio
2. Informe dentro del cual se evidencie registro fotográfico y listado de asistencia a las capacitaciones realizadas a la comunidad beneficiaria.		A la fecha no se ha entregado informe de evidencia por parte del Municipio.
3. Contrato suscrito por el Municipio.	**100%**	Clausulado del CNV 2023-021 con el municipio de TOTA.
4. Informe dentro del cual se evidencie registro fotográfico y listado de entrega de los kits de recolección de aguas lluvias.		No aplica
5. Informe dentro del cual se evidencie registro fotográfico de instalación de los kits de recolección de aguas lluvias.		No aplica

6. Informe dentro del cual se evidencie registro fotográfico del funcionamiento de los kits de recolección de aguas lluvias, actas de visita y bitácoras.		No aplica
7. Acta de las visitas realizadas a cada uno de los beneficiarios.		
INFORMES MENSUALES: El municipio realizará informes de la ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, en los cuales se refleje el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio, los cuales deberán ser presentados a la CORPORACIÓN con los respectivos soportes, actas y comunicaciones a que haya lugar.		No aplica Mediante correo electrónico de fecha 02 de noviembre el municipio presenta informes del mes de agosto y septiembre de 2023. A la fecha del presente informe el Municipio en calidad de ejecutor no ha allegado los informes correspondientes.
INFORME FINAL: Se deberá reflejar el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio en un cien por ciento (100%), por lo cual deberá contener:		No aplica
Documento técnico con el resumen de las actividades ejecutadas donde se describa las metas alcanzadas.		
a. Informe final financiero sobre la inversión de los recursos del convenio, en donde se aclaren las inversiones realizadas con los recursos de Corpoboyacá y los		No aplica

recursos aportados por el municipio, con los respectivos soportes, con base en las actividades y estrategias de ejecución. b. Anexo fotográfico, plano con la ubicación de cada uno de los beneficiarios, cuadro de coordenadas, organizado por cada actividad del convenio. c. Informe administrativo final que deberá incluir todas las acciones realizadas durante la ejecución, además, la relación y soportes de las actas de liquidación de los contratos derivados del Convenio.		No aplica No aplica No aplica

GARANTIAS:

REQUISITO	VALOR		VIGENCIA		TIPO DE ACTUALIZACION	CUMPLE / NO CUMPLE	APROBADO / NO APROBADO
	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA			
Cumplimiento	Cuarenta por ciento 20% del valor del convenio	47.303.721	28-06-2023	29-04-2023	**Firma convenio**	CUMPLE	APROBADO

No se han actualizado las pólizas de acuerdo con las modificaciones realizadas.

TRAZABILIDAD (MENSUAL):

- El día 14 de mayo de 2024 mediante oficio de salida No. 160-007247 se solicita a la alcaldesa y al supervisor del Municipio de Tota la siguiente información del convenio CNV 2023-021.

  - Pólizas establecidas en la Munita del Convenio donde se inclúyanlas modificaciones realizadas al mismo
  - Informes mensuales de supervisión en marco del convenio CNV 2023-021
  - Delegación de la supervisión por parte del Municipio de Tota.


- El día 21 de mayo de 2024 se realiza visita a beneficiarios de los kits de aguas lluvias en la vereda Toquecha a fin de verificar su instalación y funcionamiento, sé revisan 6 kits de aguas lluvias instalados.


- El día 21 de mayo de 2024 se realiza comité técnico en el cual se dejan establecidos los siguientes compromisos a cumplir por parte del Municipio de Tota:


  - Por parte del Municipio se comprometen a enviar pólizas correspondientes al Convenio CNV 2023-021 a mas tardar el día 24 de mayo de 2024, así mismo la delegación de supervisión por parte del municipio de Tota.
  - Por parte del Municipio se comprometen enviar los informes hasta el mes de abril a mas tardar el 31 de mayo de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VERIFICACIÓN INSTALACIÓN KITS AGUAS LLUVIAS

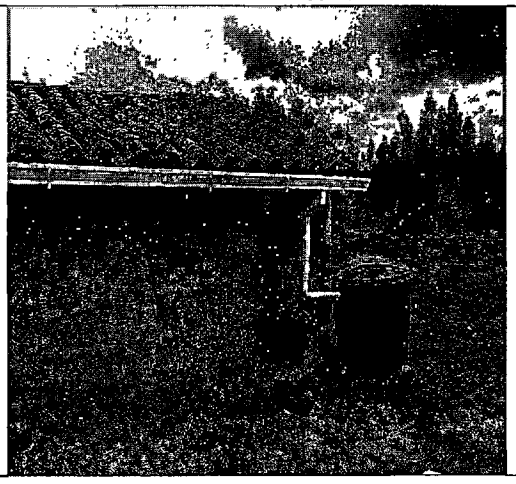

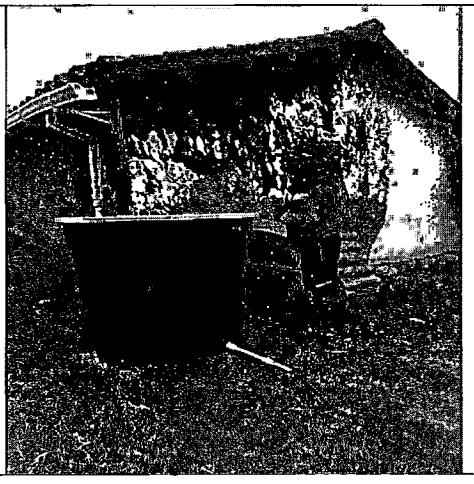

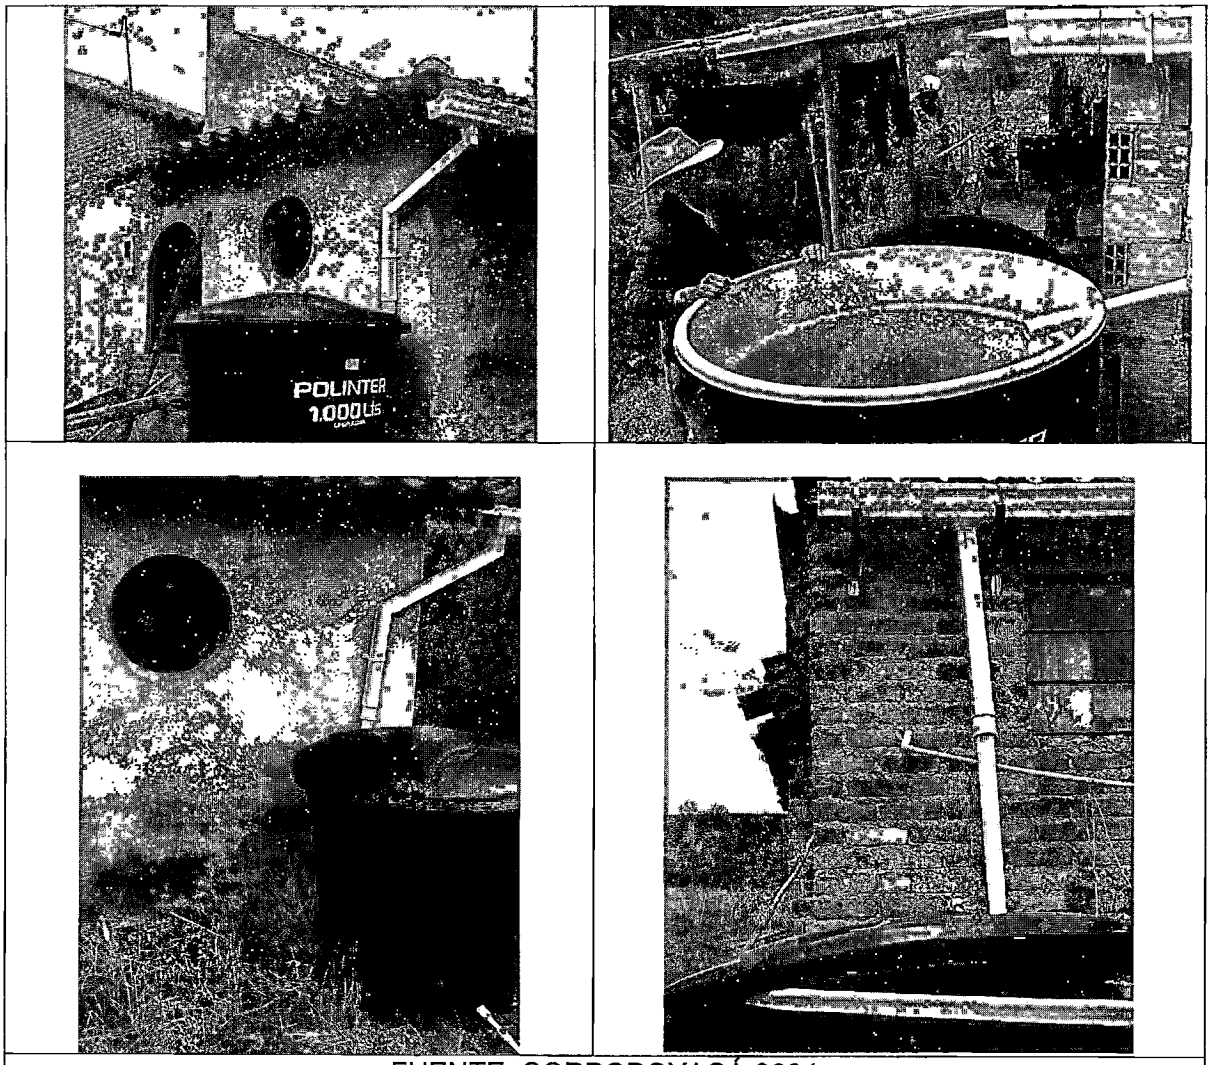

FUENTE: CORPOBOYACÁ 2024

Se firma a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.

AMÍLCAR IVÁN PIÑA MONTAÑEZ	EMIL RIQUELMEN CUERVO	KAREN VANESSA ROJAS
Supervisor CNV 2023-021	Apoyo a la supervisión CNV 2023-021	Apoyo a la supervisión CNV 2023-021
