**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN LAS INSTALACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL EN MANIZALES."**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 18 de noviembre 2023. |
| **LUGAR** | Las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en el Batallón de Infantería No.22 Batalla de Ayacucho en Manizales - Caldas |
| **HORA** | 2:00 P.M |
| **INTERVIENEN** | NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN<br>Profesional de defensa<br>Supervisor de contrato de obra No. 039-2023<br><br>MANUEL RICARDO LUNA MACA<br>Representante Legal<br>PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA |
| **ASUNTO** | Recibo Adecuaciones de la infraestructura fisica para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Manizales UAEJPMP |

**DATOS GENERALES:**

- Número del contrato: 039-2023
- Objeto del contrato**:** Adecuaciones de la infraestructura fisica para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Manizales.
- Valor: $63.057.339,16
- Contratista: PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA
- Fecha de aprobación de garantías: 19 de septiembre de 2023
- Plazo de ejecución: Hasta 18 de noviembre de 2023
- Supervisor: Nixon Hernando López Perdigón

## ÍTEMS CONTRATADOS

| NO. | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | **FISCALÍA DE CONOCIMIENTO** | | |
| 1,01 | Desmonte de división en madera. (dim=4,2m X 2,2m) | un | 1 |
| 1,02 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm. | m | 38 |
| 1,03 | Desmonte de lámparas instaladas. | un | 8 |
| 1,04 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | m2 | 2,3 |
| 1,05 | MURO en Drywall de e:12 cm.<br>Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna.<br>Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos. | m2 | 15,18 |
| 1,06 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco. | m2 | 4,20 |
| 1,07 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 10,00 |
| 1,08 | Cortinas enrollables screen | m2 | 19,50 |
| 1,09 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 145,60 |
| 1,10 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | un | 6,00 |
| 1,11 | Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1,00 |
| 1,12 | Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación. | un | 20,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,13 | Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 50,00 |
| 1,14 | Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1,00 |
| 1,15 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 4,4 |
| 1,16 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m2 | 21 |
| 1,17 | Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | GL | 1 |
| | | | |
| **SALA DE AUDIENCIAS** | | | |
| 2,01 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco. | m2 | 25,00 |
| 2,02 | Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 7,00 |
| 2,03 | Cortinas enrollables screen | m2 | 4,00 |
| 2,04 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m2 | 60,00 |
| 2,05 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | un | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,06 | Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1 |
| 2,07 | Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación. | un | 6 |
| 2,08 | Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m | 15 |
| 2,09 | Adecuación eléctrica para la instalción de 1 aire acondicionado minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. | GL | 1,00 |
| 2,10 | Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | GL | 1 |


## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ANTES | DESPUES |
|---|---|
|  |  |

| ANTES | PROCESO |
| --- | --- |
|  |  |

| ANTES | DESPUES |
| --- | --- |
|  |  |
| **ANTES** | **PROCESO** |
|  |  |

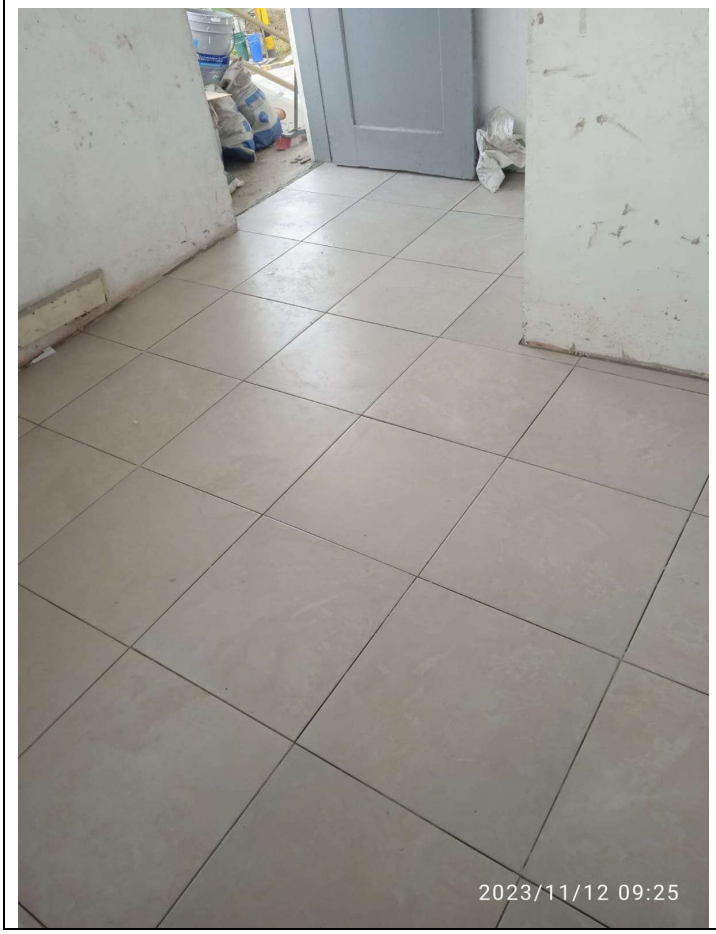


2023/11/12 09:25



No siendo otro el objeto de la presente acta para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 18 de noviembre de 2023.

---

**NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**
Supervisor de contrato No. 039-2023

---

**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**
NIT 830.102.887-5
MANUEL RICARDO LUNA MACA
Representante legal.
