

Anexo fotográfico 5: Mantenimiento de unidades sanitaria portátil.

ANEXO 3: ACTAS DE MANTENIMIENTO UNIDADES PORTATILES TRIMESTRE

El encausamiento del caudal del caño parrado se realizó de manera paralela al cauce, donde con una retroexcavadora se apilo material en ambas márgenes con el objeto de dejar zonas secas que permitieran al personal de obra desarrollar las labores requeridas



Anexo fotográfico 6: Manejo del caudal caño parrado MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA CAÑO PARRADO

9. Programa Para El Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos En La Obra

se realizan los pre operacionales de la maquinara a operar en obra, con el objeto de detectar fallas que puedan afectar las condiciones normales del medio ambiente. La maquinaria cuenta con su respetivo kit anti derrames en caso tal de que se llegue a presentar alguna contingencia.



Anexo fotográfico 7: Inspecciones pre operacionales.

10. Programa De Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto

Para la ejecución de este programa, se realiza la planeación y respectiva ejecución de capacitaciones y/o charlas ambientales para el personal que hace parte de la obra.

ANEXO 3: LISTA DE ASITENCIA CAPACITACIONES TEMATICA AMBIENTAL



Evidencia fotográfica 8: *Ejecución programa de educación ambiental.*

11. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- El contratista tiene el compromiso de entregar a la interventoría el informe ambiental con las respectivas observaciones y sus anexos.

- La Interventoría solicito al contratista todos los soportes del área ambiental para la elaboración de los informes.
  Inspección de maquinaria.
  Certificado de residuos aprovechables
  Listado de asistencia de capacitación al personal
  Mantenimiento de unidades sanitaria portátil

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

C.C. 19.266.128 de Bogotá

MP. 25202-09399


ESPECIALISTA AMBIENTAL

ANEXO INFORME ESTRUCTURAL INTERVENTORIA

VILLAVICENCIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"CONTRATO DE OBRA 1280/2023 -CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA Y PARQUE INFANTIL DE VILLAVICENCIO "'

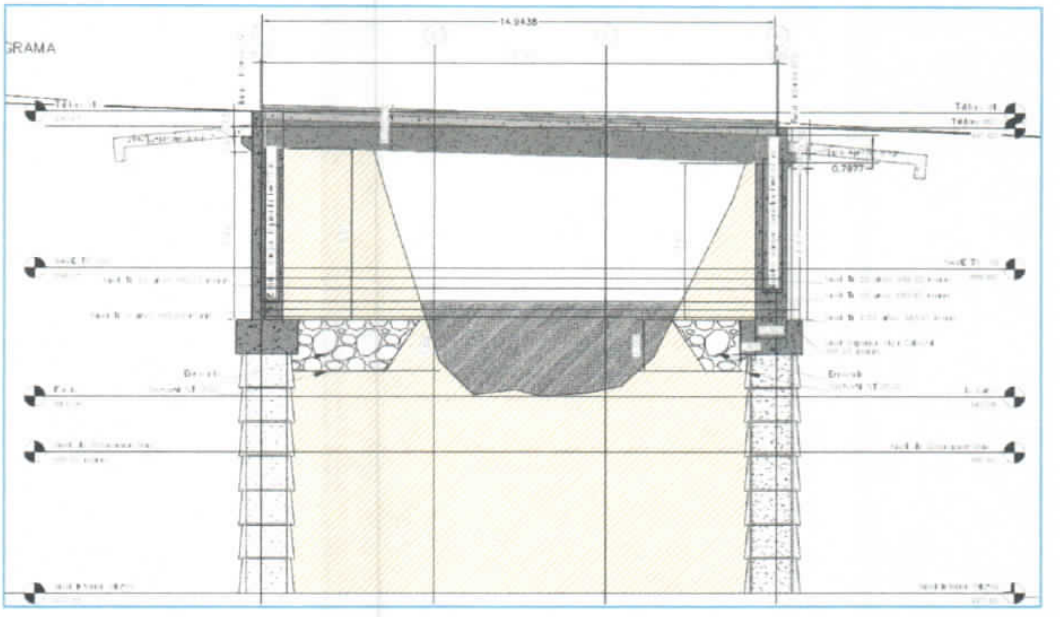

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

INFORME ESTRUCTURAL MENSUAL
Nº 4

14 OCTUBRE – 13 NOVIEMBRE 2023

INFORME ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA No. 4

DEPARTAMENTO	**META**
CONTRATO DE OBRA N°	**1280/2023**
OBJETO	*"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO -META"*
FECHA DE INFORME	**Del 14 OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2023**

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
RAMIREZ VARGAS MANUEL	**JOVEN GRAFE MIGUEL**	**VICTOR G. RODRIGUEZ R/L INTERVENTORIA**
FECHA: 13/11/2023	**FECHA:** 13/11/2023	**FECHA:** 13/11/2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. Localización del proyecto. 6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
3.1 Información del contrato de obra 7
3.2 Información del contrato de interventoría 7
4. ACTIVIDADES 8
5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 12

ESTE INFORME ESTA DIRIGIDO A:

SANDRA MILENA LEÓN BRITO
(Supervisor del proyecto)

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual Nº 4 de la interventoría, se permite relacionar a través de su contenido el estado y avance de las actividades de estructuras que se llevaron a cabo según las actividades de obra.

Se deja en conocimiento a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, la labor que se ha venido desarrollando por parte de la Interventoría, respecto al contrato cuyo objeto es " *CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA Y PARQUE INFANTIL DE VILLAVICENCIO*

En cumplimiento al seguimiento, control y registro de las actividades ejecutadas, en el contrato relacionado, este informe corresponde al periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023, y se relacionan las actividades de estructuras implementadas por el contratista y la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto.

Las obras constructivas se ejecutarán.



Figura 1. Localización.
