1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual Nº 6 de la interventoría, se permite relacionar a través de su contenido el estado y avance de las actividades de seguridad y salud en el trabajo que se llevaron a cabo según las actividades constructivas tales la habilitación del puente....

Se deja en conocimiento a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, la labor que se ha venido desarrollando por parte de la Interventoría, respecto al contrato cuyo objeto es " *CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA Y PARQUE INFANTIL DE VILLAVICENCIO*

En cumplimiento al seguimiento, control y registro de las actividades ejecutadas, en el contrato relacionado, este informe corresponde al periodo comprendido entre el 14 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2023, y se relacionan las actividades SST implementadas por el contratista y la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto.

Las obras constructivas se ejecutarán.

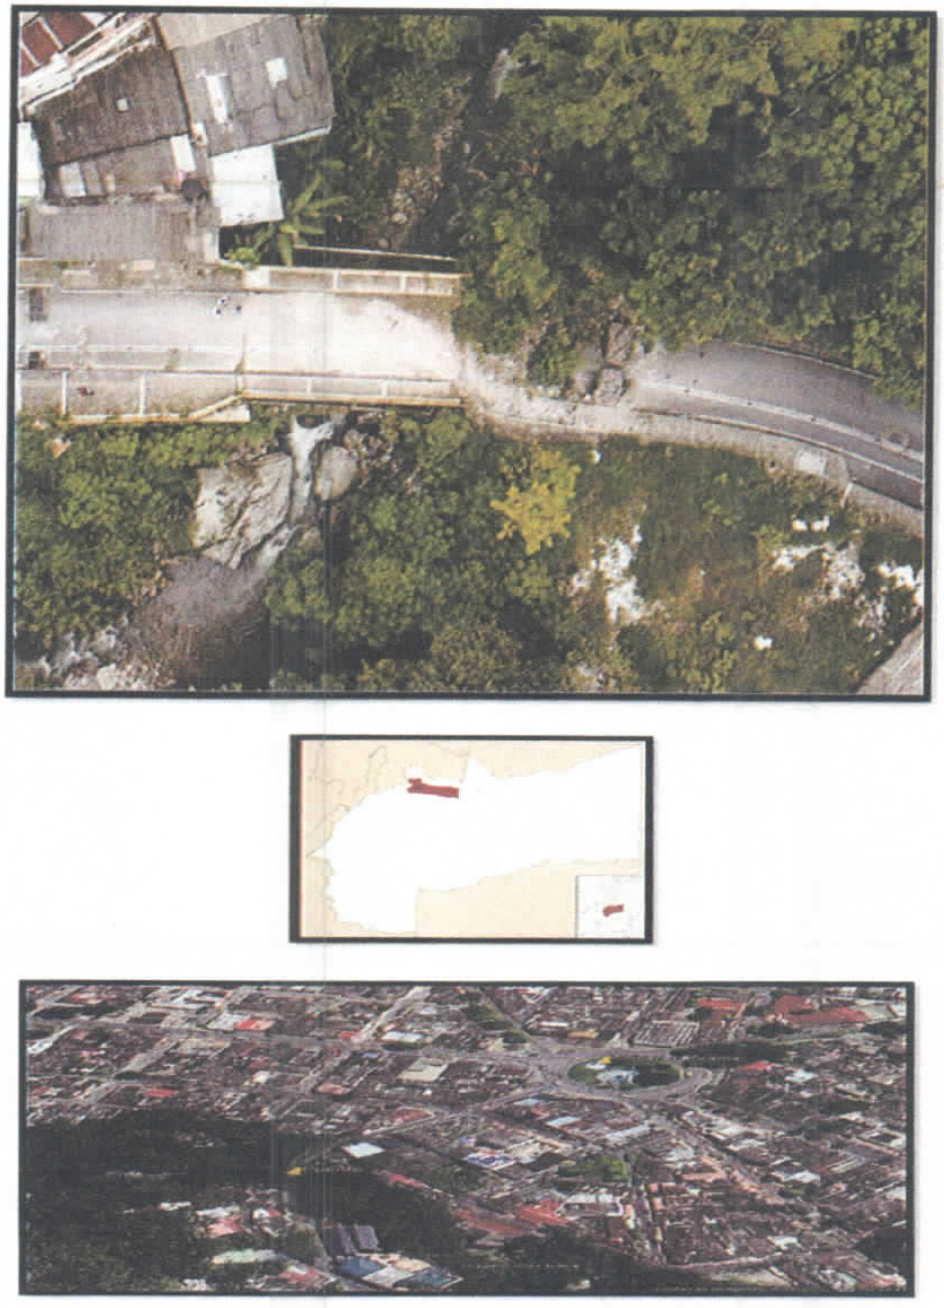


Figura 1. Localización.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Información del contrato de obra

Tabla N°1. Datos contrato de obra

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Interventor:	CONSORCIO AV NIT 901.700.999- 4 Rep. Legal VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128
Supervisión del Contrato de Interventoría:	SANDRA MILENA LEÓN BRITO
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO - META
Contrato No:	1280 DE 2023
Contratista de la obra:	CONSORCIO ECOGRAVAS NIT 901.684.957-6
Representante Legal:	RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA C.C. 17.329.108 de Villavicencio
Valor del Contrato:	DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($2.517.042.215,00) M/CTE.
Valor del Anticipo:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($755.112.664,50) M/CTE.
Fecha de terminación inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
	MODIFICACIONES REALIZADAS
Adición valor del contrato:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor del Contrato + Adicional:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.258.520.744,00) M/CTE.
Adición valor del anticipo:	N/A
Valor actualizado del contrato:	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.775.562.959,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES
Plazo de ejecución ajustado (suscripción acta de inicio):	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio:	14 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total días transcurridos de suspensión:	N/A

Fecha de Prorroga:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
Adición plazo:	CINCO (05) MESES CALENDARIO
Plazo de ejecución modificado:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de terminación actualizada:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Corte del Informe:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Días Transcurridos:	CIENTO SESENTA Y SIETE (167) DIAS CALENDARIO
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$436.372.826,00
Acta parcial 2	$0.00
Acumulado	11.56% $436.372.826,00
Anticipo	30.00% (del valor inicial) $755.112.664,50
Anticipo desembolsado:	30.00% (del valor inicial) $755.112.664,50 (Aplicando descuento FOSE 5% sobre este equivalente a $37.755.633,00)
Fecha de desembolso	03 DE OCTUBRE DE 2023
Amortización Acta parcial 1	$130.911.847,80
Amortización Acta parcial 2	$0.00
Pendiente por amortizar	$624.200.816,70

3.2 Información del contrato de interventoría

Tabla N°2. Datos contrato de Interventoría

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Supervisión del Contrato de Interventoría:	SANDRA MILENA LEÓN BRITO
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
Contrato No:	1634 DE 2023
Contratista:	CONSORCIO AV NIT 901.700.999- 4
Representante Legal:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($259.163.249) M/CTE
Valor del Anticipo:	N/A
Fecha de terminación inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES REALIZADAS	
Modificación No 01:	14 DE JULIO DE 2023
Valor Modificación No 01:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($259.086.633) M/CTE
Adición valor del contrato:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor del Contrato + Adicional:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($129.533.746) M/CTE
Adición valor del anticipo:	N/A
Valor actualizado del contrato:	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($388.620.379) M/CTE
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES
Plazo de ejecución ajustado (suscripción acta de inicio):	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio:	14 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total días transcurridos de suspensión:	N/A
Fecha de Prorroga:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
Adición plazo:	CINCO (05) MESES CALENDARIO
Plazo de ejecución modificado:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de terminación actualizada:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Corte del Informe:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Días Transcurridos:	CIENTO SESENTA Y SIETE (167) DIAS CALENDARIO
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$0.00
Acta parcial 2	$0.00
Acumulado	0.00% $0.00
Anticipo	0.00% $0.00
Anticipo desembolsado:	0.00% $0.00
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	$0.00
Amortización Acta parcial 2	$0.00
Pendiente por amortizar	$0.00

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuación, se listan las actividades constructivas desarrollas por el contratista durante el presente el 14 de DICIEMBRE – 31 de DICIEMBRE:

- El contratista realiza oportunamente sus exámenes de ingreso de acuerdo a normativa.
- Inducción al personal contratado
- Se realiza entrega de dotación al personal.
- señalización para el manejo del tráfico durante el proyecto.
- Mantenimiento de baños portátil.
- Charlas, pero- operacionales durante la jornada.
- Inspecciones pre-operacionales

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto. No. 1 Punto Ecológico



Foto. No. 2 Unidades sanitarias



Foto. No. 3. Inducciones



Foto. No. 4. Charla de seguridad




Foto. No. 7. Toma de tensión




Foto. No. 8. Medición de gases



Foto. No. 9. Manejo de tráfico



Foto. No. 10. Kit de emergencia

5. EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO.

5.1 Personal del contratista

Tabla 1: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
HECTOR ALFONSO HUERGO SALGADO	RESIDENTE DE OBRA

Anexo # 1 Listado Personal Operativo.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
YIRA ALEJANDRA RODIRGUEZ	INSP SST
HERMES PARRADO	OFICIAL DE OBRA
WILMER ROJAS ACEVEDO	AYUDANTE DE OBRA
ALEXANDER ALONSO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
HELIO ANTONIO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
ALEXANDER ALONSO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
JORGE ARTURO RUIZ ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL MAURICIO CUBILLOS	TOPOGRAFO
JORDAN ALEXIS GARZON	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
JOSE MAURICIO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO CIRO REMIREZ	AYUDANTE DE OBRA
YEISON LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA
EDISON HURTADO	AYUDANTE DE OBRA
CAYETANO LUNA	AYUDANTE DE OBRA
OMAR PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA
ALBERTO MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA
RICARDO PARRADO	AYUDANTE DE OBRA
ISAIAS GARCIA	AYUDANTE DE OBRA

5.2 Personal de la Interventoría

Continúa el mismo personal.

Tabla 2: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

NOMBRE	CARGO
CANTILLO GUTIERREZ CARLOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RAMOS BARRAGAN CLAUDIA	CADENERO
SANCHEZ MANJARRES PAOLA	SECRETARIA
PERDOMO CRUZ DANIEL	TOPOGRAFO
VALENCIA CRUZ DANIEL	CADENERO
BARRAGAN GUTIERREZ ALEJANDRA	CONTADORA
GUTIERREZ YATE FREDY	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOVEN GRAFE MIGUEL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR	ESPECIALISTA AMBIENTAL
RAMIREZ VARGAS MANUEL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CARDOSO MORENO CARMEN	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
MANRIQUE ANDRADE VICTOR	ESPECIALISTA HIDRAULICO
GUTIERREZ ECHEVERRY LUIS	MENSAJERO
GONZALEZ SUAREZ CARLOS MIGUEL	INGENIERO RESIDENTE
SILVA ZABALA BRAYAN STIWEN	AUXILIAR SISO
JAVIER AUGUSTO GOMEZ URRIAGO	INGENIERO ELECTRISISTA
ATENAIS DIAZ CARDOSO	ESPECIALISTA SISO

Por parte de interventoría se dejará de pasar la seguridad social del personal como Director Administrativo, secretaria, contador, mensajero, especialista en estructura, geotecnia, SISO, electricista, hidráulico, topógrafo y los dos cadeneros ya que cumplen su tiempo en meses según lo establecido en el contrato, mas sin embargo cuando se requieran alguno de los profesionales se volverán a incluir en la seguridad social.

ACTIVIDADES SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo evaluado el contratista realizó las siguientes actividades:

- Demarcaciones de zonas de trabajo
- Se doto al personal nuevo y se les volvió a entregar dotación a los que tenían deteriorado el implemento.
- Se realiza las inspecciones a maquinaria y equipos.
- Se realizan inducciones y capacitaciones al personal operativo.

	
Fotografía N°1.	**Fotografía N°2**
	
Fotografía N°3	**Fotografía N°4**
	
Fotografía N°5	**Fotografía N°6**
