CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICACION 28/12/2023					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
	Correas, Platinas, Anclajes, Contravientos, Pintura, instalación)				
7,07	TUBERIA PVC U.Z.4"	ML	0%		0%
7,08	TUBERIA PVC U.Z 8"	ML	0%		0%
7,09	CODO U.Z. GRAN RADIO 4"	UN	0%		0%
7,10	CODO U.Z. GRAN RADIO 8"	UN	0%		0%
7,11	UNION REPARACION U.Z. 4"	UN	0%		0%
7,12	UNION REPARACION U.Z. 8"	UN	0%		0%
	SUBTOTAL OBRAS URBANISMO				
8,00	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**				
8,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO GR-01 (En Lámina Galvanizada)	UN	0%		0%
8,02	TACHA REFLECTIVA	UN	0%		0%
8,03	PINTURA DE PISO VIA INV 700 LINE A DE DEMARCACION +A=0.12m (Incluye Microesferas)	ML	0%		0%
8,04	MARCAS VIALES PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS (Norma INV-700)	M2	0%		0%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELINEADOR DE CORONA DE VIAS PARA SEPARACION DE TRAFICO (HITO VIAL H=0,75m DE ANCLAR)	UN	0%		0%
	SUBTOTAL				
B	**IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN MANEJO TRANSITO (PMT)**				
9,00	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL**				
9,01	PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO (Inducción y Reuniones de seguimiento Trabajadores)	MES	100%	100,00%	0%
9,02	MEDIDAS DE COMPENSACION POR TALA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL (Siembra y mantenimiento-30 días- especie arbórea nativa h1-2m)	UN	0%	0,00%	0%
	SUBTOTAL				
10,00	**MANEJO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**				
10,01	MANEJO INTEGRAL MATERIALES DE CONSTRUCCION (Control emisión de material particulado)	MES	100%	100,00%	0%
10,02	SEÑALIZACION FRENTES Y ZONAS TEMPORALES	MES	100%	100,00%	0%
10,03	AISLAMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS (Protección Temporal y señalización preventiva)	UN	0%		0%
10,04	MANEJO Y ACOMODACION TEMPORAL DE LODOS Y RCDS (Residuos de Construcción y Demoliciones)	MES	93%	100,00%	7%


CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICACION 28/12/2023					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
10,05	MANEJO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES (RCDs)	TON	100%	90,34%	-10%
	SUBTOTAL				
11,00	**GESTION DEL RECURSO HIDRICO**				
11,01	MANEJO DE AGUAS Y DESVIOS TEMPORAL DE CAUCES (Obras de Protección Ambiental)	MES	100%	100,00%	0%
11,02	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES (Disposición y Tratamiento Aguas Residuales)	MES	100%	100,00%	0%
	SUBTOTAL				
12,00	**GESTION AMBIENTAL DEL RECURSO BIOTICO-BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**				
12,01	MANEJO DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL (Adecuación zonas temporales para acopio cobertura vegetal reutilizable)	MES	0%		0%
12,02	RECUPERACION AREAS AFECTADAS POR LA OBRA MEDIANTE LA SIEMBRA Y MANTENIMEINTO ARBOLES NATIVOS (Incluye mantenimiento 30 de y siembra especie arbórea nativa h>2m)	UN	0%	0,00%	0%
12,03	REVEGETALIZACION AREAS DE OBRA TALUDES Y/O JARIILONES (Incluye Tierra de Cultivo 5cm-Siembra de grama recuperada y adición de g rama faltante)	M2	0%	0,00%	0%
	SUBTOTAL				
13,00	**MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES**				
13,01	MEDIDAS AMBIENTALES PARA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y ZONAS DE ACOPIO TEMPORAL (Manejo de Aguas, Señalización-Limpieza Áreas)	GB	100%	50,00%	-50%
13,02	MEDIDAS PARA EL MANEJO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VHEICULOS (Adecuación, señalización, aislamiento áreas para mantenimiento y revisión periódica)	MES	100%	100,00%	0%
	SUBTOTAL				
14,00	**MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES**				
14,01	MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Señalización de Obra, Desvíos de Tráfico, Barreras de Protección y personal para control de tráfico)	MES	100%	100,00%	0%

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICACION 28/12/2023					
ITEM	DESCRIPCION	UND	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIF
	SUBTOTAL				
	TOTAL		50,34%	54,26%	3,92%

Seguimiento al equipo de trabajo del contratista de obra:

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD	REF
Cargador rueda	1	CATERPILLAR	3.2M3	W5K00211
Volqueta	1	INTERNATIONAL	9TON	10007094440
Retroexcavadora	1	CATERPILLAR	1.14M3	A6F01106
Trompo	1	N/A	1BTO	N/A
Compresor	1	AIRMAN	500LB	PDS185S
Martillo neumático	7	BARNES DE COLOMBIA	60LB	E0928
Martillo neumático	2	BARNES DE COLOMBIA	90LB	E0928

Seguimiento de la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos:

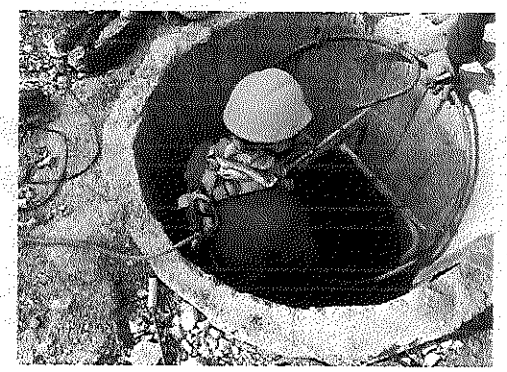

Seguimiento general de todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual, para lo cual se anexa a este informe el resultado del seguimiento SST y ambiental en documentos individuales.

7. *Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación se anexan copias de los oficios suscritos durante el periodo de informe mensual.

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
1,00	AVGPTE -02-23	...	17/04/2023	SOLICITUD DE DISEÑOS DEFINITIVOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
2,00	AVGPTE -04-23	...	26/04/2023	CONCEPTO ESP SUELOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
3,00	AVGPTE -05-23	...	26/04/2023	SOLICITUD DE FORMATOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
4,00	AVGPTE -05A-23	Notificación sobre riesgo inminente de ruina de vivienda tras actividades preliminares de inspección ocular para elaboración de acta de vecindad	2/05/2023	CONCEPTO DE RUINA VIVIENDA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
5,00	AVGPTE -06-23	Aprobación de PMT y Consideraciones a Tener en Cuenta	3/05/2023	APROBACION PMT Y OBSERVACIONES	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
6,00	AVGPTE -07-23	Solicitud de presentación de diseño de valla informativa de obra	4/05/2023	DISEÑO DE VALLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
7,00	AVGPTE -08-23	Información de condiciones mínimas necesarias para suscripción de acta de inicio	5/05/2023	CONDICIONES PARA INICIO DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
8,00	AVGPTE -09-23	Solicitud de formato establecido para elaboración de valla informativa de obra	5/05/2023	DISEÑO DE VALLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
9,00	AVGPTE -10-23	Solicitud de presentación de PMA	5/05/2023	SOLICITUD PMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
10,00	AVGPTE -11-23	Aprobación de PMA y solicitud de documentación	9/05/2023	APROBACION PMA Y OBSERVACIONES	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
11,00	AVGPTE -12-23	Solicitud de acompañamiento policial a actividades de medición en campo	18/05/2023	SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
12,00	AVGPTE -13-23	Traslado de Información	18/05/2023	MUESTRA DE AGUA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
13,00	AVGPTE -14-23	Nueva solicitud de formato establecido para elaboración de valla informativa de obra e información sobre estado de trámite de consecución de predio	24/05/2023	DISEÑO DE VALLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
14,00	AVGPTE -15-23	Solicitud de mesa técnica de trabajo	24/05/2023	MESA TECNICA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
15,00	AVGPTE -16-23	Reiteración a nueva solicitud de formato establecido para elaboración de valla informativa de obra e información sobre estado	29/05/2023	DISEÑO DE VALLA Y ESTADO DE PREDIO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
		de tramite de consecución de predio					
16,00	AVGPTE -17-23	Solicitud de información sobre nueva fecha de toma de muestras a caño parrado	29/05/2023	MUESTRA DE AGUA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
17,00	AVGPTE -18-23	Traslado de información para elaboración de valla informativa de obra	30/05/2023	DISEÑO DE VALLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
18,00	AVGPTE -19-23	Tercera solicitud de información sobre nueva fecha de toma de muestras a caño parrado	1/06/2023	MUESTRA DE AGUA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
19,00	AVGPTE -20-23	Solicitud de información sobre fecha de entrega de compromisos	15/06/2023	BALANCE DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
20,00	AVGPTE -21-23	Segunda reiteración a solicitud de información sobre estado de trámite de consecución y/o desalojo de predio colindante al sitio de la obra	16/06/2023	ESTADO DE PREDIO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
21,00	AVGPTE -22-23	Solicitud de información sobre resultados de tomas de muestras a caño parrado	16/06/2023	MUESTRA DE AGUA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
22,00	AVGPTE -23-23	Solicitud de información sobre aprobación de PMT	16/06/2023	PMT	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
23,00	AVGPTE -24-23	Respuesta a Correo del 25-05-2023 del Contratista de Obra	16/06/2023	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
24,00	AVGPTE -25-23	Reiteración a solicitud de información sobre fecha de entrega de compromisos	23/06/2023	BALANCE DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
25,00	AVGPTE -26-23	Tercera reiteración a solicitud de información sobre estado de trámite de consecución y/o desalojo de predio colindante al sitio de la obra	23/06/2023	ESTADO DE PREDIO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
26,00	AVGPTE -27-23	Reiteración a solicitud de información sobre resultados de tomas de muestras a caño parrado	23/06/2023	MUESTRA DE AGUA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
27,00	AVGPTE -28-23	Reiteración a solicitud de información sobre aprobación de PMT	23/06/2023	PMT	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION,	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
						SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
28,00	AVGPTE -29-23	Segunda reiteración a solicitud de información sobre fecha de entrega de compromisos	30/06/2023	BALANCE DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
29,00	AVGPTE -30-23	Cuarta reiteración a solicitud de información sobre estado de trámite de consecución y/o desalojo de predio colindante al sitio de la obra	30/06/2023	ESTADO DE PREDIO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
30,00	AVGPTE -31-23	Segunda reiteración a solicitud de información sobre aprobación de PMT	30/06/2023	PMT	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
31,00	AVGPTE -32-23	Solicitud de Comité Técnico de Obra	4/07/2023	COMITÉ	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
32,00	AVGPTE -33-23	Nueva Hora de Comité Técnico de Obra	4/07/2023	COMITÉ	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
33,00	AVGPTE -34-23	Entrega de Radicado PMT	10/07/2023	PMT	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
34,00	AVGPTE -35-23	Traslado de Información para Gestión de Documentación	10/07/2023	FORMATOS ENTIDAD	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
35,00	AVGPTE -36-23	Seguimiento a Nuevo PMT Entregado	10/07/2023	SEGUIMIENTO PMT	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
36,00	AVGPTE -37-23	Segunda Aprobación de Acta de Plan de Inversión y Manejo Anticipo	10/07/2023	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
37,00	AVGPTE -38-23	Reiteración a Solicitud de Información Adicional del PMA	10/07/2023	SEGUIMIENTO PMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
38,00	AVGPTE -39-23	Solicitud de Entrega de Pre-Diseño de Valla Informativa	10/07/2023	DISEÑO DE VALLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
39,00	AVGPTE -40-23	Respuesta de Oficio del 07-07-2023	10/07/2023	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION,	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
						SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
40,00	AVGPTE -41-23	Solicitud de Realización de Actas de Vecindad	10/07/2023	ACTAS DE VECINDAD	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
41,00	AVGPTE -42-23	Solicitud de Ampliación de Información Sobre Método de Demolición a Emplear	10/07/2023	METODO DEMOLICION	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVASSUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
42,00	AVGPTE -43-23	Solicitud de Información Adicional de Balance de Obra y Programación de Mediciones en obra	10/07/2023	BALANCE DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
43,00	AVGPTE -44-23	Solicitud de Información Sobre Maniobra de Redes de Fibra Óptica	10/07/2023	FIBRA OPTICA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
44,00	AVGPTE -45-23	Aprobación de Reducción en Tiempo del Contrato de Obra	11/07/2023	REDUCCION TIEMPO DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATACION, OFICINA DE CONTRATACION SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
45,00	AVGPTE -46-23	Solicitud de Reducción en Tiempo del Contrato de Interventoría	11/07/2023	REDUCCION TIEMPO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATACION, OFICINA DE CONTRATACION SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
46,00	AVGPTE -47-23	Respuesta a Oficio de Contratista de Obra del 12-07-2023	12/07/2023	ACTAS DE VECINDAD	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
47,00	AVGPTE -48-23	Entrega de Documentación para Suscripción de Acta de Inicio del Contrato de Interventoría	14/07/2023	ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
48,00	AVGPTE -48A-23	Análisis de Precios Unitarios Actualizados a la Oferta, con Lista de Insumos	14/07/2023	OBSERVACIONES APU OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
49,00	AVGPTE -49-23	Entrega de Documentación para Suscripción de Acta de Inicio del Contrato de Interventoría	14/07/2023	ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
50,00	AVGPTE -50-23	Reiteración de Oficios y Nuevas Solicitudes	18/07/2023	REITERACIONES Y REQUERIMIENTOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
51,00	AVGPTE -51-23	Traslado de Solicitud por Contratista de Obra	18/07/2023	DEMOLICION VIVIENDA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
52,00	AVGPTE -52-23	Solicitud de Comité Técnico de Obra	18/07/2023	COMITÉ	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION,	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
						SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
53,00	AVGPTE -53-23	Traslado de Solicitud por Contratista de Obra	18/07/2023	FIBRA OPTICA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
54,00	AVGPTE -54-23	Devolución de Reprogramación de Obra y Solicitud de Corrección	21/07/2023	REPROGRAMACION	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
55,00	AVGPTE -55-23	Información sobre Posibles Afectaciones a Redes de Fibra Óptica y Solicitud de Maniobra	21/07/2023	FIBRA OPTICA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CABLE OPERADORES, CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
56,00	AVGPTE -56-23	Traslado de Solicitud a Contratista de Obra	21/07/2023	CORMACARENA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
57,00	AVGPTE -57-23	Traslado de Información de Supervisión	22/07/2023	DISEÑOS DEFINITIVOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
58,00	AVGPTE -58-23	Solicitud de Corrección de Información para Posterior Radicación	22/07/2023	CORMACARENA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
59,00	AVGPTE -59-23	Entrega de Pólizas Actualizadas a Acta de Inicio	24/07/2023	POLIZAS ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATACION, OFICINA DE CONTRATACION SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
60,00	AVGPTE -60-23	Traslado de Solicitud por Contratista de Obra	24/07/2023	DEMOLICION VIVIENDA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
61,00	AVGPTE -61-23	Traslado de Solicitud por Contratista de Obra	24/07/2023	EAAV	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
62,00	AVGPTE -62-23	Entrega de Información Cormacarena por Contratista de Obra	28/07/2023	CORMACARENA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
63,00	AVGPTE -63-23	Recepción de Información	1/08/2023	EAAV	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
64,00	AVGPTE -64-23	Recomendaciones de Obra	9/08/2023	OBSEVACIONES DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
						ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
65,00	AVGPTE -65-23	Seguimiento a Actividades de Demolición	8/08/2023	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
66,00	AVGPTE -66-23	Aprobación de Desembolso de Anticipo del Contrato de Obra	10/08/2023	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	HACIENDA, SECRETARIA DE HACIENDA SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
67,00	AVGPTE -67-23	Solicitud de Firmas y Documentos Adicionales	9/08/2023	OBSERVACIONES A DISEÑOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
68,00	AVGPTE -68-23	Entrega de Informe Semanal No 01	14/08/2023	INFORME SEM 01	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
69,00	AVGPTE -69-23	Solicitud de Observaciones a Diseños Firmadas, Documentos y Observaciones de Obra	15/08/2023	OBSERVACIONES A DISEÑOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
70,00	AVGPTE -70-23	Seguimiento a Posibles Afectaciones a Redes de Fibra Óptica y Solicitud de Maniobra	18/08/2023	FIBRA OPTICA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CABLE OPERADORES, CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
71,00	GMAIL	Nueva Solicitud de Observaciones a Diseños Firmadas, Documentos y Observaciones de Obra	18/08/2023	OBSERVACIONES A DISEÑOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
72,00	GMAIL	Requerimientos de obra	21/08/2023	REQUERIMIENTOS DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
73,00	AVGPTE -71-23	Tramite correspondencia CEG-050 2023, cuyo asunto es Respuesta AVGPTE 69-23	22/08/2023	OBSERVACIONES A DISEÑOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
74,00	AVGPTE -72-23	Tramite información ajuste de cimentación Puente Caño parrado.	22/08/2023	CORMACARENA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
75,00	AVGPTE -73-23	Entrega de Informe Semanal No 02	22/08/2023	INFORME SEM 02	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
76,00	GMAIL	Nuevos requerimientos de obra	22/08/2023	REQUERIMIENTOS DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
77,00	GMAIL	Entrega de avance de obra a corte 13-08-2023 para informe mensual y seguimiento a reprogramación de obra	22/08/2023	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
78,00	GMAIL	Seguimiento a reprogramación de obra 22-08-2023	22/08/2023	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
79,00	GMAIL	Seguimiento a reprogramación de obra 23-08-2023	24/08/2023	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
80,00	GMAIL	Respuesta de oficio CEG-051-2023	25/08/2023	REQUERIMIENTOS DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
81,00	GMAIL	Inconsistencias de Diseño de Mezcla	28/08/2023	OBSERVACIONES DISEÑOS DE MEZCLA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
82,00	AVGPTE-74-23	Entrega de Información para Tramite de Desembolso de Anticipo del Contrato de Obra No 1280 del 2023	ago-23	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATACION, OFICINA DE CONTRATACION SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
83,00	AVGPTE-75-23	Aprobación de Desembolso de Anticipo del Contrato de Obra	ago-23	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	HACIENDA, SECRETARIA DE HACIENDA SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
84,00	AVGPTE-76-23	Entrega de Informe Semanal No 03	28/08/2023	INFORME SEM 03	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
85,00	AVGPTE-77-23	Traslado de Solicitudes por Contratista de Obra	28/08/2023	LINDEROS DE PREDIO CERCANO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
86,00	GMAIL	Traslado de Requerimiento de Supervisión	29/08/2023	SOLICITUD INFORMES SEMANALES OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
87,00	GMAIL	Solicitud de Correcciones a Informes Semanales	30/08/2023	CORRECCIONES INFOMRES SEMANALES OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
88,00	AVGPTE-78-23	Seguimiento a Maquinaria y Equipos	30/08/2023	SEGUIMIENTO DE MAQUINARIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
89,00	AVGPTE-79-23	Devolución de Informe Mensual de Obra No 01	30/08/2023	CORRECCIONES INFORME MENSUAL 01 OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CE
90,00	GMAIL	Seguimiento a Actividades de Concretos	31/08/2023	REQUERIMIENTOS DE OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
91,00	AVGPTE-80-23	Entrega de Informe Semanal No 04	4/09/2023	INFORME SEM 04	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
