3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Información del contrato de obra

Tabla N°1. Datos contrato de obra

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Interventor:	CONSORCIO AV NIT 901.700.999- 4 Rep. Legal VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128
Supervisión del Contrato de Interventoría:	SANDRA MILENA LEÓN BRITO
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO - META
Contrato No:	1280 DE 2023
Contratista de la obra:	CONSORCIO ECOGRAVAS NIT 901.684.957-6
Representante Legal:	RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA C.C. 17.329.108 de Villavicencio
Valor del Contrato:	DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($2.517.042.215,00) M/CTE.
Valor del Anticipo:	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($755.112.664,50) M/CTE.
Fecha de terminación inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor Adicional:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.258.520.744,00) M/CTE.
Adición valor del anticipo:	N/A
Valor actualizado del contrato:	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.775.562.959,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES
Plazo de ejecución ajustado (suscripción acta de inicio):	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio:	14 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Fecha de reinicio:	N/A
Total días transcurridos de suspensión:	N/A
Fecha de Prorroga:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Adición plazo:	CINCO (05) MESES CALENDARIO
Plazo de ejecución modificado:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de terminación actualizada:	28 DE MAYO DE 2024
Fecha de Corte del Informe:	29 DE FEBRERO DE 2024
Días Transcurridos:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DIAS CALENDARIO
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$436.372.826,00
Acta parcial 2	$0.00
Acumulado	11.56% $436.372.826,00
Anticipo	30.00% (del valor inicial) $755.112.664,50
Anticipo desembolsado:	30.00% (del valor inicial) $755.112.664,50 (Aplicando descuento FOSE 5% sobre este equivalente a $37.755.633,00)
Fecha de desembolso	01 DE DICIEMBRE DE 2023
Amortización Acta parcial 1	$130.911.847,80
Amortización Acta parcial 2	$0.00
Pendiente por amortizar	$624.200.816,70

3.2 Información del contrato de interventoría

Tabla N°2. Datos contrato de Interventoría

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Supervisión del Contrato de Interventoría:	SANDRA MILENA LEÓN BRITO
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE CAÑO PARRADO EN LA VÍA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y EL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
Contrato No:	1634 DE 2023
Contratista:	CONSORCIO AV NIT 901.700.999- 4
Representante Legal:	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ C.C. 19.266.128
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($259.163.249) M/CTE
Valor del Anticipo:	N/A
Fecha de terminación inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Modificación No 01:	14 DE JULIO DE 2023
Valor Modificación No 01:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($259.086.633) M/CTE
Adición valor del contrato:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor del Contrato + Adicional:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($129.533.746) M/CTE
Adición valor del anticipo:	N/A
Valor actualizado del contrato:	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($388.620.379) M/CTE
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES

Plazo de ejecución ajustado (suscripción acta de inicio):	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio:	14 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total, días transcurridos de suspensión:	N/A
Fecha de Prorroga:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Adición plazo:	CINCO (05) MESES CALENDARIO
Plazo de ejecución modificado:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de terminación actualizada:	28 DE MAYO DE 2024
	INFORMACION FINANCIERA
Acta parcial 1	$0,00
Acta parcial 2	$0,00
Acumulado	0.00% $0,00
Anticipo	0.00% $0,00
Anticipo desembolsado:	0.00% $0,00
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	$0.00
Amortización Acta parcial 2	$0.00
Pendiente por amortizar	$0.00

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuación, se listan las actividades constructivas desarrollas por el contratista durante el presente el 14 de julio de 2023 – 29 de febrero de 2024:

- El contratista realiza oportunamente sus exámenes de ingreso de acuerdo a normativa.
- Inducción al personal contratado
- Se realiza entrega de dotación al personal.
- Señalización para el manejo del tráfico durante el proyecto.
- Mantenimiento de baños portátil.
- Charlas, pero- operacionales durante la jornada.
- Inspecciones pre-operacionales

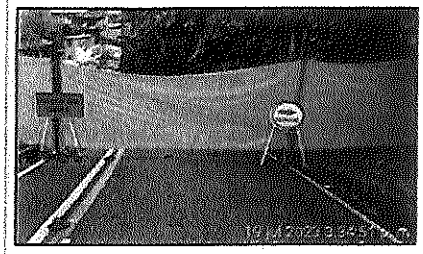
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto. No. 1 inducción y entrega de EPP</td><td>Foto. No. 2 señalización</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto. No. 3. señalización</td><td>Foto. No. 4. señalización</td></tr>
</table>



Foto. No. 5. jornada de orden y aseo

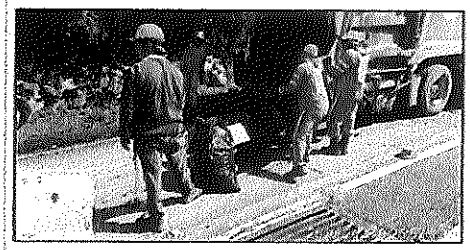


Foto. No. 6. Jornada de orden y aseo



Foto. No. 7. Instalación de baño portátil




Foto. No. 8. Aseo de baño portátil



Foto. No. 1 Punto Ecológico




Foto. No. 2 Unidades sanitarias



Foto. No. 3. Inducciones

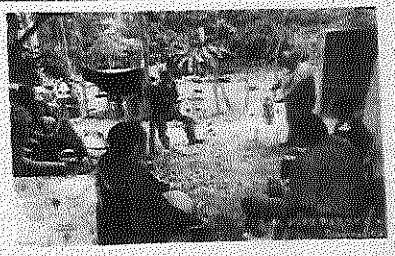


Foto. No. 4. Charla de seguridad

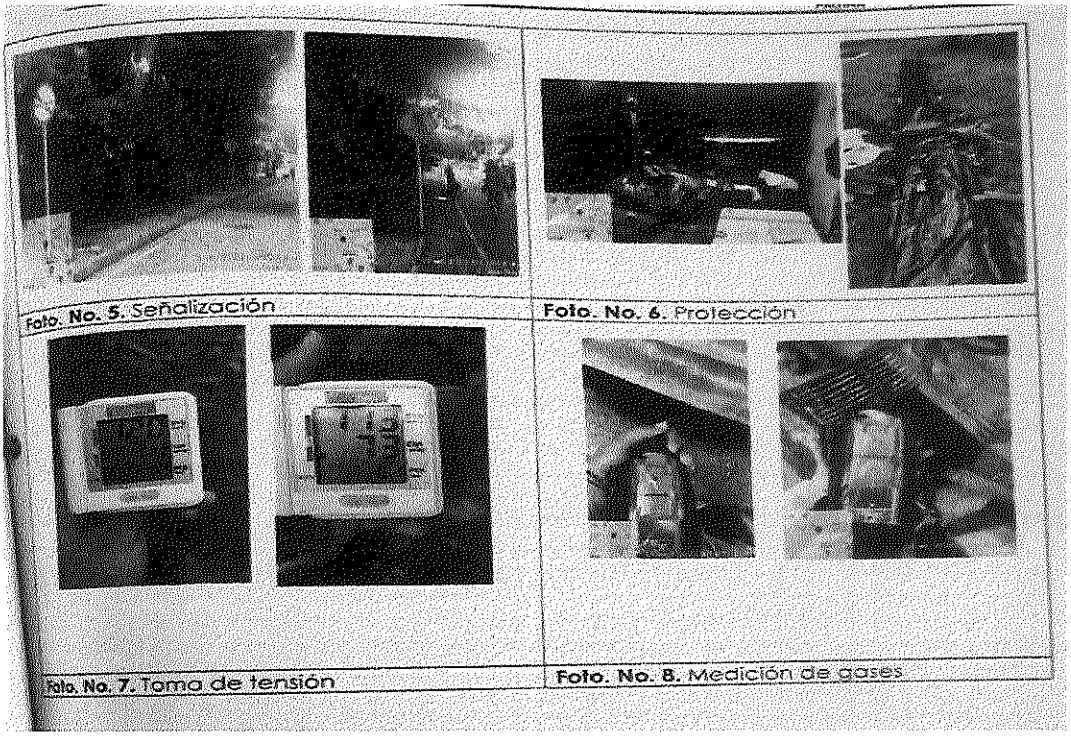


Foto. No. 5. Señalización

Foto. No. 6. Protección

Foto. No. 7. Toma de tensión

Foto. No. 8. Medición de gases

5. EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO.

5.1 Personal del contratista

Tabla 1: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

14 de julio - 13 de agosto de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
FERNANDO CASANOVA TRUJILLO	RESIDENTE DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO

Tabla 2: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

14 de agosto – 13 de septiembre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
FERNANDO CASANOVA TRUJILLO	RESIDENTE DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

14 de agosto – 13 de septiembre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA

Tabla 3: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

14 de septiembre – 13 de octubre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
JHON JAIRO MORENO MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA

Tabla 4: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

14 de octubre – 13 de noviembre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

14 de octubre – 13 de noviembre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
JHON JAIRO MORENO MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA

Tabla 5: Relación Profesionales contratados de acuerdo al perfil mínimo exigible.

14 de noviembre – 13 diciembre de 2023	
NOMBRE PROFESIONAL	**CARGO**
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	DIRECTOR DE OBRA
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	PROFESIONAL SST
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICO
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
EDNA BOTELLA ROJAS	INGENIERA AMBIENTAL
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	GERENTE DE PROYECTO
HECTOR HUERGO	RESIDENTE DE OBRA
JHON JAIRO MORENO MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA
