NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Proceso:	**DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**
Subproceso:	**Mantenimiento y conservación de los bienes públicos**
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	26-01-2024.
Hora de Inicio:	9:00 am.
Hora de Terminación:	9:50 am.
Fecha reunión de Seguimiento:	9-02-2024.

PARTICIPANTES

- Ing. Carlos Gonzalez. Interventoria. - Residente
- Ing. Oscar. Velez. Contratista - Gerente proyecto
- Ing. Yisoyel Angel Baba. Contratista - Geotecnista
- Sandra Leon. Supervisora.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


- Seguimiento del avance contractual de la obra Contrato 1280 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

- Recorrido e inspeccion visual a la obra.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizo recorrido por la obra, se evidenció trabajos de excavación en los caisson 1, 2, 7 y 9 para llegar a la cota clave. los caisson 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 15 ya se encuentran fundidos. Se informa por el contratista e interventoria que se tiene proyectado terminar cimentación en la siguiente semana para proceder a la excavacion para el faldon.
se tiene la visita del Ing. Geotecnista del contratista de obra quien evaluará las condiciones para la ejecución de los caisson 8 y 10, se espera concepto al respecto.

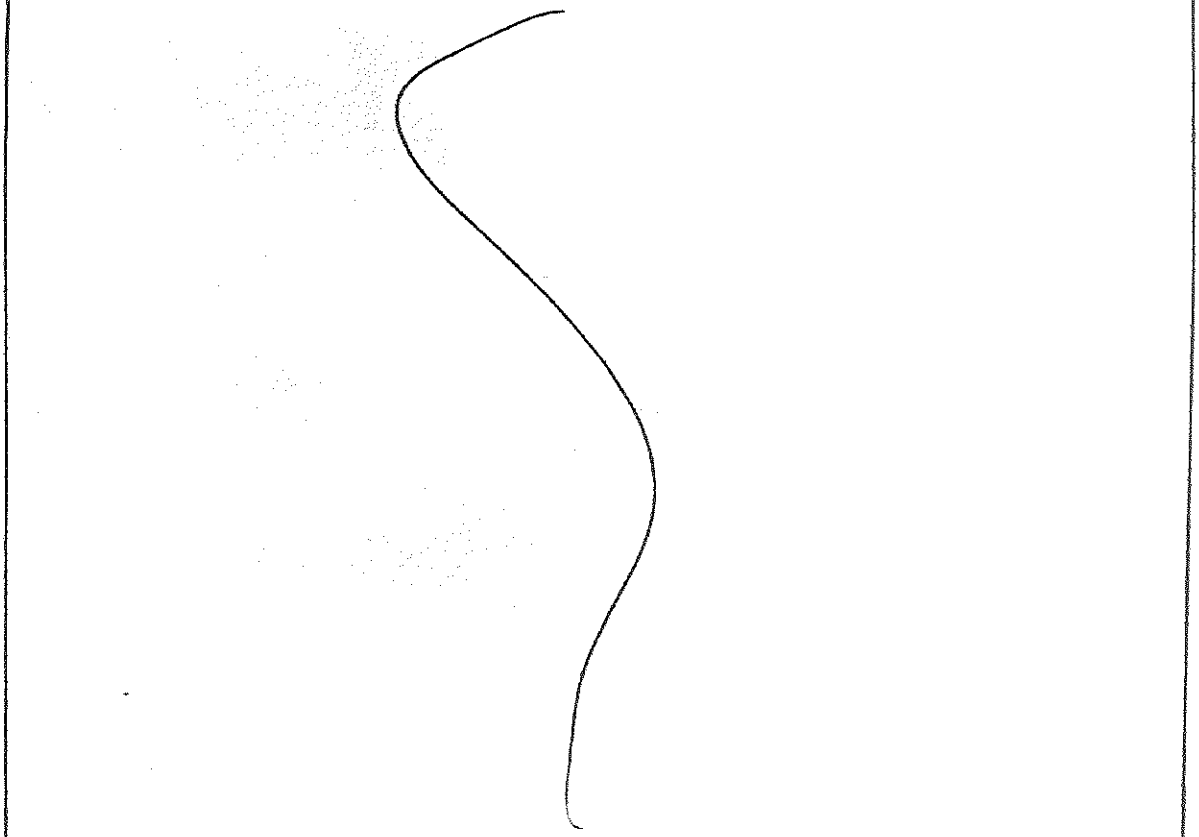

DECISIONES TOMADAS

-Solicitar comité con la empresa de acueducto y alcantarillado para tratar los temas relacionados con las redes de acueducto existentes y el descole de aguas lluvias.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

N/A

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	- Solicitud comité EAAV	26-01/21.	Supervisión
2			

5697

3			

Nombre: Carlos Gonzalez
Cargo: Residente

Nombres: Oscar Vela
Cargo: Gerente Proyecto

Sandra Milena Leon.
Nombre:
Cargo: Supervisora.

Nombres: MIGUEL ARAGA L
Cargo: GEOTECNISTA

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:		
Elaboró:		

5698

NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Proceso:	**DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**
Subproceso:	**Mantenimiento y conservación de los bienes públicos**
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	29-01-2024
Hora de Inicio:	3:00 Pm
Hora de Terminación:	4:21 Pm
Fecha reunión de Seguimiento:	

PARTICIPANTES

Contratista de obra, Interventoria, Secretaria de Infraestructura, EAAV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento de obra EAAV

ORDEN DEL DÍA

Estructuras de Paso de tubería acueducto y alcantarillado.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El Contratista de obra inicia con la intervención en el comité indicando que el estado actual del proyecto no contempla estructuras de paso de tubería de acueducto así como tampoco el suministro de tubería; indicando que actualmente en la zona aguas arriba se realizo desmonte y reinstalacion de tubería de 8" que actualmente pasa servicio a el sector del centro de la ciudad.


Seguidamente el contratista de obra informa que en el sector aguas abajo existia una tubería de acueducto de 4" y de 14", siendo la de 14" usada como suplencia de la red de 8", por lo cual la tubería de 14" actualmente no esta en funcionamiento; seguidamente se informa que la tubería de 4" fue suspendida con un tapon y en la parte baja se habilito el suministro mediante una valvula

Al no haber recurso disponible para las estructuras de paso de tubería de acueducto se propone por parte de la EAAV la revisión del abastecimiento de la tubería al puente mediante ganchos o elementos similares con el Fin de dar solucion al problema

Continuando con el desarrollo del comité se informa que actualmente una red de alcantarillado pluvial descarga en la zona de la construcción de la altura aguas abajo negra rezagada por lo cual al existir una red de alcantarillado cerca al sitio de intervención se genera la posibilidad de dejar

5699

descargando ambas redes de alcantarillado pluvial en esta estructura de descarga.

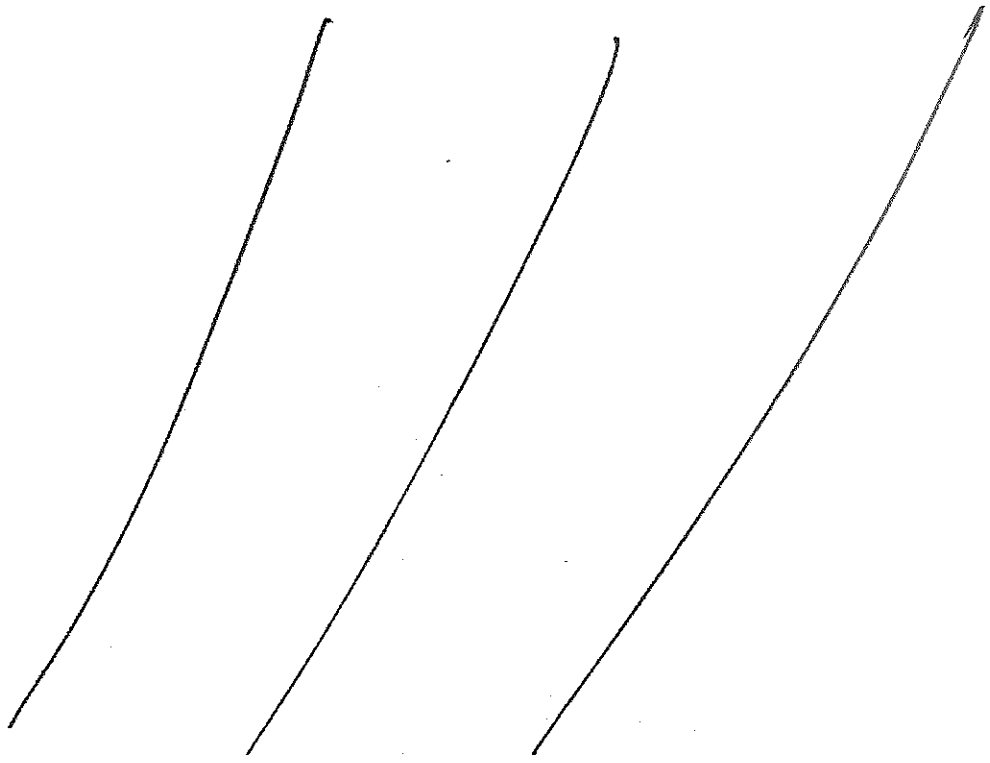

DECISIONES TOMADAS

- Verificar por parte de los especialistas del proyecto la posibilidad de adosar la tubería a la superestructura mediante grapas o elementos similares de sujeción esto para los 3 diametros de tubería.
- Verificar la conexión de la red de alcantarillado pluvial a la red de alcantarillado pluvial Etucan y que las dos redes descargan en este punto de forma descontinua.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

N/A

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Verificar adosamiento de tubería		Contratista de obra
2	Verificar capacidad de red de alcanta-		

	Tilado para conexión definitiva y descarga en un mismo predio		
3			

Nombre: Carlos Gonzalez
Cargo: Residente de interventoria.

Nombres: Cristian Olmedo Cardenas
Cargo: Jefe oficina de acueducto.

Nombre: Oficina Alcaldia
Cargo: Alcalde Barrio

Nombres: ALEXANDER PEREZ COY
Cargo: PROFESIONAL EMAV.

Nombre: Leonardo J. Bello
Cargo: Jefe de oficina de Interventoria

Nombres: Sandra M. Jeon
Cargo: Supervisora de Interventoria.

Nombre: Omar Fernando Velez
Cargo: Contratista

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:		
Elaboró:		

5401

ACTA DE COMITÉ	
Proceso:	**Contrato de Obra No 1280 de 2023**
Subproceso:	**CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO - META**
Acta Número:	-
Fecha de la reunión:	23/10-2023
Hora de Inicio:	8:00 am.
Hora de Terminación:	
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Supervision, interventoria y contratista.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento del contrato

ORDEN DEL DÍA

- Alcance de obra
- Pre-acta modificatoria,
- Informes mensuales y mensuales
- Revision estados.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La supervision inicia con la intervencion del comite. solicitando, informacion sobre el avance de obra.

La interventoria informa que la obra cuenta con el 17%. de avance, de gun condiciones contractuales, Existe un 61%. Programado esto debido a que los actividades de se cambiaron en modificacion de proyectos con su ejecucion completa, asi mismo la interventoria manifiesta que el contrato cuede con un 73% según condicions de modificacion.

La supervision solicito informacion sobre lamodificatorio de contrato de obra.

La interventoria y obra manifiesta que el acta modificatoria ya fue enviada revisada y ajustes al valor contractual.

Powered by CamScanner

5702

La supervisión solicita información sobre los avances en la revisión y ajuste a diseños en relación a los resultados de los estudios hidráulicos y geotécnicos.

La interventoría manifiesta que se tiene mesa de trabajo para la entrega de los diseños basados en que la profundidad de cimentación de la viga cabezal se mantenga a la cota 481.00.

DECISIONES TOMADAS

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

Powered by CamScanner

5903

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	entrega de acta Parcial de obra e interventoria	23-10-2013	Contratista e interventoria
2	Entrega de Modificatoria.	25-10-2013	Contratista e interventoria
3			

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
Cargo: R/L CONSORCIO AV
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: FREDY ALBERTO GUTIERREZ YATE	DIRECTOR. ADM INTERVENTORIA	
Elaboró: CARLOS MIGUEL GONZALEZ SUAREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	

Powered by CamScanner

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	ACTA DE COMITÉ – CONTRATO DE OBRA No 1280 DE 2023				
FECHA:		**HORA INICIO:**		**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:	CONSORCIO AV - CONTRATO DE INTERVENTORIA 1634 de 2023				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
01	SANDRA MILENA LEÓN BRITO	30.081.447	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SUPERVISOR		3002823001	Sandra.Leon@villavicencio.gov.co
02	VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	19.266.128	INTERVENTORIA	R/L INTERVENTORIA		3208360025	Intervillavicencio.pte@gmail.com
03	FREDY ALBERTO GUTIERREZ YATE	86.071.041	INTERVENTORIA	DIRECTOR. ADM INTERVENTORIA		3103298371	intervillavicencio.pte@gmail.com
04	CARLOS MIGUEL GONZALEZ SUAREZ	1.121.957.460	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA		3105505570	Intervillavicencio.pte@gmail.com
05	RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA	17.329.108	CONTRATISTA DE OBRA	R/L CONTRATISTA		3158660074	consorcioecogravasadmon2023@gmail.com
06	OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	86.070.760	CONTRATISTA DE OBRA	DIRECOTR. ADM OBRA		3142258535	consorcioecogravasadmon2023@gmail.com
	Leidy Huertas Rusice	1121864976	Sec. Infraestructura	Directora.		3125316586	leidy.huertas@villavicencio.
	Miguel E. Joven	7713442	Interventoria	Director		3133168926	intervillavicencio.
	Sandra Y						
	Maria Fernanda Velez Rios	1.121.896539	Contratista Obra.	Apoyo.		3560480	ecobras.licitaciones@gm

Powered by CamScanner
