NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Proceso:	**DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**
Subproceso:	**Mantenimiento y conservación de los bienes públicos**
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	28-10-2023
Hora de Inicio:	9:30 AM
Hora de Terminación:	10:30 AM
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Contratista de obra, interventoria, especialista hidraulico interventoria.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Revision hidraulica estudios

ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento y revision de estudios hidraulicos.


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- El especialista hidráulico de interventoria, hace presencia en la obra, verificando los avances de las ajustes realizados a la adaptacion de la cimentacion del puente. indicando que la cota de cimentacion recomendada es de 481.00 MSM la cual es la cota calculada de socavacion.

- Asi mismo aclara que las estructuras de cimentacion son viables siempre y cuando se ajuste el diseño estructural se halla contemplado que los cassion estan trabajando desde la cota 481.00 hacia abajo. Referencia a prediseño estructural del 27 octubre/2023.

Powered by CamScanner

5106

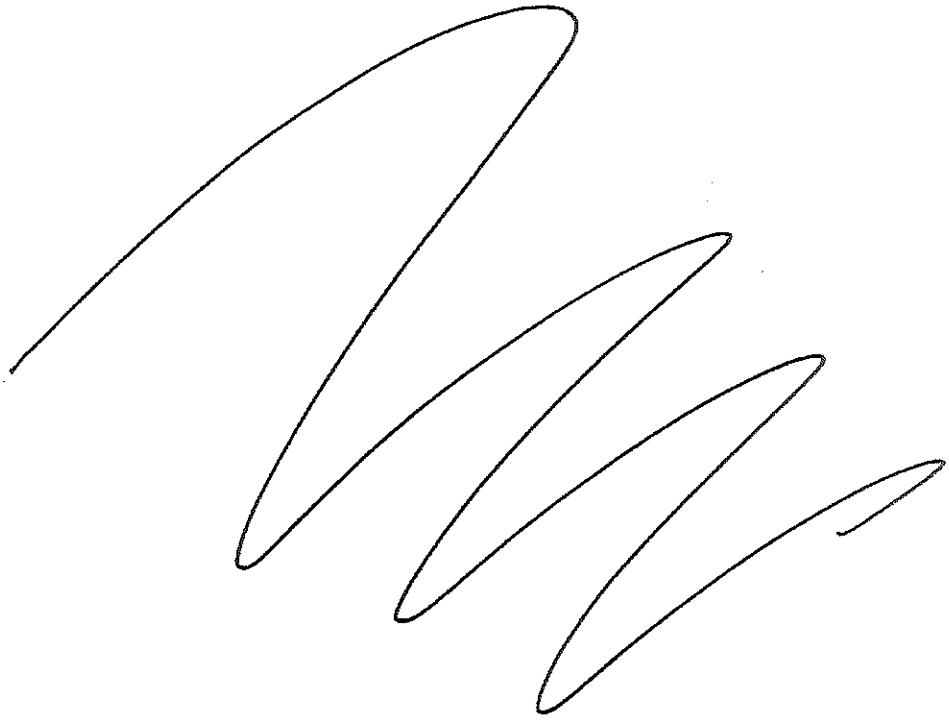

DECISIONES TOMADAS

- Realizar una mesa técnica con el operador de la bocatoma para revisión.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

Powered by CamScanner

5308
5309

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Mov tecnico de trabajo distribuidos	del 30/11/2023 al 08/11/2023	Contratista e interventoria
2	/	/	/
3	/	/	/

Nombre: Victor Manuel Acosta
Cargo: Asesor Hidráulico Interventoria

Nombres: Oscar Felipe Ortiz
Cargo: Ecopetrol

Nombre: Alan J Moreno Martinez
Cargo: Ing. Residente Obra

Nombres: Carlos Miguel Garcia Jaime
Cargo: Ing Residente de Obra

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:		
Elaboró:		

Powered by CamScanner

IÓN:					
		HORA INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
ODERADOR:					

MBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Victor Mauricio Az	80.751.278	Interventoria	Consultor		3142433063	victor.msc@gmail.com
Jhon Mauricio M	1121902.582	Obra	Residente		3103097469	ingjhonmaurecio1992@gmail.com
Oscar Fdo Velez	86.080.760	Ecoparques	Proyectos		3112258535	.
Carlos Mayid Guda Sosa	1014937480	Interventoria	Residente de Interventoria		3105505870	

Powered by CamScanner

5909

NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Proceso:	**DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**
Subproceso:	**Mantenimiento y conservación de los bienes públicos**
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	02-11-2023
Hora de Inicio:	12:30 PM
Hora de Terminación:	1:30 PM
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Contratista de obra, Interventoria y Supervision.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento del contrato.
Avance de Actividades en obra
Revision de Ajustes A Diseños

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento del contrato
Avance de Actividades en Obra
Revision de Ajuste A Diseños.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La supervision inicia con intervencion solicitando Informacion sobre el Avance actual de obra referente a actividades en ejecucion.

El contratista de obra manifiesta que actualmente se adelantan actividades de excavacion y Fundicion de anillos de cajilla en la Margen izquierda Finalizando el dia Sabado de la pasada semana el dia 04/11/2023.

Seguidamente la supervision solicita Informacion sobre el estado de la revision de Ajustes a diseños y las acciones a la fecha por parte de los diseñadores.

La interventoria informa que actualmente se cuenta con Version preliminar del estudio hidraulico la cual recomienda construir a partir de la cota 481.00, sin embargo tambien hacer claridad en que si el trabajo de los estructurales esta calculado a partir de la cota 481.00 los diseños cumplen y las estructuras son estables.

De otra parte la interventoria informa que el dia de hoy 02/11/2023 Fue allegado el Plano de localizacion de las casetas y que se tiene previsto la entrega del estudio geotecnico para el dia 08/11/2023; y a su vez el diseño estructural el proximo 13/11/2023, lo cual daria lugar a la modificacion final y ajuste de las obras.

Seguidamente la supervision solicita dichas fechas de entrega sean acordadas teniendo en cuenta el tiempo contractual del contrato.

El contratista de obra en conjunto con la interventoria concertan realizar mesa tecnica de trabajo para acordar dichas fechas.

La supervision solicita informacion sobre la entrega del acta modificatoria a lo que la interventoria responde que fue entregada el dia de hoy 02/11/2023.

Se da por terminada la reunion.

DECISIONES TOMADAS

Se establecen compromisos para entrega de informacion

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	entrega de estudio geotecnico	08-11-2023	Contratistas
2	entrega de diseño estructural	15-11-2023	Contratistas
3			

Nombre: Oscar Pablo Yelas
Cargo: Gerente Proyecto.

Nombres: Carlos Miguel Gonzalez.
Cargo: Residente Interventoria

Nombre: Sandra Jadn
Cargo: supervisora.

Nombres:
Cargo: Secretario

Nombre:
Cargo: Directora O.C.

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Carlos Gonzalez	Residente interventoria	
Elaboró: Carlos Gonzalez	Apoyo Ambiental	

NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Proceso:	**DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL**
Subproceso:	**Mantenimiento y conservación de los bienes públicos**
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	07-11-2023
Hora de Inicio:	2:00 PM
Hora de Terminación:	3:00 pm
Fecha reunión de Seguimiento:	N/A

PARTICIPANTES

Contratista, Interventoria, Supervision

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento del contrato.

ORDEN DEL DÍA

Revision de Avance del Ajuste de cimentacion del puente en construccion

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

la supervision inica con intervencion solicitando informacion sobre los avances que se tienen en cuanto a la revision de los estudios y diseños para el alcance de la cimentacion ajustada.

la interventoria informa que se continuan adelantando mesas tecnicas de trabajo entre los especialistas en hidraulica, geotecnia y estructural, informando nuevamente que la fecha de entrega Final de los soportes ajustados esta dada para el proximo 15/11/2023.

La contratista informa que ya fueron recibidas las observaciones a la modificacion y se plantea la realizacion de un comite tecnico en compañia de la supervision, contratista y oficina de contratacion para el proximo 15/11/2023. con el fin de dar tramite al acto administrativo.

Seguidamente la supervision, interventoria y obra evaluan la

Powered by CamScanner

Posibilidad de generar una sobrecosto al contrato de obra esta tramido en cuanto que hasta tanto no se cuente con la revisión Final y Ajuste a diseños en referencia a las situaciones de socavación presentadas, no es posible continuar con intervenciones físicas en obra, sumado a que para la construcción del puente se prevé de acuerdo a las verificaciones adelantadas en los mismos frentes de trabajo la adición de recursos por causa de ajustes en cimentación, por lo anterior en próximo comité se continuara revisando la posibilidad de suspensión.

DECISIONES TOMADAS

- Comité técnico con oficina de contratación, supervisión, interventoría y contratista el jueves 09/11/2023 a las 2:00 PM.
- Reasignación observaciones de modificación jueves 09/11/2023 a las 2:00 PM.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

Powered by CamScanner

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Comite Tecnico	09/11/2023	Contratista, interventoria supervisor, Contratista
2	Respuesta observaciones modificacion	9/11/2023	Contratista interventoria
3			

Nombre: Carlos Gonzalez
Cargo: Resident Ingeniero

Nombres:
Cargo: CPS SIM.

Nombre: Oscar Fdo Veloz
Cargo: Ecopraderas.

Nombres: Eduardo Martinez
Cargo: Consorcio Bosques

Nombre: FERNANDO BARQUERO
Cargo: Rep. Legal C. Ecopraderas

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombres:
Cargo:

Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó:		
Elaboró:		

Powered by CamScanner
