6235

* Jueves 5 de Octubre 2023
Clima: Soleado
Equipo: Compresor neumatico (1); martillos neumaticos (3); mezcladora (1); Bombas sumergibles (3) Personal: Ing Residente (1); profesional SST (1) maestro general (1); Topografo (1) cadenero (1). ayudante Vigilante (1)
Se da inicio a la construccion de los muros 5 y 6 acondicionando la zona de trabajo y excavando el anillo sobre el terreno el cual es de protección para el personal que realiza la perforación al anillo se le instalaron los 28 anillos verticales y los 7 flejes que corresponde de cada diseño
Personal interventoria: Residente interventoria (1); Profesional SST (1)
La interventoria recuerda al contratista la necesidad de realizar la correcta implementacion de las recomendaciones establecidas para cada actividad y a su vez evidenciar la necesidad de disponer de mangueras para la correcta aplicacion de la mezcla 12 grado la cual debe estar dentro de la resolucion y especifica el nivel de Ruido de la viga cabezal y la cantidad de personal encargado de realizar la mezcla de los aditivos mineral a contener en los dos mangueros del No, todo esto que para futuras ocasiones se obre con el rigor de las actividades se descalla el registro de seguridad y obras pero hace mayor complejidad para los trabajadores por lo que realizar la recomendacion mayor, tranquilo con todo que cada actividad el contratista se adhiera para dicha recomendacion de trabajo constructivo.

N) Cabeceo

* Viernes 06 de Octubre 2023
Clima: Soleado
Equipo: Compresor Neumatico (1); martillos neumaticos (3); mezcladora (1); Bombas sumergibles (3); Personal: Ing Residente (1); profesional SST (1); maestro general (1); Topografo (1); Cadenero (1) Ayudante (1) Vigilante (1)
Se continua con trabajos en los muros #5 y #6, ensayos triaxiales inicio el corte de acero y Verificacion del mismo para la Fundicion, y se realizo el de concreto 1 anillo Fundido en Concreto 4P y a la espera del Vaciado del anillo Muro #6

Powered by CamScanner

6236

Perfil de Usuario (arte de atención (1), Protocolo SST (1).
La atención recae al contratista ya que garantiza la calidad técnica de los procedimientos constructivos para el avance de la construcción de los anillos de contención; igualmente la topografía de la intervención hace verificación del replanteo de la margen izquierda encontrando que solo la estaca del eje #9 se encuentra en sitio, el anillo contenido en el cajón #5 se encuentra desplazado por lo cual se ubicaron nuevas estacas del anillo del cajón #6 no tiene estaca y no se encuentra más replanteo adelante en este margen por el contratista, adicionalmente la cinta estaca encontrada del anillo cajón #4 se encuentra desplazada 5 cm, después por fuera la estación realizó verificación nuevamente el replanteo y esta entorno a continuar para la ampliación del Día quedaron anotados

Powered by CamScanner

*Sábado 7 octubre 2022
Clima: Medio
Síntomas: Congestión nasal (1); malestar general (1); tos seca (1); Viento (1)
Imagen: (1)
Personal (Nombre de cargo (1): Pedro J. (1), maestro general (1); Jhonny (1); Victor (1)
Continuamos con la excavación del terreno con el fin de fundir el solado sobre el cual se armara el anillo de protección se trabaja hasta el medio día y se deja lista para la instalación del solado el día lunes, se dejan localizados los refuerzos y son arrodeados por la topografía de la interventoría

Personal de interventoría: Reinaldo Montaña (1) Pedro J. (1)
La interventoría recuerda al contratista la urgencia de garantizar la correcta ejecución de los procedimientos constructivos para el avance de la construcción de los anillos de cajón; igualmente la topografía de la interventoría hace verificación del replanteo de la margen izquierda encontrando que solo la estaca del eje #9 se encuentra en sitio, el anillo contenido en el cajón #5 se encuentra desplazado por lo cual se ubicaron nuevas estacas del anillo del cajón #6 no tiene estaca y no se encuentra más replanteo adelante en este margen por el contratista, adicionalmente la cinta estaca encontrada del anillo cajón #4 se encuentra desplazada 5 cm, después por fuera la estación realizó verificación nuevamente el replanteo y esta entorno a continuar para la ampliación del Día quedaron anotados

6239

Reporte Mañana

*Lunes 9 de Octubre 2023.
Clima: Soleado
Equipos: compresor neumático (1); martillos neumáticos (3); mezcladora (1) Bombas sumergibles (3)
Personal: Ing. Residente (1); profesional SST (1) maestro general (1); Topografía (1); cadenero (1) ayudante vigilante (1)
Con las lluvias presentes durante la noche del domingo todo el trabajo realizado de nivelación se perdió por la creciente del caño pasando el muro de contención en la margen izquierda aguas abajo colapso viendo hacia el caño se reanudaron las actividades de nivelación para la aplicación del solado, se continua con la excavación del caisson #1 para llegar a la cota de los 8 mt
Personal Maestro/Residente de Interventoría (1); Profesional SST (1)
La interventoría solicita la petición de reforzar medidas adicionales de seguridad para los trabajadores y remitir al contratista el cargo completo de los pendientes contractuales.

Reporte Interventoría

*Martes 10 de Octubre 2023.
Clima Soleado
Equipos: compresor neumático (1); martillo neumático (3) mezcladora (1); Bombas sumergibles (3)
Personal de obra: Ing. Residente (1); profesional SST (1) maestro general (1) Topografo (1); cadenero (1); ayudante vigilante (1)
Con las fuertes lluvias presentes durante la noche anterior el caño presento una creciente la cual arraso con las obras realizadas como protección de trabajo de los caisson retiro el anillo de protección del caisson 5 y se llevo la nivelación del terreno durante el día se realizaron algunas obras de nivelación otras de protección quedando a la espera que el nivel del caño

Powered by CamScanner

6238

disminuya adicional se presento volcamiento de una viga sobre el estribo derecho, se llevo las obras de proteccion dejando una reconversión sobre el sector de la margen derecha

Residente de obra: Residente de interventoria (1), Profesional SST (1)

La interventoria informa al contratista que en dicha actividad se solicito la cantidad completa de (4) estribos en concreto los cuales han podido ejecutarse en el año y adicional las vigas en ambos de la margen derecha estaba pendiente por dejarlas completas

Miercoles 11 de Octubre 2023.

Clima: Soleado

Equipo: Compresor neumatico (1); martillo neumatico (3) mezcladora (1); Bombas sumergibles (3)

Personal de Obra: Ing. Residente (1); profesional SST (1) Topografo (1); Cadenero (1); maestro general (1) ayudante vigilante (1)

Continuamos con la nivelacion de la zona del caisson la cual no fue afectada por las lluvias en los sectores de los caissons 4 y 5 se encuentran muy cerca de la zona del rio por lo cual no se puede trabajar se termino de excavar el caisson 5 para completar el 8 anillo fuera del anillo de proteccion, se alisto el material y se amarro el acero que hace parte del anillo, se preparo una maquina para realizar el manejo del cauce y la demolicion de las estructuras que afectan el flujo del rio.

Residente de obra: Residente Interventoria (1), Profesional SST (1)

La interventoria realiza la aceptacion de cambio de actividad y el retiro de la estructural que se encuentra en el centro del cauce

Jueves. 12 de Octubre 2023.

Clima: Soleado

Equipos: Compresor neumatico (1); martillo neumatico (3); mezcladora (1); Retro oruga 320D con martillo demoledor; Bombas sumergibles (3).


Personal de Obra: Ing. Residente (1); profesional SST (1) Topografo (1); Cadenero (1); maestro general (1) ayudante

Powered by CamScanner

6239


se suende el anillo del reinsen y saltante completando los anillos fuera del anillo de protección llega la retro excavadora Doha Dare 3200 para iniciar con las demoliciones y con el ingreso de la electricidad se debe demoler unas estructuras para acondicionar la bajada de la maquina

muro 1

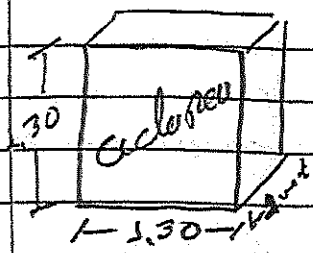


ancho = 1,30mt
Alto = 1,30m
Espesor = 1,00mt

muro 2 bajada a caño




Ancho = 5mt
Alto = 0,60mt
Espesor = 0,50mt.

muro 3 bajada caño



ancha: 4,95
Alto = 1,60
Espesor = 0,80.

Se realiza la demolición de la viga calzada en la margen derecha cuyas medidas son:

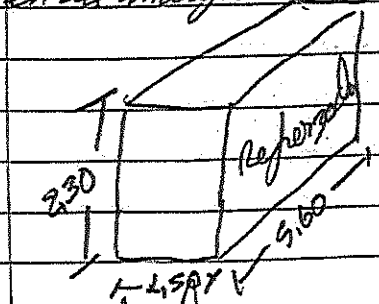

Ancho = 1,50m
Alto: 2,30
Espes: 5,60.


Observaciones: Durante la actividad (C): Personal SIT.

La contratista verificara las estructuras proyectadas por el contratista con la demolición con las especificaciones y medidas ya existentes, solicita al contratista asegurar los estabilizadores de la tubería en ambas margenes. El retiro de los estribos en concreto que se vaya encontrando.

Powered by CamScanner

6240

Viernes 13 de Octubre 2023.
Clima: Nublado mañana
Soleado tarde
Equipos: Retro Excavadora (1) 320D; nivel y estaciones topográficos
Personal de Obra: Ing. Residente (1); Topografo (1); cadenero topografo general (1); practicante SST (1) ayudante vigilante (1)
Se da inicio a la jornada laboral con charlas por parte de la ARL se continuo con las demoliciones de las estructuras localizadas en el cauce del caño con las siguientes dimensiones
Concreto Ciclopeo 1 Ciclopeo 2

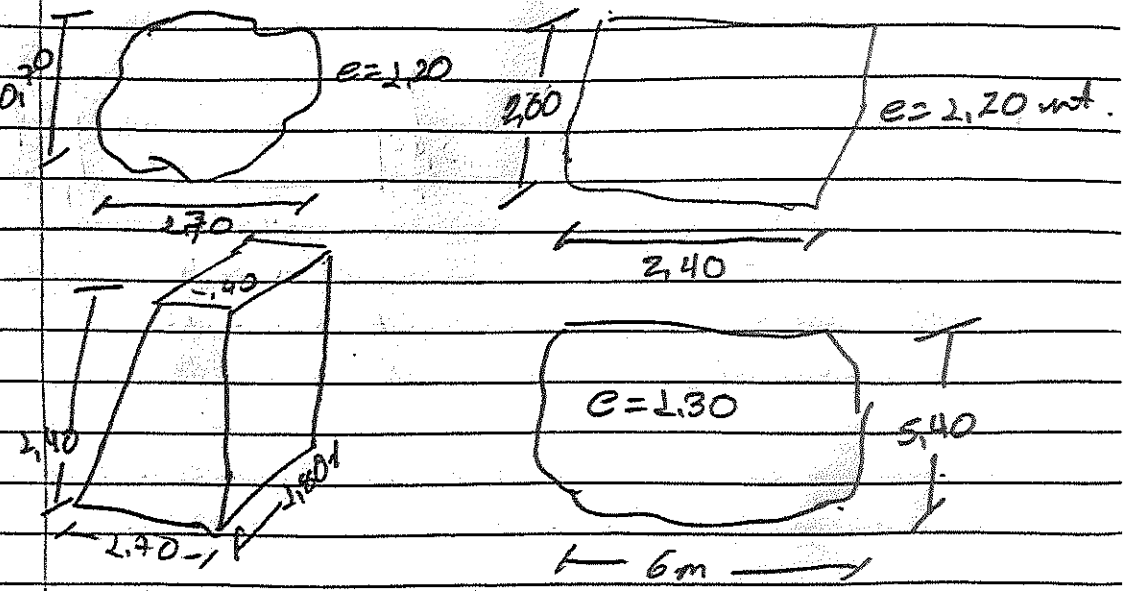

En la jornada de la tarde se inicio con manejo del cauce organizando un jarillon en costales margenes a fin de continuar con las actividades de obra

Panel de la entidad Parte de atención (d). Profesional SST (1)
La interventoria recuerda al contratista la necesidad de cumplir las disposiciones de la Circular conjunta 001 de 2020, aclarando que la Figura No 01 sin requiere de la tarjeta Panel para dar paso de vehículos y de entrada en obra, la misma exige la necesidad de mejorar la condición de

Powered by CamScanner

6241

Cave todo el que en los datos aquí abajo se reunen un consolidamiento del suelo, así mismo Constate seguimiento de los gruitos hasta grados con conformación en material granular ordinario y los trabajos relacionados con seguridad, así mismo valuate colocación de soluciones en cada ocasión y en general calidad obtenidas de trabajo rutinario con seguimiento de las actividades mismas las Figuras asignadas por el contratista con los montos que constan en el contrato.

Sábado 14 de Octubre 2023.
Clima: soleado
Equipos: Mezcladora (1); martillo neumático (3) compresor neumático (1)
Personal de Obra: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topógrafo (1); Cadenero (1); Maestro general (1); ayudante (1); Vigilante (1)
Se instala un salado por encima de la cota de cimentación puesto que esta esta por debajo del nivel del rio produciendo inundación y se bombean las aguas situación que fue puesta en conocimiento a la interventoría donde el día viernes 13 de octubre 2023 al ing. Felipe Manzanera quien hace parte de la interventoría.

Domingo 15 de Octubre 2023.
no se trabaja

Lunes 16 de Octubre 2023.
No se labora día festivo

Powered by CamScanner

6242

FECHA	MARTES 17 DE OCTUBRE 2023
CLIMA	SOLEADO (LLUVIA DE 3:30 PM A 4:00 PM)
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL DE OBRA, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD	· Se hace labor de replanteo y ubicación del caisson 6 y 4 · Se hace amarre de acero, encofrado interno y externo del primer anillo (1m) del caisson 6 · El material de la excavación es material granular

Personal de interventoría: (1) Residente de interventoría, (1) Profesional SST

FECHA MIERCOLES 18 DE OCTUBRE 2023
CLIMA SOLEADO
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES.
ACTIVIDAD · Se hacen labores de replanteo y ubicación del caisson 4
· Se hace armado de acero, encofrado y vaciado del primer anillo (1m) caisson 4.
- Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en caisson 5 y 6. En el caisson 5 se hace anillo de 0,57m y en caisson 6 de 0,5m.
- El material de la excavación es material granular

Personal de interventoría: (1) Residente de interventoría, (1) Profesional SST

FECHA JUEVES 19 DE OCTUBRE 2023
CLIMA SOLEADO
PERSONAL 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL, 6 AYUDANTES
ACTIVIDAD · Se hacen labores de excavación en el caisson 5 y 6
- Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado de concreto del segundo anillo del caisson 4 (0,65m)
- Se encuentra material granular en las excavaciones

Personal de interventoría: (1) Residente interventoría, (1) Profesional SST

Powered by CamScanner

6293

FECHA: VIERNES 20 DE OCTUBRE 2023
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CARPENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL, 6 AYUDANTES
ACTIVIDAD:
- Se hacen labores de excavación en caisson 4 y 6
- Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en el tercer anillo (1m) del caisson 5.
- Se encuentra material granular en las excavaciones.

Personal de visita: C) Residente de obra, C) Personal SST.

FECHA: SABADO 21 DE OCTUBRE 2023
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CARPENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL
ACTIVIDAD:
- Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en caisson 4 (5° anillo 1m) y caisson 6 (3° anillo 1m)
- Se encuentra material granular en excavación

Personal de visita: C) Jefe de interventoría, C) Profesional SST

FECHA: LUNES 23 DE OCTUBRE 2023
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CARPENERO, 1 MAESTRO GENERAL, 1 OFICIAL,
ACTIVIDAD:
- Se hacen labores de excavación en caisson 5 y 6
- Se encuentra material granular

Personal de visita: C) Jefe de interventoría, C) Profesional SST

Powered by CamScanner

6794

FECHA	MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023
CLIMA	MAÑANA LLUVIOSA DE 7 a 11 AM, TARDE NUBLADA
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL,
ACTIVIDAD	- Se hacen labores de excavación en el caisson 4 - Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en caisson 5 (se hace anillo de 1m y en caisson 6 (Se hace anillo de 1m) - Material granular en la excavación Personal de Interventoría: C) Residente de Interventoría, C) Profesional SST

Rec Interventoría

FECHA	MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023
CLIMA	MAÑANA CALUROSA, TARDE NUBLADA (LLUVIA DE 3:30PM A 6:30PM)
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL,
ACTIVIDAD	- Se hacen labores de excavación en caissons 4, 5 y 6 - Se encuentra material granular en las excavaciones - Se hace labores de armado de acero, encofrado en caisson 4 - Se inicia vaciado del 4to anillo del caisson 4, pero el rio tiene una creciente que impide seguir con las labores de vaciado. Personal de visitas C) Ruben de interventoría, C) Profesional SST.

Rec Interventoría

FECHA	JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023
CLIMA	MAÑANA NUBLADA, LLUVIA DE (12:00M A 3:00 PM)
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL,
ACTIVIDAD	- Se hacen labores de excavación, encofrado, armado de acero y vaciado de 5to anillo (1m) en caisson 5 y 6 - Se reanuda con las labores de encofrado y vaciado de 4to anillo (1m) en caisson 4 - Se encuentra material granular en la excavación Personal de visitas C) Ruben de Interventoría, C) Profesional SST.

Rec Interventoría

Powered by CamScanner
