Wilmar Moncada Arcila
NIT. 71.672.180-9

INFORME DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y FINAL



Contrato N. IP-001-2024 cuyo objeto es: "REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA"

INFORME No. 1 DE OBRA

DEL 18 DE ABRIL DE 2024 AL 10 DE MAYO DE 2024

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15

Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com

RIONEGRO

MAYO DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA

1. INTRODUCCION

Entre LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE- EDESO, Municipio de Rionegro — Antioquia y CIMAG S.A.S, representada por HECTOR MAURICIO GUTIERREZ, se celebró el contrato N. CD-007-2024, cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA ", por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILSETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($64.263.750). IVA incluido. y un plazo estipulado de dos (2) meses y quince (15) días, desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo del contrato no podrá ser superior al contrato interadministrativo 1080-06-09-008-2024.

El contrato de interventoría tuvo inicio el 18 de abril de 2024, el acta de inicio tuvo fecha del 18 de abril de 2024 y fecha de finalización inicial el 27 de mayo de 2024, ésta fecha de terminación está en revisión.

El contrato de construcción IP 001 de 2024 fue celebrado entre LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE- EDESO, Municipio de Rionegro y WILMAR JOSE MONCADA ARCILA cuyo objeto es: " REPARCHEO, SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA ", por un valor de ($838.371.650) AU incluido y un plazo estipulado de DOS MESES (2), contados a partir del inicio del contrato.

El presente documento elaborado por WILMAR JOSE MONCADA ARCILA, como parte de los compromisos contractuales adquiridos, tiene por objeto presentar al municipio de Rionegro - Antioquia un informe en el cual se presentan los procedimientos y acciones realizadas para el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual garantizando la calidad de las obras y el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y la legislación vigente durante el desempeño de todo el contrato, periodo en el cual, de igual manera, la interventoría desarrolló actividades inherentes a su objeto contractual.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas en el período del 18 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, en el marco del contrato de obra No IP 001- 2024 suscrito entre Wilmar José Moncada Arcila y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO.

CONTRATO No IP 001 - 2024

CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO
NIT No	900 974 762-8
CONTRATISTA	WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
NIT	71 672.180-9
OBJETO	REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

PLAZO	DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-0609-02-008-2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MIL ($838 371 650). AU INCLUIDO
LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA -

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Rionegro Antioquia.

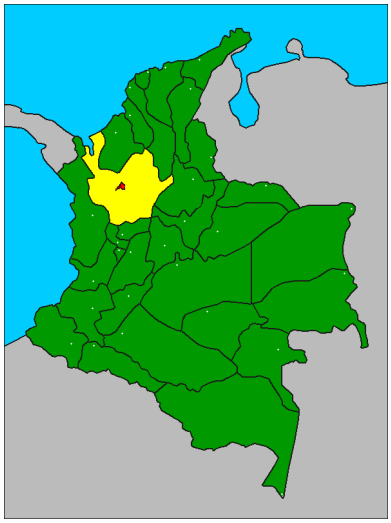


Figura 1 Mapa de Rionegro en Antioquia y en Colombia

Los sectores a intervenir han sido previamente determinados por el municipio de Rionegro a saber:

1 Calle 45 (Juan de Dios Morales)
2 Calle 43
3 Vía tranvía
4 Carrera 47
5 Carrera 46
6 Calle 47
7 Calle 41 y diagonal 45 sector UCO
8 Carrera 52 AC sector los colegios

9 Carrera 62ª, sector Villas de Gualanday

10 Carrera 55ª Los Remansos

11 Vía principal Galicia parte alta

12 Sector zona franca

3 SEGUIMIENTO TÉCNICO

3.1 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE INTERVENCIÓN: La metodología para las intervenciones inicia con recorrido entre La supervisión por parte del municipio de Rionegro, la supervisión por parte de la EDESO, representante del contratista y representante de la interventoría, a fin determinar las prioridades, señalar los puntos exactos de intervención, perímetros y áreas por cada punto.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS EN EL PERIODO: El presente periodo corresponde al informe N°1 desde el 18 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, donde se vienen adelantando las siguientes actividades:

3.2.1 PERFILACION Y CONFORMACION

- Nivelación y/o conformación de Calzada Existente (céreo), incluye compactación. En vías rehabilitadas y con tránsito vehicular).

3.2.2 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y LLENOS

- Suministro, transporte y colocación de base granular tipo Invias

- Demolición de pavimento asfaltico

3.2.3 MEZCLAS

- Suministro, transporte e instalación de riego de Imprimación para superficie a pavimentar
- Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de huecos de forma MANUAL Y PUNTUALES

3.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD, ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS

Para el periodo reportado en este informe, se hace entrega del control de calidad de mezclas asfálticas de la planta de mezclas San Javier – Pavimentos Aburra S.A.S. Se anexan los certificados de los días 18 – 19 - 22 – 23 – 24 – 25 – 26 -29 - 30 de abril de 2024, los días 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 y 10 de mayo de 2024. (Anexo N°1).

3.4 RESUMEN EJECUCIÓN FORMATO DE INTERVENCIÓN

Si bien en cierto que la fecha de corte con el contratista es hasta final de mes, el formato de intervención presenta ejecución desde el 18 de abril hasta el día 10 de mayo 2024.

Nota: en el formato anexo de intervención, se presenta la información con coordenadas de los puntos de intervención.

3.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona el avance acumulado financiero del proyecto de acuerdo a la última acta de obra (No. 1) concertada y pendiente de pago.

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, E INTERVENTORIA EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIÓN ACUMULADA DE LOS CAMBIOS DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											ACTA 1		ACUMULADA	
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	**Preliminares**													
1.1	Localizacion, trazado y replanteo (incluye equipo de precisión debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la Inteventoria	día	2.00	$ 627,100	$ 1,254,200	-	2.00	-$ 1,254,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
1.2	Nivelación y/o conformación de Calzada Existente (cereo), incluye compactación. En vias rehabilitadas y con tránsito vehicular).	m2	10,000.00	$ 3,270	$ 32,700,000	-	7,000.00	-$ 22,890,000	3,000.00	$ 9,810,000	2,376.81	$ 7,772,169	2,376.81	$ 7,772,169
2	**DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y LLENOS**													
2.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m3	10.00	$ 206,200	$ 2,062,000	-	10.00	-$ 2,062,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.2	Excavación mecánica en material común 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, incluye botada, derecho de escombrera, cargue y transporte (No incluye entibado). Incluye 15 km min de transporte externo que debe ser validado por la Interventoria.	m3	95.51	$ 34,220	$ 3,268,355	-	95.51	-$ 3,268,355	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	180.00	$ 56,060	$ 10,090,800	-	180.00	-$ 10,090,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.4	Suministro, transporte y colocación de base granular tipo Invias, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. previa autorizacion de la interventoria , para parcheos de maximo 25 m2 de area superficial.	m3	370.00	$ 280,560	$ 103,807,200	-	370.00	-$ 103,807,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.5	Llenos compactados con material de préstamo (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVÍAS) Deben alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo Próctor Modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVÍAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoria.	m3	40.00	$ 45,070	$ 1,802,800	-	40.00	-$ 1,802,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
2.6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4" a 5" Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	1,000.00	$ 30,990	$ 30,990,000	-	500.00	-$ 15,495,000	500.00	$ 15,495,000	207.68	$ 6,436,003	207.68	$ 6,436,003
3	**MEZCLAS**													
3.1	Suministro, transporte e instalación de riego de Imprimación para superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS con emulsion asfaltica 2 capas.	m2	2,200.00	$ 5,470	$ 12,034,000			$ -	2,200.00	$ 12,034,000	1,411.44	$ 7,720,577	1,411.44	$ 7,720,577
3.2	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES, Incluye demolición del pavimento existente, transporte de escombros, imprimación. Transporte y instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica. El area de superficie por parcheo no podra ser superior a 25 m2.	m3	280.00	$ 1,564,168	$ 437,967,040	-	118.79	-$ 185,810,836	161.21	$ 252,156,204	129.06	$ 201,871,522	129.06	$ 201,871,522
3.3	SOBRE CARGO nocturno para aplicación de MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA , (Suministro , Extendido , Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 Tonelada ó cualquier maquinaria pesada para la aplicación de la mezcla incluye operario y combustible).	m3	30.00	$ 152,410	$ 4,572,300	+	11.83	$ 1,803,010	41.83	$ 6,375,310	41.83	$ 6,375,310	41.83	$ 6,375,310
4	**REDES HIDRAULICAS VIAS**													
4.1	Realce de MH, Incluye Tapa y cuellos nuevos de Concreto, demolicion de pavimento, realce entre 10 y 12 cm.	und	2.00	$ 993,000	$ 1,986,000	-	2.00	-$ 1,986,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**													
5.1	Marca vial con pintura plástico en frio para flechas, giro, resalto, cebras etc., resistencia al deslizamiento. Incluye el suministro de las plantillas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m²	90.00	$ 53,810	$ 4,842,900	-	90.00	-$ 4,842,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
5.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio base solvente para linea de 0,12m de ancho con resistencia al deslizamiento para canalizacion continua o segmentada, berma, agujas, celdas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alumina antideslizante.	m	350.00	$ 5,770	$ 2,019,500	-	350.00	-$ 2,019,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
O.E	**OBRA EXTRA**													
O.E 1	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19. para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES. Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica.	m3		$ 1,467,847	$ -	+	198.23	$ 290,971,311	198.23	$ 290,971,311	198.23	$ 290,971,311	198.23	$ 290,971,311
O.E 2	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, cargue, transporte y botada de escombros, ESPESOR DE 12,5 cm a 25,0 cm Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2		$ 52,573	$ -	+	1,204.64	$ 63,331,539	1,204.64	$ 63,331,539	1,204.64	$ 63,331,539	1,204.64	$ 63,331,539
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CONTRACTUAL				**$ 649,397,095**					**$ 650,173,364**		**$ 584,478,431**		**$ 584,478,431**
	ADMINISTRACION			**24.10%**	**$ 156,504,700**					**$ 156,691,781**		**$ 140,859,302**		**$ 140,859,302**
	UTILIDAD			**5.00%**	**$ 32,469,855**					**$ 32,508,668**		**$ 29,223,922**		**$ 29,223,922**
	COSTO TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 838,371,650**					**$ 839,373,813**		**$ 754,561,654**		**$ 754,561,654**
	TOTAL OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA INCLUYENDO AU											**$ 754,561,654**		**$ 754,561,654**
	AMORTIZACION DE ANTICIPO											**$ 0**		**$ 0**
	PAGO ADELANTADO											**$ 167,674,330**		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA											**$ 586,887,324**		**$ 754,561,654**

Figura 2 Acta de obra

Tabla 1 Control de Programación

ACUMULADO PROYECTO		
ACTIVIDADES	**VALOR APROXIMADO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
VALOR EJECUTADO	$754.561.654,00	90.00%
TOTAL, COSTO DIRECTO	$584.478.431,00	
ADMINISTRACION (24,10%)	$140.859.302,00	
UTILIDAD (5%)	$29.223.922,00	
TOTAL ACUM. PARA ACTA DE OBRA No. 1	$754.561.654,00	

De acuerdo a lo presentado en la tabla 3, se relacionan los avances físicos que tiene el contrato, hasta el 10 de mayo de 2024.

Tabla 2 Avance físico. Control de Programación

AVANCE FISICO	
Programado:	40%
Ejecutado:	90.00%

A partir de la programación entregada por el contratista, se hizo control a la misma, teniendo como resultado, un adelanto de 23 días en el tiempo de ejecución, se anexa el control con corte a mayo 10 de 2024.



1. Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada.	

3.7 SEGUIMIENTO TÉCNICO

3.7.1 Programa por frentes de trabajo

Tabla 4 Programa por frentes de trabajo

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
REPARCHE VIAS RIONEGRO	52	18/04/2024	25/06/2024
Localización, trazado y replanteo	2	18/04/2024	19/04/2024
Carrera 62 A – Gualanday	3	18/04/2024	22/04/2024
San Antonio - San Bartolo	2	22/04/2024	23/04/2024
Carrera 55 A – Remansos	3	24/04/2024	26/04/2024
Carrera 52 AC – Colegios	6	26/04/2024	2/05/2024
Calle 41 y Diagonal 45 sector la UCO	6	2/05/2024	8/05/2024
Calle 45 - Juan de Dios Morales	8	8/05/2024	16/05/2024
Calle 45 - Vía el tranvía	8	16/05/2024	27/05/2024
Calle 43 - San Nicolas	4	27/05/2024	30/05/2024
Carrera 47 – Centro	3	30/05/2024	3/06/2024
Carrera 46 – Centro	3	4/06/2024	6/06/2024
Aplicación de pintura plástico en frio	7	7/06/2024	17/06/2024

Se anexa programación en Project.

3.8 OBRAS EXTRAS ADICIONALES APROBADAS EN EL PERIODO Y PORQUE SE REQUIRIERON

Según necesidades observadas en campo por municipio y Edeso se tuvieron que intervenir áreas mayores a 25 m2 y adicional a esto se encontraron espesores mayores a 12.5 cm, por lo tanto, la entidad solicito la elaboración de las siguientes obras extras:

- Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19. para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES. Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica.
- DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, cargue, transporte y botada de escombros, ESPESOR DE 12,5 cm a 25,0 cm Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

3.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

3.9.1 Gualanday

3.9.1.1 Intervención #1







Intervención #1

Foto 1 Intervención #1

3.9.1.2 Intervención #2

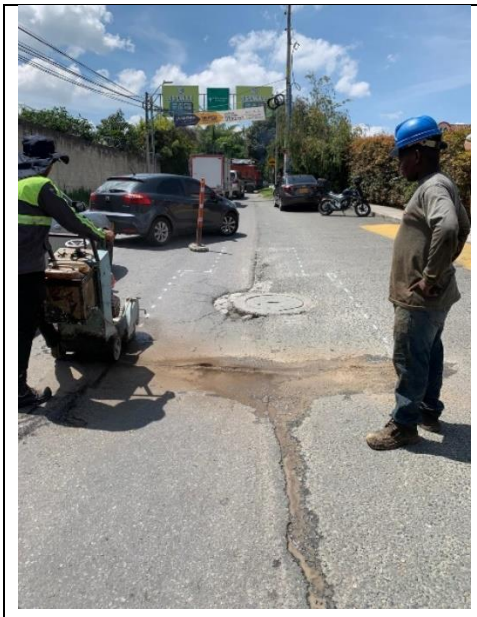
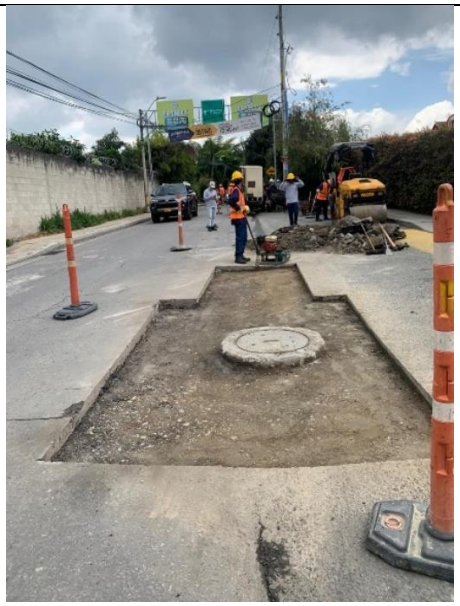
	
	INTERVENCIÓN #2

Foto 2 Intervención #2

3.9.1.3 Intervención #3


	
	Intervención #3

Foto 3 Intervención #3

3.9.1.4 Intervención #4



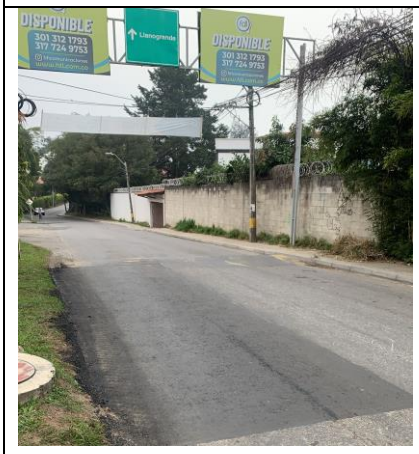

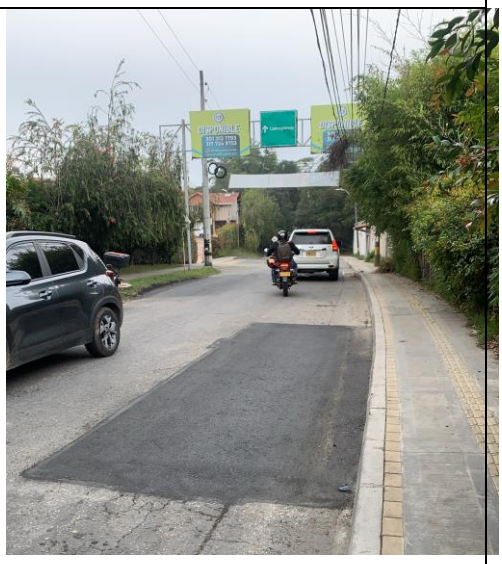


Foto 4 Intervención #4

3.9.1.5 Intervención #5

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com







Foto 5 Intervención #5

3.9.1.6 Intervención #6

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com





Foto 6 Intervención #6

Se presenta el registro fotográfico completo como anexo, siempre se presenta el antes y el después, en cada una de las intervenciones por sector.

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com

Empresa de Desarrollo Sostenible

ACTA DE AVANCE DE OBRA

CÓDIGO: FO-ESI-30	
VERSIÓN: 01	
FECHA: 17/09/2016	

CONTRATO No :	IP-001-2024
OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA	
VR INICIAL	$ 838.371.650
PORCENTAJE ANTICIPO	
VR ANTICIPO	

FECHA INICIO	18/04/2024
PLAZO	2 meses
ADICIÓN	
FECHA TERMINACIÓN	17/06/2024

CONTRATANTE: WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	ACTA DE OBRA
	ACTA No. 01
FECHA:18-05-2024	MUNICIPIO: RIONEGRO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN, E INTERVENTORIA EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIÓN ACUMULADA DE LOS CAMBIOS DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											ACTA 1		ACUMULADA	
ITEM	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	+ -	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	Preliminares													
1,1	Localizacion, trazado y replanteo (incluye equipo de precisión debidamente calibrado, estacas, libretas, planos, memorias, edición y dibujo). Se incluye la localización y replanteo de ambas márgenes con todos los elementos necesarios para el proyecto, y de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría	día	2,00	$ 627.100	$ 1.254.200	-	2,00	-$ 1.254.200	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,2	Nivelación y/o conformación de Calzada Existente (carreo), incluye compactación. En vías rehabilitadas y con tránsito vehicular).	m2	10.000,00	$ 3.270	$ 32.700.000	-	7.000,00	-$ 22.890.000	3.000,00	$ 9.810.000	2.376,81	$ 7.772.169	2.376,81	$ 7.772.169
2	DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y LLENOS													
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	10,00	$ 206.200	$ 2.062.000	-	10,00	-$ 2.062.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,2	Excavación mecánica en material común 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, incluye botada, derecho de escombrera, cargue y transporte (No incluye entibado). Incluye 15 km min de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría.	m3	95,51	$ 34.220	$ 3.268.355	-	95,51	-$ 3.268.355	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,3	EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	180,00	$ 56.060	$ 10.090.800	-	180,00	-$ 10.090.800	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,4	Suministro, transporte y colocación de base granular tipo invías, reacomodado con medios MANUALES y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. previa autorización de la interventoría , para parcheos de maximo 25 m2 de area superficial.	m3	370,00	$ 280.560	$ 103.807.200	-	370,00	-$ 103.807.200	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,5	Llenos compactados con material de préstamo (limo de la zona de acuerdo con las especificaciones para construcción de terraplenes del INVIAS) Deben alcanzar el 95% del valor seco máximo del ensayo Próctor Modificado; y realizar el control de densidades y materiales, de acuerdo con la normatividad INVIAS y las indicaciones de la Interventoría. Incluye 15 km de transporte externo que debe ser validado por la Interventoría.	m3	40,00	$ 45.070	$ 1.802.800	-	40,00	-$ 1.802.800	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4" a 5" Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	1.000,00	$ 30.990	$ 30.990.000	-	500,00	-$ 15.495.000	500,00	$ 15.495.000	207,68	$ 6.436.003	207,68	$ 6.436.003
3	MEZCLAS													
3,1	Suministro, transporte e instalación de riego de imprimación para superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS con emulsion asfaltica 2 capas.	m2	2.200,00	$ 5.470	$ 12.034.000			$ -	2.200,00	$ 12.034.000	1.411,44	$ 7.720.577	1.411,44	$ 7.720.577
3,2	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES, Incluye demolición del pavimento existente, transporte de escombros, imprimación. Transporte y instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica. El area de superficie por parcheo no podra ser superior a 25 m2.	m3	260,00	$ 1.564.168	$ 407.967.040	-	118,79	-$ 185.810.838	161,21	$ 252.156.204	129,06	$ 201.871.522	129,06	$ 201.871.522
3,3	SOBRE CARGO nocturno para aplicación de MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA , (Suministro , Extendido , Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Bentin de 1 Toneladas ó cualquier maquinaria pasada para la aplicación de la mezcla incluye operario y combustible).	m3	30,00	$ 152.410	$ 4.572.300	+	11,83	$ 1.803.010	41,83	$ 6.375.310	41,83	$ 6.375.310	41,83	$ 6.375.310

4	REDES HIDRAULICAS VIAS														
4.1	Realce de MH, incluye Tapa y cuellos nuevos de Concreto, demolicion de pavimento, realce entre 10 y 12 cm.	und	2,00	$ 993.000	$ 1.986.000	-	2,00	-$ 1.986.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
5	SEÑALIZACION Y DEMARCACION														
5.1	Marca vial con pintura plástico en frio para flechas, giro, resalto, cebras etc., resistencia al deslizamiento. Incluye el suministro de las plantillas y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m²	90,00	$ 53.810	$ 4.842.900	-	90,00	-$ 4.842.900	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
5.2	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio base solvente para linea de 0,12m de ancho con resistencia al deslizamiento para canalizacion continua o segmentada, barra, agujas, celdas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye micro esferas de vidrio y alumina antideslizante.	m	350,00	$ 5.770	$ 2.019.500	-	350,00	-$ 2.019.500	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
O.E	OBRA EXTRA														
O.E 1	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19. para parchaos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES. Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica.	m3		$ 1.467.847	$ -	+	198,23	$ 290.971.311	198,23	$ 290.971.311	198,23	$ 290.971.311	198,23	$ 290.971.311	
O.E 2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFÁLTICO, cargue, transporte y botada de escombros, ESPESOR DE 12,5 cm a 25,0 cm Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m2		$ 52.573	$ -	+	1.204,64	$ 63.331.539	1.204,64	$ 63.331.539	1.204,64	$ 63.331.539	1.204,64	$ 63.331.539	

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CONTRACTUAL		$ 649.397.695		$ 650.173.364		$ 584.478.431	$ 584.478.431
ADMINISTRACION	24,10%	$ 156.504.709		$ 156.691.781		$ 140.859.302	$ 140.859.302
UTILIDAD	5,00%	$ 32.469.855		$ 32.509.668		$ 29.223.922	$ 29.223.922
COSTO TOTAL OBRA CONTRACTUAL		$ 838.371.850		$ 839.373.813		$ 754.561.654	$ 754.561.654

TOTAL OBRA ORDINARIA + OBRA EXTRA INCLUYENDO AU													$ 754.561.654		$ 754.561.654
AMORTIZACION DE ANTICIPO													$ 0		$ 0
PAGO ADELANTADO													$ 167.674.330		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA													$ 586.887.324		$ 754.561.654

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen:

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
Representante legal Contratista
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

MAURICIO GUTIERREZ
Representante legal Interventoria
CEMAS S.A.S.

90,09%


Empresa de Servicios Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2016

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 01

FECHA	DD	18	MM	6	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE	1	
							CORTE N°	1	ELABORÓ	ALejandro Garcia Bedoya			

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA						
CONTRATISTA	VILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-9	CONTRATO N°	IP-001-2024		

CAPÍTULO	2	ÍTEM: 2.6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4" a 5" Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	UNID.	m2	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPÍTULO	DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y LLENOS						

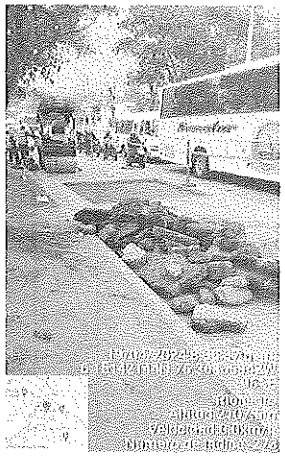

	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
15	Carrera 55 No 18 A 37 Sector los Remansos	18/04/2024		10,50	3,93		41,27
				3,12	2,26		7,04
				7,25	1,45		10,51
20	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		8,88	2,43		21,68
				2,60	1,87		4,86
22	Calle 41 Carrera 45 Panaderia Sector Los Colegios	19/04/2024		3,30	2,59		8,55
				2,87	0,42		1,21
				1,53	0,58		0,89
				4,70	2,47		11,61
				2,11	1,65		3,48
				2,45	1,65		3,60
				2,41	2,48		5,96
52	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada al estadio, Carril derecho	23/04/2024		9,15	2,80		25,62
54	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril derecho	23/04/2024		3,06	1,37		4,19
				2,28	1,35		3,08
				1,20	0,55		0,66
				5,48	2,32		12,71
				3,07	1,57		4,82

50	Avenida Juan de Dios Morales, Retorno parque lineal, Carril derecho	23/04/2024		4,47	1,74		7,78
				5,85	2,67		15,62
				4,83	2,58		12,44
OBSERVACIONES:							
			Subtotal			207,68	
			menos pagado actas anteriores				
			TOTAL			207,68	

FIRMA:
NOMBRE: Wilmar Moncada Arcila
Representante del Contratista

CRIAG S.A.S.
Representante de la Interventoria


	MEMORIAS DE CÁLCULO	CODIGO: FO-ES1-23 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/05/2018


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	18	MM	5	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE	1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	ALejandro García Badoya		


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA						
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672189-9	CONTRATO N°	IP-001-2024		

CAPÍTULO	3	ITEM: 3.1	Suministro, transporte e instalación de riego de imprimación para superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS con emulsion asfaltica 2 capas.	UNID.	m2	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPITULO	MEZCLAS						





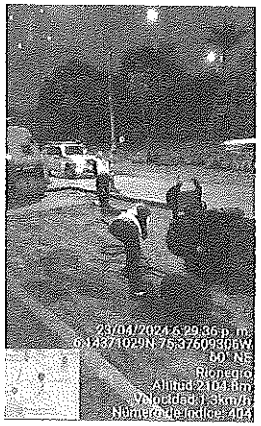



	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
8	Carrera 55 CA con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		0.614292562			0,61
				6,60	5,40		35,10
				4,15	0,93		3,86
13	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo, parqueaderos	18/04/2024		6,30	1,16		7,31
				4,70	3,25		15,28
				2,40	1,10		2,64
				2,60	2,01		5,23
15	Carrera 55 No 18 A 37 Sector los Remansos	18/04/2024		10,50	3,93		41,27
				3,12	2,26		7,04
				7,25	1,45		10,51
20	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		8,88	2,43		21,58
				2,60	1,87		4,86
22	Calle 41 Carrera 45 Panaderia Sector Los Colegios	19/04/2024		3,30	2,59		8,55
				2,87	0,42		1,21
				1,53	0,58		0,89
				4,70	2,47		11,61
				2,11	1,65		3,48
				2,45	1,55		3,80
				2,41	2,48		5,96





52	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada al estadio. Carril derecho	23/04/2024		9,15	2,80		25,62
54	Avenida Juan de Dios Morales. Detrás del estadio. Carril derecho	23/04/2024		3,06	1,37		4,19
				2,28	1,35		3,08
				1,20	0,55		0,66
				5,48	2,32		12,71
				3,07	1,57		4,82
56	Avenida Juan de Dios Morales. Retorno parque lineal. Carril derecho	23/04/2024		4,47	1,74		7,78
				5,85	2,67		15,62
				4,83	2,58		12,44
60	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	23/04/2024		3,15	2,04		6,43
				4,66	5,64		26,82
				3,40	1,14		3,88
63	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		2,82	2,22		6,26
				7,63	2,34		17,85
				6,21	1,74		10,81
				10,40	2,13		22,10
72	Avenida Tranvía glorieta reloj. Carril izquierdo	26/04/2024		7,00	4,57		31,99
				2,90	3,82		11,06
				2,72	3,41		9,26
76	Avenida Tranvía. Sentido Rionegro Marinilla. Carril derecho	26/04/2024		8,44	2,82		23,80
				1,80	1,39		2,50
78	Avenida Tranvía. Sentido Rionegro Marinilla. Carril izquierdo	26/04/2024		14,46	3,31		47,79
				4,11	2,27		9,33
79	Avenida Tranvía. Sentido marinilla Rionegro. Carril izquierdo	29/04/2024		6,15	2,03		12,45
				4,36	1,80		7,85
				2,92	2,61		7,62
				1,70	0,55		0,94
80	Avenida Tranvía. Sentido marinilla Rionegro. Carril izquierdo	29/04/2024		7,73	4,36		33,70
				5,90	2,61		15,40
				3,49	2,32		8,10
				1,95	1,88		3,67
				3,27	1,27		4,15

Empresa de Servicios Públicos	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2016

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 6


FECHA	DD	18	MM	5	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE 1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	ALejandro Garcia Bedoya	

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA						
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-9	CONTRATO N°	IP-001-2024		

CAPÍTULO	1	ITEM: 1.2	Nivelación y/o conformación de Calzada Existente (cereo), incluye compactación. En vias rehabilitadas y con tránsito vehicular).	UNID.	m2	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPITULO	Preliminares						





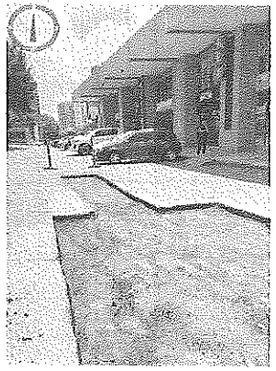




	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
1	Entrada urbanizacion Gualanday	18/04/2024		2,42	2,19		5,29
				1,41	2,74		3,85
2	Entrada urbanizacion Gualanday	18/04/2024		3,77	2,40		9,05
				2,74	1,58		4,33
				-0,79			-0,79
3	Resalto salida urbanizacion Gualanday	18/04/2024		9,76	2,23		21,72
4	Gualanday Transversal 24 A No 60-304	18/04/2024		7,49	2,03		15,20
5	Gualanday llegado a resalto glorieta virtual	18/04/2024		6,95	2,97		20,63
6	Gualanday llegado a resalto glorieta virtual	18/04/2024		5,98	1,92		11,48
7	Gualanday resalto glorieta virtual	18/04/2024		2,20	1,81		3,98
				6,37	1,78		11,34
8	Carrera 55 CA con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		2,37	0,63		1,49
				6,50	5,40		35,10
				4,15	0,93		3,86
9	Carrera 55 No 18-44 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,73	2,92		7,97
10	Carrera 55 No 18-60 Sector Los Remansos	18/04/2024		4,63	3,45		15,97
11	Carrera 55 No 18A-19 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,48	2,12		5,26







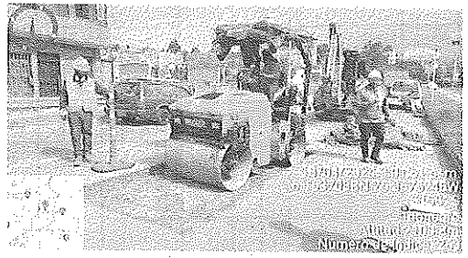

12	Carrera 55 con calle 21 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,00	1,54		3,08
				3,80	4,68		17,78
13	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo, parqueaderos	18/04/2024		6,30	1,16		7,31
				4,70	3,25		15,28
				2,40	1,10		2,64
				2,60	2,01		5,23
14	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		2,83	4,60		13,02
15	Carrera 55 No 16 A 37 Sector los Remansos	18/04/2024		10,50	3,93		41,27
				3,12	2,26		7,04
				7,25	1,45		10,51
16	Carrera 55 No 21 C 14 Sector Los Remansos	19/04/2024		7,00	2,05		14,35
17	Carrera 55 No 22-29 Sector Los Remansos	19/04/2024		7,96	2,20		17,51
18	Carrera 48 con Calle 41 Sector los colegios	19/04/2024		1,97	0,27		0,53
				5,31	2,45		13,01
				3,70	2,54		9,40
19	Calle 41 No 47-43 Sector Los Colegios	19/04/2024		4,85	2,78		13,48
				3,65	1,87		6,83
				2,37	1,39		3,29
20	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		8,88	2,43		21,58
				2,60	1,87		4,86
21	Calle 41 No 46-34 Sector Los Colegios	19/04/2024		3,45	3,93		13,56
				1,60	1,54		2,46
				2,55	1,84		4,69



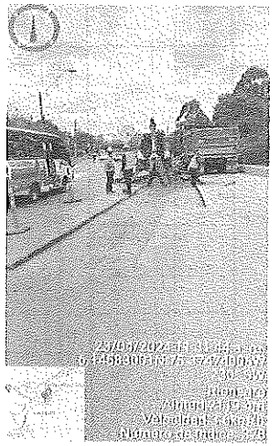

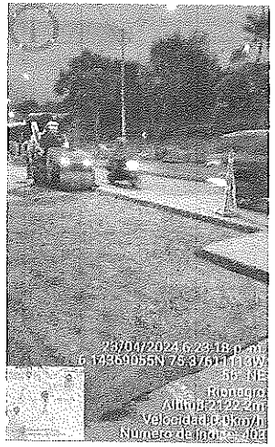

22	Calle 41 Carrera 45 Panaderia Sector Los Colegios	19/04/2024		3,30	2,59		8,55
				2,87	0,42		1,21
				1,53	0,58		0,89
				4,70	2,47		11,61
				2,11	1,65		3,48
				2,45	1,55		3,80
				2,41	2,48		5,96
23	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		4,55	2,34		10,65
				3,36	1,14		3,83
24	Calle 41 No 46-30 Sector Los Colegios	19/04/2024		1,28	1,17		1,50
25	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		5,27	1,36		7,17
				1,78	1,22		2,17
26	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,33	3,86		16,71
27	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		3,70	3,15		11,66
				1,00	0,21		0,21
28	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,70	2,17		10,20
29	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,25	2,18		9,27
30	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,87	4,30		20,94
31	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		3,54	2,02		7,15
32	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,69	2,44		11,44
33	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,45	1,88		8,37
34	Avenida Juan de Dios Morales. Antes del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		3,94	1,84		7,25
35	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		2,22	2,15		4,77
36	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		2,98	2,75		8,14
37	Avenida Juan de Dios Morales. Salida Parqueadero D1 Carril derecho	22/04/2024		2,81	3,04		8,54
38	Avenida Juan de Dios Morales. Semaforo adelante del D1 carril derecho	22/04/2024		3,57	3,22		11,50
39	Avenida Juan de Dios Morales. Cancha Las Acacias. Carril izquierdo	22/04/2024		4,65	4,00		18,60
				6,20	2,38		14,76

40	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril izquierdo	22/04/2024		2,68	0,98		2,63
				3,18	2,22		7,06
41	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril izquierdo	22/04/2024		3,00	2,55		7,65
42	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		2,88	2,40		6,91
43	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		4,35	2,18		9,48
44	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		4,43	1,83		8,11
45	Avenida Juan de Dios Morales, Sector autolarte, Carril derecho al frente de sura	22/04/2024		4,29	2,22		9,52
46	Avenida Juan de Dios Morales, Sector autolarte, Carril derecho al frente de bodega	22/04/2024		5,10	1,90		9,69
47	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	22/04/2024		4,14	3,67		15,19
48	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	22/04/2024		3,67	3,35		12,28
49	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril izquierdo	23/04/2024		4,52	3,14		14,19
				3,10	1,46		4,53
50	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril izquierdo	23/04/2024		8,52	2,46		20,96
51	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril izquierdo	23/04/2024		5,18	2,83		14,66
52	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada al estadio, Carril derecho	23/04/2024		9,15	2,80		25,62
53	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril derecho	23/04/2024		2,38	1,82		4,33
				1,95	1,62		3,16
54	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril derecho	23/04/2024		3,06	1,37		4,19
				2,28	1,35		3,08
				1,20	0,55		0,66
				5,48	2,32		12,71
				3,07	1,57		4,82
55	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	23/04/2024		4,60	1,74		8,00
				1,40	0,37		0,52
				2,66	3,30		9,44

56	Avenida Juan de Dios Morales. Retorno parque lineal. Carril derecho	23/04/2024		4,47	1,74		7,78
				5,85	2,67		15,62
				4,83	2,58		12,44
57	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril central	23/04/2024		8,00	2,00		16,00
58	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril izquierdo	23/04/2024		3,17	1,65		5,23
				2,14	0,52		1,11
				2,92	1,40		4,09
				3,11	1,74		5,41
59	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril izquierdo	23/04/2024		2,55	2,30		5,87
60	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	23/04/2024		3,15	2,04		6,43
				4,66	5,54		25,82
				3,40	1,14		3,88
61	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	23/04/2024		3,85	2,04		7,85
				5,60	2,38		13,60
62	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		1,40	0,93		1,30
63	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		2,82	2,22		6,26
				7,63	2,34		17,85
				6,21	1,74		10,81
				10,40	2,13		22,10
64	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		4,30	2,21		9,50
65	Parqueadero unidad deportiva estadio	25/04/2024		3,10	2,85		8,84
				4,46	2,92		13,02
66	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril izquierdo	25/04/2024		3,60	2,01		7,24
67	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril izquierdo	25/04/2024		3,36	2,00		6,72
				4,24	2,80		11,87
68	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril derecho	25/04/2024		5,30	1,35		7,16
				7,12	1,63		11,61
				2,27	1,97		4,47

69	Avenida Tranvía edificio Pinares, Carril derecho	25/04/2024		7,02	1,53		12,12
				5,06	0,84		4,25
				2,04	1,89		3,86
70	Avenida Tranvía edificio Pinares, Carril izquierdo	26/04/2024		2,84	1,95		5,54
71	Avenida Tranvía edificio Pinares, Carril izquierdo	26/04/2024		2,24	2,22		4,97
72	Avenida Tranvía glorieta reloj, Carril izquierdo	26/04/2024		7,00	4,57		31,99
				2,90	3,82		11,08
				2,72	3,41		9,26
73	Avenida Tranvía glorieta reloj, Carril izquierdo	26/04/2024		4,20	2,55		10,71
74	Avenida Tranvía glorieta reloj, Carril izquierdo	26/04/2024		4,74	1,63		7,73
75	Avenida Tranvía glorieta reloj, Carril derecho	26/04/2024		5,95	2,09		12,44
76	Avenida Tranvía, Sentido Rionegro Marinilla, Carril derecho	26/04/2024		8,44	2,82		23,80
				1,80	1,39		2,50
77	Avenida Tranvía, Sentido Rionegro Marinilla, Carril derecho	26/04/2024		3,33	3,27		10,89
78	Avenida Tranvía, Sentido Rionegro Marinilla, Carril izquierdo	26/04/2024		14,46	3,31		47,79
				4,11	2,27		9,33
79	Avenida Tranvía, Sentido marinilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		6,15	2,03		12,45
				4,36	1,80		7,85
				2,92	2,61		7,62
				1,70	0,55		0,94
80	Avenida Tranvía, Sentido marinilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		7,73	4,36		33,70
				5,90	2,61		15,40
				3,49	2,32		8,10
				1,95	1,88		3,67
				3,27	1,27		4,15

81	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		2,83	2,80		7,92
				1,70	1,45		2,47
82	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		8,90	2,68		23,81
				4,14	1,82		7,53
				4,84	4,07		19,70
83	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		4,11	3,14		12,91
				3,98	2,50		9,95
84	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		4,42	2,56		11,32
85	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo. Al frente de PTAR	30/04/2024		2,74	2,38		6,52
				4,18	2,77		11,58
86	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril derecho. Al frente de PTAR	30/04/2024		4,54	2,36		10,71
				4,16	2,36		9,82
87	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Carril derecho. Al frente de PTAR	02/05/2024		4,20	3,05		12,81
88	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Junto a semaforo puente peatonal. carril izquierdo	02/05/2024		12,24	4,12		50,43
89	Avenida Tranvía. Sentido Marinilla Rionegro. Junto a semaforo puente peatonal. carril derecho	02/05/2024		4,12	3,66		15,08
90	Sector los Colegios Urbanizacion Montevarde	03/05/2024		15,00	8,26		123,90
				2,90	0,91		2,64
				-1,65	1,30		-2,15
				-2,04			-2,04

91	Cruce colegios al frente de la panaderia	03/05/2024		8,39	6,82		57,22
				-1,80	1,78		-3,20
				4,36	3,82		16,66
				3,65	0,53		1,92
				2,50	0,90		2,25
92	Sector el centro carrera 50 con calle 47 frimos	08/05/2024		8,81	2,05		18,06
				11,95	6,51		77,79
				3,50	2,81		9,84
				-1,94			-1,94
				-0,79			-0,79
				-0,74			-0,74
				-3,50	2,81		-9,84
93	Sector el centro Al frente del fruver Calle 47 No 49-36	08/05/2024		4,79	2,61		12,50
				6,44	3,61		23,25
				3,26	2,84		9,26
95	Sector el centro Calle 47 entre carrera 51 y 48	08/05/2024		23,62	1,66		39,21
				22,40	3,24		72,58
96	Sector el centro Calle 47 No 49-35	08/05/2024		3,22	1,54		4,96

97	Sector el centro Calle 47 No 49-28	08/05/2024		0,70	0,51		0,36
				1,32	1,08		1,43
				3,27	1,31		4,28
				14,56	1,95		28,39
				-1,60	0,70		-1,12
				-0,08			-0,08
98	Sector el centro las motos Cll 49 No 46-76	09/05/2024		2,52	1,36		3,43
99	Sector el centro las motos Cll 49 No 48-86	09/05/2024		2,81	2,25		6,32
				12,34	4,67		57,63
				4,08	2,92		11,86
				11,63	1,42		16,51
				-5,20	0,30		-1,56
				-1,70	0,68		-1,16
				-1,60	0,77		-1,23
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
102	Sector el centro Mexiceramica	10/05/2024		1,70	1,42		2,41
				13,02	6,27		81,64

103	Sector el centro glorieta la tienda del biplex	10/05/2024		2,35	2,25		5,29
				1,80	1,75		3,15
				2,71	2,52		6,83
				2,50	1,65		4,13
				3,99	2,97		11,85
				2,20	0,55		1,20
				5,60	4,89		27,36
	Subtotal					2.376,81	
	menos pagado actas anteriores						
	TOTAL					2.376,81	

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE:

Wilma Mendoza Arcila
Representante del Contratista

CIMAG S.A.S.
Representate de la Interventoria

87	Avenida Tranvía, Sentido Marinilla Rionegro, Carril izquierdo	30/04/2024		8,90	2,68		23,81
				4,14	1,82		7,53
				4,84	4,07		19,70
88	Avenida Tranvía, Sentido Marinilla Rionegro, Junto a semaforo puente peatonal, carril izquierdo	02/05/2024		12,24	4,12		50,43
89	Sector los Colegios Urbanizacion Montaverde	03/05/2024		15,00	8,26		123,90
				2,90	0,91		2,64
				-1,65	1,30		-2,15
				-2,04			-2,04
91	Cruce colegios al frente de la panadaria	03/05/2024		8,39	6,82		57,22
				-1,80	1,78		-3,20
				4,36	3,82		16,66
				3,65	0,53		1,92
				2,50	0,90		2,25
92	Sector el centro carrera 50 con calle 47 Manos	06/05/2024		8,81	2,05		18,06
				11,95	6,51		77,79
				3,50	2,81		9,84
				-1,94			-1,94
				-0,79			-0,79
				-0,74			-0,74
				-3,50	2,81		-9,84
93	Sector el centro Al frente del lavar Calle 47 No 49-38	06/05/2024		4,79	2,61		12,50
				6,44	3,61		23,25
				3,25	2,84		9,26
95	Sector el centro Calle 47 entre carrera 51 y 48	08/05/2024		23,62	1,66		39,21
				22,40	3,24		72,58

97	Sector el centro Calle 47 No 49-28	08/05/2024		0,70	0,51		0,36
				1,32	1,08		1,43
				3,27	1,31		4,28
				14,56	1,95		28,39
				-1,60	0,70		-1,12
				-0,08			-0,08
99	Sector el centro las rocas Cllle 49 No 46-65	09/05/2024		2,81	2,25		6,32
				12,34	4,67		57,63
				4,06	2,92		11,88
				11,63	1,42		16,51
				-5,20	0,30		-1,56
				-1,70	0,68		-1,16
				-1,60	0,77		-1,23
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
102	Sector el centro bifurcacerámica	10/05/2024		1,70	1,42		2,41
				13,02	6,27		81,64
103	Sector el centro glorieta la tienda del trapiex	10/05/2024		2,35	2,25		5,29
				1,80	1,75		3,15
				2,71	2,52		6,83
				2,50	1,65		4,13
				3,99	2,97		11,85
				2,20	0,55		1,20
				6,60	4,89		27,36
		Subtotal					1.411,44
		menos pagado actas anteriores					
		TOTAL					1.411,44

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE:
Wilmar Montada Arcila
Representante del Contratista

Representante de la Interventoria


Empresa de Parques y Servicios	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2016


MEMORIA DE CALCULO APU No. 01


FECHA	DD	18	MM	5	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE	1
							CORTE Nº	1	ELABORÓ	ALejandro Garcia Bedoya		


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA				
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-9	CONTRATO Nº	IP-001-2024

CAPÍTULO	3	ITEM: 3.2	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19 para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES, Incluye demolición del pavimento existente, transporte de escombros, Imprimación, Transporte y instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica. El area de superficie por parcheo no podra ser superior a 25 m2.	UNID.	m3	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPITULO	MEZCLAS						

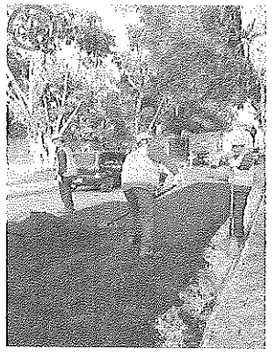

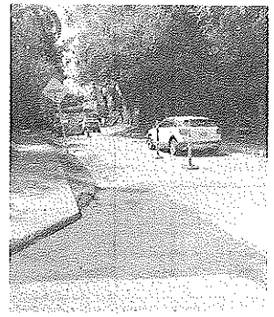


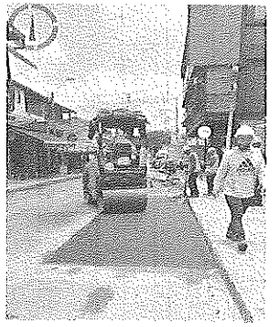

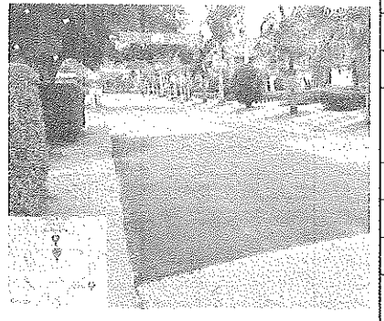


	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
1	Entrada urbanizacion Gualanday	18/04/2024		2,42	2,19	0,137	0,72
				1,41	2,74	0,137	0,53
2	Entrada urbanizacion Gualanday	18/04/2024		3,77	2,40	0,142	1,28
				2,74	1,58	0,142	0,61
				-0,79		0,142	-0,11
3	Resalto salida urbanizacion Gualanday	18/04/2024		9,76	2,23	0,147	3,19
4	Gualanday Transversal 24 A No 60-304	18/04/2024		7,49	2,03	0,176	2,66
5	Gualanday llegado a resalto glorieta virtual	18/04/2024		6,95	2,97	0,130	2,68
6	Gualanday llegado a resalto glorieta virtual	18/04/2024		5,98	1,92	0,130	1,49
	-						
7	Gualanday resalto glorieta virtual	18/04/2024		2,20	1,81	0,150	0,60
				6,37	1,78	0,150	1,70
9	Carrera 55 No 18-44 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,73	2,92	0,125	1,00
10	Carrera 55 No 18-60 Sector Los Remansos	18/04/2024		4,63	3,45	0,135	2,16
11	Carrera 55 No 18A-19 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,48	2,12	0,123	0,65
12	Carrera 55 con calle 21 Sector Los Remansos	18/04/2024		2,00	1,54	0,120	0,37
				3,80	4,68	0,120	2,13
14	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		2,53	4,60	0,143	1,86
16	Carrera 55 No 21 C 14 Sector Los Remansos	19/04/2024		7,00	2,05	0,120	1,72







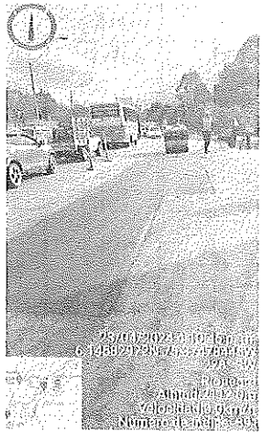

17	Carrera 55 No 22-29 Sector Los Remansos	19/04/2024		7,96	2,20	0,115	2,01
18	Carrera 48 con Calle 41 Sector los colegios	19/04/2024		1,97	0,27	0,120	0,06
				5,31	2,45	0,120	1,56
				3,70	2,54	0,120	1,13
19	Calle 41 No 47-43 Sector Los Colegios	19/04/2024		4,85	2,78	0,128	1,72
				3,65	1,87	0,128	0,87
				2,37	1,39	0,128	0,42
21	Calle 41 No 46-34 Sector Los Colegios	19/04/2024		3,45	3,93	0,117	1,58
				1,60	1,54	0,117	0,29
				2,55	1,84	0,117	0,55
23	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		4,65	2,34	0,126	1,34
				3,36	1,14	0,126	0,48
24	Calle 41 No 46-30 Sector Los Colegios	19/04/2024		1,28	1,17	0,080	0,12
25	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		5,27	1,36	0,125	0,89
				1,78	1,22	0,125	0,27
26	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,33	3,86	0,125	2,09
27	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		3,70	3,15	0,128	1,49
				1,00	0,21	0,128	0,03
28	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,70	2,17	0,129	1,31
29	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Izquierdo)	22/04/2024		4,26	2,18	0,128	1,18
30	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,87	4,30	0,137	2,86
31	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		3,54	2,02	0,126	0,89
32	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,69	2,44	0,123	1,41
33	Avenida Juan de Dios Morales al frente de Puertas CasaCentro (Carril Derecho)	22/04/2024		4,45	1,88	0,137	1,14
34	Avenida Juan de Dios Morales. Antes del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		3,94	1,84	0,125	0,91
35	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		2,22	2,15	0,120	0,57
36	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada del CDA (Carril Derecho)	22/04/2024		2,96	2,75	0,120	0,98

37	Avenida Juan de Dios Morales, Salida Parqueadero D1 Carril derecho	22/04/2024		2,81	3,04	0,126	1,08
38	Avenida Juan de Dios Morales, Semaforo adelante del D1 carril derecho	22/04/2024		3,67	3,22	0,123	1,41
39	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril Izquierdo	22/04/2024		4,65	4,00	0,140	2,60
40	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril Izquierdo	22/04/2024		6,20	2,38	0,124	1,83
				2,68	0,98	0,124	0,33
				3,18	2,22	0,124	0,87
41	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril Izquierdo	22/04/2024		3,00	2,55	0,130	0,99
42	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		2,86	2,40	0,128	0,89
43	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		4,35	2,18	0,124	1,18
44	Avenida Juan de Dios Morales, Cancha Las Acacias, Carril derecho	22/04/2024		4,43	1,83	0,147	1,19
45	Avenida Juan de Dios Morales, Sector autolarte, Carril derecho al frente de sura	22/04/2024		4,29	2,22	0,23	2,17
46	Avenida Juan de Dios Morales, Sector autolarte, Carril derecho al frente de bodega	22/04/2024		5,10	1,90	0,193	1,87
47	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	22/04/2024		4,14	3,67	0,133	2,03
48	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	22/04/2024		3,67	3,35	0,144	1,77
49	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril Izquierdo	23/04/2024		4,52	3,14	0,120	1,70
				3,10	1,46	0,120	0,54
50	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril Izquierdo	23/04/2024		8,52	2,46	0,119	2,49
51	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril Izquierdo	23/04/2024		5,18	2,83	0,115	1,69
53	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril derecho	23/04/2024		2,38	1,82	0,128	0,55
				1,95	1,62	0,128	0,40
55	Avenida Juan de Dios Morales, Sector Doblamos, Carril derecho	23/04/2024		4,50	1,74	0,167	1,33
				1,40	0,37	0,167	0,09
				2,86	3,30	0,167	1,57
57	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada parqueadero patinodromo, Carril central	23/04/2024		8,00	2,00	0,126	2,02

58	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril izquierdo	23/04/2024		3,17	1,65	0,126	0,66
				2,14	0,52	0,126	0,14
				2,92	1,40	0,126	0,61
				3,11	1,74	0,126	0,68
59	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril izquierdo	23/04/2024		2,55	2,30	0,133	0,78
61	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	23/04/2024		3,85	2,04	0,149	1,17
				5,80	2,38	0,149	2,05
62	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada parqueadero patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		1,40	0,93	0,126	0,16
64	Avenida Juan de Dios Morales. Entrada patinodromo. Carril derecho	24/04/2024		4,30	2,21	0,149	1,41
65	Parqueadero unidad deportiva estadio	25/04/2024		3,10	2,85	0,130	1,15
				4,46	2,92	0,130	1,69
66	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril izquierdo	25/04/2024		3,60	2,01	0,129	0,93
67	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril izquierdo	25/04/2024		3,36	2,00	0,130	0,87
				4,24	2,60	0,130	1,54
68	Avenida Tranvia edificio Portal del Tranvia. Carril derecho	25/04/2024		5,30	1,35	0,128	0,91
				7,12	1,63	0,128	1,48
				2,27	1,97	0,128	0,57
69	Avenida Tranvia edificio Pinares. Carril derecho	25/04/2024		7,92	1,53	0,126	1,52
				5,06	0,84	0,126	0,53
				2,04	1,89	0,126	0,48
70	Avenida Tranvia edificio Pinares. Carril izquierdo	26/04/2024		2,64	1,95	0,130	0,72
71	Avenida Tranvia edificio Pinares. Carril izquierdo	26/04/2024		2,24	2,22	0,118	0,59
73	Avenida Tranvia glorieta reloj. Carril izquierdo	26/04/2024		4,20	2,55	0,136	1,46
74	Avenida Tranvia glorieta reloj. Carril izquierdo	26/04/2024		4,74	1,63	0,140	1,08
75	Avenida Tranvia glorieta reloj. Carril derecho	26/04/2024		5,95	2,09	0,145	1,80
77	Avenida Tranvia. Sentido Rionegro Manizales. Carril derecho	26/04/2024		3,33	3,27	0,131	1,42

81	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		2,83	2,60	0,145	1,15
				1,70	1,45	0,145	0,36
83	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		4,11	3,14	0,125	1,61
				3,98	2,50	0,125	1,24
84	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo	30/04/2024		4,42	2,56	0,157	1,78
85	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril izquierdo, Al frente de PTAR	30/04/2024		2,74	2,38	0,138	0,90
				4,18	2,77	0,138	1,60
86	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril derecho, Al frente de PTAR	30/04/2024		4,64	2,36	0,138	1,48
				4,16	2,36	0,138	1,36
87	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro. Carril derecho, Al frente de PTAR	02/05/2024		4,20	3,05	0,148	1,90
89	0	02/05/2024		4,12	3,66	0,137	2,06
	Provisional en el centro	25/04/2024		1,00	1,00	0,005	0,01
	Provisional en el centro	03/05/2024		2,00	1,50	0,005	0,02
95	Sector el centro Calle 47 No 49-35	08/05/2024		3,22	1,54	0,145	0,72
98	Sector el centro las motos Cll 49 No 46-75	09/05/2024		2,62	1,36	0,173	0,59
	Subtotal					129,06	
	menos pagado actas anteriores						
	TOTAL					129,06	

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE: Wilmar Moncada Arcila
Representante del Contratista

CIMAQ S.A.S.
Representate de la Interventoria

Firma


	MEMORIAS DE CÁLCULO	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2016

MEMORIA DE CÁLCULO Actualización Vías


FECHA	DD	18	MM	5	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE	1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	ALejandro Garcia Bedoya		

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA				
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-9	CONTRATO N°	IP-001-2024

CAPÍTULO	3	ITEM: 3,3	SOBRE CARGO nocturno para aplicación de MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA , (Suministro , Extendido , Nivelación Manual y Compactación con vibrocompactador Benitin de 1 Tonelada ó cualquier maquinaria pesada para la aplicación de la mezcla incluye operario y combustible).	UNID.	m3	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPÍTULO	MEZCLAS						





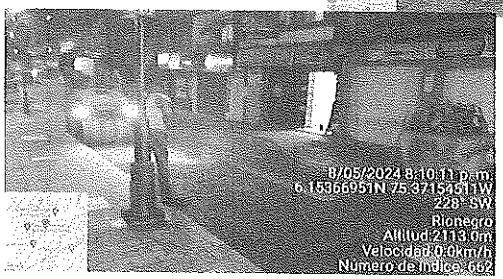

	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
92	Sector el centro carrera 50 con calle 47 Manos	06/05/2024		8,81	2,05	0,149	2,69
				11,95	6,51	0,149	11,59
				3,60	2,81	0,050	0,49
				-1,94		0,149	-0,29
				-0,79		0,149	-0,12
				-0,74		0,149	-0,11
				-3,50	2,81	0,149	-1,47
93	Sector el centro Al frente del fruver Calle 47 No 49-36	06/05/2024		4,79	2,61	0,130	1,63
				6,44	3,61	0,130	3,02
				3,26	2,84	0,130	1,20
94	Sector el centro Al frente de la terminal de trasnporte	06/05/2024		6,05	4,01	0,135	2,73
				2,32	0,94	0,135	0,29
95	Sector el centro Calle 47 entre carrera 51 y 49	06/05/2024		23,62	1,66	0,131	5,13
				22,40	3,24	0,131	9,50
96	Sector el centro Calle 47 No 49-35	06/05/2024		3,22	1,64	0,146	0,72



97	Sector el centro Calle 47 No 49-29	08/05/2024		0,70	0,51	0,145	0,05
				1,32	1,08	0,145	0,21
				3,27	1,31	0,145	0,62
				14,66	1,95	0,145	4,12
				-1,60	0,70	0,145	-0,16
				-0,08		0,145	-0,01
		Subtotal				41,83	
		menos pagado actas anteriores					
		TOTAL				41,83	

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE:

Wilmar Montada Arcila
Representante del Contratista


CEIAG S.A.S.
Representante de la Interventoría


Empresa de Desarrollo Sostenible	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/09/2018


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	18	MM	6	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE	1	
							CORTE N°	1	ELABDRÓ	ALejandro Garcia Bedoya			


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA						
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-0	CONTRATO N°	IP-001-2024		
CAPÍTULO	O.E 1	ITEM: O.E	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19, para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES, Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica,	UNID.	m3	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPITULO	OBRA EXTRA						

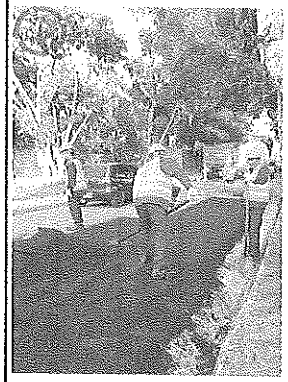


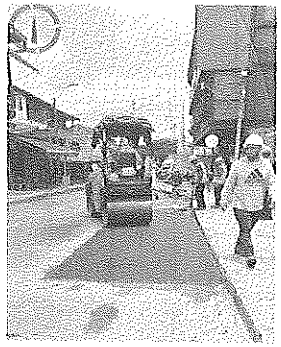


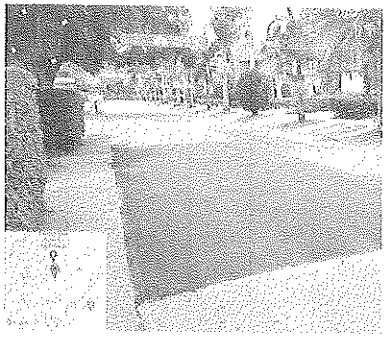


	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
8	Carrera 55 CA con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		2,37	0,63	0,140	0,21
				6,50	5,40	0,140	4,91
				4,15	0,93	0,140	0,54
13	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo, parqueaderos	18/04/2024		6,30	1,16	0,1267	0,93
				4,70	3,25	0,127	1,93
				2,40	1,10	0,127	0,33
				2,60	2,01	0,127	0,66
15	Carrera 55 No 18 A 37 Sector los Remansos	18/04/2024		10,50	3,93	0,125	5,16
				3,12	2,26	0,125	0,88
				7,25	1,45	0,125	1,31
20	Calle 41 No 46-66 Sector los Colegios	19/04/2024		8,88	2,43	0,114	2,47
				2,60	1,87	0,114	0,56
22	Calle 41 Carrera 45 Panaderia Sector Los Colegios	19/04/2024		3,30	2,59	0,125	1,07
				2,87	0,42	0,125	0,15
				1,53	0,58	0,125	0,11
				4,70	2,47	0,125	1,45
				2,11	1,65	0,125	0,44
				2,45	1,55	0,125	0,47
				2,41	2,48	0,125	0,75
62	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada al estadio, Carril derecho	23/04/2024		9,15	2,80	0,125	3,20
				3,06	1,37	0,125	0,52

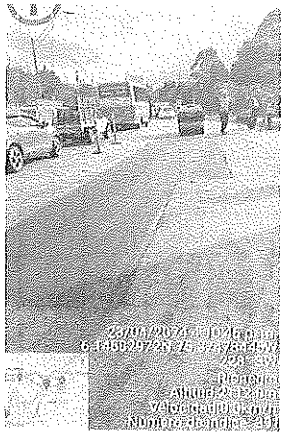







54	Avenida Juan de Dios Morales, Detrás del estadio, Carril derecho	23/04/2024		2,28	1,35	0,125	0,38
				1,20	0,55	0,125	0,08
				5,48	2,32	0,125	1,59
				3,07	1,67	0,125	0,60
55	Avenida Juan de Dios Morales, Retorno parque lineal, Carril derecho	23/04/2024		4,47	1,74	0,125	0,97
				5,85	2,67	0,125	1,95
				4,83	2,68	0,125	1,55
59	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada patinodromo, Carril derecho	23/04/2024		3,15	2,04	0,137	0,88
				4,66	5,54	0,137	3,54
				3,40	1,14	0,137	0,53
63	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada patinodromo, Carril derecho	24/04/2024		2,82	2,22	0,170	1,06
				7,63	2,34	0,170	3,04
				6,21	1,74	0,170	1,84
				10,40	2,13	0,170	3,76
72	Avenida Tranvia glorieta reloj, Carril izquierdo	26/04/2024		7,00	4,57	0,130	4,16
				2,90	3,62	0,130	1,44
				2,72	3,41	0,130	1,20
76	Avenida Tranvia, Sentido Rionegro Marinilla, Carril derecho	26/04/2024		8,44	2,82	0,128	3,03
				1,80	1,39	0,128	0,32
78	Avenida Tranvia, Sentido Rionegro Marinilla, Carril izquierdo	26/04/2024		14,46	3,31	0,130	6,21
				4,11	2,27	0,130	1,21
79	Avenida Tranvia, Sentido marinilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		6,15	2,03	0,148	1,84
				4,36	1,80	0,148	1,16
				2,92	2,61	0,148	1,13
				1,70	0,55	0,148	0,14

86	Avenida Tranvia, Sentido marinilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		7,73	4,36	0,145	4,89
				5,90	2,61	0,145	2,23
				3,49	2,32	0,145	1,17
				1,95	1,68	0,145	0,53
				3,27	1,27	0,145	0,60
87	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro, Carril izquierdo	30/04/2024		8,90	2,68	0,145	3,46
				4,14	1,82	0,145	1,09
				4,84	4,07	0,145	2,86
88	Avenida Tranvia, Sentido Marinilla Rionegro, Junto a semaforo puente peatonal, carril izquierdo	02/05/2024		12,24	4,12	0,163	8,19
90	Sector los Colegios Urbanizacion Montevarde	03/05/2024		15,00	8,26	0,139	17,17
				2,90	0,91	0,139	0,37
				-1,65	1,30	0,139	-0,30
				-2,04		0,139	-0,28
91	Cruce colegios al frente de la panaderia	03/05/2024		8,39	6,82	0,141	8,06
				-1,60	1,78	0,141	-0,45
				4,36	3,82	0,141	2,35
				3,65	0,53	0,141	0,27
				2,50	0,90	0,141	0,32
92	Sector el centro carrera 50 con calle 47 Mmes	06/05/2024		8,81	2,05	0,149	2,69
				11,95	6,51	0,149	11,59
				3,50	2,81	0,956	0,49
				-1,94		0,149	-0,29
				-0,79		0,149	-0,12
				-0,74		0,149	-0,11
				-3,50	2,81	0,149	-1,47
93	Sector el centro Al frente del fruver Calle 47 No 49-36	06/05/2024		4,79	2,61	0,130	1,63
				6,44	3,61	0,130	3,02
				3,26	2,84	0,130	1,20
95	Sector el centro Calle 47 entre carrera 51 y 48	08/05/2024		23,62	1,66	0,131	5,13
				22,40	3,24	0,131	9,50

97	Sector el centro Calle 47 No 49-28	08/05/2024		0,70	0,51	0,145	0,05
				1,32	1,08	0,145	0,21
				3,27	1,31	0,145	0,62
				14,56	1,95	0,145	4,12
				-1,60	0,70	0,145	-0,16
				-0,08		0,145	-0,01
98	Sector el centro las motos Cll 49 No 48-66	09/05/2024		2,81	2,25	0,186	1,18
				12,34	4,67	0,186	10,72
				4,06	2,92	0,186	2,21
				11,63	1,42	0,186	3,07
				-5,20	0,30	0,186	-0,29
				-1,70	0,68	0,186	-0,22
				-1,60	0,77	0,186	-0,23
				-0,79		0,186	-0,15
				-0,79		0,186	-0,15
				-0,79		0,186	-0,15
102	Sector el centro Maxiceramica	10/05/2024		1,70	1,42	0,144	0,35
				13,02	8,27	0,144	11,76
103	Sector el centro glorieta la bendia del triplex	10/05/2024		2,35	2,25	0,131	0,69
				1,80	1,75	0,131	0,41
				2,71	2,52	0,131	0,90
				2,50	1,65	0,131	0,54
				3,99	2,97	0,131	1,56
				2,20	0,55	0,131	0,16
				5,60	4,89	0,131	3,60
			Subtotal				198,23
			menos pagado actas anteriores				
			TOTAL				198,23

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE: Wilmar Moncada Arcila
Representante del Contratista

Cidao S.A.S.
Representate de la Interventoria


	MEMORIAS DE CÁLCULO	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	18	MM	5	AA	2024	Consecutivo	1	HOJA	1	DE 1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	ALejandro Garcia Bedoya	


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA					
CONTRATISTA	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	NIT O C.C.	71672180-9	CONTRATO N°	IP-001-2024	

CAPÍTULO	O.E 1	ITEM: O.E	Suministro Transporte y Colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-19, para parcheos de fallos de forma MANUAL Y PUNTUALES, Transporte e instalación de mezcla asfáltica compactación mecánica.	UNID.	m2	MPIO	RIONEGRO
SUB CAPITULO	OBRA EXTRA						

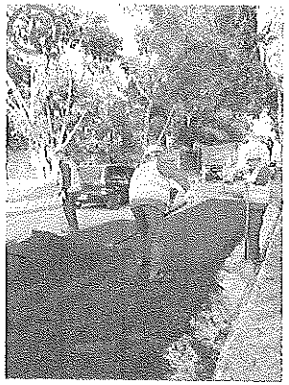


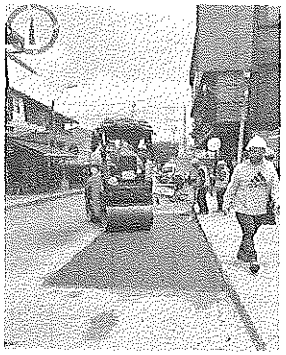






	Descripción	Fecha	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
				L	B	H	
8	Carrera 55 CA con Calle 19, Sector San Bartolo	18/04/2024		2,37	0,63		1,49
				6,50	5,40		35,10
				4,15	0,93		3,86
13	Carrera 55 B con Calle 19, Sector San Bartolo, parqueaderos	18/04/2024		6,30	1,16		7,31
				4,70	3,25		15,28
				2,40	1,10		2,64
				2,60	2,01		5,23
60	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada patinodromo, Carril derecho	23/04/2024		3,15	2,04		6,43
				4,66	5,54		25,82
				3,40	1,14		3,88
63	Avenida Juan de Dios Morales, Entrada patinodromo, Carril derecho	24/04/2024		2,82	2,22		6,26
				7,63	2,34		17,85
				6,21	1,74		10,81
				10,40	2,13		22,10
72	Avenida Transita glorieta reloj, Carril izquierdo	26/04/2024		7,00	4,57		31,99
				2,90	3,82		11,06
				2,72	3,41		9,26
76	Avenida Transita, Sentido Rionegro Marinilla, Carril derecho	26/04/2024		8,44	2,82		23,80
				1,80	1,39		2,50

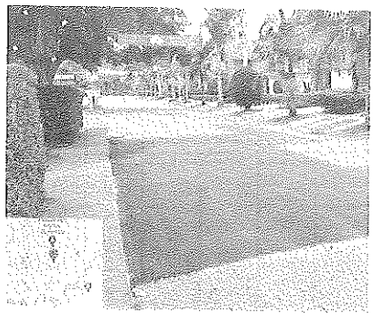

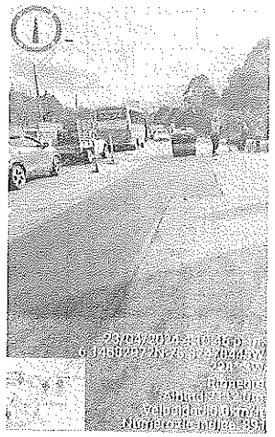



78	Avenida Tranvia, Sentido Rionegro Manrilla, Carril izquierdo	26/04/2024		14,46	3,31		47,79
				4,11	2,27		9,33
79	Avenida Tranvia, Sentido manrilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		6,15	2,03		12,45
				4,36	1,80		7,85
				2,92	2,61		7,62
				1,70	0,55		0,94
80	Avenida Tranvia, Sentido manrilla Rionegro, Carril izquierdo	29/04/2024		7,73	4,36		33,70
				5,90	2,61		15,40
				3,49	2,32		8,10
				1,95	1,88		3,67
				3,27	1,27		4,15
82	Avenida Tranvia, Sentido Manrilla Rionegro, Carril izquierdo	30/04/2024		8,90	2,68		23,81
				4,14	1,82		7,53
				4,84	4,07		19,70
88	Avenida Tranvia, Sentido Manrilla Rionegro, Junto a semaforo puente peatonal, carril izquierdo	02/05/2024		12,24	4,12		50,43
90	Sector los Colegios Urbanizacion Monteverde	03/05/2024		15,00	8,26		123,90
				2,90	0,91		2,64
				-1,65	1,30		-2,15
				-2,04			-2,04
91	Cruce colegios al frente de la panaderia	03/05/2024		8,39	6,82		57,22
				-1,80	1,78		-3,20
				4,36	3,82		16,66
				3,65	0,53		1,92
				2,50	0,90		2,25
92	Sector el centro carrera 50 con calle 47 Mimos	06/05/2024		8,81	2,05		18,06
				11,95	6,51		77,79
				3,50	2,81		9,84
				-1,94			-1,94
				-0,79			-0,79
				-0,74			-0,74
				-3,50	2,81		-9,84

93	Sector el centro Al frente del frutver Calle 47 No 40-38	06/05/2024		4,79	2,61		12,50
				6,44	3,61		23,25
				3,26	2,84		9,26
95	Sector el centro Calle 47 entre carrera 51 y 48	08/05/2024		23,62	1,66		39,21
				22,40	3,24		72,58
97	Sector el centro Calle 47 No 49-28	08/05/2024		0,70	0,51		0,36
				1,32	1,08		1,43
				3,27	1,31		4,28
				14,56	1,95		28,39
				-1,60	0,70		-1,12
				-0,08			-0,08
99	Sector el centro las motos Cll 49 No 46-55	09/05/2024		2,81	2,25		6,32
				12,34	4,67		57,63
				4,08	2,92		11,86
				11,63	1,42		16,51
				-5,20	0,30		-1,56
				-1,70	0,68		-1,16
				-1,60	0,77		-1,23
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
				-0,79			-0,79
102	Sector el centro Maxiceramica	10/05/2024		1,70	1,42		2,41
				13,02	6,27		81,64

103	Sector el centro glorieta la banda del triplex	10/05/2024		2,36	2,25		5,29
				1,80	1,75		3,16
				2,71	2,52		6,83
				2,50	1,65		4,13
				3,99	2,97		11,85
				2,20	0,55		1,20
				5,60	4,89		27,36
		Subtotal				1.204,64	
		menos pagado actas anteriores					
		TOTAL				1.204,64	

OBSERVACIONES:

FIRMA:
NOMBRE: Wilmar Moncada Arcila
Representante del Contratista

CEIAD S.A.S.
Representante de la Interventoría

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069506551

(415)7707212489984(8020) 001876406950655 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
71672180	9	MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

11. Razón social

12. Dirección seccional — Cód.
Impuestos de Medellín — 1 1

24. Dirección
CL 17 A SUR 44 170 IN 108

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellin

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-04-24 / 10:45:57 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONCADA ARCILA WILMAR JOSE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 71672180 1004. DV 9
1005. Cod. Representación
1006. Organización MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

997. Fecha formalización 2024-04-24/10:45:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069506551

(415)7707212489984(8020) 001876406950655 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
71672180	9	MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	WILMAR JOSE MONCADA ARCILA CL 17 A SUR 44 170 IN 108	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEWM	38	50	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 7 2 1 8 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

42. Correo electrónico: facturacionwilmarmoncada@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 3 1 7 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 2 2 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 14 22 41 42 48 52

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 08- Retención timbre nacional
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 41- Declaración anual de activos en el exte
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 06 - 13 / 08 : 54: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-06-2024 08:55:39AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719122928

(415)7707212489984(8020) 000001471912292 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 0 6 9 7 7 4		1 4 4 6 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONCADA	ARCILA	GLORIA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719122928

(415)7707212489984(8020) 000001471912292 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 2 8 6 9 5 0 0 2	2 0 0 2 0 5 2 2	
168. Teléfono: 2 3 5 7 9 8 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA NO CERTIFICADO DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Banco de Occidente

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA** identificado con NIT número **71,672,180** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **23 de marzo de 1999** con la cuenta Corriente **408035434** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **17 de abril de 2024** dirigida a:
WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA

FRANK GOMEZ ACEVEDO
Gerente Relacion BCA EMP PYMES
Oficina BANCA CENTRALIZADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EF5E7B0C1D3BCB7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43069774 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 144628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144928-T



GLORIA PATRICIA
MONCADA ARCILA
C.C. 43059774

RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/11/2009
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
INGENIERO CONTRATISTA

Medellín, 19 de julio de 2024

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

Los suscritos, **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.180 de Medellín en calidad de persona natural, con Nit. 71.672.180-9 y **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificada con cédula de ciudadanía número 43.069.774 expedida en Medellín, con matrícula profesional número **144628 — T** expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, Contador de la **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, con Nit. 71.672.180-9, certificamos que **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus empleados	SI (X)	NO ( )	SI ( )	NO ( )

Cordialmente,

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
CC. 71.672.180
Representante Legal

GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
TP. 144628 — T
Contadora
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. constructorawmasas@gmail.com

Powered by CamScanner

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
INGENIERO CONTRATISTA

Medellín, 19 de julio de 2024

MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTADOR DONDE SE DÉ A CONOCER QUE SE ENCUENTRA EXONERADO DEL PAGO DE ALGUNA OBLIGACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO AL ART. 114 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Ref.: Contrato No. IP 001 - 2024, REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

Los suscritos, **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.672.180 de Medellín en calidad de persona natural, con Nit. 71.672.180-9 y **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificada con cédula de ciudadanía número 43.069.774 expedida en Medellín, con matrícula profesional número **144628 — T** expedida por la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**, Contador de la **WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA**, con Nit. 71.672.180-9, certificamos que el **"WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA SE ENCUENTRA EXONERADO DEL PAGO DE ALGUNA OBLIGACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO CON EL ART. 114 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO".**

Cordialmente,

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
CC. 71.672.180
Representante Legal

GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
TP. 144628 — T
Contadora
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA

TELEFAX: (604) 313 17 26
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. constructorawmasas@gmail.com

Powered by CamScanner



Wilmar Moncada Arcila
NIT. 71.672.180-9

N	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	SALARIO	INGRESO	RETIRO
1	71337679	Pedro Alejandro Garcia Bedoya	Residente de Obra Civil	WM SAS	4800000	18/04/2024	
2	1128267231	Isabel Cristina Rendon Osorio	Profesional Social	WM SAS	1300000	18/04/2024	
3	1037649680	Andres Escobar Moncada	Almacenista	WMA	2800000	18/04/2024	
3	1128418461	Diego Ernesto Echeverri Vera	Tecnotologo SST	VAOS	1300000	18/04/2024	
4	18848807	Eduardo Luis Machuca Gonzales	Operador	VAOS	1300000	18/04/2024	
5	1238339593	Thony enrrique Valdez	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	2/05/2024
7	1035441036	Alex lozano mosquera	Ligero	VAOS	1300000	18/04/2024	
8	1076817455	Luis Omar perea morquera	Ayúdate	VAOS	1300000	18/04/2024	
9	19935236	Eugenio valdes Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
10	1036626682	Juan Camilo Piedrahita	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
11	1030421192	Julián Gabino Mosquera Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
12	4520966	Víctor Alfonzo Ruiz ramos	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
13	19935236	Eugenio Valdez Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
14	71388211	Rafael Alberto Usuga David	Rastrillero	VAOS	1300000	18/04/2024	
15	1000532586	Neyde Perea Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
16	1017226908	Arley Perea Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	2/05/2024
17	1101459620	Ronaldo Camargo Salaz	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
18	1030421192	Julián Gabino Mosquera Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	18/04/2024	
19	1128084718	José Guillermo Sánchez mosquera	Ayúdante	VAOS	1300000	18/04/2024	2/05/2024
20	1152462804	Juan José Valbuena Osorio	Representante Legal	VAOS	1300000	18/04/2024	
21	11128269224	David Alejandro Henao Osorio	Director Operativo	VAOS		18/04/2024	
22	1036952962	Juan Camilo Villa Zuluaga	Operador	Henrry Bahena-Hector Villa	1300000	18/04/2024	
23	1000872307	Diego Alejandro Ruiz Gaviria	Ayudante	VAOS	1300000	29/04/2024	
24	1030420204	Yaleison Benitez Sanchez	Ayudante	VAOS	1300000	29/04/2024	
25	1030420998	hardwinson Mosquera Mosquera	Ayudante	VAOS	1300000	2/05/2024	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71672180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAR MONCADA ARCILA
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17A SUR N 44 170 OF108	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925943295**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	627514101		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 224.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 537.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 55.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 817.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 204.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 204.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 204.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 204.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 355.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 355.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.581.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.581.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71672169
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAR MONCADA ARCILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17A SUR N 44 170 OF 103 ED NATUZZI	TELÉFONO:	3131729
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7925943295	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		637514101

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23031	23031-PORVENIR	1	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.500	$ 0	$ 55.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 537.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.600	$ 0	$ 537.600
23025	23025- PROTECCION	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										$ 817.100	$ 0	$ 817.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AEPRES	COTIZACIÓN	VALOR AEPRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS019	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 204.300
SUBTOTALES:													$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 204.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IEP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 355.600	$ 355.600	$ 0	$ 0	$ 355.600
SUBTOTALES:									$ 355.600	$ 0	$ 0	$ 355.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 204.300	$ 0	$ 204.300
SUBTOTALES:			$ 204.300	$ 0	$ 204.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

comfama

Radicado: 910175

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Diego Ernesto Echeverri Vera con cédula de ciudadanía 1128418461, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de:

Razon social	Tipo Documento	Fecha afiliacion	Fecha ingreso empresa*
Vaos Obras Y Pavimentos Sas	NIT 901694238	2024-04-16	2024-04-16

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el dia 16 de abril de 2024 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones

ARL | sura

Medellín, 15 de April de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ANTIOQUIA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1128418461	ECHEVERRI VERA DIEGO ERNESTO	16/04/2024		227Q2001	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/04/2024 23:44:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.128.73.38, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 900.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DIEGO ERNESTO ECHEVERRI VERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.128.418.461**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 16 de Abril del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-09, 10:43:04 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1063039273

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 09/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS		
Documento	NI901694238	**Dirección**	CL 42B #92 - 44
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5385870
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALBUENA OSORIO JUAN JOSE	**Identificación**	CC 1152462804
Total Afiliados	21	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Nov.	INT	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	VSP	VCF	VCO	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ENS	Días ARP	Días APO	Días ACT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1020332516	NEYDE PEREA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 203.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1059372307	DIEGO ALEJANDRO RUIZ OAVIRIA	01	00	X																	0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 13.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 66.667	$ 3.500	6.960	$ 66.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 66.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1019150419	THOMAS JUAN VALBUENA OSORIO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 205.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1017220703	ARLEY PEREA MOSQUERA	01	00		X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 173.334	$ 7.000	6.960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF04) COMFAMA	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1050420204	YALEISON BENITEZ SANCHEZ	01	00	X																	0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 13.000	(EPS035) EPS SANITAS	$ 66.667	$ 3.500	6.960	$ 66.667	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 66.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1036421192	JULIAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(232301) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1035441035	ALEX LOZANO MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 203.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1101453820	RONALDO CAMARGO SALAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 203.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1128284718	JOSE GUILLERMO SANCHEZ MOSQUERA	01	00	X	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 173.334	$ 27.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 173.334	$ 7.000	6.960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF04) COMFAMA	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1128282274	DAVID ALEJANDRO HENAO OSORIO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1128418491	DIEGO ERNESTO ECHEVERRI VERA	01	02	X																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS010) EPS SURA	$ 650.000	$ 26.000	6.960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1152462804	JUAN JOSE VALBUENA OSORIO	01	00																		0	30	30	30	30	(210201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1035332573	THONY ENRIQUE VALDES TORRES	01	02		X																0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 173.334	$ 27.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 173.334	$ 7.000	6.960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF04) COMFAMA	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 15525542	LUIS ALBERTO OSORIO COLORADO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15035235	EUGENIO VALDES MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 203.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 32956918	GLORIA ISABEL OSORIO VELASQUEZ	01	00	X																	0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 553.334	$ 90.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 553.334	$ 22.600	6.960	$ 553.334	$ 38.500	(CCF04) COMFAMA	$ 553.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 71227652	EVER ARNESIDE SANCHEZ MOSQUERA	01	00	X	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 173.334	$ 7.000	6.960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF04) COMFAMA	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 71359211	RAFAEL ALBERTO USUGA DAVID	01	00	X																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 853.334	$ 152.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 853.334	$ 33.200	6.960	$ 853.334	$ 64.400	(CCF04) COMFAMA	$ 853.334	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.400
CC 92703083	JOHAN STIBEN GUNTERO FONNEGRA	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.600	6.960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Pagado: 09/05/2024 | Empresa NI901694238 VAOS OBRAS Y PAVIMENTOS SAS | Planilla Nro: 1063039273 | Periodo Cotización: abril de 2024 | Periodo Servicio: mayo de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
PT 4523064	VICTOR ALFONZO RUIZ RAMOS	01	03																0	X	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
PT 6052697	EDUARDO LUIS MACHUCA GONZALEZ	01	03																0	X	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.076.672	$ 18.076.672	$ 18.076.672	$ 18.076.672	$ 2.892.800	$ 723.600	$ 1.258.900	$ 723.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.598.900	$ 0	$ 5.598.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402502 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.



Wilmar Moncada Arcila
NIT. 71.672.180-9

Medellín, 15 de mayo de 2024

Señores
CIMAG SAS
Atn.: Mauricio Gutiérrez
Calle 8 Sur No. 32 – 306 Interior 001
Medellín-Antioquia

Ref.: Contrato No. IP 001 – 2024. Reparcheo, señalización y demarcación en vias urbanas y rurales del municipio de Rionegro, Antioquia.

Asunto: Pago FIC por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Cordial saludo,

Debido a la corta duración de la obra y teniendo en cuenta que llevamos menos de un mes calendario de ejecución, el pago del impuesto FIC se hará al finalizar la obra liquidándolo como lo permite la ley.

Atentamente,

WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
Representante legal.

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. parcheosrionegro2024@gmail.com – constructorawmasas@gmail.com



WILMAR JOSE MONCADA ARCILA
NIT 71.672.180-9
CALLE 17A SUR 44 170
Tel: 3131726
Medellín - Colombia
wilmarjm@une.net.co



Factura de venta Electrónica
No. FEWM 40

Señores	Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO		
NIT	900.974.762-8	**Teléfono**	(604) 5204060 - Ext. 000
Dirección	Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 12:20
Expedición	19/07/2024, 12:20
Vencimiento	19/07/2024

Item	Cantidad	Código	Descripción	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	1.00	PO	Pago Obra - Acta # 1	586,887,324.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y seis millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 586,887,324.00

Total Bruto	586,887,324.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**586,887,324.00**

Observaciones:
Acta de Obra # 1
Valor Completo $ 754.561.654
Valor Pago Adelantado $ 167.674.330
Saldo a Pagar - $ 586.887.324

Factura Actual Pago # 2
Pago # 1 - Pago Adelantado

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069506551 aprobado en 20240423 prefijo FEWM desde el número 38 al 50 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c431b9089e7cd9cff5f924b3920f604ac3d036d8208b00b8022963f9e926146a028072de3022cb68c96015a56fe333cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
