	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-062
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
7	**CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS**					Fotográfica
7.1	ALINEAMIENTO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS UBICACIÓN TOLERANCIA			28/06/2024	Interventoría revisa antes de cada fundición de columnas la alinación de estos elementos respecto a los ejes estructurales para garantizar que estén conforme a lo señalado en los planos estructurales. Durante la vigencia del presente informe (22 a 28 de junio de 2024) se revisa alineación en columnas de segundo nivel.	
7.2	ACABADO DE LA SUPERFICIE Y SU VERTICALIDAD			28/06/2024	Interventoría revisa antes y después de cada fundición de columnas verifica la verticalidad o plomo de cada uno de los elementos fundidos. Durante la vigencia del presente informe (22 a 28 de junio de 2024) se revisa las columnas de segundo nivel.	
7.3	RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ANTE POSIBLES ASENTAMIENTOS			-	Para los elementos estructurales fundidos hasta la fecha, no se requiere estabilidad ante posibles asentamientos.	
7.4	APROBACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA CIMBRA			-	Para los elementos fundidos hasta la fecha, no se requiere cálculo o diseño de formaletas.	
7.5	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN			28/06/2024	Interventoría realiza la revisión del estado de limpieza de la formaleta antes de la fundición de una columna.	
7.6	ABERTURAS DE INSPECCIÓN			-	Para los elementos fundidos hasta la fecha, no se requiere aberturas de inspección.	
7.7	AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO			-	N/A	
7.8	DECIMBRADO			28/06/2024	El retiro de la formaleta se realiza una vez han transcurrido 24 horas desde la fundición de la columna. Al momento del decimbrado, Interventoría revisa la integridad del elemento y busca posibles falencias como hormigueros	
7.9	REVISIÓN DEL PROCESO			28/06/2024	Interventoría realiza la revisión del proceso para cada una de las columnas antes de autorizar su fundición.	
7.10	INFORME A SUPERVISOR			-		

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

REVISÓ:


ING. MARIO DE JESUS GIL CARDONA
Representante legal Interventoria
Firma y Posfirma Mario de Jesús Gil Cardona

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-062
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RÍOS - DIFRA

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO			
REGISTRO FOTOGRÁFICO						

FORMALETAS METÁLICAS INSTALADAS

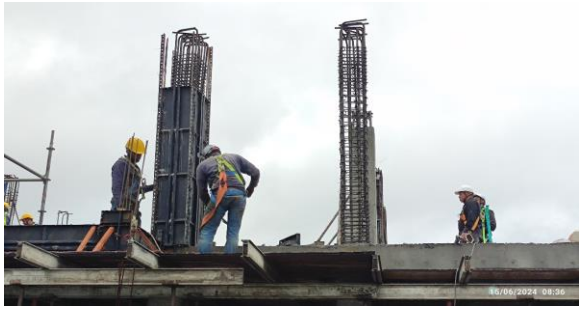

7.2 VERTICALIDAD



7.8 DECIMBRADO

