- 1 Residente de obra
- 1 Director de Obra
- 1 Auxiliar de Ingeniería
- 1 Arq. Asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 16 Ayudantes.

• Actividades realizadas:

- Se reporta llegada, a sitio de obra, del (dire) Supervisor DIFRA, Teniente Luis Chamorro para verificaciones de obra y gestión documental de obra.

- Continúa el armado y pega de la tubería sanitaria y de ventilación para la zona de lavandería ubicada en el cuadrante 8-5 entre C-D.
- Continúa corte y figurado del acero de refuerzo para las vigas y losa de entrepiso del nivel N+3,15.
- Continua el armado e instalación del acero de refuerzo para las vigas aéreas y viguetas del nivel 3,15.
- Continúan excavaciones manuales en la zona adyacente a la viga de borde del eje A para la red sanitaria de los baños del cuadrante 10-9 entre A-B.
- Inicia colocación de los casetones en icopor para aligeramiento de la losa de entrepiso del nivel 3,15.
- Se reporta la llegada del tercer cargamento de ladrillo para los muros en mampostería. (cuarto viaje de bloques)

- COMPONENTE SST Y AMBIENTAL
- Seguimiento uso adecuado de Equipos de protección contra caída.
- Verificación de documentos de ingreso de vehículos con insumos de material a obra.
- Socialización en actividades de obra en relación (ISA)

Interventoría SISOMA.

* Sábado, 1 de junio de 2024

• Estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de obra
- 1 (Director) Auxiliar de ingeniería
- 1 Arquitecto Asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 15 Ayudantes.

Powered by CamScanner

- Actividades realizadas:
  - Continúa la instalación de acero de refuerzo para las vigas aéreas del nivel 3,15.
  - Continuan las excavaciones manuales en la zona adyacente a la viga de bordo del eje A para la red sanitaria de los baños del cuadrante 10-9 entre A-B.
  - Inicia la instalación de la formaleta lateral para la losa de entrepiso
  - Continúa el armado y pega de la tubería sanitaria y de ventilación para la zona de lavandería ubicada en el cuadrante 8-5 entre C-D.

- COMPROMISOS SST y AMBIENTAL.
- Se realiza mesa de trabajo y/o comité SISOMA Nº 13 con los nuevos compromisos semana Nº 14 en la gestión del Manual de Salud Ocupacional (SST) y Plan de Manejo Ambiental (PNA).

Interventoría SISOMA. Katerine Chamorro.

* Lunes 3 de Junio de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en Obra:
  - 1 Arquitecto Asesor.
  - 2 plomeros.
- Actividades realizadas
  - limpieza de zanjas para instalación de redes sanitarias en área de lavandería.
  - Armado y pegado de ramales principales redes sanitarios. en área de lavandería.
  - Instalación de atraque primera capa (inferior) en toda la red sanitaria del área de lavandería.
  - Instalación de red de ventilación en tubería sanitaria de área de lavandería.
  - Instalación de Tapones de inspección 4" y 6".
  - No se realizaron trabajos en altura ni actividades de alto riesgo.

Powered by CamScanner


-Martes, 4 de Junio

- Estado del tiempo: soleado
- Personal en obra:
  - 1 Residente de Obra
  - 1 Auxiliar de Ingeniería
  - 1 Arquitecto asesor
  - 1 Profesional SISOMA
  - 1 Profesional de costos y Presupuestos
  - 16 Ayudantes

- Se registra la visita del asesor estructural, el Ingeniero Mauricio Martínez, realizando la verificación de los avances del figurado y instalación de los aceros de refuerzo para vigas y losa del nivel 3.15.
- Se realiza la verificación de la estanqueidad de la tubería sanitaria y ventilación de la zona comprendida entre los ejes 8.5 D-C zona de lavandería.
- Se procede a realizar el atraque de la tubería sanitaria y de ventilación en la zona de la lavandería.
- Se realiza la extensión de la excavación para la tubería de 3" de la red de voz y datos que ingresa al cuarto de Rack del alojamiento.
- Por disposición y revisión en obra se indica al contratista de obra realizar la bajante de aguas lluvia sobre la zona de lavandería en tubería de 4" Autorizado por Interventoría.
- Continua el armado y figurado de acero de refuerzo para la Placa y vigas del nivel 3.15
- Se inicia la instalación de la tubería de 3/4 conduit PVC en el nivel 3.15
- Continua la instalación de casetones de icopor forrados para la fundición de vigas y losa de nivel 3.15.

- COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se realiza recomendación sobre Sistema de Acceso a losa de entrepiso 3 Cuerpo de andamio, para utilización de eslingas en ascenso y descenso a esta superficie. Reforzar retroalimentación sobre medidas de seguridad para este tipo de Actividades.

Kateline Chamorro
Residente Interventoría SISOMA

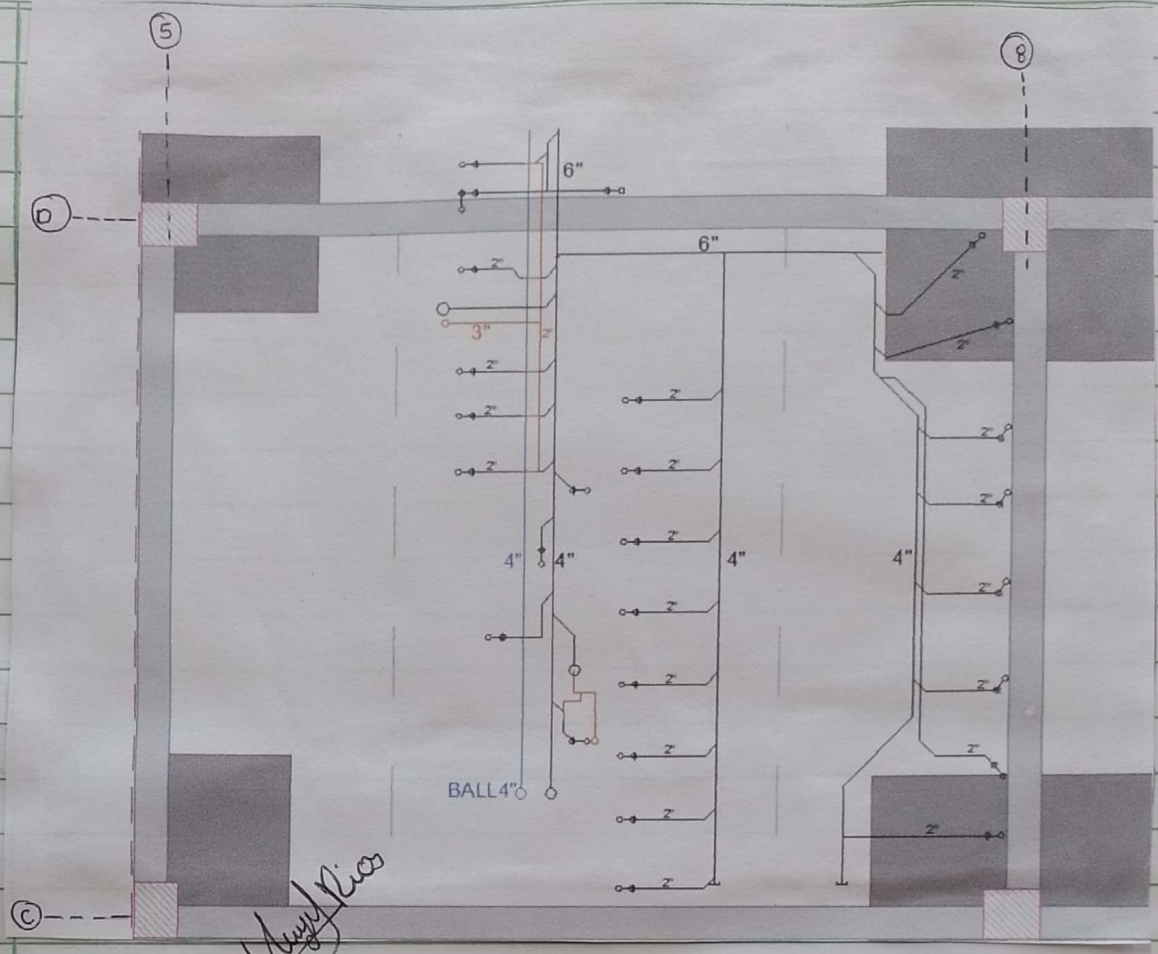

• Se autoriza el esquema anterior para la red sanitaria y pluvial en la zona de lavandería del cuadrante 8-5 entre C-D.

* Miércoles, 5 de junio de 2024

• Estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de obra
- 1 Auxiliar de ingeniería
- 1 Arquitecto asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 15 Ayudantes
- 1 Profesional de Costos.

• Actividades realizadas:

- Continúa corte y figurado del acero de refuerzo para vigas y viguetas aéreas del nivel N+3,15.
- Continua instalación y armado del acero de refuerzo para losa de entrepiso del nivel 3,15.
- Continua la instalación y armado de la red sanitaria, hidráulica y de ventilación para la zona de lavandería en el cuadrante 8-5 entre C-D.

Powered by CamScanner

- Continua instalación del geotextil en la zona de lavandería.
- Se realiza el llenado y compactación con subbase en la zona de lavandería.
- Se realiza la instalación de la malla electrosoldada para la zona de lavandería en el cuadrante B-5 entre C-D.
- Se realiza la instalación de la tubería eléctrica tipo conduit para la zona de lavandería.
- Se realiza la revisión de la malla instalada, así como también de las tuberías sanitarias, hidráulicas y eléctricas instaladas.
- Se aprueba la fundición de la placa de contrapiso ubicada en el cuadrante B-5 entre C-D correspondiente a la zona de lavandería.
- Se realiza la fundición de la placa de contrapiso en la zona autorizada con concreto de 3000 psi producido en obra y adicionado con impermeabilizante.
- Se reporta lluvias moderadas intermitentes durante las horas de la tarde. Se presentan lluvias de 12:05pm a 12:40pm; de 1:30pm a 1:45pm; de 2:00pm a 2:25pm. Estas lluvias no generan afectación en las actividades ejecutadas por el personal de obra.
- Se reporta lluvia muy fuerte en el horario de 5:30pm a 6:20pm. Esta lluvia generó afectación en la ejecución de actividades ya que el personal de obra cesó actividades para guarecerse y evitar riesgos de condiciones atmósféricas no favorables.

- COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se continúa realizando seguimiento al uso adecuado de Equipos de protección contra caídas, A su vez recomendación sobre sistema de Acceso, descenso, Ascenso Seguro en andamio, garantizando anclaje de personal y medida de restricción en laterales.
- Se Verifica Protección de Agregados en Zona temporal de Acopio.
- Contratista realiza entrega Informe SISOMA Nº 3 correspondiente al mes de mayo. Quedando Soportes pendientes en el acta SISOMA semanal Nº 14 e Informe Nº 4 correspondiente al mes de Junio (2024).

INTERVENTOR
SISOMA
Katerine Chamorro

* Jueves, 6 de junio de 2024
- Estado del tiempo: soleado.
- Personal en obra:
  - 1 Residente de obra
  - 1 Arquitecto asesor
  - 16 Ayudantes
  - 1 Auxiliar de Ingeniería
  - 1 Profesional SISOMA.
- Actividades realizadas:

- Continua la instalación y fijavado de acero de refuerzo para las vigas aéreas y losa del nivel 3.15.
- Continua la instalación de la tubería conduit de 3/4 electrica en el nivel 3.15 previo a la fundición de la Placa de este nivel.
- Continua la instalación de los Pases sanitarios y de ventilación en el nivel 3.15
- Continua la instalación de los casetones de icopor para la fundición de Placa y vigas del nivel 3.15
- Continua la instalación de la malla electrosoldada para la fundición de la Placa del nivel 3.15.

* ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL Y SST.
- Se realiza segunda recolección de residuos aprovechables salientes de obra, A su vez se verifica orden y aseo en Baterías sanitarios.
- Se continúa realizando seguimiento al uso adecuado de equipos de protección contra caídas (ESA).

Katerine Chamorro S
Inspector SISOMA

* Viernes 7 de junio de 2024
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra
  - 1 Residente de obra
  - 1 Arquitecto asesor
  - 16 Ayudantes
  - 1 Auxiliar de Ingeniería
  - 1 Profesional SISOMA
- Actividades realizadas

- Continúa la instalación y fijavado de acero de refuerzo

Para las vigas aéreas y Placa de entrePiso nivel 3.15
- continua la instalación de malla electro soldada para la fundición de la Placa de entrePiso nivel 3.15.
- Continua la instalación de tubería conduit de 3/4 en el nivel 3.15
- Continúa la instalación de los Pisos Sanitarios y de ventilación
- Se realiza la verificación de los aceros de refuerzo de vigas aéreas y losa de entrePiso nivel 3.15 entre el contratista e interventoría
- Se realiza limpieza de zonas de acopio de material de obra.
- Continuan las actividades de instalación de tubería Sanitaria entre el EJE 9-10 A-B de la zona de baños, con el colector de 6"

*COMPONENTE SST y AMBIENTAL.
- Se continúa realizando realizando seguimiento a lo expuesto en el apéndice IFA-082. con asunto: Gestión medidas de restricción en actividades a diferente nivel (Altura) (IDA). A su vez se observa Organización punto ecológico y zona agregados.

* Sábado 8 de Junio de 2024
- Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra
1 Residente de obra — 1. Auxiliar de ingeniería
1. Asesor SISOMA — 1. Profesional SISOMA
16 Ayudantes

• Actividades realizadas

- Continua la instalación de tubería conduit de 3/4 PVC para la red eléctrica en el nivel 3.15
- Se realiza revisión de apuntalamiento interior de la formaleta para la fundición de vigas y Placa del nivel 3.15
- Se realiza reforzamiento del apuntalamiento para la fundición de vigas aéreas y Placa nivel 3.15
- Se realiza el alineamiento lateral de la formaleta de borde de Placa

Powered by CamScanner

* Domingo 9 de Junio de 2024
Estado del tiempo: Soleado
-Personal en obra:
1. Residente de obra — 1 Auxiliar de ingeniería
-1. Arquitecto asesor — 1 Profesional SISOMA
. 15 Ayudantes
· Actividades Realizadas
- Se finaliza instalación de tubería conduit 3/4 en área de placa nivel +3.15m
- Se realiza verificación final de plomos de formaleta lateral para fundición de placa de contrapiso entrepiso nivel +3.15.
- Verificación de paso para tubería sanitaria en placa de entrepiso Nivel +3.15.
- Reforzamiento atraque formaleta lateral para fundición de placa de entrepiso Nivel +3.15

* Lunes 10 de Junio de 2024
-Estado del tiempo: Nublado.
- Personal en obra:
1 Residente de Obra 1 Auxiliar de ingeniería.
· Actividades Realizados
- Verificación junto con interventoría de todas las actividades previas a la fundición de placa de entrepiso nivel +3.15.
- Se hizo la verificación de localización de 3 pases sanitarios en área de alojamiento VIP en placa entrepiso

nivel +3.15.
- Junto con interventoria se determina la ubicación de 1 sifón de piso por cada bateria sanitaria los cuales no se contemplaron en los diseños para la plo de entrepiso nivel +3.15.

* Martes 11 de Junio de 2024
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en Obra.

1 Residente de Obra	1 Auxiliar de ingenieria
1 Arquitecto Asesor.	1 Profesional SISOMA.
15 Ayudantes	1 Profesional de Costos
1 Director de Obra.	

- Actividades Realizados.
- Coordinación para ingreso de autobomba de concreto y 14 mixer al lugar de Obra alojamiento de cadetes.
- Fundición de losa de entrepiso nivel +3.15. 4 MIL PSI
- Verificación de niveles de losa de entrepiso nivel +3.15
- Aplicación de Antisol a toda el área de placa de entrepiso
- Realización de ensayos de asentamiento según especificaciones y aceptación del concreto
- Realización de muestras de concreto de 4 mil PSI para pruebas de compresión.
- Se reporto presencia en obra de Teniente Luis Chamorro, Supervisor saliente y de Teniente Yeimi Rios, Supervisora entrante para empalme y verificacion de obra.
- Se reporta presencia en obra de Director de Interventoria, Ing. Mario Quiroga y de Director Obra Contratista, Arq Jairo Villamizar.

*COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.

-Se continúa realizando seguimiento al uso adecuado de Equipos contra caidas y lo relacionado en el OFICIO IFA-082 enviado el 06 junio 2024. Se Valida documentación de Operarios CEMEX y Socialización riesgos y medidas de control en obra

Katerine Chamorro S.
Interventoría SISOMA

* Miercoles, 12 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Profesional de costos
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 13 Ayudantes
  - Actividades realizadas:
    - Continua corte y figurado del acero de refuerzo para columnas del nivel 3,15.
    - Continúa curado de la losa de entrepiso mediante la aplicacion continua de agua.
    - Continúa el armado del acero de refuerzo para las columnas del nivel 3,15. Se inicia por las columnas del eje 5.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.

-Se continúa con seguimiento en el uso adecuado de equipos de protección contra caidas (ETSA)
-Se verifica documentación de vehiculo que ingresa con material a obra.
-Contratista realiza socialización de riesgos y peligros a personal en obra

INTERVENTOR SISOMA
Katerine Chamorro S.

* Jueves, 13 de junio de 2024.
  - Estado del tiempo: soleado.
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto Asesor
    - 1 Profesional de costos
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 13 ayudantes.

Powered by CamScanner

- Actividades realizadas:
  - Continua corte y figurado del acero de refuerzo para columnas del nivel 3,15.
  - Continúa el armado e instalación del acero de refuerzo para las columnas del nivel 3,15. Se continua con las columnas de los ejes 8 y 5.

* COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se instala Punto ecologico en obra con su respectiva señalización
- Se Continúa realizando Seguimiento al uso adecuado de equipos de protección contra Caidas (Se realiza recomendación de realizar Socialización de 2 Personas pa andamio, uso de andamio certificado y anclado en el armado de columnas en borde de losa de entre piso.
- Se Verifica Señalización, orden, aseo en obra, baliza señalera, contenedor

Kaleone Chamorro
Ingeniero SISOMA

* Viernes, 14 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado.
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Auxiliar de ingeniería
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Profesional SISOMA
    - 14 ayudantes
  - Actividades realizadas:
    - Continúa corte y figurado del acero de refuerzo para columnas.
    - Continua el armado e instalación del acero de refuerzo para las columnas sobre el nivel 3,15. Se continúa con las columnas del eje 5 y 8.
    - Se realiza la revisión del acero instalado en las columnas del nivel 3,15 en los ejes 5 y B.
    - Se autoriza la fundición de las columnas D8, C8, B8 y A'8.
    - Se realiza la fundición de las columnas autorizadas con concreto de 4000 psi producido en obra.

* COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se remite comunicado IFA-090 con seguimiento al uso adecuado de elementos de Protección contra caidas en trabajo seguro en Altura.

Powered by CamScanner

- Se remite comunicado IFA-091 en la reiteración de conceptos medicos de Personal para trabajo seguro en Alturas (TSA).
- Se recibe visita de la TTE. Mora del componente SST de parte de la base aerea "Marco Fidel Suarez", realizando inspección de Equipos de Protección contra caidas y EPP general, realizo las siguientes recomendaciones:
  * Presentar certificación de equipos de Protección contra caidas por personal certificado y/o avalado de todos los equipos que se encuentrán disponibles en obra
  * Implementar medidas de Seguridad en bordes y/o laterales del Perimetro de losa de entre piso.
  * Retroalimentación Sobre riesgos en Altura y riesgos generales.
- Se continúa realizando seguimiento al uso adecuado de equipos de protección contra caidas (TSA) como: Uso de andamio certificado en actividades de losa de entre piso, Uso linea de vida con aseguramiento de personal, Seguimiento en medidas de restricción para actividades a diferente nivel.
- Se reporta lluvia moderada de las 4:35pm a las 4:50pm. Esta lluvia NO produce afetación de ningún tipo en la ejecución de actividades de obra.

Valentina Chamorro
Interventoria SISOMA
STE

* Sábado; 15 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 13 ayudantes
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
  - Actividades realizadas:
    - Continua el corte y figurado de acero para columnas del segundo nivel.
    - Continua la instalación y armado del acero de refuerzo para las columnas del segundo nivel (N+3.15).
    - Se realiza la revisión del acero instalado en las columnas A8 y A7. Se revisa la verticalidad de la formaleta instalada y su ubicación

respecto a los ejes estructurales.
- Se autoriza la fundición de las columnas A8 y A7 del nivel N+13,75.
- Se realiza la fundición de las columnas autorizadas con concreto de 4000 psi producido en obra.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se realiza mesa de trabajo Nº 15 del componente SISOMA con nuevos compromisos semana Nº 16. En relación a gestión (Plan Manejo Ambiental-PMA-Manual de Seguridad SST).

Katerine Chavarro
Interventor SISOMA

* Lunes, 17 de junio de 2024
  - Estado del tiempo:
  - Personal en obra
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto Asesor
    - 12 Ayudantes
    - 1 Profesional SISOMA
    - 1 Auxiliar de ingeniería
    - 1 Profesional de costos.
  - Actividades realizadas:
    - lluvia el dia sabado 6:45am. a 7:45 am parada de actividades 1 hora.

- Continua el armado y figurado de acero de refuerzo para las columnas del nivel 3.15
- Se realiza la verificación del acero de refuerzo de las columnas a fundir.
- Se realiza la fundición de las columnas SD 4 SB 4 se verifica el aplomamiento de estos elementos

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Se continua realizando seguimiento al uso adecuado de Equipos de Protección contra caidas para actividades a diferente nivel en relación a ultimo comunicado del 14 JUNIO 2024-IFA-090.
- Se Verifica cumplimiento de requerimiento orden, aseo en obra, componente, Almacén

Interventor SISOMA

* Martes 18 de Junio de 2024
· Estado del tiempo: soleado.

Personal en obra:
1. Residente de obra
1. Arquitecto asesor
4 - "doce" (12). Ayudantes
1. Asesor estructural.
1 Profesional SISOMA.
1 Auxiliar de ingeniería.
1. profesional de costos.

Actividades realizadas
- Se registra la visita del ingeniero estructural asesor del contratista, el ingeniero mando instrucciones.
- Se verifican los conceptos técnicos acerca de la viga canal y bordillos de confinamiento que puedan ser vaciados para el relleno exterior del edificio.
- Se realiza la fundición de las columnas SA', SC y PC para verificación de aceros de refuerzo y aplomamiento.
- Continúa el figurado e instalación de acero de refuerzo para las columnas del nivel 3.15
- Se realiza visita a las instalaciones de alojamientos de cadetes de Emavi para verificar la carpintura metálica.
- Se realiza Mesa de trabajo para la verificación del Balance de obra.
- Se reporta lluvia fuerte de las 3:55pm a las 4:05 pm. Se reporta 10 min de afectación por suspensión de actividades por lluvia, en actividades de fundición de columnas.

COMPONENTE SST y AMBIENTAL
- Revisión documental de vehículos que ingresarán a obra con insumos
- Seguimiento de medidas de seguridad en Altura (TSA)
- Verificación (aislación individuo arbóreo. (se conserva protección).
- Cumplimiento de preparación de mezcla en tinas (Protección en suelo)

INGENIERO SISOMA

* Miercoles, 19 de junio de 2024
· Estado del tiempo: soleado.
· Personal en obra:
- 1 Residente de Obra
- 1 Auxiliar de ingeniería

- 1 Arquitecto asesor
- 13 Ayudantes
- 1 Profesional SISOMA
- 1 Profesional de costos.

• Actividades en obra:

- Continua corte y figurado del acero de refuerzo para columnas del piso del nivel 3,15
- Continua armado e instalación del acero de refuerzo para columnas del nivel 3,15 en los ejes 9, 10 y 11.
- Se realiza la revisión del acero de refuerzo instalado en las columnas 11A, 5A, 10A, 10B, 10C y 10D.
- Se autoriza la fundición de las columnas revisadas.
- Se realiza la fundición de las columnas 5A, 11A y 9B y 9D con concreto de 4000 psi producido en obra.
- Se reporta lluvia fuerte a las 3:50pm con fin a las 4:20pm. Se retoman actividades de fundición a la 4:23pm. Se reporta un periodo de 30 minutos de afectación por lluvias fuertes.

COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Se realiza en conjunto analisis de temas relacionados para capacitación y/o Socialización en todo lo relacionado a Riesgos, peligros, medidas preventivas para trabajo Seguro en Alturas, Segun compromiso de la semana 15 y recomendación de The Mora del Area SST-EMAUI.
- Se Continua con seguimiento adecuado del uso de los equipos para TSA, Se comunica nuevamente sobre el uso adecuado de Andamios certificados en las actividades de losa de entre piso (Consolidado Acta SISOMA N° 16.
- Se realiza documentación de Personal y vehiculos que ingresan con material a obra.

Inspector SISOMA.

* Jueves, 20 de junio de 2024

• estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de obra
- 1 Arquitecto asesor
- Ayudantes
- 1 Auxiliar de ingeniería
- 1 Profesional SISOMA

• Actividades realizadas:

-COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

-Se realiza Capacitación en relación a Riesgos, peligros y medidas

Preventivas a riesgo en Altura a través de dinamica ludo-pedagogica, contacto con la participación general de Personal en obra
- Se instala Señalización Preventiva en relación a riesgo de objetos, y/o Personas a diferente nivel.
- Se Acordona Area del Perimetro de losa de entre Piso para mitigación de riesgo de caida de objetos, Personas a diferente nivel y/o Personal Autorizado.
- Se Continua realizando seguimiento a medidas Preventivas TSA (Altura)
- Continua corte y figurado de acero de refuerzo para columnas.
- Continúa la instalación de acero de refuerzo para columnas del nivel 3,15 en los ejes 10 y 11.
- Se realiza la revisión del refuerzo instalado en las columnas A6, C11, B11 y A11 y D11.
- Se realiza la fundición, previa autorización, de las columnas A6, A9 y D10 con concreto producido en obra de 4000 psi.
- Se reporta la salida de obra de una mezcladora.

Ingeniero SISOMA

7 Viernes, 21 de junio de 2024.
- Estado del tiempo: soleado
- Personal en obra
  - 1 Residente de obra
  - 1 Auxiliar de ingeniería
  - 1 Arquitecto asesor
  - 1 Profesional SISOMA
  - Ayudantes
- Actividades realizadas:
- Continuan las actividades en el banco de ductos 4x4" exterior en el costado sur con la instalación de la cama de arena y la cinta roja.
- Se realiza la fundición, previa autorización, de las columnas A10, C10, B11 y C11 con concreto producido en obra de 4000 psi.
- Continua el retiro de la obra falsa y casetones para la losa de entre piso.

*COMPONENTE SST Y SISOMA
- Se Continua realizando seguimiento al uso adecuado de equipos para TSA
- Se realiza recomendación sobre acopio adecuado de residuos que puedan ser desplazados al area de operaciones aereas de la EHAVI ITA-096.

Ingeniero SISOMA

LIBRO Nº 2

BITACORA DE OBRA

INTERVENTORIA

PROYECTO:

EMAVI-"MARCO-FIDEL"

CALI-VALLE

Powered by CamScanner

* Sábado, 22 de junio de 2024

• Estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de Obra
- 1 Auxiliar de Ingeniería
- 1 Arquitecto asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 13 Ayudantes

• Actividades realizadas:

- Se realiza la revisión de la formaleta instalada, verificando plomos alineación, recubrimientos internos. Se autoriza la fundición de las columnas B10 y D11
- Se realiza el vaciado de las columnas autorizadas con concreto de 4000 psi producido en obra.
- Continua el retiro de tableros y obra falsa para la losa de entrepiso
- Continua el corte y figurado del acero de refuerzo.
- Continua el retiro de los casetones para aligeramiento.

*COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Se realiza mesa de trabajo N°16 del componente SST y Ambiental en relación a los nuevos compromisos de la Semana N° 17 en el seguimiento de la gestión SST (Manual) y Ambiental (PMA)

SUPERVISOR SISOMA
Katerine Chamorro S.

* Lunes, 24 de junio de 2024

• Estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de obra
- 1 Auxiliar de ingeniería
- 1 Arquitecto asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 14 Ayudantes

• Actividades realizadas:

- Continua el retiro de tableros y de obra falsa de la losa de entrepiso.
- Continua retiro de casetones para aligeramiento.
- Continua corte y figurado del acero de refuerzo.

*COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

- Acondicionamiento de area para caseta de bloque (mitigación material Paticado)

Powered by CamScanner

- Socalización y Publicación en hábitos Saludables.
- Se continúa Seguimiento uso adecuado de equipos de Protección contra caídas.

* Martes, 25 de junio de 2024
  - estado del tiempo soleado
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 13 Ayudantes
    - 1 Director de Obra.
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 1 Profesional de Costos
  - Actividades realizadas:
    - Se reporta la presencia en sitio de obras del Director de obra del contratista, Arq. Jairo Villamizar.
    - Se reporta la presencia en sitio de obras de la supervisora del contrato: DIFRA, Te. Yeimy Ríos.
    - Continua armado de la obra falsa para la losa del nivel 6,30.
    - Continua el retiro de casetones y obra falsa en la losa del nivel 3,15.
    - Se repoita llegada de cargamento de acero.

* COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
- Revisión de documentos de personal que ingresa con vehiculos y madera a dia (Soat, tecnomecanica, Planilla de seguidad social).
- Seguimiento al uso adecuado de EPP y EPI en trabajos a diferente nivel o Alturas.

Katerine Chamorro.
Intervence SISOMA

* Miercoles, 26 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA

- 14 Ayudantes

• Actividades realizadas:

- Se reporta presencia en obra de la Supervisora del Contrato, Te. Yeimy Ríos.
- Continua la instalación de la obra falsa para la losa del nivel 6,30.
- Continuan actividades en el banco de ductos 4x4" exterior paralelo al cerramiento existente en el costado sur.
- INICIAN las actividades de mampostería con la colocación de anclajes para dovelas y pega de bloques para muros de cerramiento en el eje 11.

* COMPONENTE SST y AMBIENTAL.

- Seguimento uso adecuado de EPP y EPI en actividades a diferente nivel
- Socialización y complemento de acciones de hábitos saludables.
- Verificación en ejecución de Andamios Albareo Cintura Perimetro de obra.

Kaleth Chamorro
Inspector SISOMA

Muyl Ríos

* Jueves, 27 de junio de 2024

• Estado del tiempo: soleado

• Personal en obra:

- 1 Residente de obra.
- 1 Auxiliar de Ingeniería
- 1 Arquitecto asesor
- 1 Profesional SISOMA
- 15 Ayudantes.

• Actividades realizadas:

- Continuan las actividades de instalación de dovelas.
- Continua la pega de bloques para muros en mampostería en nivel 3,15
- Continua la instalación de la obra falsa para losa de cubierta del nivel 6,30.
- Continua el armado del acero de refuerzo para vigas aéreas del nivel 3,15.
- Continua corte y figurado del acero de refuerzo para vigas aéreas.
- Se reporta lluvia moderada - fuerte entre las 3:00 pm y las 4:10 pm. Se presenta afectación únicamente en la actividad de

Powered by CamScanner

instalación de acero de refuerzo en nivel 6.30. Las actividades como pega de bloque e instalación de douelas continúa.

- COMPONENTE SST y AMBIENTAL
- Interventoría verifica en campo uso obligatorio de EPI y EPP en todas las actividades realizadas durante el día.
- Durante el día de hoy no se reportaron novedades de accidentes de trabajo.

INTERVENTOR SISOMA.

* Viernes, 28 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado.
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Profesional de costos
    - 1 Auxiliar de ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 13 Ayudantes.
  - Actividades realizadas:
    - Continua el corte y figurado del acero de refuerzo.
    - Continúa la instalación del acero de refuerzo para vigas aéreas del nivel 6.30.
    - Continua instalación de douelas para muros.
    - Continua pega de bloques para muros en mampostería.

* COMPONENTE SST y AMBIENTAL.
- Se realiza inspección mensual en relación a la gestión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Manual de Seguridad (SST)
- Se Verifica recolección de residuos aprovechables (ASOTRIUNTO)
- Se controla con seguimiento al uso adecuado de EPP-EPI-EPCC

Katerine Chamorro.
INTERVENTOR SISOMA

* Sábado, 29 de junio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 13 Ayudantes
    - 1 Profesional SISOMA
    - 1 Auxiliar de ingeniería.
  - Actividades realizadas:
    - Se reporta la visita a obra del asesor estructa del contratista,

Powered by CamScanner

Ing Marcelo Martinez para revisión de Avance de obra, revisión de Mamposteria y detalles de la estructura de cubierta.

*COMPONENTE SST y AMBIENTAL.

- Se realiza mesa de trabajo SISOMA Nº17 con los nuevos compromisos de la semana Nº18 en relación al componente SST y Ambiental.

• Componente técnico:

- Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo para estructura del nivel 6,30.
- Continúa el armado del acero de refuerzo para vigas aéreas del nivel 6,30.
- Continúa la instalación de dovelas para muros en mamposteria.
- Continúa pega de bloques para muros en mamposteria en ejes 11 y A, B, C, D entre ejes 11 y 10.
- Se realiza la primera fundición de dovelas para los muros anteriores con concreto producido en obra de 3000 psi.

INTERVENTOR SISOMA

*Domingo. 30-Junio-2024.

Tiempo: Soleado

Personal de obra: 1 Profesional Sisoma
6 Ayudantes de obra

Actividades Realizadas

- Se continuan con las actividades de mamposteria
- Fondicion de dovelas.
- Se continua con el corte y amarre de hierro para vigas de nivel. 6 30.

John Edgar Rayest
John Edgar Rayest.

*Componente. SST y ambiental


- Se realiza orden y Aseo en la obra
- Se. Inicia el informe del mes de Junio /2024

INTERVENTOR SISOMA

- Se entregan EPP por Reposicion o los trabajadores.


Jhon Edgar Reyes. Profesional Sisoma

Jhon Edgar Reyes.



* Martes, 02 de julio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado.
  - Personal en obra:
    - 1 Residente de obra
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Profesional de Costos
    - 1 Auxiliar de ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 14 ayudantes
  - Actividades realizadas:
    - Continua corte y figurado de acero de refuerzo para vigas aéreas del nivel N+6,30.
    - Continua armado del refuerzo para vigas aéreas en el nivel N+6,30 en los ejes 8 y 9.
    - Continua armado de obra falsa para la losa del nivel N+6,30.
    - Continua pega de bloques para muros en mampostería, entre los ejes 10 y 9.
    - Se reporta lluvia moderada-fuerte entre las 3:10pm y las 3:35pm. NO se produjeron afectaciones en la ejecución de actividades de obra.
* COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
* Redemarcación zona de excavación externa (Eléctrico).
* Seguimiento uso adecuado de EPP-EPI-EPCC.
* Verificación en grabación de Individuos Alberico interno en obra.

Trabajo en alturas



* Miércoles, 03 de julio de 2024
  - Estado del tiempo: soleado
  - Personal en obra
    - 1 Auxiliar de Ingeniería
    - 1 Profesional SISOMA
    - 16 ayudantes
    - 1 Arquitecto asesor
    - 1 Profesional de Costos
  - Actividades realizadas:

Powered by CamScanner
