MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

Medellín, 14 de junio de 2024 **IFA-090**

Arquitecto:
JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
Director de obra y Representante Legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

REFERENCIA: CONTRATO No. 168-00-A- COFAC-DIFRA-2023 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ.

Asunto: Seguimiento en el uso adecuado de equipos de protección contra caídas

Estimado arquitecto,

A continuación, se relaciona las acciones observadas durante la actividad ejecutada en el vaciado de losa entre piso el día martes 11 junio 2024. Por lo tanto, se reitera cumplimiento de las medidas de restricción enviadas a través del comunicado IFA-082, comunicado enviado el 06 junio 2024. Se insiste en gestionar medidas que garanticen el cumplimiento seguro para actividades en Altura que a la fecha continúan en proceso de seguimiento por esta interventoria.

Cordialmente

Ingeniero
Mario Humberto Quiroga Acosta
Director de Interventoria
Interventoria Mario de Jesús Gil Cardona



Proyecto
Katerine Chamorro Sandoval
Residente SISOMA
Interventoria Mario de Jesús Gil Cardona

A continuación, se anexan fichas de seguimiento en actividades en Altura

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

ACCION OBSERVADA: Ascenso y descenso en andamio sin equipo TSA y sin uso de aseguramiento en laterales de andamio.
Descripción acción insegura Se observo personal que utilizo sistema de acceso, descenso y ascenso sin equipo de protección contra caídas. Cabe mencionar que este sistema de acceso cumple con una altura aproximada de 2.70 metros expuestos a caída diferente nivel con politraumatismo.
Medida de cumplimiento requerida: Personal al usar sistema de acceso, ascenso y descenso debe usar equipo de protección contra caídas completo, A su vez uso de eslingas en laterales de andamio, realización de retroalimentación del uso adecuado de los equipos de protección contra caídas y riesgos en actividades a diferente nivel.
Registro fotografico


Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

ACCION OBSERVADA: Personal sin equipo de protección contra caída en losa de entre piso


Descripción acción insegura

Se observo, personal realizando actividades de vaciado en losa de entre piso, sin equipo de protección contra caídas, cabe mencionar que los laterales del perímetro de intervención a la fecha no cuentan con medida de restricción. La medida de señalización en perímetro no cuenta como medida de restricción en actividades de Altura.

Medida de cumplimiento requerida:

Gestión en medidas de restricción en bordes y/o laterales del perímetro que comprende las actividades en losa de entre piso.

Registro fotográfico

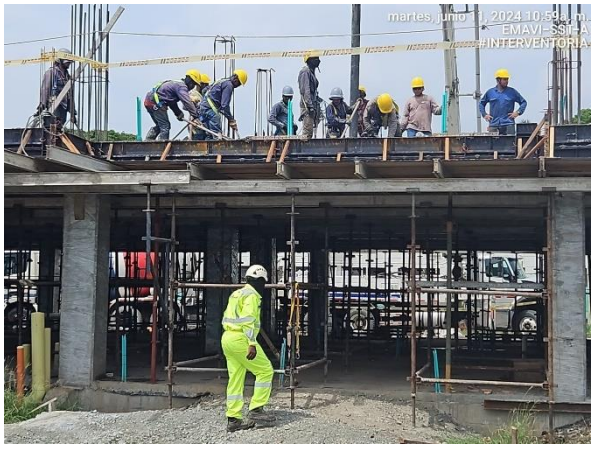







Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

ACCION OBSERVADA: Personal en bordes de losa de entre piso sin anclaje o aseguramiento

Descripción acción insegura:
Se observo personal en bordes o laterales de losa entre piso, sin uso de línea de vida que se encontraba en laterales en el día de la actividad de vaciado del martes 11 junio 2024. A la fecha se ha reiterado organización de línea de vida existente en bordes.

Medida de cumplimiento requerida:
Reorganización de líneas de vida existentes en el perímetro de intervención, análisis de riesgos, peligros y medidas preventivas, para posible adquisición de insumos de restricción o de seguridad para actividades en Altura.

Registro fotográfico









Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com

ACCION OBSERVADA: Línea de vida no disponible a nivel intermedio en ejecución de actividades.

Descripción acción insegura

Personal que se encontraba realizando la actividad de vaciado de losa de entre piso, no conto con disponibilidad de línea de vida ubicada a nivel intermedio que garantizara desplazamiento seguro de personal y equipo de autobomba.

Medida de cumplimiento requerida:

Disponibilidad de línea de vida o sistema de anclaje portátil de aseguramiento de personal para desplazamiento seguro en losa de entre piso.

Registro fotográfico









Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

ACCION OBSERVADA: Inspección de equipos de protección contra caídas adicionales en uso.


Descripción acción insegura: A la fecha se ha observado el uso de mas de 7 equipos de protección contra caídas por parte del contratista. Cabe mencionar que esta interventoria cuenta con soporte de 4 inspecciones de equipos en obra realizada el 25 abril 2024. A la fecha se continúa requiriendo este punto por medio de las actas de mesa de trabajo SISOMA realizadas de forma semanal contratista e Interventoria.

Medida de cumplimiento requerida:
Inspección de los equipos de protección contra caídas restantes que se encuentran en uso en obra, para ser registrados por parte de esta Interventoria.

Registro fotográfico





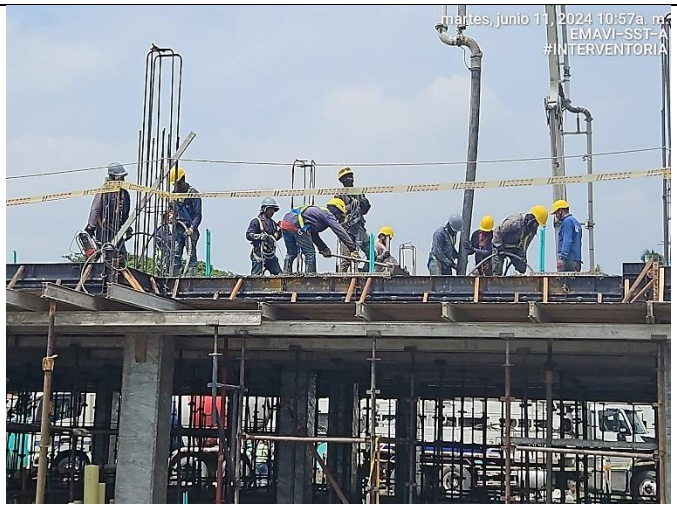

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com

Cra 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry, Medellín
Tel: 473 41 45 -311 390 09 73
Email: mariogilconsultorias@gmail.com
