Chigorodó, 05 de julio de 2024.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que fue recibido a entera satisfacción por este Despacho, la cuenta de cobro para, EL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA No 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023, EL CUAL TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR VALOR TOTAL DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($6.479.842.319), VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR FACTURADO	$458.967.367
VALOR AMORTIZADO	$0
VALOR NETO A PAGAR	$458.967.367

Servicio prestado por: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
NIT N° 901.730.180-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Proceso de contratación No LP 184-2023
ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.5179994
CONTRATO DE OBRA No 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de infraestructura física y valoración

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Asesor Técnico Ext. – Abel Garces.		05/07/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		05/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CONTRATO N° Y FECHA	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Proceso de contratación N° LP 184-2023 ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.4440771 CONTRATO DE OBRA No 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP 01104 del 26/07/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 01776 DE 30/11/2022
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Secretaría de Infraestructura Física y Valorización – 25/01/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($6.479.842.319).
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($458.967.367).
VALOR POR EJECUTAR	SEIS MIL VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($6.020.874. 952).
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios () Regalías () Tasas Retributivas () Convenio (X) Inversión () Estampillas () Transferencias del Departamento ()
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
LEGALIZACION DEL CONTRATO	SECOP II

El SUPERVISOR del Contrato hace constar que: SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO, identificado con NIT No. 901.730.180-8, cumplió a satisfacción con las actividades correspondientes al Acta Parcial No. 01, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($458.967.367)., a los 05 días del mes de julio de 2024.

GESTIÓN TRANSPARENTE
12 JUL. 2024
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se deja constancia que la Señora, SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO, identificado con NIT No. 901.730.180-8, acreditó los siguientes pagos a la Seguridad Social de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, relacionados con el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de Pensiones respectivamente:

COMPROBANTE DE PAGO				
Planilla: 70490151		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Abril	21/06/2024	$1.817.700
RIESGO ARL		Mayo	21/06/2024	$3.163.400
PENSION		Mayo	21/06/2024	$6.963.000
Planilla: 71480869		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Junio	21/06/2024	$2.397.800
RIESGO ARL		Mayo	21/06/2024	$4.172.700
PENSION		Mayo	21/06/2024	$9.174.200

Cumplimiento de actividades a la fecha	Construcción de Placa Huella en la Vereda Guapá Alto, Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia.
Procedimiento de verificación	Se realizó la verificación de las actividades realizadas y a la documentación que adjunta: factura, pago de la seguridad social mes de Abril - Mayo - Junio de 2024.
Actividades realizadas	El Contratista adjunta documentos e informe correspondiente al acta y avance parcial de obra.
Observaciones	Cuenta de cobro del Acta parcial N° 01 $458.967.367.

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR E.
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ
R/L CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Abel Garcés Arroyo – Asesor Técnico Ext		05/07/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		05/07/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	
FECHA	21/06/2024		

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ ACTA No: 1 POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____

CONTRATO No : 226 de 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA GUAPA ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 970 de 2022 INTERVENTOR: TNM ENGINEERING, CONSULTING & MANAGEMENT

PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	25 DE ENERO DE 2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 6,479,842,319.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 6,479,842,319.00		

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 11 DE JUNIO DE 2024		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 11 DE JUNIO DE 2024		OBRA ACUMULADA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				I. PLACA HUELLA												
1.1	600.2.p			Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	985.80	$ 26,408	$ 26,033,006	1,027.30	$ 27,128,938	150.80	$ 3,982,326			150.80	$ 3,982,326
1.2	310.1			Conformación de la calzada existente	m2	32,860.00	$ 1,159	$ 38,084,740	19,800.00	$ 22,948,200	10,525.00	$ 12,198,475			10,525.00	$ 12,198,475
1.3	320.3			Subbase Granular Clase C	m3	4,650.00	$ 207,070	$ 962,875,500	2,534.40	$ 524,798,208	416.00	$ 86,141,120			416.00	$ 86,141,120
1.4	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1,569.32	$ 704,421	$ 1,105,461,964	997.92	$ 702,955,804	87.75	$ 61,812,943			87.75	$ 61,812,943
1.5	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	387.50	$ 704,421	$ 272,963,138	396.00	$ 278,950,716	0.00	$ 0			0.00	$ 0
1.6	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1,674.00	$ 704,421	$ 1,179,200,754	1,323.17	$ 932,068,735	48.75	$ 34,340,524			48.75	$ 34,340,524
1.7	630.7			Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	1,656.51	$ 510,273	$ 845,272,327	997.92	$ 509,211,632	43.88	$ 22,390,779			43.88	$ 22,390,779
1.8	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	186,000.00	$ 8,237	$ 1,532,082,000	140,573.54	$ 1,157,904,249	6,337.73	$ 52,203,882			6,337.73	$ 52,203,882
1.9	900.1			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia (CONFORMACIÓN TERRAPLEN)	M3/KM	12,815.40	$ 1,637	$ 20,978,810	10,237.80	$ 16,759,279	0.00	$ 0			0.00	$ 0
				II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA												
2.1	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	532.00	$ 42,029	$ 22,359,428	616.00	$ 25,889,864	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.2	600.1.1.1			Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)	m3	304.00	$ 7,433	$ 2,259,632	0.00	$ 0	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.3	661.1			Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	114.00	$ 1,157,608	$ 131,967,312	84.00	$ 97,239,072	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.4	630.6			Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	16.91	$ 563,248	$ 9,524,524	30.52	$ 17,190,329	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.5	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	152.00	$ 704,421	$ 107,071,992	109.20	$ 76,922,773	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.6	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	10,830.00	$ 8,237	$ 89,206,710	8,104.88	$ 66,759,897	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.7	610.1			Relleno para Estructuras con material del sitio	m3	304.00	$ 22,791	$ 6,928,464	0.00	$ 0	0.00	$ 0			0.00	$ 0
2.8	610.2			Relleno para Estructuras con recebo	m3	114.00	$ 79,000	$ 9,006,000	371.00	$ 29,309,000	0.00	$ 0			0.00	$ 0
				III. CARACTERIZACIÓN VIAL												
3.1				Caracterización del corredor	km	6.50	$ 790,000	$ 5,135,000	4.00	$ 3,160,000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0
				IV. BOX CULVERTS E ITEM NUEVOS												
4.1	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar para BOX CULVERT	m3	0.00	$ 42,029	$ 0	128.96	$ 5,420,060	0.00	$ 0			0.00	$ 0
4.2	INP 1			Mejoramiento de la SUB-RASANTE y/o construcción de terraplen con adición de materiales	m3	0.00	$ 157,619	$ 0	6,957.40	$ 1,096,618,431	848.75	$ 133,779,126			848.75	$ 133,779,126
4.4	INP 2			Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - BOX CULVERT	m3	0.00	$ 1,421,180	$ 0	321.79	$ 457,321,512	0.00	$ 0			0.00	$ 0
4.5	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - BOX CULVERT	kg	0.00	$ 8,237	$ 0	34,896.15	$ 287,439,588	0.00	$ 0			0.00	$ 0
4.6	610			Relleno para Estructuras con recebo - BOX CULVERT	m3	0.00	$ 79,000	$ 0	385.00	$ 30,415,000	0.00	$ 0			0.00	$ 0

SUBTOTAL OBRAS	$ 6,366,411,302	$ 6,366,411,302	$ 406,849,175		$ 406,849,175
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 61,312,825	$ 61,312,825	$ 0		$ 0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 43,796,800	$ 43,796,800	$ 43,796,800		$ 43,796,800
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 8,321,392	$ 8,321,392	$ 8,321,392		$ 8,321,392
VALOR TOTAL	**$ 6,479,842,319**	**$ 6,479,842,319**	**$ 458,967,367**		**$ 458,967,367**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 2220220926 9COR

Firma:
Nombre: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202116054CND

Firma:
Nombre: MONICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Física
Municipio de Chigorodó
Matricula No.:

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA		Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Excavaciones para subrasante		K0+040	K0+100		96.80
Excav. Para mejoramiento subrasante		K0+040	K0+100		54.00
TOTAL					150.80

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.2	Conformación de la calzada existente	m2		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA







DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Vía Guapá Alto		2,105.00	5.00		10,525.00
TOTAL					10,525.00

OBSERVACIONES:

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.3	Subbase Granular Clase C	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Franja de 3,60 m de ancho		650.00	3.60	0.15	351.00
Franja de 1,00 m cunetas		650.00	1.00	0.10	65.00
TOTAL					416.00

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia



MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA

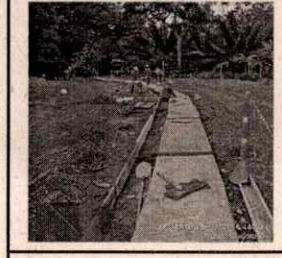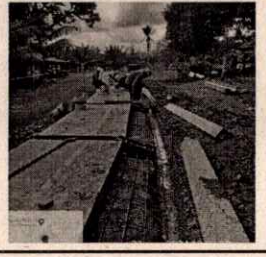

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Concreto placa vehicular derecho	1	650.00	0.90	0.15	87.75
Concreto placa vehicular izquierdo	1	0.00	0.90	0.15	0.00
TOTAL					87.75

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA

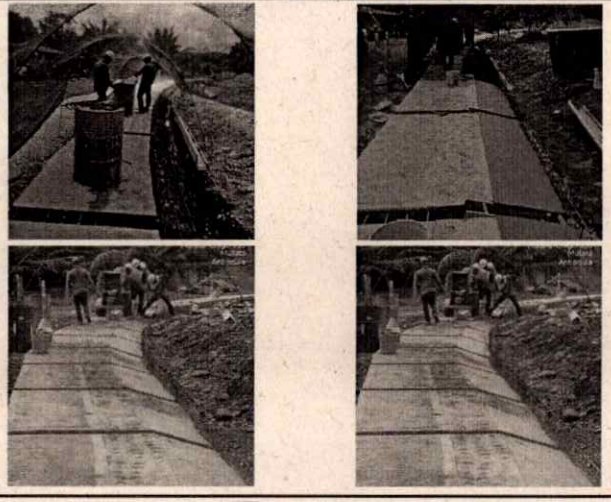

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Área		
Concreto cuneta	1.00	650.00	0.075		48.75
Concreto bordillo	2.00	0.00	0.104		0.00
TOTAL					48.75

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.968-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Concreto ciclópeo central	0	0.00	0.90	0.15	0.00
Concreto ciclópeo laterales	1	650.00	0.45	0.15	43.88
TOTAL					43.88

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia


MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.8	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA



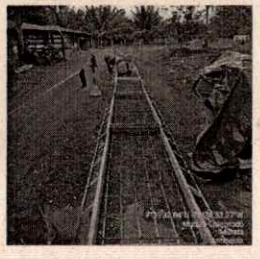



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Acero placa vehicular longitudinal (kg)					3,900.00
Acero placa vehicular transversal (kg)					325.15
Acero vigas riostra longitudinal (kg)					0.00
Acero vigas riostra transversal (kg)					0.00
Acero cunetas longitudinal (kg)					1,950.00
Acero cunetas transversal (kg)					162.58
Acero bordillos longitudinal (kg)					0.00
Acero bordillos transversal (kg)					0.00
TOTAL					6,337.73

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.986-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
4	BOX CULVERTS E ITEM NUEVOS			4,2	Mejoramiento de la SUB-RASANTE y/o construcción de terraplen con adición de materiales	m3		21 de Junio de 2024

MEMORIA GRÁFICA





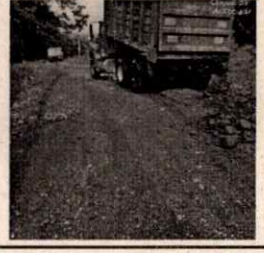

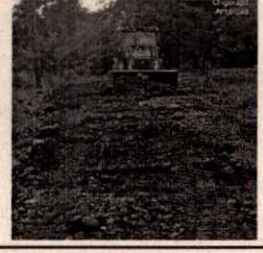

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Terraplen		K0+040	K0+660		794.75
Mejoramiento Sub-rasante		60.00	3.00	0.30	54.00
TOTAL					848.75

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño de obras menores de la cartilla de INVIAS

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

VICTOR GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría

CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ

Chigorodó, noviembre 15 de 2023

Doctora
YANET MADRID
Jefe contratación y compras
Municipio Chigorodó

REF.: CONTRATO DE OBRA Nro. 226 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ Y EL CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ.

Cordial saludo,

Yo, **SANDRA MILENA SÁNCHEZ DIAZ**, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ, identificado con Nit Nro. 901.130.180-8, por medio de la presente me permito manifestar la RENUNCIA AL ANTICIPO DEL CONTRATO, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con el fin de continuar las actividades incluidas en el proyecto con recursos propios.

Así las cosas, me permito solicitar, se siga pagando tal cual fue pactado en el contrato, realizando pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avances de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, dejando tal y como lo menciona la CLÁUSULA 8, FORMAS DE PAGO, Parágrafo 1. La entidad realizará al contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por cientos (10%) del valor total del

Dirección: Carrera 74 No 71-12 Carepa - Antioquia tel. 3242223502
E- mail cooserdecon1@gmail.com

contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.

De esta manera se evitarían, los gastos generados por la fiducia, optimizando el dinero en la obra a ejecutar, que es el objetivo principal del desarrollo del proyecto.

Agradeciendo de antemano su colaboración y atención

SANDRA MILENA SÁNCHEZ DIAZ
Representante legal
Consorcio placa huella de Chigorodó

15/11/2023
