SGC-CP-16229-24
Neiva, agosto 01 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad


Ref.: Contrato de Interventoría No.434 de 2023.
Asunto: Informe de interventoría No.9

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual interventoría No.9
2. Informes semanales el periodo
3. Acta de comité
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME DE INTERVENTORÍA

9

Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	9	Periodo comprendido entre el :	1 de julio de 2024	y el:	31 de julio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	434 DE 2023	**Contrato Nº:**	416 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 85.481.726,00	**Valor Inicial:**	$ 842.938.161,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 85.481.726,00	**Valor total:**	$ 842.938.161,00
Valor pagado:	$ 27.191.736,96	**Valor pagado:**	
Valor por pagar:	$ 58.289.989,04	**Valor por pagar:**	$ 842.938.161,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	8/11/2023	9/09/2029	$ 8.548.180,00
Cumplimiento	8/11/2023	12/03/2025	$ 25.644.540,00
Prestaciones sociales	8/11/2023	9/09/2027	$ 8.548.180,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	10/09/2027	$ 84.293.816,10
Estabilidad y calidad de la obra	Un año mas		$ 168.587.632,20
Calidad del servicio	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	7/09/2024	$ 232.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	30/05/2024	$ 27.191.736,96
		$ 27.191.736,96

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	30/05/2024	$ 268.103.355,00
		$ 268.103.355,00

INFORME DE INTERVENTORÍA

9

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	70,17%	8,98%	79,14%
% Ejecutado	69,64%	7,62%	77,26%
Diferencia	-0,53%	-1,35%	-1,89%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 591.487,60	$ 75.654,48	$ 667.142,08	79,14%
% Ejecutado	$ 586.997,59	$ 64.237,13	$ 651.234,72	77,26%
Diferencia	$ (4.490,01)	$ (11.417,35)	$ (15.907,36)	-1,89%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento de los aislamientos en los siguientes municipios:

Tello: Vereda El cadillo, predio Primavera (3.000ml de 3.000ml), predio La Ilusion (1.140m de 1.200m), predio La Esmeralda (230m de 1.142m) y **vereda Rio Negro**, predio La Argentina (1.360ml de 2.000ml).
Guadalupe: Vereda Alto Resinas, predio La Union (760m de 1.908m), predio Lagunilla (260m de 1.273m).
Neiva: Vereda San Bartolo, predio El Concilio (500ml de 500ml), predio Los Piscos (576 ml de 576ml), predio La Albania (1.876ml de 1.876ml) y predio La Esperanza (600ml de 600ml); **vereda Motilón**, predio Las Pavas (270ml de 600ml) y predio El Trigal (800ml de 1.000ml); **vereda Alto Motilón**, predio Soledad (1.430ml de 1.689ml), **vereda Pueblo Nuevo**, predio San Agustín (1.200ml de 1.200ml), **vereda La Plata**, predio Filo Frío (190ml de 190ml) y predio Himalaya (1.022ml de 1.023ml), **vereda Floragaita**, predio La Gironda (1.140ml de 1.526ml), **vereda San Miguel**, predio La Lorena (1.275ml de 1.275ml).

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	1		33,33%	0,00%	1
TÉCNICO	2		66,67%	0,00%	2
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3
TOTALES	3		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		1	0,00%	7,69%	1
TÉCNICO	6		46,15%	0,00%	6
M.O.N.C.	6		46,15%	0,00%	6
TOTAL	12	1	92,31%	7,69%	13
TOTALES	13		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME DE INTERVENTORÍA**	**9**	Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

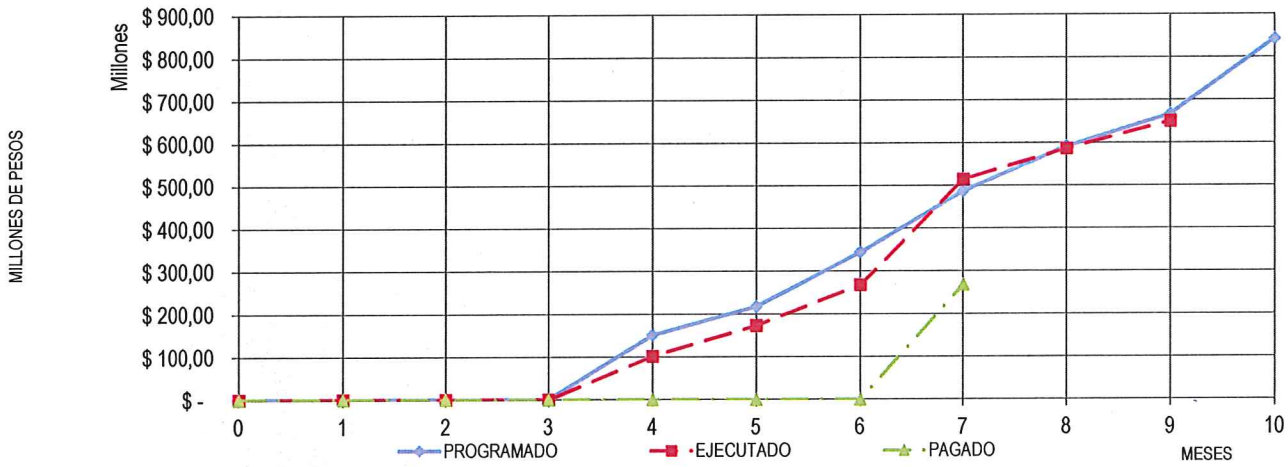

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo la interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas. El 05 de julio de 2024 se suscribió el Otrosí No.3 al contrato de obra, por cambio de predios y ajustes de cantidades correspondientes al balance realizado mediante acta de mayores y menores cantidades No.2.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Humberto Quiza Camacho **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia zambrano serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

9

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES				$ 670.910.102,00				$ 467.202.259,00	$ 51.127.524,00	$ 518.329.783,00		$ 152.580.319,00
1	Manteniento aislamiento	ML		$ 10.241	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	Manteniento aislamiento cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	ML		$ 6.064	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	Mantenimiento restauracion activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	HA	65	$ 1.730.481	$ 112.481.265,00	65,00	0,00	65,00	$ 112.481.265,00		$ 112.481.265,00	0,00	
4	Manteniento de barreras vivas de fique (Ha)	ML	9400	$ 3.155	$ 29.657.000,00	7.031,00	900,00	7.931,00	$ 22.182.805,00	$ 2.839.500,00	$ 25.022.305,00	1.469,00	$ 4.634.695,00
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	ML	6.742	$ 10.878	$ 73.339.476,00	3.830,00	1.360,00	5.190,00	$ 41.662.740,00	$ 14.794.080,00	$ 56.456.820,00	1.552,00	$ 16.882.656,00
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	ML	4.399	$ 10.232	$ 45.010.568,00	1.876,00	0,00	1.876,00	$ 19.195.232,00		$ 19.195.232,00	2.523,00	$ 25.815.336,00
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	ML	2.049	$ 9.582	$ 19.634.252,00	1.350,00	170,00	1.520,00	$ 12.935.700,00	$ 1.628.940,00	$ 14.564.640,00	529,08	$ 5.069.612,00
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	ML	2.292	$ 10.089	$ 23.123.988,00	1.390,00	516,00	1.906,00	$ 14.023.710,00	$ 5.205.924,00	$ 19.229.634,00	386,00	$ 3.894.354,00
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	ML	1.000	$ 10.041	$ 10.041.000,00	0,00	0,00	0,00				1.000,00	$ 10.041.000,00
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	ML	1.275	$ 9.295	$ 11.851.125,00	1.275,00	0,00	1.275,00	$ 11.851.125,00		$ 11.851.125,00	0,00	
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	ML	1.000	$ 8.905	$ 8.905.000,00	750,00	50,00	800,00	$ 6.678.750,00	$ 445.250,00	$ 7.124.000,00	200,00	$ 1.781.000,00
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	ML	600	$ 9.357	$ 5.614.200,00	270,00	0,00	270,00	$ 2.526.390,00		$ 2.526.390,00	330,00	$ 3.087.810,00
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	ML	500	$ 9.263	$ 4.631.500,00	330,00	170,00	500,00	$ 3.056.790,00	$ 1.574.710,00	$ 4.631.500,00	0,00	
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	ML	3.100	$ 8.049	$ 24.951.900,00	0,00	0,00	0,00				3.100,00	$ 24.951.900,00
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	ML	211	$ 6.551	$ 1.382.261,00	0,00	0,00	0,00				211,00	$ 1.382.261,00
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	ML	737	$ 5.854	$ 4.314.398,00	0,00	0,00	0,00				737,00	$ 4.314.398,00
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	ML	0	$ 4.791	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	ML	500	$ 4.676	$ 2.338.000,00	0,00	0,00	0,00				500,00	$ 2.338.000,00
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	ML	1.200	$ 4.277	$ 5.132.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	$ 5.132.400,00		$ 5.132.400,00	0,00	
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	ML	1.023	$ 2.042	$ 2.089.899,00	1.022,00	0,00	1.022,00	$ 2.086.924,00		$ 2.086.924,00	1,46	$ 2.975,00
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	ML	11.713	$ 11.407	$ 133.610.191,00	7.332,00	2.160,00	9.492,00	$ 83.636.124,00	$ 24.639.120,00	$ 108.275.244,00	2.221,00	$ 25.334.947,00
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	ML	1.783	$ 10.986	$ 19.588.038,00	1.783,00	0,00	1.783,00	$ 19.588.038,00		$ 19.588.038,00	0,00	
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	ML	1.263	$ 11.317	$ 14.293.371,00	0,00	0,00	0,00				1.263,00	$ 14.293.371,00
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	ML	852	$ 10.277	$ 8.756.004,00	0,00	0,00	0,00				852,00	$ 8.756.004,00
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	ML	690	$ 8.998	$ 6.208.620,00	690,00	0,00	690,00	$ 6.208.620,00		$ 6.208.620,00	0,00	
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	ML	1.295	$ 8.845	$ 11.454.275,00	1.295,00	0,00	1.295,00	$ 11.454.275,00		$ 11.454.275,00	0,00	
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	ML	1.266	$ 8.677	$ 10.985.082,00	1.266,00	0,00	1.266,00	$ 10.985.082,00		$ 10.985.082,00	0,00	
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	ML	1.624	$ 8.858	$ 14.385.392,00	1.624,00	0,00	1.624,00	$ 14.385.392,00		$ 14.385.392,00	0,00	
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	ML	4.855	$ 7.343	$ 35.650.265,00	4.855,00	0,00	4.855,00	$ 35.650.265,00		$ 35.650.265,00	0,00	
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	ML	4.581	$ 6.872	$ 31.480.632,00	4.581,00	0,00	4.581,00	$ 31.480.632,00		$ 31.480.632,00	0,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 670.910.102,00**				**$ 467.202.259,00**	**$ 51.127.524,00**	**$ 518.329.783,00**		**$ 152.580.319,00**
	ADMINISTRACION		20,00%		$ 134.182.020,00				$ 93.440.452,00	$ 10.225.505,00	$ 103.665.957,00		$ 30.516.063,00
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 6.709.101,00				$ 4.672.023,00	$ 511.275,00	$ 5.183.298,00		$ 1.525.803,00
	UTILIDAD		3,90%		$ 26.165.494,00				$ 18.220.887,00	$ 1.993.975,00	$ 20.214.862,00		$ 5.950.632,00
	IVA		19,00%		$ 4.971.444,00				$ 3.461.969,00	$ 378.855,00	$ 3.840.824,00		$ 1.130.620,00
	COSTO AIU (24.90%)				**$ 172.028.059,00**				**$ 119.795.331,00**	**$ 13.109.610,00**	**$ 132.904.941,00**		**$ 39.123.118,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 842.938.161,00**				**$ 586.997.590**	**$ 64.237.134**	**$ 651.234.724**		**$ 191.703.437,00**
									69,64%	**7,62%**	**77,26%**		**22,74%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 1**	9

CQ Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 842.938.161,00	**V/R ANTICIPO:**	$ 0,00
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 842.938.161,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FV1	30/05/2024	$ 268.103.355,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 268.103.355,00	$ 574.834.806,00	31,81%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		
	TOTAL				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 268.103.355,00**	**$ 574.834.806,00**	**31,81%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 85.481.726,00	**V/R ANTICIPO:**	**NA**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**NA**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 85.481.726,00**	**% RETEGARANTIA:**	**10,00%**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FVE - 65	30/05/2024	$ 27.191.736,96	$ 0,00	N/A	N/A	$ 27.191.736,96	$ 58.289.989,04	31,81%
						N/A	N/A	$ 0,00		31,81%
	TOTAL			**$ 27.191.736,96**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 27.191.736,96**	**$ 58.289.989,04**	**31,81%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	9	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador de Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de julio de 2024	al	31 de julio de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



AISLAMIENTO PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - TELLO

FOTOGRAFÍA No.2



AISLAMIENTO EL CONCILIO - VDA SAN BARTOLO - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.3



AISLAMIENTO SOLEDAD - VDA ALTO MOTILON - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.4



AISLAMIENTO EL TRIGAL - VDA MOTILON - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.5



AISLAMIENTO SAN PEDRO - VDA EL VISO - YAGUARA

FOTOGRAFÍA No.6



AISLAMIENTO LA GIRONDA - VDA FLORAGAITA - NEIVA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	8-jul-24	PERIODO No.	32	DEL	1/07/2024	AL	7/07/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	62			DÍAS POR EJECUTAR	62		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	242	EQUIVALE AL	79,6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	242	EQUIVALE AL	79,6%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 610.890.248,69	72,47%	-0,18%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 609.413.640,31	72,30%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** predio La primavera 2.350m de 3.200m de la vereda El Cadillo, predio La Argentina 950m de 2.118m de la vereda Rio Negro y **Neiva** en el predio El Concilio 500m de 500m de la vereda San Bartolo; en los predios Las Pavas 270m de 600m y el Trigal 800m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 1.430m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 700m de 1.526m de la vereda Floragaita.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el período. A la fecha la Entidad se encuentra en proceso de aprobación del Otrosí No.3 al contrato de obra.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO LAS PAVAS - VDA MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA SOLEDAD - VDA ALTO MITILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR ENCARGADO**
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	16-jul-24	PERIODO No.	33	DEL	8/07/2024	AL	14/07/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	55			DÍAS POR EJECUTAR	55		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	249	EQUIVALE AL	81,9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	249	EQUIVALE AL	81,9%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 629.006.274,45	74,62%	-1,32%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 617.889.469,74	73,30%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** predio La primavera 2.985m de 3.200m de la vereda El Cadillo, predio La Argentina 1.060m de 2.118m de la vereda Rio Negro y **Neiva** en los predios Las Pavas 270m de 600m y el Trigal 800m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 1.430m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 700m de 1.526m de la vereda Floragaita.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo. A la fecha la Entidad se encuentra en proceso de aprobación del Otrosí No.3 al contrato de obra.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO EL TRIGAL - VDA MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO SOLEDAD - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	22-jul-24	PERIODO No.	34	DEL	15/07/2024	AL	21/07/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	434 DE 2023	CONTRATO No.:	416 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (10 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	48	DÍAS POR EJECUTAR	48
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	256 EQUIVALE AL 84,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	256 EQUIVALE AL 84,2%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00	VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00	VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 632.618.287,79	75,05%	-1,05%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 623.795.312,67	74,00%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** predio La Esmeralda 110m de 1.142m y predio La Ilusión 120m de 1.200 de la vereda El Cadillo; predio La Argentina 1.060m de 2.000m de la vereda Rio Negro; **Neiva** en los predios Las Pavas 270m de 600m y el Trigal 800m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 1.520m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 700m de 1.526m de la vereda Floragaita; y **Guadalupe** en los predios La Unión 190m de 1.908 y predio Lagunilla 120m de 1.273m en la vereda Alto Resinas.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA


6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo. Se iniciaron actividades en predios nuevos en los municipios de Tello y Guadalupe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

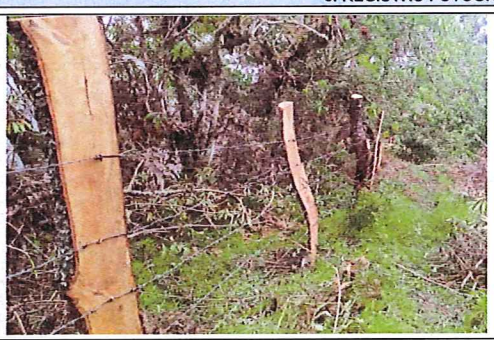

PREDIO SOLEDAD - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA UNION - VDA ALTO RESINAS - MUNICIPIO DE GUADALUPE



PREDIO LA ESMERALDA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO LA ARGENTINA - VDA RIO NEGRO - MUNICIPIO DE TELLO

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

***VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	29-jul-24	PERIODO No.	35	DEL	22/07/2024	AL	28/07/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	434 DE 2023	CONTRATO No.:	416 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (10 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	41	DÍAS POR EJECUTAR	41
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	263 EQUIVALE AL 86,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	263 EQUIVALE AL 86,5%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00	VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00	VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	8/11/2023	8/11/2023	0
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales			no iniciado
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 667.142.083,49	79,14%	-1,89%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 651.234.723,59	77,26%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
EVER YESID CHACON PEREZ	1.091.673.855	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** predio La Esmeralda 230m de 1.142m y predio La Ilusión 1.140m de 1200 de la vereda El Cadillo; predio La Argentina 1.360m de 2.000m de la vereda Rio Negro; **Neiva** en los predios Las Pavas 270m de 600m y el Trigal 800m de 1.000m de la vereda Motilón; en predio La Soledad 1.520m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio La Gironda 1.140m de 1.526m de la vereda Floragaita; y **Guadalupe** en los predios La Unión 760m de 1.908 y predio Lagunilla 260m de 1.273m en la vereda Alto Resinas.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA


6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo. Se hace observacion al contratista de iniciar predios faltates para cumplir con tiempo contractual.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA GIRONDA - VDA FLORAGAITA - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA UNION - VDA ALTO RESINAS - MUNICIPIO DE GUADALUPE



PREDIO LA ILUSION - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO LAGUNILLA - VDA ALTO RESINAS - MUNICIPIO DE GUADALUPE

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

***VoBO SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

SGC-CP-16228-24
Neiva, julio 22 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Citación comité técnico.

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día lunes 29 de julio de 2024 a las 2:30 pm, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.10	CONTRATO DE OBRA No.416 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
DIEGO FAJARDO PERILLA (DF) - RL Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
MIGUEL ANGEL CATAÑEDA (MA) - Técnico campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
ALVARO ROMERO (AR) - Técnico campo Ceibas CAM	Firma listado de asistencia adjunto
ALEXIS TOVAR (AT) - Técnico campo Ceibas CAM	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, inicio de actividades y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos anteriores.

V. TEMAS TRATADOS

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en el proceso final de ejecución, considerando que faltan 41 días aproximadamente para su terminación, JC solicita información sobre avance, estado general del desarrollo del contrato, de igual manera manifestar las situaciones que se hayan presentado.

CQ informa que las actividades de mantenimiento se encuentran en un 77,26% de ejecución física, y en acuerdo con lo manifestado por JC, solicita al contratista de obra optimizar rendimientos en las actividades que se encuentran en ejecución e igualmente en los predios que a la fecha no se han iniciado.

DF informa que en el periodo no se ha presentado ningún inconveniente para la ejecución de las actividades en avance, la programación que se ejecuta garantiza la terminación dentro del plazo del contrato. Existe contratado el personal necesario para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual; de manera que acoge la solicitud de la Interventoría para lograrlo. Sin embargo, hay 1.239 ml de mantenimiento a la barrera de fique que no se podrían realizar en el predio La Hondina de la vereda Motilón, debido a que al momento de ejecutar la actividad ya no se encontraba el fique que se había diagnósticado inicialmente.

JC solicita al personal técnico de campo de la Corporación buscar en la presente semana un predio donde se hayan ejecutado barreras de fique para realizar el respectivo mantenimiento y así alcanzar esta meta física.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2024.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	____ de ____ de 2022

TEMA: Avance y Seguimiento Contrato 416 de 2023 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CAM - Interventoría

SITIO DEL EVENTO: CAM | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 29-Julio-2024 | HORA: 2:30 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	DIEGO FAJARDO	X		7998493	UT REFOC.	R.L	NEIVA	3214926772	gerencia@jolco.com	SI	
2	Miguel Angel Castañeda	X		1110568503	UT REFOCBAS	Contratista	Neiva	3197547150	miancasango36@gmail.com	SI	Miguel Angel Castañeda
3	Abraz Romero	X		12108275	CAM	Tecnico	Neiva	3115541398	—	Si	
4	Javier Alexis Torres Pinto	X		1075244623	CAM	Tec.	Neiva	3138022403	alextovarmos19@outlook.es	Si	
5	Javier Carvajal G	X		7694557	CAM	PNSGA	Neiva	3675770	proyectos@cam.gov.co	Si	
6	CARLOS A. QUIZA	X		79.142300	INTERV.	DIRECTOR	NEIVA.	310.3214229	cquizac@gmail.com	Si	
7	Lindsay Daza S.		X	49.609.707	Interventoría	Profesional Apoyo	Neiva	3183826935	cquizac@gmail.com	Si	Lindsay Daza S.

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	30276718	2024-07-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
6	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30276718	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.648.000	0	17.400	0	1.665.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	5.500	0	525.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.128.000	0	11.900	0	1.139.900
EPS(Administradoras: 3)				6	464.000	0	5.000	0	469.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	1.700	0	161.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	1.900	0	175.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	130.000	0	1.400	0	131.400
ARP(Administradoras: 1)				6	723.700	0	7.700	0	731.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	723.700	0	7.700	0	731.400
CCF(Administradoras: 1)				6	464.000	0	4.900	0	468.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	464.000	0	4.900	0	468.900
Gran Total					3.299.700	0	35.000	0	3.334.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	8.600	0	824.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	6.400	0	614.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.200	0	210.200
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	600	0	52.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	1.600	0	153.600
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	3.800	0	358.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	3.800	0	358.800
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	2.200	0	206.200
Gran Total					1.579.000	0	16.800	0	1.595.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.400	0	226.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.400	0	226.400
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.900	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.900	0	176.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.400	0	410.800
