	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

RESUMEN GENERAL CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2024

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 90% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR Y PAGAR 10% SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL											
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	296	$ 711.610.936	289	$ 694.782.299	249	$ 598.618.659	40	96.163.640
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	$ 2.168.970	62	$ 134.476.140	62	$ 134.476.140	62	$ 134.476.140	0	0
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	$ 3.276.890	5	$ 16.384.450	5	$ 16.384.450	5	$ 16.384.450	0	0
LE03-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 146W - Solo luminaria y Fotocelda, en Grúa	Und	$ 4.529.438	57	$ 258.177.966	57	$ 258.177.966	57	$ 258.177.966	0	0
LE05A	Suministro, transporte e instalación de Proyector led´s 190W	Und	$ 5.221.917	5	$ 26.109.585	5	$ 26.109.585	5	$ 26.109.585	0	0
L001	Desinstalación y transporte a bodega de Luminarias y Proyectores de hasta 1000W sobre parques o malla vial municipal, en Grúa	Und	$ 295.827	28	$ 8.283.163	28	$ 8.283.163	28	$ 8.283.163	0	0
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	19	$ 32.166.058	19	$ 32.166.058	19	$ 32.166.058	0	0
P011	Deshincada y transporte a bodegas de poste metalico 8-12m.	Und	$ 999.205	111	$ 110.911.753	111	$ 110.911.753	111	$ 110.911.753	0	0
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 7.620.660	116	$ 883.996.556	116	$ 883.996.556	116	$ 883.996.556	0	0
P018	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Sencillo	Und	$ 6.456.504	11	$ 71.021.544	11	$ 71.021.544	11	$ 71.021.544	0	0
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 3.838.045	44	$ 168.873.975	44	$ 168.873.975	44	$ 168.873.975	0	0
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	253	$ 649.251.956	246	$ 631.288.463	209	$ 536.338.572	37	94.949.891
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	279	$ 43.601.201	277	$ 43.288.648	238	$ 37.193.856	39	6.094.792
M003	Suministro, transporte e instalación de caja control conformado por: caja metalica, breaker y cableado.	Und	$ 616.778	3	$ 1.850.334	2	$ 1.233.556	2	$ 1.233.556	0	0
A001	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto.	Und	$ 580.487	3	$ 1.741.461	4	$ 2.321.948	4	$ 2.321.948	0	0
C002	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla.	Und	$ 383.902	22	$ 8.445.841	21	$ 8.061.939	21	$ 8.061.939	0	0

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

RESUMEN GENERAL CANTIDADES EJECUTADAS DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2024

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 90% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR Y PAGAR 10% SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL											
C003	Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.	m	$ 109.170	412	$ 44.978.132	428	$ 46.724.856	428	$ 46.724.856	0	0
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	$ 14.855	3.118	$ 46.318.464	3408	$ 50.626.467	3.408	$ 50.626.467	0	0
T001	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público.	Und	$ 349.566	10	$ 3.495.664	10	$ 3.495.664	10	$ 3.495.664	0	0
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	7.835	$ 162.820.576	7672	$ 159.433.243	6.645	$ 138.100.466	1.027	21.332.778
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)											
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	5	$ 12.831.066	5	$ 12.831.066	0	0
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	0	$ -	2	$ 4.808.182	2	$ 4.808.182	0	0
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	$ 3.276.890	0	$ -	2	$ 6.553.780	0	$ -	2	6.553.780
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	0	$ -	1	$ 156.277	1	$ 156.277	0	0
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	0	$ -	20	$ 415.624	20	$ 415.624	0	0
SUBTOTAL					**$ 3.384.515.755**		**$ 3.376.423.202**		**$ 3.151.328.322**		**$ 225.094.880**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 1.015.354.727**		**$ 1.012.926.961**		**$ 945.398.497**		**$ 67.528.464**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 169.225.788**		**$ 168.821.160**		**$ 157.566.416**		**$ 11.254.744**
TOTAL					**$ 4.569.096.270**		**$ 4.558.171.322**		**$ 4.254.293.234**		**$ 303.878.088**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 169.225.788		$ 168.821.160				$ 168.821.160
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 4.738.322.058**		**$ 4.726.992.482**		**$ 4.254.293.234**		**$ 472.699.248**

VALOR PAGADO 50% SEGÚN ACTAACTA No. 05 DE 2024 - "ACTA DE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024" DE ABRIL 15 DE 2024	**$ 2.369.161.029**
VALOR A PAGAR SEGÚN PRESENTE ACTA	**$ 1.885.132.205**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

001-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 58A CON CARRERA 13A BARRIO REPOSO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	7	$ 16.828.637	9	$ 21.636.819	9	$ 21.636.819
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	3	$ 468.830	8	$ 1.250.214	8	$ 1.250.214
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	130	$ 2.701.554	157	$ 3.262.646	157	$ 3.262.646
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	3	$ 7.698.640	3	$ 7.698.640
SUBTOTAL					**$ 25.077.872**		**$ 38.927.170**		**$ 38.927.170**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 7.523.362**		**$ 11.678.151**		**$ 11.678.151**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.253.894**		**$ 1.946.358**		**$ 1.946.358**
TOTAL					**$ 33.855.128**		**$ 52.551.679**		**$ 52.551.679**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 1.253.894	5%	$ 1.946.358	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 35.109.021**		**$ 54.498.037**		**$ 52.551.679**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

002-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VIA ENTRADA JARDIN BOTANICO BARRIO BUCARICA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL								
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	$ 3.276.890	3	$ 9.830.670	3	$ 9.830.670	3	$ 9.830.670
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	3	$ 468.830	3	$ 468.830	3	$ 468.830
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	70	$ 1.454.683	50	$ 1.039.059	50	$ 1.039.059
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)								
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 16.833.034**		**$ 16.417.411**		**$ 16.417.411**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 5.049.910**		**$ 4.925.223**		**$ 4.925.223**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 841.652**		**$ 820.871**		**$ 820.871**
TOTAL					**$ 22.724.596**		**$ 22.163.504**		**$ 22.163.504**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 841.652		$ 820.871	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 23.566.248**		**$ 22.984.375**		**$ 22.163.504**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

003-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALAR 29 CON CARRERA 22 BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES			**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**			**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**		**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	7	$ 16.828.637		7	$ 16.828.637	7	$ 16.828.637
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	7	$ 11.850.653		7	$ 11.850.653	7	$ 11.850.653
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	7	$ 1.093.937		7	$ 1.093.937	7	$ 1.093.937
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	200	$ 4.156.237		170	$ 3.532.801	170	$ 3.532.801
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -				0	$ -
SUBTOTAL					**$ 33.929.464**			**$ 33.306.028**		**$ 33.306.028**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 10.178.839**			**$ 9.991.808**		**$ 9.991.808**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.696.473**			**$ 1.665.301**		**$ 1.665.301**
TOTAL					**$ 45.804.776**			**$ 44.963.138**		**$ 44.963.138**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 1.696.473			$ 1.665.301	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 47.501.249**			**$ 46.628.439**		**$ 44.963.138**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

004-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 8 CON CALLE 15 BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	2	$ 4.808.182	2	$ 4.808.182	2	$ 4.808.182
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	1	$ 2.566.213	1	$ 2.566.213	1	$ 2.566.213
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	2	$ 312.553	2	$ 312.553	2	$ 312.553
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	40	$ 831.247	40	$ 831.247	40	$ 831.247
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 8.518.196**		**$ 8.518.196**		**$ 8.518.196**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 2.555.459**		**$ 2.555.459**		**$ 2.555.459**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 425.910**		**$ 425.910**		**$ 425.910**
TOTAL					**$ 11.499.565**		**$ 11.499.565**		**$ 11.499.565**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 425.910		$ 425.910	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 11.925.474**		**$ 11.925.474**		**$ 11.499.565**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

005-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 34 CON CALLE 112A BARRIO TENZA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	5	$ 12.020.455	3	$ 7.212.273	0	$ -
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	2	$ 312.553	2	$ 312.553	0	$ -
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	20	$ 415.624	20	$ 415.624	0	$ -
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	0	$ -	0	$ -
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	$ 3.276.890	0	$ -	2	$ 6.553.780	0	$ -
SUBTOTAL					**$ 12.748.632**		**$ 14.494.230**		**$ -**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 3.824.590**		**$ 4.348.269**		**$ -**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 637.432**		**$ 724.712**		**$ -**
TOTAL					**$ 17.210.653**		**$ 19.567.211**		**$ -**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 637.432		$ 724.712	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 17.848.085**		**$ 20.291.922**		**$ -**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS ELECTRICAS S.A.S INTELEC S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

013-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 59 CON CALLE 145A BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	10	$ 24.040.910	9	$ 21.636.819	9	$ 21.636.819
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851	3	$ 5.078.851
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	3	$ 468.830	3	$ 468.830	3	$ 468.830
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	60	$ 1.246.871	60	$ 1.246.871	60	$ 1.246.871
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 30.835.462**		**$ 28.431.371**		**$ 28.431.371**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 9.250.639**		**$ 8.529.411**		**$ 8.529.411**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.541.773**		**$ 1.421.569**		**$ 1.421.569**
TOTAL					**$ 41.627.874**		**$ 38.382.351**		**$ 38.382.351**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 1.541.773		$ 1.421.569	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 43.169.647**		**$ 39.803.920**		**$ 38.382.351**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

014-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 58 CON CALLE 142 BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES			**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL								
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	3	$ 7.212.273	3	$ 7.212.273	3	$ 7.212.273
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	2	$ 312.553	2	$ 312.553	2	$ 312.553
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	50	$ 1.039.059	25	$ 519.530	25	$ 519.530
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)								
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 10.256.836**		**$ 9.737.306**		**$ 9.737.306**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 3.077.051**		**$ 2.921.192**		**$ 2.921.192**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 512.842**		**$ 486.865**		**$ 486.865**
TOTAL					**$ 13.846.729**		**$ 13.145.364**		**$ 13.145.364**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 512.842		$ 486.865	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 14.359.570**		**$ 13.632.229**		**$ 13.145.364**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

016-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 10A CON CALLE 21 BARRIO GUANATA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	5	$ 12.020.455	6	$ 14.424.546	6	$ 14.424.546
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	1	$ 156.277	4	$ 625.107	4	$ 625.107
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	25	$ 519.530	55	$ 1.142.965	55	$ 1.142.965
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 14.389.212**		**$ 17.885.568**		**$ 17.885.568**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 4.316.764**		**$ 5.365.671**		**$ 5.365.671**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 719.461**		**$ 894.278**		**$ 894.278**
TOTAL					**$ 19.425.436**		**$ 24.145.517**		**$ 24.145.517**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 719.461		$ 894.278	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 20.144.896**		**$ 25.039.796**		**$ 24.145.517**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTERCEP S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

		Alcaldía Municipal de Floridablanca						CODIGO: DI-F-400-43			
								VERSION:			
ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024											
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA			
DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA											
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890											
FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021											
PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024											
019-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 3 ZONA VERDE BARRIO JARDIN DE LIMONCITOS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA											
FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024											
CONDICIONES ORIGINALES								BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA			
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL		
PRESUPUESTO INICIAL											
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	$ 2.168.970	32	$ 69.407.040	32	$ 69.407.040	32	$ 69.407.040		
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 3.838.045	16	$ 61.408.718	16	$ 61.408.718	16	$ 61.408.718		
M003	Suministro, transporte e instalación de caja control conformado por: caja metalica, breaker y cableado.	Und	$ 616.778	2	$ 1.233.556	2	$ 1.233.556	2	$ 1.233.556		
A001	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto.	Und	$ 580.487	1	$ 580.487	2	$ 1.160.974	2	$ 1,160.974		
C002	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla.	Und	$ 383.902	18	$ 6.910.234	17	$ 6.526.332	17	$ 6.526.332		
C003	Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.	m	$ 109.170	400	$ 43.668.089	416	$ 45.414.813	416	$ 45.414.813		
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	$ 14.855	600	$ 8.913.110	700	$ 10.398.629	700	$ 10.398.629		
T001	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público.	Und	$ 349.566	6	$ 2.097.398	6	$ 2.097.398	6	$ 2.097.398		
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)											
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -		
SUBTOTAL					$ 194.218.633		$ 197.647.460		$ 197.647.460		
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			30%		$ 58.265.590		$ 59.294.238		$ 59.294.238		
COSTO DE LA UTILIDAD			5%		$ 9.710.932		$ 9.882.373		$ 9.882.373		
TOTAL					$ 262.195.155		$ 266.824.071		$ 266.824.071		
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 9.710.932		$ 9.882.373	0%	$ -		
TOTAL COSTO EXPANSION					$ 271.906.086		$ 276.706.444		$ 266.824.071		

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

020-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 121 CON CARRERA 58B ZONA VERDE BARRIO LA ESMERALDA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES				**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL								
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)								
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 2.404.091**		**$ 2.404.091**		**$ 2.404.091**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 721.227**		**$ 721.227**		**$ 721.227**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 120.205**		**$ 120.205**		**$ 120.205**
TOTAL					**$ 3.245.523**		**$ 3.245.523**		**$ 3.245.523**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 120.205		$ 120.205	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 3.365.727**		**$ 3.365.727**		**$ 3.245.523**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

001-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA BUENAVISTA SECTOR FINCA EL PARAISO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	470	$ 9.767.156	520	$ 10.806.216	520	$ 10.806.216
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 91.792.452**		**$ 92.831.511**		**$ 92.831.511**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 27.537.736**		**$ 27.849.453**		**$ 27.849.453**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.589.623**		**$ 4.641.576**		**$ 4.641.576**
TOTAL					**$ 123.919.810**		**$ 125.322.540**		**$ 125.322.540**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 4.589.623		$ 4.641.576	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 128.509.433**		**$ 129.964.116**		**$ 125.322.540**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

002-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA BUENAVISTA PASANDO LA QUEBRADA 200 MTS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	10	$ 24.040.910	10	$ 24.040.910	10	$ 24.040.910
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	10	$ 25.662.133	10	$ 25.662.133	10	$ 25.662.133
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	10	$ 1.562.767	10	$ 1.562.767	10	$ 1.562.767
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	300	$ 6.234.355	290	$ 6.026.543	290	$ 6.026.543
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 57.500.165**		**$ 57.292.353**		**$ 57.292.353**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 17.250.049**		**$ 17.187.706**		**$ 17.187.706**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.875.008**		**$ 2.864.618**		**$ 2.864.618**
TOTAL					**$ 77.625.223**		**$ 77.344.677**		**$ 77.344.677**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 2.875.008		$ 2.864.618	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 80.500.231**		**$ 80.209.294**		**$ 77.344.677**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

003-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA LA JUDIA FINCA LA Y MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	22	$ 52.890.002	23	$ 55.294.093	23	$ 55.294.093
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	22	$ 56.456.692	23	$ 59.022.905	23	$ 59.022.905
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	22	$ 3.438.088	23	$ 3.594.364	23	$ 3.594.364
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	600	$ 12.468.710	705	$ 14.650.735	705	$ 14.650.735
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 125.253.492**		**$ 132.562.097**		**$ 132.562.097**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 37.576.048**		**$ 39.768.629**		**$ 39.768.629**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 6.262.675**		**$ 6.628.105**		**$ 6.628.105**
TOTAL					**$ 169.092.214**		**$ 178.958.831**		**$ 178.958.831**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 6.262.675		$ 6.628.105	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 175.354.888**		**$ 185.586.936**		**$ 178.958.831**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

004-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA LA JUDIA PASANDO EL BOLO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	420	$ 8.728.097	440	$ 9.143.721	440	$ 9.143.721
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 90.753.393**		**$ 91.169.016**		**$ 91.169.016**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 27.226.018**		**$ 27.350.705**		**$ 27.350.705**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.537.670**		**$ 4.558.451**		**$ 4.558.451**
TOTAL					**$ 122.517.080**		**$ 123.078.172**		**$ 123.078.172**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 4.537.670		$ 4.558.451	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 127.054.750**		**$ 127.636.623**		**$ 123.078.172**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

005-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA CASIANO "Y" HACIA ALZACIA MALAVAR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	17	$ 40.869.547	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	17	$ 43.625.626	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	17	$ 2.656.704	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	490	$ 10.182.780	460	$ 9.559.345	460	$ 9.559.345
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 97.334.657**		**$ 91.584.640**		**$ 91.584.640**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 29.200.397**		**$ 27.475.392**		**$ 27.475.392**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.866.733**		**$ 4.579.232**		**$ 4.579.232**
TOTAL					**$ 131.401.786**		**$ 123.639.264**		**$ 123.639.264**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 4.866.733		$ 4.579.232	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 136.268.519**		**$ 128.218.496**		**$ 123.639.264**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

006-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALTOS DE MANTILLA FINCA DOÑA LEONOR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	9	$ 21.636.819	9	$ 21.636.819	9	$ 21.636.819
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	9	$ 23.095.919	9	$ 23.095.919	9	$ 23.095.919
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	9	$ 1.406.490	9	$ 1.406.490	9	$ 1.406.490
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	270	$ 5.610.920	280	$ 5.818.732	280	$ 5.818.732
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 51.750.148**		**$ 51.957.960**		**$ 51.957.960**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 15.525.045**		**$ 15.587.388**		**$ 15.587.388**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.587.507**		**$ 2.597.898**		**$ 2.597.898**
TOTAL					**$ 69.862.700**		**$ 70.143.246**		**$ 70.143.246**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 2.587.507		$ 2.597.898	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 72.450.208**		**$ 72.741.144**		**$ 70.143.246**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43 VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

007-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA GAUYANA FINCA TARA TANADUG MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	22	$ 52.890.002	22	$ 52.890.002	22	$ 52.890.002
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	22	$ 56.456.692	22	$ 56.456.692	22	$ 56.456.692
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	22	$ 3.438.088	22	$ 3.438.088	22	$ 3.438.088
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	610	$ 12.676.522	610	$ 12.676.522	610	$ 12.676.522
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 125.461.304**		**$ 125.461.304**		**$ 125.461.304**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 37.638.391**		**$ 37.638.391**		**$ 37.638.391**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 6.273.065**		**$ 6.273.065**		**$ 6.273.065**
TOTAL					**$ 169.372.760**		**$ 169.372.760**		**$ 169.372.760**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 6.273.065		$ 6.273.065	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 175.645.825**		**$ 175.645.825**		**$ 169.372.760**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

008-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA VERICUTE ADELANTE HOTEL CAMPESTRE SAN JOSE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	13	$ 31.253.183	15	$ 36.061.365	15	$ 36.061.365
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	13	$ 33.360.772	15	$ 38.493.199	15	$ 38.493.199
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	13	$ 2.031.597	15	$ 2.344.151	15	$ 2.344.151
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	480	$ 9.974.968	415	$ 8.624.191	415	$ 8.624.191
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 76.620.521**		**$ 85.522.906**		**$ 85.522.906**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 22.986.156**		**$ 25.656.872**		**$ 25.656.872**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.831.026**		**$ 4.276.145**		**$ 4.276.145**
TOTAL					**$ 103.437.703**		**$ 115.455.923**		**$ 115.455.923**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 3.831.026		$ 4.276.145	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 107.268.729**		**$ 119.732.068**		**$ 115.455.923**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

009-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALZACIA FINCA EL LUCERO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	20	$ 48.081.820	19	$ 45.677.729	19	$ 45.677.729
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	20	$ 51.324.265	19	$ 48.758.052	19	$ 48.758.052
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	20	$ 3.125.534	19	$ 2.969.257	19	$ 2.969.257
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	550	$ 11.429.651	525	$ 10.910.122	525	$ 10.910.122
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 113.961.271**		**$ 108.315.160**		**$ 108.315.160**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 34.188.381**		**$ 32.494.548**		**$ 32.494.548**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.698.064**		**$ 5.415.758**		**$ 5.415.758**
TOTAL					**$ 153.847.715**		**$ 146.225.466**		**$ 146.225.466**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 5.698.064		$ 5.415.758	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 159.545.779**		**$ 151.641.224**		**$ 146.225.466**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

010-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALZACIA GRANJA ALZACIA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	21	$ 50.485.911	26	$ 62.506.366	11	$ 26.445.001
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	21	$ 53.890.479	26	$ 66.721.545	11	$ 28.228.346
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	21	$ 3.281.811	26	$ 4.063.194	11	$ 1.719.044
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	600	$ 12.468.710	730	$ 15.170.264	353	$ 7.345.256
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	0		0	$ -
SUBTOTAL					**$ 120.126.911**		**$ 148.461.370**		**$ 63.737.647**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 36.038.073**		**$ 44.538.411**		**$ 19.121.294**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 6.006.346**		**$ 7.423.068**		**$ 3.186.882**
TOTAL					**$ 162.171.330**		**$ 200.422.849**		**$ 86.045.823**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 6.006.346		$ 7.423.068	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 168.177.675**		**$ 207.845.917**		**$ 86.045.823**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECTEL S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

012-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALTOS DE MANTILLA "Y " A ESCUELA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	12	$ 28.849.092	12	$ 28.849.092	12	$ 28.849.092
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	12	$ 30.794.559	12	$ 30.794.559	12	$ 30.794.559
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	12	$ 1.875.320	12	$ 1.875.320	12	$ 1.875.320
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	330	$ 6.857.791	330	$ 6.857.791	330	$ 6.857.791
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 68.376.762**		**$ 68.376.762**		**$ 68.376.762**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 20.513.029**		**$ 20.513.029**		**$ 20.513.029**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.418.838**		**$ 3.418.838**		**$ 3.418.838**
TOTAL					**$ 92.308.629**		**$ 92.308.629**		**$ 92.308.629**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 3.418.838		$ 3.418.838	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 95.727.467**		**$ 95.727.467**		**$ 92.308.629**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

013-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ROSA BLANCA ANTES CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	14	$ 33.657.274	$ 13	$ 31.253.183	13	$ 31.253.183
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	14	$ 35.926.986	$ 13	$ 33.360.772	13	$ 33.360.772
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	14	$ 2.187.874	$ 13	$ 2.031.597	13	$ 2.031.597
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	390	$ 8.104.662	$ 375	$ 7.792.944	375	$ 7.792.944
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 79.876.795**		**$ 74.438.497**		**$ 74.438.497**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 23.963.039**		**$ 22.331.549**		**$ 22.331.549**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.993.840**		**$ 3.721.925**		**$ 3.721.925**
TOTAL					**$ 107.833.674**		**$ 100.491.970**		**$ 100.491.970**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 3.993.840		$ 3.721.925	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 111.827.513**		**$ 104.213.895**		**$ 100.491.970**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

014-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA DESPENSA VERICUTE RAMAL DE INGRESO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456	16	$ 38.465.456
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412	16	$ 41.059.412
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427	16	$ 2.500.427
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	440	$ 9.143.721	460	$ 9.559.345	460	$ 9.559.345
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 91.169.016**		**$ 91.584.640**		**$ 91.584.640**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 27.350.705**		**$ 27.475.392**		**$ 27.475.392**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.558.451**		**$ 4.579.232**		**$ 4.579.232**
TOTAL					**$ 123.078.172**		**$ 123.639.264**		**$ 123.639.264**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 4.558.451		$ 4.579.232	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 127.636.623**		**$ 128.218.496**		**$ 123.639.264**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S
INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

015-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA VERICUTE ENTRE EL PLAN Y GALPONES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	9	$ 21.636.819	10	$ 24.040.910	10	$ 24.040.910
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	9	$ 23.095.919	10	$ 25.662.133	10	$ 25.662.133
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	9	$ 1.406.490	10	$ 1.562.767	10	$ 1.562.767
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	260	$ 5.403.108	305	$ 6.338.261	305	$ 6.338.261
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 51.542.337**		**$ 57.604.071**		**$ 57.604.071**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 15.462.701**		**$ 17.281.221**		**$ 17.281.221**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.577.117**		**$ 2.880.204**		**$ 2.880.204**
TOTAL					**$ 69.582.154**		**$ 77.765.496**		**$ 77.765.496**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 2.577.117		$ 2.880.204	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION				-	**$ 72.159.271**		**$ 80.645.699**		**$ 77.765.496**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

016-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALZACIA "Y" POSADA MONTEFIORI MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	22	$ 52.890.002	19	$ 45.677.729	0	$ -
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	22	$ 56.456.692	19	$ 48.758.052	0	$ -
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	22	$ 3.438.088	19	$ 2.969.257	0	$ -
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	600	$ 12.468.710	550	$ 11.429.651	0	$ -
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL					**$ 125.253.492**		**$ 108.834.690**		**$ -**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 37.576.048**		**$ 32.650.407**		**$ -**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 6.262.675**		**$ 5.441.734**		**$ -**
TOTAL					**$ 169.092.214**		**$ 146.926.831**		**$ -**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 6.262.675		$ 5.441.734	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 175.354.888**		**$ 152.368.566**		**$ -**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

018-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA SANTA BARBARA FINCA VILLA INES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	13	$ 31.253.183	3	$ 7.212.273	0	$ -
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	13	$ 33.360.772	3	$ 7.698.640	0	$ -
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	13	$ 2.031.597	3	$ 468.830	0	$ -
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	380	$ 7.896.850	80	$ 1.662.495	0	$ -
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	0	$ -	0	$ -
SUBTOTAL					**$ 74.542.403**		**$ 17.042.238**		**$ -**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 22.362.721**		**$ 5.112.671**		**$ -**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.727.120**		**$ 852.112**		**$ -**
TOTAL					**$ 100.632.243**		**$ 23.007.021**		**$ -**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 3.727.120		$ 852.112	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 104.359.364**		**$ 23.859.133**		**$ -**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS S.A.S. INTELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

019-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO TRANSVERSAL DEL BOSQUE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE03-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 146W - Solo luminaria y Fotocelda, en Grúa	Und	$ 4.529.438	57	$ 258.177.966	57	$ 258.177.966	57	$ 258.177.966
L001	Desinstalación y transporte a bodega de Luminarias y Proyectores de hasta 1000W sobre parques o malla vial municipal, en Grúa	Und	$ 295.827	28	$ 8.283.163	28	$ 8.283.163	28	$ 8.283.163
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 7.620.660	13	$ 99.068.580	13	$ 99.068.580	13	$ 99.068.580
P018	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Sencillo	Und	$ 6.456.504	3	$ 19.369.512	3	$ 19.369.512	3	$ 19.369.512
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	$ 14.855	2.500	$ 37.137.960	2690	$ 39.960.445	2.690	$ 39.960.445
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 422.037.180**		**$ 424.859.665**		**$ 424.859.665**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 126.611.154**		**$ 127.457.900**		**$ 127.457.900**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 21.101.859**		**$ 21.242.983**		**$ 21.242.983**
TOTAL					**$ 569.750.193**		**$ 573.560.548**		**$ 573.560.548**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 21.101.859		$ 21.242.983	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 590.852.052**		**$ 594.803.531**		**$ 573.560.548**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

		Alcaldía Municipal de Floridablanca				CODIGO: DI-F-400-43				
						VERSION:				
ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024										
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA				
DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA										
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890										
FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021										
PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024										
020-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES BARRIO MOLINOS ALTOS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA										
FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024										
CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA		
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	
PRESUPUESTO INICIAL										
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	$ 2.168.970	26	$ 56.393.220	26	$ 56.393.220	26	$ 56.393.220	
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 3.838.045	26	$ 99.789.167	26	$ 99.789.167	26	$ 99.789.167	
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)										
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -	
SUBTOTAL					$ 158.586.478		$ 158.586.478		$ 158.586.478	
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			30%		$ 47.575.943		$ 47.575.943		$ 47.575.943	
COSTO DE LA UTILIDAD			5%		$ 7.929.324		$ 7.929.324		$ 7.929.324	
TOTAL					$ 214.091.746		$ 214.091.746		$ 214.091.746	
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 7.929.324		$ 7.929.324	5%	$ -	
TOTAL COSTO EXPANSION					$ 222.021.070		$ 222.021.070		$ 214.091.746	

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

021-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOPISTRA ENTRE PAPI QUIERO PIÑA Y PUENTE PEATONAL ESTADIO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES				**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL								
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 7.620.660	56	$ 426.756.958	56	$ 426.756.958	56	$ 426.756.958
P018	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Sencillo	Und	$ 6.456.504	8	$ 51.652.032	8	$ 51.652.032	8	$ 51.652.032
P011	Deshincada y transporte a bodegas de poste metalico 8-12m.	Und	$ 999.205	64	$ 63.949.119	64	$ 63.949.119	64	$ 63.949.119
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)								
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 542.358.109**		**$ 542.358.109**		**$ 542.358.109**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 162.707.433**		**$ 162.707.433**		**$ 162.707.433**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 27.117.905**		**$ 27.117.905**		**$ 27.117.905**
TOTAL					**$ 732.183.447**		**$ 732.183.447**		**$ 732.183.447**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 27.117.905		$ 27.117.905	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 759.301.353**		**$ 759.301.353**		**$ 732.183.447**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

022-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOPISTRA ENTRE PAPI QUIERO PIÑA Y PUENTE INTERCAMBIADOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 7.620.660	47	$ 358.171.019	47	$ 358.171.019	47	$ 358.171.019
P011	Deshincada y transporte a bodegas de poste metalico 8-12m.	Und	$ 999.205	47	$ 46.962.634	47	$ 46.962.634	47	$ 46.962.634
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 405.133.653**		**$ 405.133.653**		**$ 405.133.653**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 121.540.096**		**$ 121.540.096**		**$ 121.540.096**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 20.256.683**		**$ 20.256.683**		**$ 20.256.683**
TOTAL					**$ 546.930.431**		**$ 546.930.431**		**$ 546.930.431**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 20.256.683		$ 20.256.683	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 567.187.114**		**$ 567.187.114**		**$ 546.930.431**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

023-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PUENTE VEHICULAR ENTRE EL CAI CARMEN Y BARRIO VILLA LUZ MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
	PRESUPUESTO INICIAL								
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	$ 3.276.890	2	$ 6.553.780	2	$ 6.553.780	2	$ 6.553.780
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	2	$ 312.553	0	$ -	0	$ -
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	20	$ 415.624	0	$ -	0	$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)								
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	1	$ 2.566.213	1	$ 2.566.213
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	0	$ -	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091
SUBTOTAL					**$ 7.281.957**		**$ 11.524.084**		**$ 11.524.084**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 2.184.587**		**$ 3.457.225**		**$ 3.457.225**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 364.098**		**$ 576.204**		**$ 576.204**
TOTAL					**$ 9.830.642**		**$ 15.557.514**		**$ 15.557.514**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 364.098		$ 576.204	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 10.194.740**		**$ 16.133.718**		**$ 15.557.514**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

024-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE TIERRA LA MESITA BARRIO BUCARICA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

				CONDICIONES ORIGINALES		**BALANCE**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANTIDADES INICIALES**		**CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024**		**CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA**	
				CANT.	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
PRESUPUESTO INICIAL									
LE05A	Suministro, transporte e instalación de Proyector led´s 190W	Und	$ 5.221.917	4	$ 20.887.668	4	$ 20.887.668	4	$ 20.887.668
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	0	$ -	1	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -	1	$ 2.566.213	1	$ 2.566.213
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	0	$ -	1	$ 156.277	1	$ 156.277
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	0	$ -	20	$ 415.624	20	$ 415.624
SUBTOTAL					**$ 20.887.668**		**$ 26.429.873**		**$ 26.429.873**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 6.266.300**		**$ 7.928.962**		**$ 7.928.962**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.044.383**		**$ 1.321.494**		**$ 1.321.494**
TOTAL					**$ 28.198.352**		**$ 35.680.328**		**$ 35.680.328**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 1.044.383		$ 1.321.494	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 29.242.735**		**$ 37.001.822**		**$ 35.680.328**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

		Alcaldía Municipal de Floridablanca				CODIGO: DI-F-400-43				
						VERSION:				
ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024										
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA				
DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA										
CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890										
FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021										
PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024										
025-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES BARRIO ALTAMIRA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA										
FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024										
CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024			CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL		CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL										
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	$ 2.168.970	4	$ 8.675.880	4	$	8.675.880	4	$ 8.675.880
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	1	$ 2.404.091	1	$	2.404.091	1	$ 2.404.091
LE05A	Suministro, transporte e instalación de Proyector led´s 190W	Und	$ 5.221.917	1	$ 5.221.917	1	$	5.221.917	1	$ 5.221.917
M003	Suministro, transporte e instalación de caja control conformado por: caja metalica, breaker y cableado.	Und	$ 616.778	1	$ 616.778	0	$	-	0	$ -
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	$ 3.838.045	2	$ 7.676.090	2	$	7.676.090	2	$ 7.676.090
A001	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto.	Und	$ 580.487	2	$ 1.160.974	2	$	1.160.974	2	$ 1.160.974
C002	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla.	Und	$ 383.902	4	$ 1.535.607	4	$	1.535.607	4	$ 1.535.607
C003	Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.	m	$ 109.170	12	$ 1.310.043	12	$	1.310.043	12	$ 1.310.043
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	$ 14.855	18	$ 267.393	18	$	267.393	18	$ 267.393
T001	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público.	Und	$ 349.566	4	$ 1.398.265	4	$	1.398.265	4	$ 1.398.265
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)										
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -				0	$ -
SUBTOTAL					$ 30.267.039		$	29.650.261		$ 29.650.261
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			30%		$ 9.080.112		$	8.895.078		$ 8.895.078
COSTO DE LA UTILIDAD			5%		$ 1.513.352		$	1.482.513		$ 1.482.513
TOTAL					$ 40.860.502		$	40.027.852		$ 40.027.852
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 1.513.352		$	1.482.513	0%	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					$ 42.373.854		$	41.510.365		$ 40.027.852

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
		VERSION:

ANEXO ACTA N°10 DE 2024 - PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONVENIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2024

026-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 CON CARRERA 12 BARRIO NUEVO VILLABEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: JULIO 23 DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°9 DEL 10 DE JULIO DE 2024		CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL									
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.404.091	2	$ 4.808.182	2	$ 4.808.182	2	$ 4.808.182
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950	1	$ 1.692.950
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 156.277	2	$ 312.553	1	$ 156.277	1	$ 156.277
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 20.781	30	$ 623.436	20	$ 415.624	20	$ 415.624
ACTIVIDADES NO PREVISTAS APROBADAS SEGÚN ACTA 09 DE 2024 (JULIO 10 DE 2024)									
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.566.213	0	$ -			0	$ -
SUBTOTAL					**$ 7.437.121**		**$ 7.073.033**		**$ 7.073.033**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 2.231.136**		**$ 2.121.910**		**$ 2.121.910**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 371.856**		**$ 353.652**		**$ 353.652**
TOTAL					**$ 10.040.114**		**$ 9.548.594**		**$ 9.548.594**
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas		5%	0	$ 371.856		$ 353.652	0	$ -
TOTAL COSTO EXPANSION					**$ 10.411.970**		**$ 9.902.246**		**$ 9.548.594**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
LEONARDO DUEÑES GOMEZ
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

CONTRATO No. :	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890**
FECHA DE CONTRATO:	**NOVIEMBRE 12 DE 2021**
PROYECTO:	**2021682760020**

OBJETO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**
VALOR INICIAL	$478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosi No. 2)
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) AÑOS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
	LEONARDO DUEÑES GOMEZ - Director Rep Legal
	Deleg. Ing EFRAIN MARÍN ARIZA
INTERVENTOR	INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
	R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
SUPERVISOR	ING GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	Secretario de Infraestructura
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACION	JULIO 01 DE 2022
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
ACTA MODIFICATORIA Y/O ACLARATORIA N.01	
FECHATERMINACION INICIAL	JULIO 01 DE 2042
FECHA TERMINACION FINAL	
OFICINA GESTORA	ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	Secretario de Infraestructura

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Expansión del sistema de alumbrado público con tecnología LED.


Dentro del PMT, se tiene prevista la construcción de huecos u orificios para la instalación de postes en fibra y concreto exclusivos de alumbrado público e iluminación, las cuales serán puestas en terrenos tipo escarpado y tipo pavimentado del sector urbano y rural del municipio; Floridablanca está dividido en zona rural y zona urbana. La zona rural se dividida en 8 veredas: Aguablanca, Alsacia, Casiano, Guayanas, Helechales, Riofrío, Ruitoque y Vericute; sin embargo, hay sectores rurales que si bien no están constituidos como veredas si gozan de importancia como: El Mortiño, San Ignacio, Rosa blanca, Los Cauchos, Alto Mantilla, malabar, La Paja, La Cidra.


La zona urbana consta de más de 250 barrios y conjuntos de vivienda, sobresalen por su tradición y población los siguientes: Casco Antiguo (o centro), Villabel, Santa Ana, Caldas, El Reposo, La Cumbre, Primavera I y II, Bucarica, Lagos I, II, III, IV y V, Zapamanga I, II, III, IV, V, VI, VII, y VIII, Los Alares, La Trinidad, Las Villas, El Carmen, Cañaveral, El Bosque, El Porvenir, (palomitas), Ciudad Valencia, San Bernardo, Altamira (casas y apartamentos), Los Andes, Limoncito, Jardín del Limoncito, Las Rondas, La Castellana, Versalles, La Paz, Villas de San Francisco, El Verde, El Recreo, y otros más y realizar expansiones a la infraestructura a cumplir con su vida útil, implementación de nueva tecnología, la eficiencia del sistema y/o el ahorro en el consumo de energía.

EJECUCIÓN PROYECTOS PAS VIGENCIA 2024

001-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 58A CON CARRERA 13A BARRIO REPOSO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	9
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	3
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	8
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	157
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	3

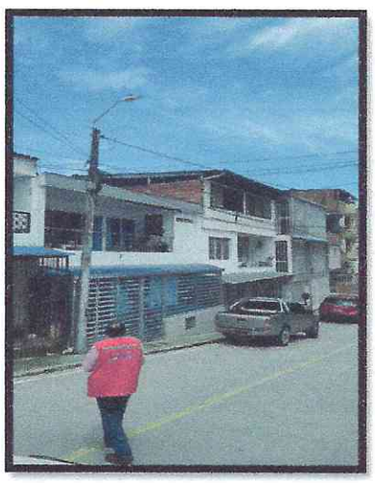


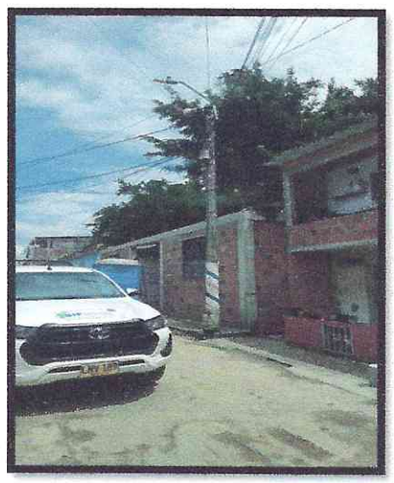

002-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VIA ENTRADA JARDIN BOTANICO BARRIO BUCARICA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	3
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	3
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	3
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	50

REGISTRO FOTOGRAFICO

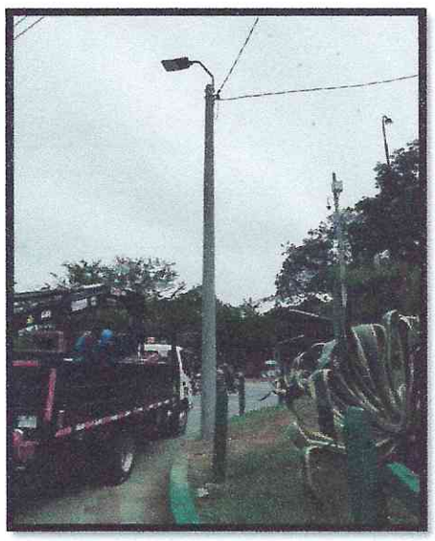




003-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALAR 29 CON CARRERA 22 BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	7
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	7
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	7
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	170

REGISTRO FOTOGRAFICO

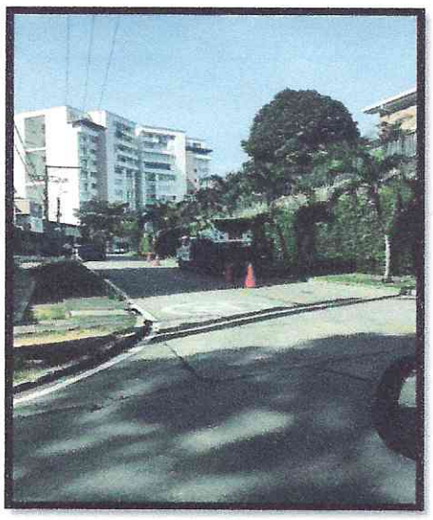





004-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 8 CON CALLE 15 BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES EJECUTADAS
		CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	2
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	1
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	2
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	40

REGISTRO FOTOGRAFICO

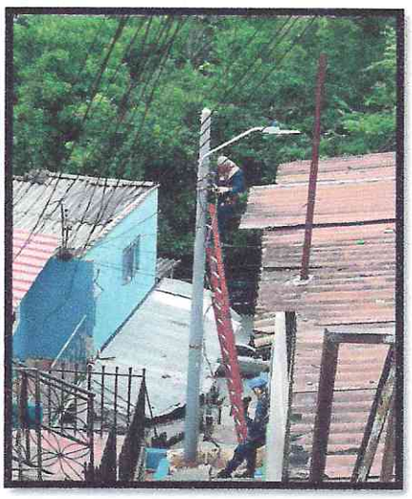


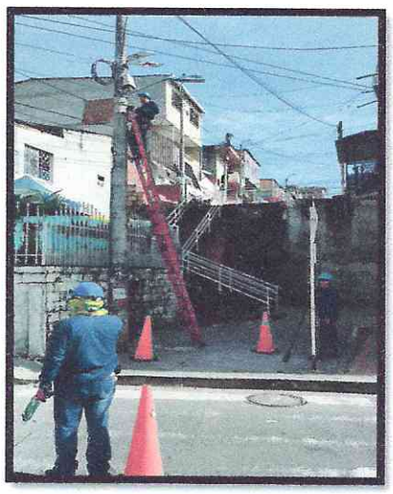

013-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 59 CON CALLE 145A BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN PRESENTE ACTA
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	9
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	3
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	3
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	60

REGISTRO FOTOGRAFICO

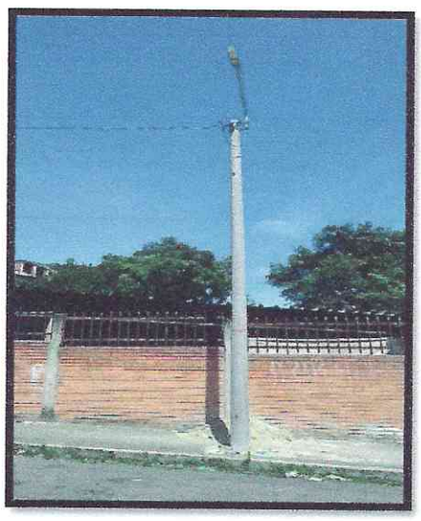




014-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 58 CON CALLE 142 BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	3
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	1
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	2
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	25

REGISTRO FOTOGRAFICO

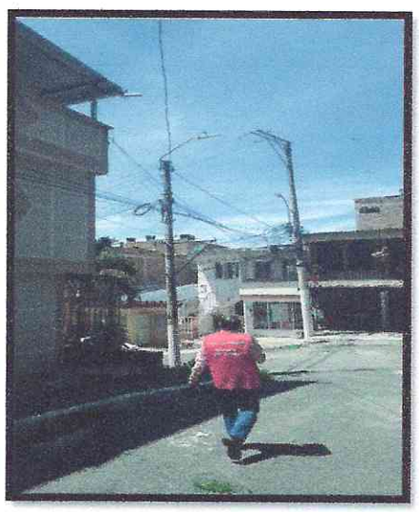




016-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 10A CON CALLE 21 BARRIO GUANATA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	6
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	1
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	4
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	55

REGISTRO FOTOGRAFICO




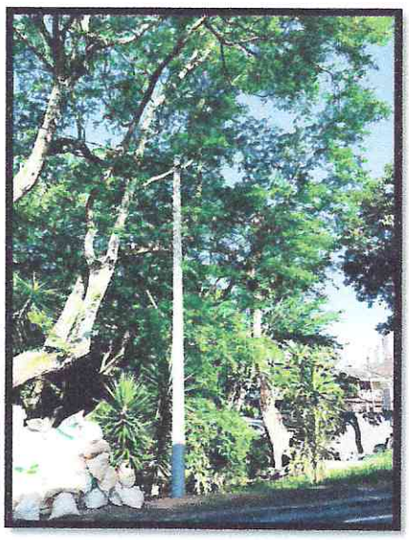

019-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 3 ZONA VERDE BARRIO JARDIN DE LIMONCITOS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	32
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	16
M003	Suministro, transporte e instalación de caja control conformado por: caja metalica, breaker y cableado.	Und	2
A001	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto.	Und	2
C002	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla.	Und	17
C003	Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.	m	416
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	700
T001	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público.	Und	6

REGISTRO FOTOGRAFICO

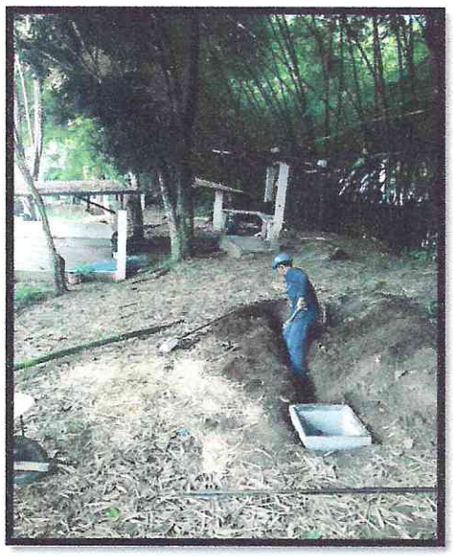






020-2022 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 121 CON CARRERA 58B ZONA VERDE BARRIO LA ESMERALDA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

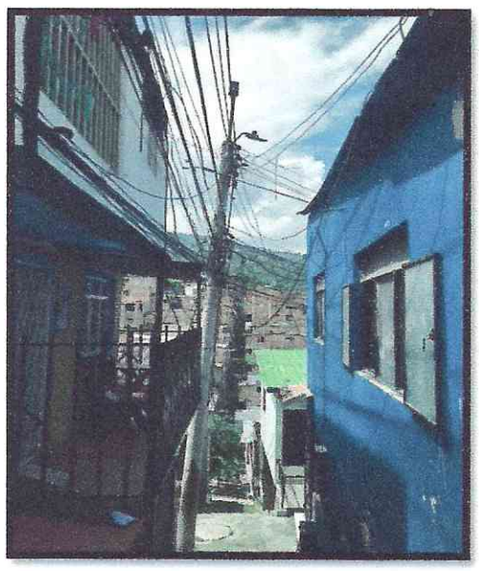


001-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA BUENAVISTA SECTOR FINCA EL PARAISO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	16
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	16
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	16
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	520

REGISTRO FOTOGRAFICO



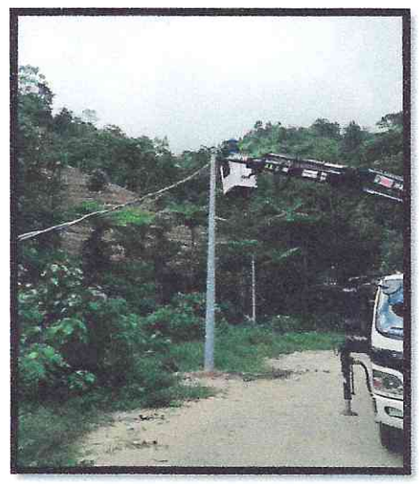


002-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA BUENAVISTA PASANDO LA QUEBRADA 200 MTS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	10
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	10
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	10
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	290

REGISTRO FOTOGRAFICO



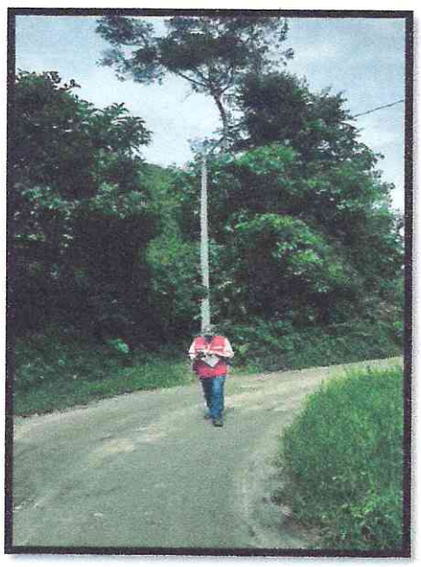

003-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA LA JUDIA FINCA LA Y MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	23
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	23
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	23
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	705

REGISTRO FOTOGRAFICO





004-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA LA JUDIA PASANDO EL BOLO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	16
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	16
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	16
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	440

REGISTRO FOTOGRAFICO






005-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA CASIANO "Y" HACIA ALZACIA MALAVAR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	16
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	16
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	16
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	460

REGISTRO FOTOGRAFICO

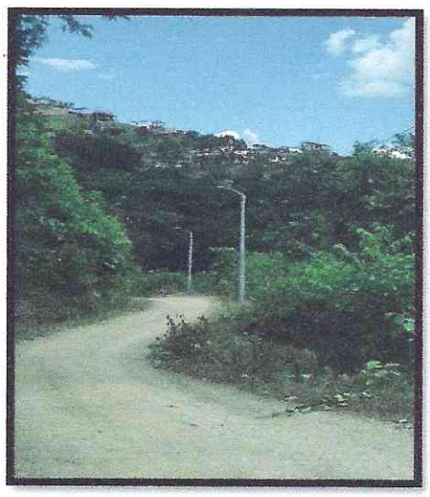




006-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALTOS DE MANTILLA FINCA DOÑA LEONOR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	9
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	9
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	9
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	280

REGISTRO FOTOGRAFICO

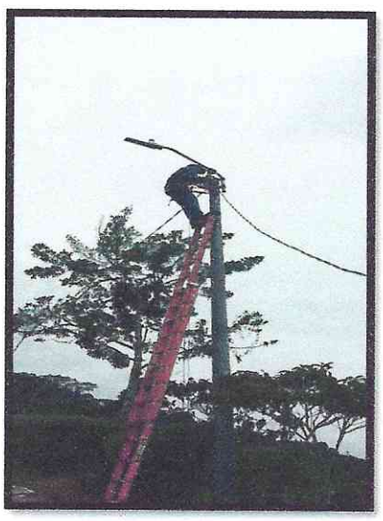




007-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA GAUYANA FINCA TARA TANADUG MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	22
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	22
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	22
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	610

REGISTRO FOTOGRAFICO




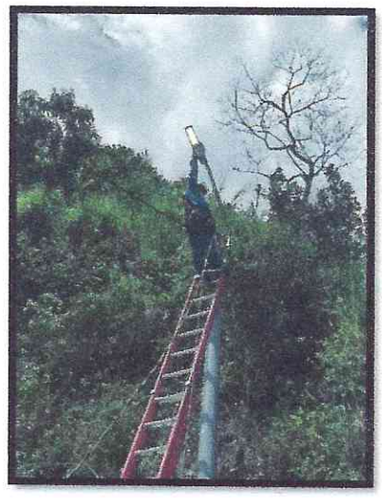


008-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA VERICUTE ADELANTE HOTEL CAMPESTRE SAN JOSE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	15
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	15
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	15
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	415

REGISTRO FOTOGRAFICO

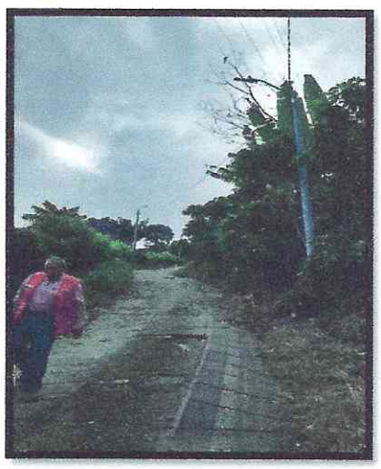


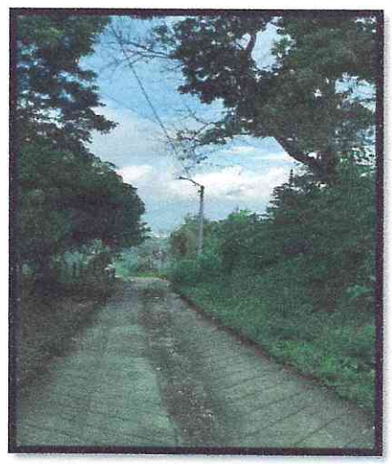

009-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALZACIA FINCA EL LUCERO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	19
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	19
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	19
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	525

REGISTRO FOTOGRAFICO

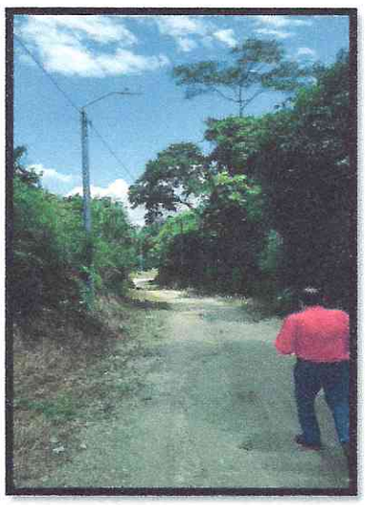




010-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALZACIA GRANJA ALZACIA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	11
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	11
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	11
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	353

REGISTRO FOTOGRAFICO

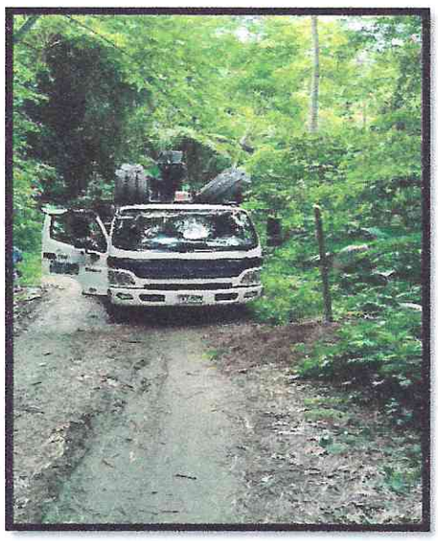





012-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA ALTOS DE MANTILLA "Y " A ESCUELA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	12
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	12
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	12
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	330

REGISTRO FOTOGRAFICO

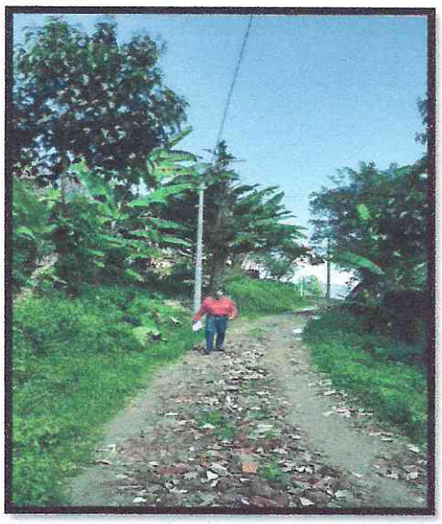

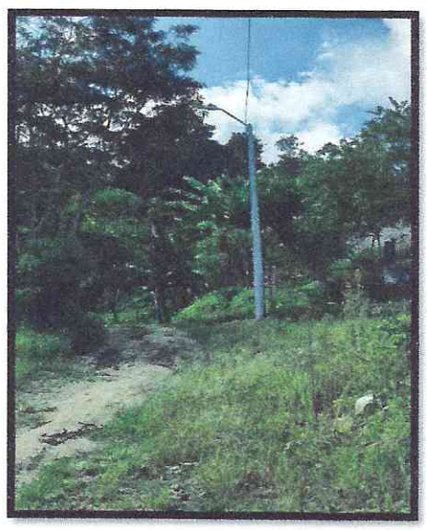

013-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ROSA BLANCA ANTES CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	13
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	13
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	13
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	375

REGISTRO FOTOGRAFICO






015-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA VERICUTE ENTRE EL PLAN Y GALPONES MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	10
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	10
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	10
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	305

REGISTRO FOTOGRAFICO

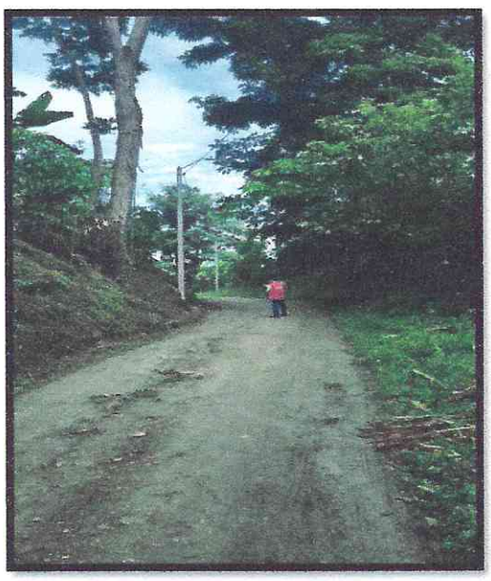

019-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO TRANSVERSAL DEL BOSQUE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE03-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 146W - Solo luminaria y Fotocelda, en Grúa	Und	57
L001	Desinstalación y transporte a bodega de Luminarias y Proyectores de hasta 1000W sobre parques o malla vial municipal, en Grúa	Und	28
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	13
P018	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Sencillo	Und	3
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	2.690

REGISTRO FOTOGRAFICO








020-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES BARRIO MOLINOS ALTOS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	1
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	26
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	26

REGISTRO FOTOGRAFICO




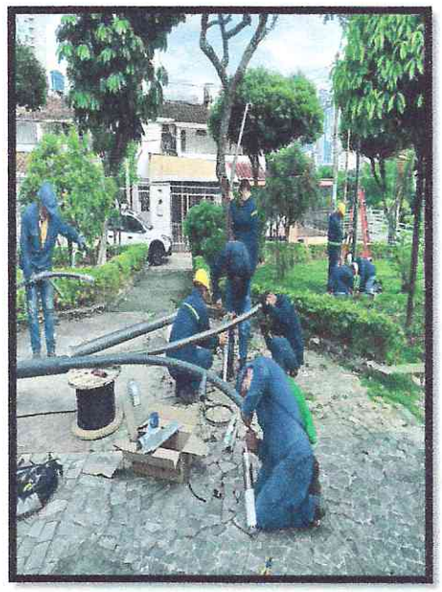


021-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOPISTRA ENTRE PAPI QUIERO PIÑA Y PUENTE PEATONAL ESTADIO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	56
P018	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Sencillo	Und	8
P011	Deshincada y transporte a bodegas de poste metalico 8-12m.	Und	64

REGISTRO FOTOGRAFICO

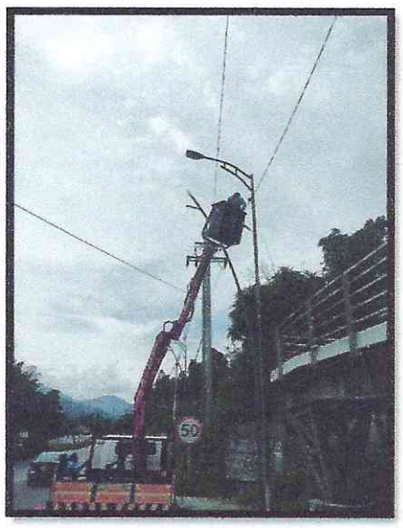


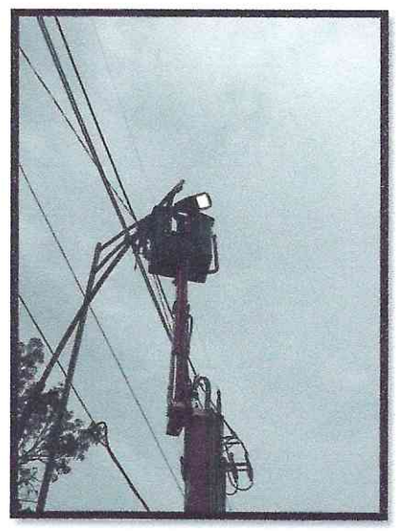


022-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOPISTRA ENTRE PAPI QUIERO PIÑA Y PUENTE INTERCAMBIADOR EL BOSQUE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
P017	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 9,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	47
P011	Deshincada y transporte a bodegas de poste metalico 8-12m.	Und	47

REGISTRO FOTOGRAFICO

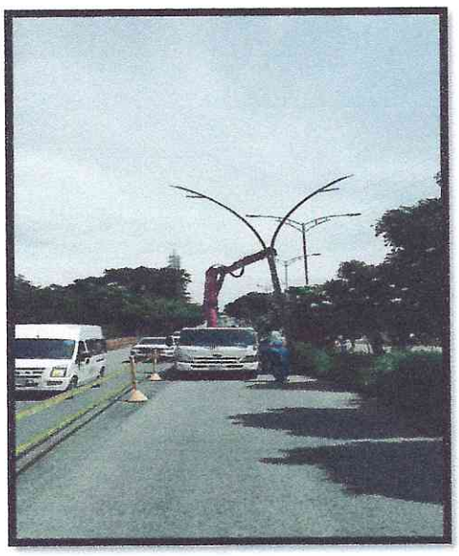


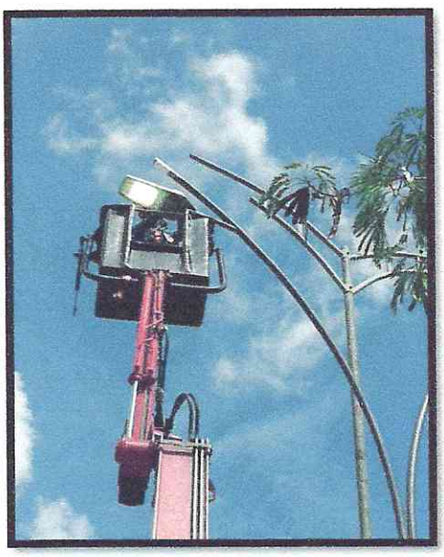

023-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO PUENTE VEHICULAR ENTRE EL CAI CARMEN Y BARRIO VILLA LUZ MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE02	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W - Completa en Camioneta	Und	2
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	1
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

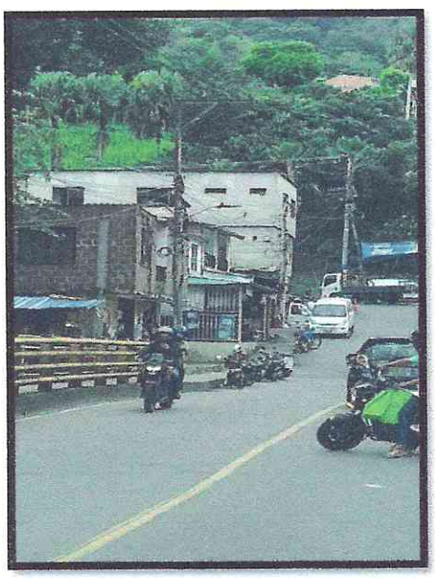

024-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE TIERRA LA MESITA BARRIO BUCARICA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE05A	Suministro, transporte e instalación de Proyector led´s 190W	Und	4
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	1
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	1
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	1
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	20


REGISTRO FOTOGRAFICO



025-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES BARRIO ALTAMIRA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01-B	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Solo luminaria y Fotocelda, en Camioneta	Und	4
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	1
LE05A	Suministro, transporte e instalación de Proyector led´s 190W	Und	1
M003	Suministro, transporte e instalación de caja control conformado por: caja metalica, breaker y cableado.	Und	0
P019	Suministro, transporte e instalacion Poste decorativo de 4,5 mts. Oleron Brazo Doble	Und	2
A001	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto.	Und	2
C002	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla.	Und	4
C003	Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.	m	12
R001	Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Al THWN Nº 2 AWG para baja tensión.	m	18
T001	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público.	Und	4

REGISTRO FOTOGRAFICO

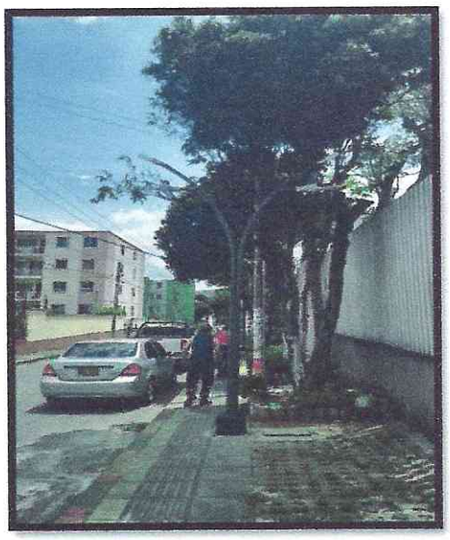




026-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 CON CARRERA 12 BARRIO NUEVO VILLABEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	2
P001	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de concreto 8m 510kg.	Und	1
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	1
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	20

REGISTRO FOTOGRAFICO

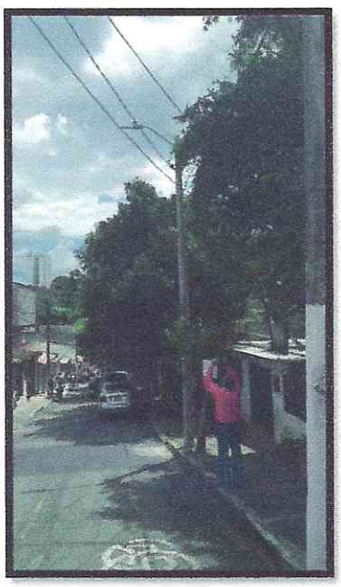

CONCLUSIONES

Una buena y adecuada prestación del servicio de alumbrado público se constituye en un indicador de desarrollo del Municipio con un gran impacto social favorable, puesto que implica un sin número de beneficios dentro de los cuales podemos mencionar, el desarrollo, el confort, bienestar, la confiabilidad, la estética, el embellecimiento urbano, la seguridad, la prevención hurtos, delitos, y accidentes con iluminación blanca LED que usa tecnología limpia.

Este proyecto permitirá adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecución del Convenio unas mejores condiciones técnicas, que aseguran la continua y adecuada prestación del servicio de alumbrado público bajo altos estándares de desarrollo, eficiencia, haciendo especial énfasis en los cambios o adelantos tecnológicos que son tan importantes a favor de los fines públicos que hay que salvaguardar.


Las nuevas tecnologías en los sistemas de alumbrado público como es la utilización de luminarias tipo LED, disminuyen los consumos de energía y aumenta la vida útil de las mismas, gracias a este ahorro de energía cuyo precio se ve afectado por los fenómenos naturales de sequía se prevé la sostenibilidad financiera del sistema de alumbrado público, el cual se podría ver altamente perjudicado sino se aboca dicho proyecto.

En efecto, una buena y adecuada prestación del servicio de alumbrado público se constituye en un indicador de desarrollo del Municipio, puesto que implica un sin número de beneficios dentro de los cuales podemos mencionar, el desarrollo, el confort, bienestar, la confiabilidad, la estética, el embellecimiento urbano, la seguridad, la prevención hurtos, delitos, accidentes y adicionalmente con implementación de nueva

014-2024 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO VEREDA DESPENSA VERICUTE RAMAL DE INGRESO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	16
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	16
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	16
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	460

REGISTRO FOTOGRAFICO

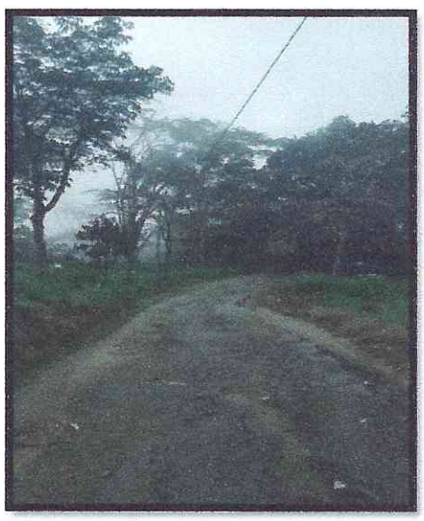



tecnología se logra un ahorro importante en el consumo de energía, haciendo un beneficio para el bolsillo de la comunidad.

En constancia firman,

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Director
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
CONTRATISTA

GERSON ANDRES GONZALEZ
Secretario de Infraestructura
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
SUPERVISOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS S.A.S
INTECELEC S.A.S.

JORGE ARAGÓN ANAYA
Representante Legal Suplente
INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS SAS
INTERVENTOR
