
INFORME No. 16

PERIODO: 06 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 05 DE JULIO DE 2024

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	

UT. INTERCOMEDOR ITSI
901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
JULIO 2024

INFORME No. 16 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



JULIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 8
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 10
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **11**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 11
2.2. ACTAS SUSCRITAS 12
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL 12
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 15
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 16
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 16
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 17
2.10. COMITÉ DE OBRA 17
2.11. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA 17
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **18**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 18
3.2. ACTAS SUSCRITAS 19
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 19
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 19
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 21
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 21
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 22
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 22
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 22

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 22

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 24

5. CAPITULO V. ANEXOS 25

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 25

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 26

5.3. BITÁCORA DE OBRA 27

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 28

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 29

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 30

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA 31

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 32

5.9. INFORME HSE DE OBRA 33

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 34

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 06 de JUNIO de 2024 al 05 de JULIO de 2024.

ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.


- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.

- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

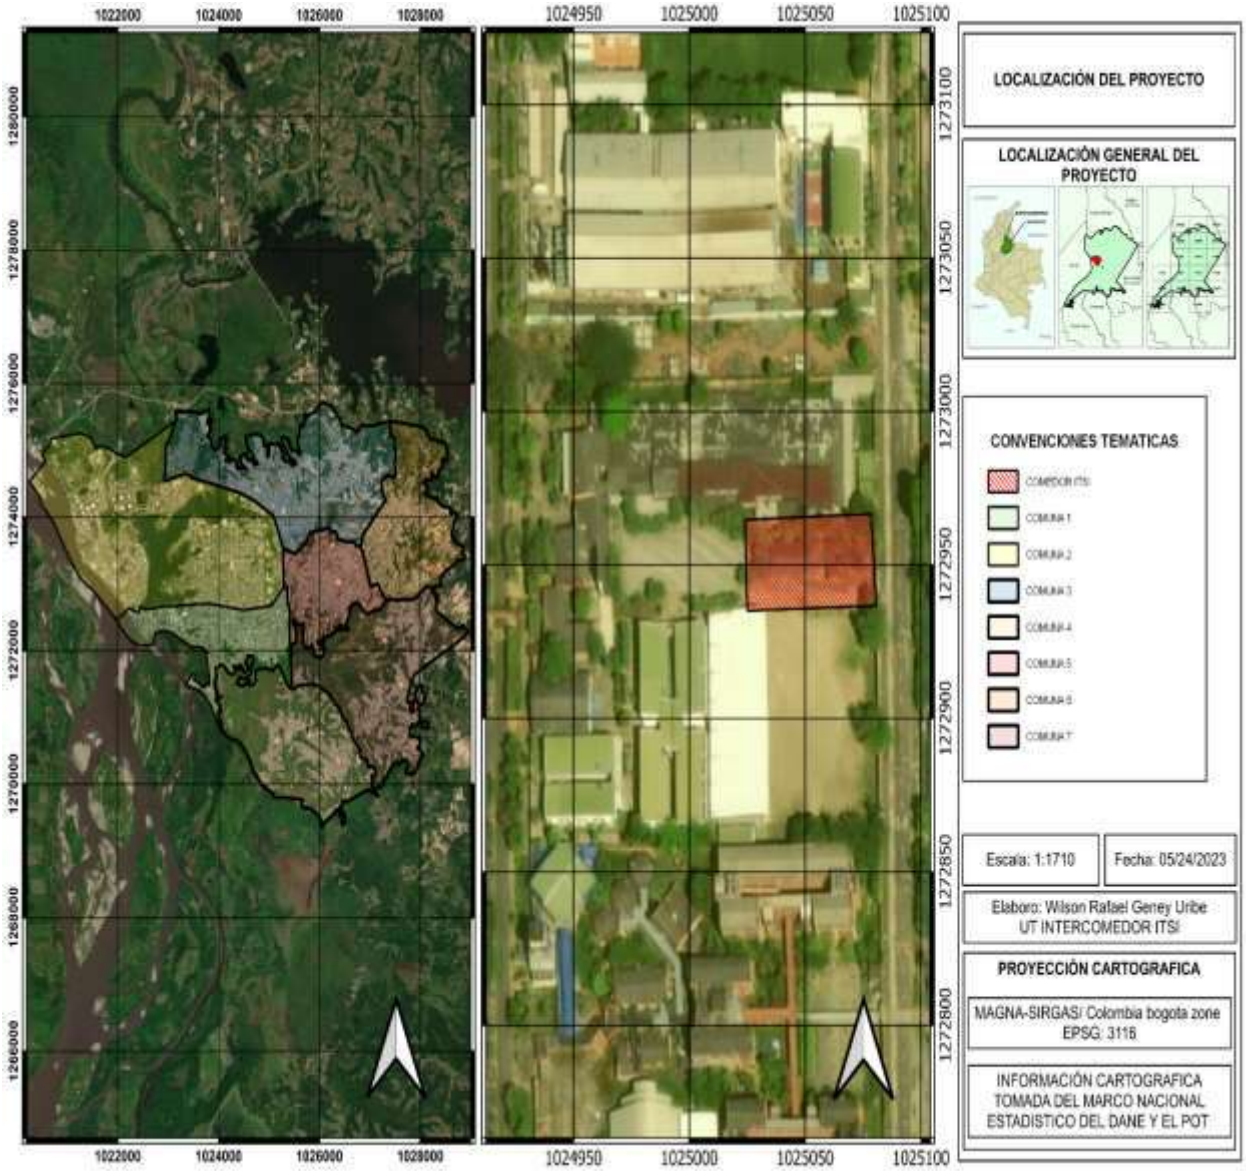


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría.

Figura 2. Planta general cafetería.

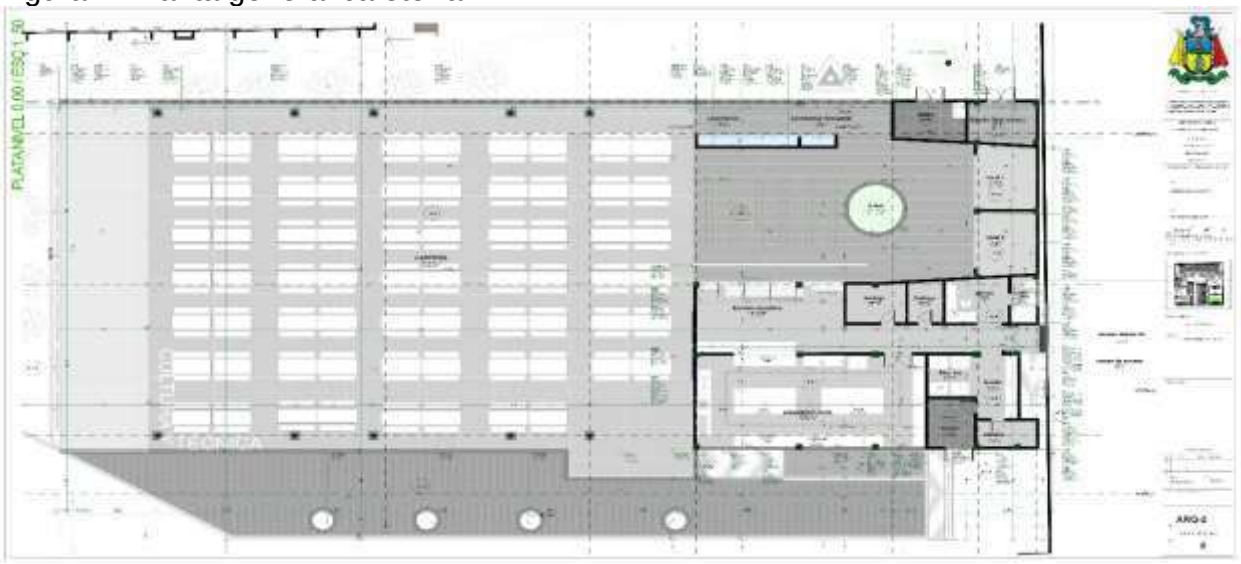

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.
En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.

- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.

- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.

- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.

- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.

- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.

- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.

- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables. El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

A la fecha del presente informe se han suscrito 3 adicionales en tiempo, como se muestra en el siguiente cuadro. Para un plazo de ejecución total de 18 meses.

ACTAS	TIEMPO	FECHA
Acta adicional N° 1 en tiempo	30 DIAS	28 de febrero de 2024
Acta adicional N° 2 en tiempo	30 DIAS	04 de abril de 2024
Acta adicional N° 3 en tiempo	90 DIAS	10 de mayo de 2024
Acta adicional N° 4 en tiempo	30 DIAS	31 de mayo de 2024

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°:	0757-23
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas entre la supervisión e interventoría.

ACTAS	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023
Acta de recibo parcial N° 1	8 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1	13 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1	21 de septiembre de 2023
Acta de recibo parcial N° 2	25 de octubre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 2	27 de octubre de 2023
Acta de recibo parcial N° 3	19 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°3	20 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°3	21 de diciembre de 2023
Acta adicional N° 1 en plazo	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1	03 de mayo de 2024
Acta de reinicio N°1	08 de mayo de 2024
Acta adicional N°3 en plazo	10 de mayo de 2024
Acta adicional en plazo N°4 y en valor N°1	31 de mayo de 2024

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL


En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del ultimo informe semanal del periodo.

Figura 3. Avance presupuestal.

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL		
	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,60%	62,45%
Valor de la Obra Programada	$ 21.945.521,35	$ 2.284.190.593,29

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,20%	70,96%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 43.891.042,70	$ 2.595.563.696,30

Figura 4. Programado vs Ejecutado.

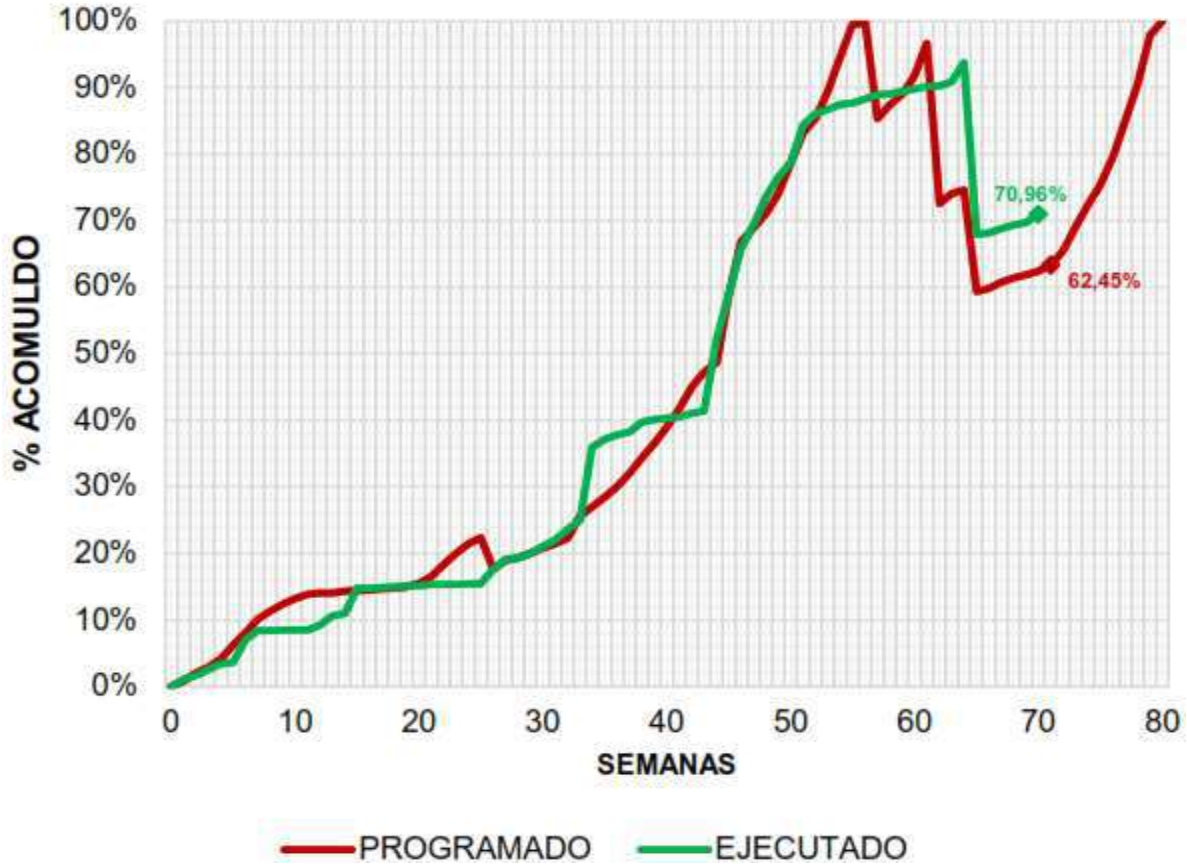

A continuación, se relacionan las actividades técnicas ejecutadas por el contratista durante en el periodo:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT. EJECUTADA
2.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (Recebo)	M3	300
3.1.1	CONCRETO DE 2000PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN ESP 0.05m	M2	35
5.3.1	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO RAYADO ESP=5CM RAMPAS	M2	52
5.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO	ML	50
14.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO ESP 0.10 m	M2	300
14.16	REJILLA PARA CARCAMO EN ANGULO DE 2"X2" 1/8" EN VARILLA DE 3/4 LISA ESPACIO CADA 2CM, ANCHO 0,20 CM	ML	23
14.15	RETIRO DE MATERIAL SATURADO Y CONFORMACION DE RASANTE	M2	250

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades.

- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.

- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.

- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.

- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **(Ver anexo 5.3)**

2.4.2 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **(Ver anexo 5.4)**

PERSONAL	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	20%
Residente de Interventoría	100%
Topógrafo	100%
Profesional SST	100%
Auxiliar de Interventoría	100%

2.4.3 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de cómputo portátil	5
Impresora multifuncional	1
Camioneta	1

2.4.4 Licencias

Durante el periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar, ya que en ninguna de las actividades realizadas se intervinieron especies de flora, ocupación de causes o se hizo uso del espacio púbico.

2.4.5 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría no se enviaron comunicaciones. **(Ver anexo 5.5)**

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 48.280.624,69	12,85%
ACTA PARCIAL 2	$ 46.832.034,00	12,47%
ACTA PARCIAL 3	$ 16.993.350,33	4,52%
ACTA PARCIAL 4	$112.106.006,34	32,95%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$235.887.424,66**	**62,80%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 375.617.600,00**	**--**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 139.730.175,34**	**37,20%**

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el correcto.

- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.

- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que el señalizador vial o paletero se encuentre en sitio cada vez que ingresan o salen vehículos de carga pesada de obra.

- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

La interventoría en compañía con el contratista y el supervisor, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.6.**

- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura y eficiente.

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 6 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	10/03/2025	$ 75.123.520,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	10/09/2027	$ 37.561.760,00
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	06/05/2025	$ 75.123.520,00

2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría, contratista y supervisión se han realizado los siguientes comités de obra.

FECHA	N° ACTA	TEMAS	ASISTENTES
03/07/2024	44	• Avance de obra. • Actividades por ejecutar. • Verificación de las actividades ejecutadas.	Wilson Rafael Geney Uribe-Interventoría.
			Cesar Narváez- Ing. Residente WRUSSY S.A.S
			Yesenia Álvarez- Prof. Social
			Alejandro Enríquez M-Supervisor Sec. Infraestructura.

2.11. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
25/06/2024	0028	APROBACIÓN DE FICHAS TENICAS DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, GASODOMESTICOS Y DEMAS EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DEL COMEDOR.	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
26/06/2024	0029	SOLICITUD DE APUS ITEMS NO PREVISTOS.	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
05/07/2024	0030	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA Y REQUERIMIENTO DE CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

TIPO DE CONTRATO	FECHA
Contrato 0756-23	23 de febrero de 2023
Acta de inicio	06 de febrero de 2023
Acta de pactación de precios no previstos N°1	28 de agosto de 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas N°1	29 de agosto de 2023
Acta parcial N°1	11 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°1	13 de septiembre del 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°1	21 de septiembre del 2023
Acta parcial N°2	24 de octubre del 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°.2	27 de octubre del 2023
Acta parcial N°3	19 de diciembre del 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°.3	20 de diciembre del 2023
Acta de pactación de precios no previstos N°.02	26 de diciembre del 2022
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades N° previstas #2	27 de diciembre del 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades N° previstas #3	15 de febrero de 2024
Adicional N°01 en plazo en plazo al contrato de obra pública N° 0756-23	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo al contrato de obra pública no. 0756-23	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1 al contrato 0756-23	03 de mayo de 2024
Acta de reinicio N°1 al contrato 0756-23	08 de mayo de 2024
Acta adicional N°3 en plazo al contrato 0756-23	10 de mayo de 2024
Acta adiciona N°4 en plazo y N°1 en valor al contrato 0756-23	31 de mayo de 2024

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **(Ver anexo 5.7)**

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **(Ver anexo 5.8).**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR	ESTADO
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra	**ACTIVO**
Cesar Orlando Narváez Quiñonez	Residente de Obra	**ACTIVO**
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico	**ACTIVO**
Yesenia Álvarez Acosta	Profesional Social	**ACTIVO**
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST	**ACTIVO**
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra	**ACTIVO**
Jorge Reyes Serrano	Guarda de seguridad	**ACTIVO**

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	1
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	1
Rana compactadora	1
Retro excavadora	1

3.4.2 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **(Ver anexo 5.5).**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
21/06/2024	0087-0756	RADICACION FICHAS TECNICAS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
26/06/2024	088-0756	FICHA TÉCNICA MESAS COMEDOR	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
27/06/2024	089-0756	RADICACIÓN POLIZAS PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
03/07/2024	091-0756	SOLICITUD DE INCLUSION ÍTEMS NO PREVISTOS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 652.092.013,92	12,85%
ACTA PARCIAL 2	$ 468.320.345,00	9,32%
ACTA PARCIAL 3	$ 393.584.241,12	7,76%
ACTA PARCIAL 4	$ 1.671.827.231,59	32,95%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$ 3.185.823.831,63**	**62,79%**
VALOR TOTAL	**$ 5.073.942.869,88**	**--**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 1.888.119.038,25**	**37,21%**

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **(Ver anexo 5.9).**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.
- Se realizó constantemente la reposición de EPP’s por daños a los trabajadores.
- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19 en el periodo de este informe.
- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.
- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.
- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.
- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **(Ver anexo 5.10).**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con los padres de familia del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.

- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por parte de la empresa ASSEAR y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.

- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por adicional en plazo N°4 y en valor N°1.

INFORMACIÓN POLIZAS			
Póliza de cumplimiento:	11-44-101198726		
Póliza de Reps. Civil extracontractual:	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición	30 DE MARZO DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha inicial	**Fecha final**	
Cumplimiento de contrato	06/03/2023	10/03/2025	$1.014.788.574,00
Salarios y prestaciones sociales	06/03/2023	10/09/2027	$507.394.287,00
Estabilidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 1 días		$1.014.788.574,00
Responsabilidad civil extracontractual	06/03/2023	10/09/2024	$520.000.000,00

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el décimo mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima dentro de la jornada laboral, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra.

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Durante el periodo de ejecución de presente informe se evidencio un porcentaje de avance físico del 70,96%

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2024 AL 05-07-2024
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFIA NO.1 – REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRA PARA POSTERIOR FUNDIDA DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI.



















FOTOGRAFÍA NO.2 – INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA Y FUNDIDA DE ANDENES Y RAMPA DE ACCESO AL COMEDOR.








INICIO DE OBRA





















FOTOGRAFÍA NO.3 – FUNCIONARIOS DE VANTI S.A E.S.P, REALIZAN INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRIMERA ETAPA.





FOTOGRAFÍA NO.4 – DEMOLICIÓN DE ESCOMBRO EN MURO DE CERRAMIENTO PRINCIPAL.











FOTOGRAFÍA NO.5 – CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRAMPA DE GRASAS DE 1000 LITROS.





FOTOGRAFÍA NO.6 - SE REALIZA APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES.





FOTOGRAFÍA NO.7 – CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LAS PLACAS DE LOS ANDENES.





FOTOGRAFÍA NO.8 - VISITA TÉCNICA EN LA OBRA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LOS GASODOMESTICOS Y DEMÁS EQUIPOS.






FOTOGRAFÍA NO.9 – FUNCIONARIOS DE VANTI S.A E.S.P REALIZA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR, CERTIFICACIÓN DE RED INTERNA Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.





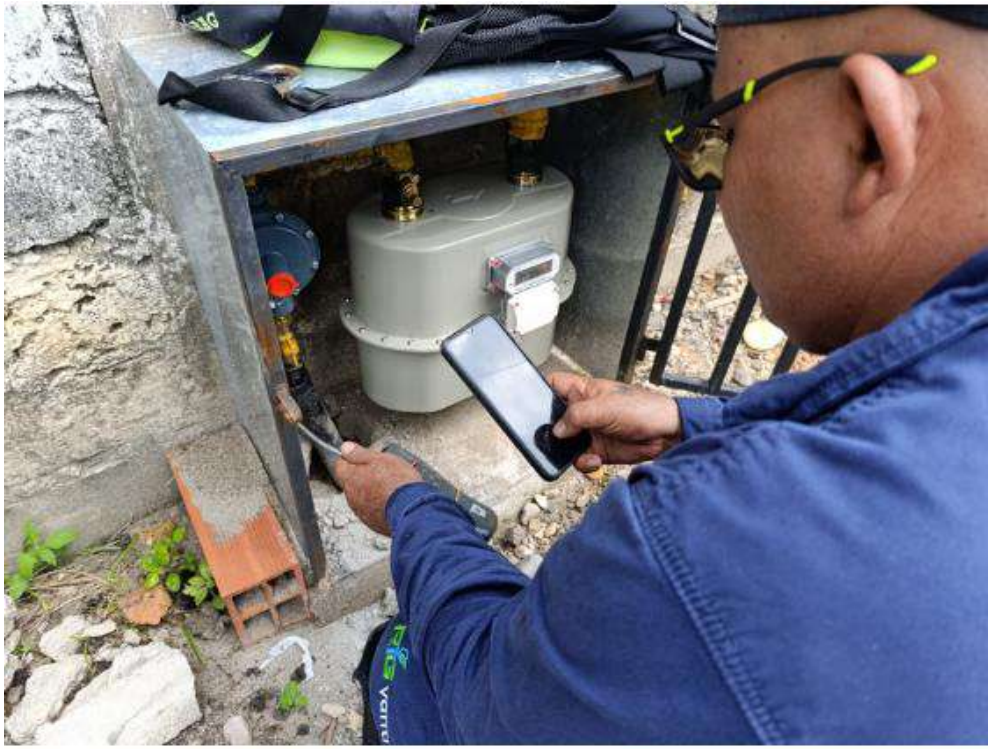



FOTOGRAFIA NO.10 - SE REALIZA INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE.





FOTOGRAFIA NO.11 - SE REALIZA EXCAVACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLADO PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DE CÁRCAMOS PREFABRICADOS EN CONCRETO.







FOTOGRAFIA No. 12 - INSTALACIÓN DE CÁRCAMOS EN CONCRETO PREFABRICADO.







FOTOGRAFIA No.13 - INSTALACIÓN DE BAJANTE DE CANAL DE AGUA LLUVIA DE LA CUBIERTA.





FOTOGRAFÍA No.14 - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ESCOMBROS Y RECONFORMACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.

















5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	2. No. INFORME	66	3. SEMANA No.	66
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	03/06/2024 AL 09/06/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88	
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO: 18 Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00	
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO: 18 Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00	
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	75,26%	5,42%	-24,74%	-1,78%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	98,00%	1,18%	91,31%	1,10%	-6,69%	-0,08%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	39,00%	4,59%	84,10%	9,91%	45,10%	5,31%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	54,48%	0,26%	-45,52%	-0,22%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	3,00%	0,13%	94,23%	4,22%	91,23%	4,08%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	63,00%	14,26%	59,95%	13,57%	-3,05%	-0,69%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**59,87%**		**68,09%**		**8,22%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,99%	59,29%	8,70%
Durante el periodo	0,10%	0,58%	-0,48%
Acumulado Actual	68,09%	59,87%	8,22%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,58%	59,87%
Valor de la Obra Programada	$ 21.214.003,97	$ 2.189.784.097,61

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,10%	68,09%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3.657.586,89	$ 2.490.369.752,03

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

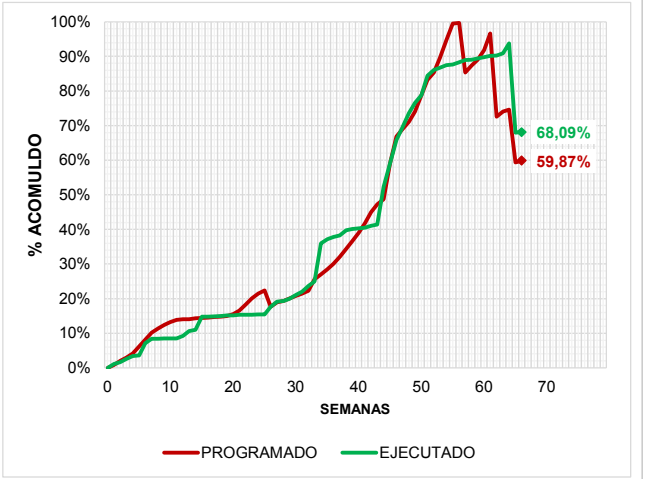

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	4	DEMOLEDOR	1	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	1	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza el replanteo e instalación de malla de refuerzo para la posterior la fundida de concreto de 3000 PSI (E=0,10) para rampa y andenes.
2. El contratista finalizo el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO.
3. El contratista finalizo el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS NATURAL EN ALUMINIO (incluye todos los accesorios para su correcta instalación).
4. El contratista realiza la acometida de gas natural y la posterior instalación del regular de primera etapa.
5. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoria.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoria, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	No. INFORME	66	SEMANA No.	66

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de la acometida de gas natural.



DESCRIPCIÓN: Instalación del regulador de primera etapa.



DESCRIPCIÓN: Alistamiento del paso posterior del área de cocina para posterior instalación de mortero de nivelación.



DESCRIPCIÓN: Alistamiento del paso posterior del área de cocina para posterior instalación de mortero de nivelación.



DESCRIPCIÓN: Replanteo del área de anden.



DESCRIPCIÓN: Replanteo del área de anden.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	6	2024	2. No. INFORME	67	3. SEMANA No.	67
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	10/06/2024 AL 16/06/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$	1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$	102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	75,26%	5,42%	-24,74%	-1,78%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	100,00%	1,20%	91,31%	1,10%	-8,69%	-0,10%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	39,00%	4,59%	84,39%	9,94%	45,39%	5,35%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	54,48%	0,26%	-45,52%	-0,22%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	3,00%	0,13%	94,23%	4,22%	91,23%	4,08%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	5,00%	0,22%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,22%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	66,00%	14,94%	62,79%	14,21%	-3,21%	-0,73%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**60,79%**		**68,77%**		**7,98%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,99%	59,29%	8,70%
Durante el periodo	0,68%	0,92%	-0,24%
Acumulado Actual	68,67%	60,21%	8,46%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,92%	60,79%
Valor de la Obra Programada	$ 33.649.799,41	$ 2.223.417.316,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,68%	68,77%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 24.871.590,86	$ 2.515.206.527,87

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

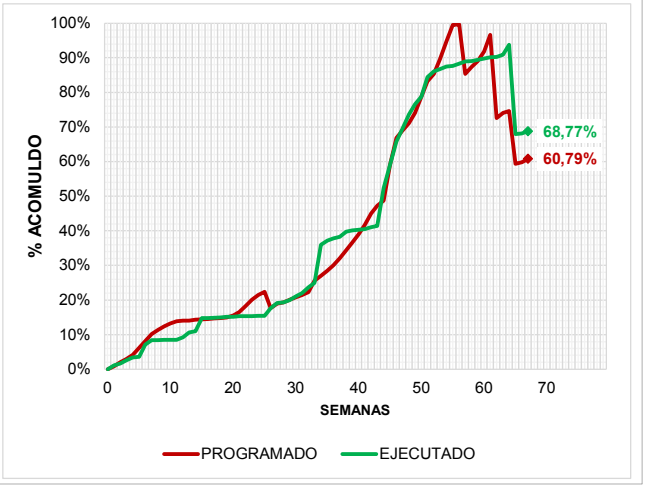

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	3	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	2	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la fundida de CONCRETO DE 3000 PSI (ESP=0.10M) en la zona de la rampa de acceso al comedor.
2. El contratista finaliza la fundida de CONCRETO DE 3000 PSE (ESP=0.10M) para andenes en la margen izquierda del comedor.
3. El contratista realiza la instalación de MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 CON ACABADO RAYADO ESP=5CM RAMPAS en la rampa de acceso del comedor.
4. El contratista realiza la instalación de MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 ESP= 4CM IMPERMEABILIZADO PARA BAÑOS, COCINAS Y ZONAS AL AIRE LIBRE en la parte posterior del comedor.
5. El contratista realiza el replanteo e instalación de malla de refuerzo en a zona de andenes del margen derecho del comedor.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de UPS que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	17	6	2024	No. INFORME	67	SEMANA No.	67
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: fundida de concreto de 3000 PSI en el área designada para la rampa de acceso.



DESCRIPCIÓN: fundida de concreto de 3000 PSI en el área designada para la rampa de acceso.



DESCRIPCIÓN: Instalación de Mortero 1:3 rayado para rampa de acceso



DESCRIPCIÓN: Instalación de Mortero 1:3 rayado para rampa de acceso



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000 PSI para anden (margen izquierda del comedor).



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000 PSI para anden (margen izquierda del comedor).


UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	17	6	2024	No. INFORME	67	SEMANA No.	67

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

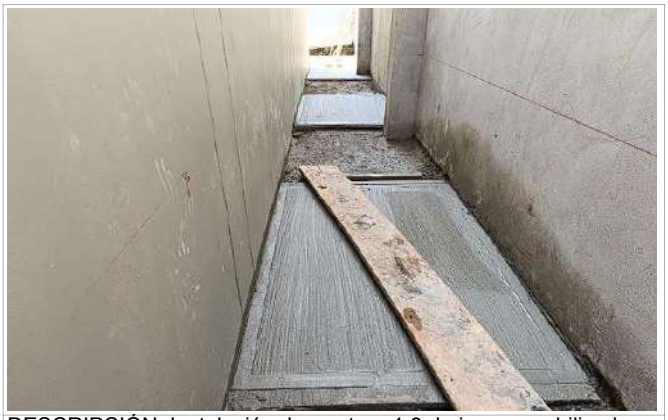

DESCRIPCIÓN: Instalación de mortero 1:3 de impermeabilizado para el pasillo posterior del comedor.



DESCRIPCIÓN: Instalación de mortero 1:3 de impermeabilizado para el pasillo posterior del comedor.



DESCRIPCIÓN: Instalación de mortero 1:3 de impermeabilizado para el pasillo posterior del comedor.



DESCRIPCIÓN: Replanteo para posterior fundida de concreto de 3000 PSI.



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla de refuerzo.



DESCRIPCIÓN: Instalación de mortero 1:3 en el cuarto de bombas.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	6	2024	2. No. INFORME	68	3. SEMANA No.	68
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	17/06/2024 AL 24/06/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$	1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$	102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	80,39%	5,79%	-19,61%	-1,41%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	100,00%	1,20%	91,31%	1,10%	-8,69%	-0,10%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	39,00%	4,59%	85,66%	10,09%	46,66%	5,50%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	73,42%	0,35%	-26,58%	-0,13%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	7,00%	0,31%	94,23%	4,22%	87,23%	3,90%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	5,00%	0,22%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,22%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	68,00%	15,39%	62,79%	14,21%	-5,21%	-1,18%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**61,42%**		**69,38%**		**7,96%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,77%	60,79%	7,98%
Durante el periodo	0,61%	0,63%	-0,02%
Acumulado Actual	69,38%	61,42%	7,96%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,63%	61,42%
Valor de la Obra Programada	$ 23.042.797,42	$ 2.246.523.308,55

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,61%	69,38%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 22.311.280,04	$ 2.537.530.540,83

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

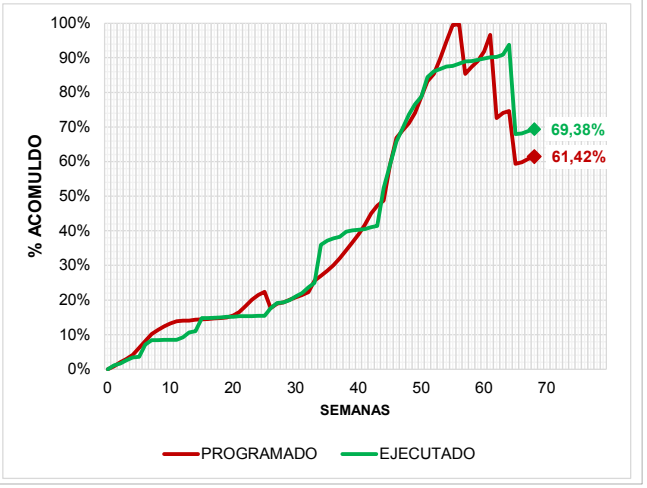

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	**CANTIDAD**	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**CANTIDAD**	**DIA**	**ESTADO**
OBREROS	3	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	2	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista continua con el replanteo y relleno con material de préstamo para la posterior fundida de CONCRETO DE 3000 PSI para andenes.
2. El contratista realiza la excavación de la zanja en la zona de la rampa de acceso para el posterior SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO.
3. El contratista junto con la empresa VANTI S.A. E.S.P realizan la certificación de acometidas, red interna y realizan la posterior instalación de medidor y regular de primer etapa.
5. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	24 / 6 / 2024	No. INFORME	68	SEMANA No.	68
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Replanteo y relleno de área de andenes



DESCRIPCIÓN: Replanteo y relleno de área de andenes



DESCRIPCIÓN: Instalación de medidor y regulador de primera etapa



DESCRIPCIÓN: Certificación de red interna.



DESCRIPCIÓN: Excavación para instalación de cárcamo en concreto.



DESCRIPCIÓN: Excavación para instalación de cárcamo en concreto.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	1	7	2024	2. No. INFORME	69	3. SEMANA No.	69
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	24/06/2024 AL 30/06/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$	1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$	102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	80,39%	5,79%	-19,61%	-1,41%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	100,00%	1,20%	91,31%	1,10%	-8,69%	-0,10%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	40,00%	4,71%	86,11%	10,14%	46,11%	5,43%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	73,42%	0,35%	-26,58%	-0,13%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	9,00%	0,40%	94,23%	4,22%	85,23%	3,81%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	5,00%	0,22%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,22%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	69,00%	15,62%	64,24%	14,54%	-4,76%	-1,08%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**61,85%**		**69,76%**		**7,90%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	69,38%	61,42%	7,96%
Durante el periodo	0,38%	0,43%	-0,05%
Acumulado Actual	69,76%	61,85%	7,91%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,43%	61,85%
Valor de la Obra Programada	$ 15.727.623,64	$ 2.262.384.434,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,38%	69,76%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 13.898.830,19	$ 2.551.409.038,98

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

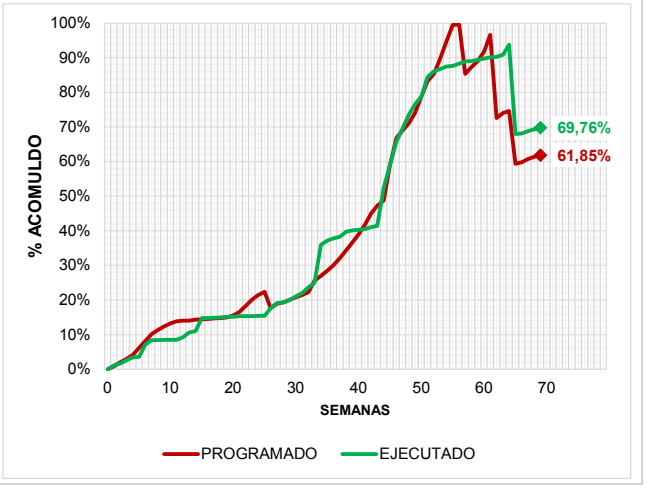

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	3	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	2	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la instalación de CONCRETO DE 2000PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN ESP 0.05m.
2. El contratista realiza la INSTALACION DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO en la zona de la rampa de acceso.
3. El contratista realiza la instalación de malla de refuerzo para andenes en concreto de 3000 PSI.
4. El contratista realiza la fundida de CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO ESP 0.10 m para andenes frontales y laterales.
5. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO CANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI	REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	1	7	2024	No. INFORME	69	SEMANA No.	69
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: instalación de CONCRETO DE 2000PSI, CLASE F, PARA SOLADO



DESCRIPCIÓN: instalación de CONCRETO DE 2000PSI, CLASE F, PARA SOLADO



DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO



DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE CÁRCAMO CON REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADO



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla de refuerzo.



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla de refuerzo.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	1	7	2024	No. INFORME	69	SEMANA No.	69
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de malla de refuerzo.



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000 PSI.



DESCRIPCIÓN: Rayado de concreto.



DESCRIPCIÓN: Rayado de concreto.



DESCRIPCIÓN: Rayado de concreto.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	8	7	2024	2. No. INFORME	70	3. SEMANA No.	70
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	01/07/2024 AL 07/07/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$	1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$	102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	93,91%	6,76%	-6,09%	-0,44%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	100,00%	1,20%	91,31%	1,10%	-8,69%	-0,10%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	42,00%	4,95%	85,66%	10,09%	43,66%	5,14%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	73,42%	0,35%	-26,58%	-0,13%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	12,00%	0,54%	94,23%	4,22%	82,23%	3,68%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	5,00%	0,22%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,22%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	70,00%	15,84%	65,50%	14,83%	-4,50%	-1,02%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**62,45%**		**70,96%**		**8,51%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	69,76%	61,85%	7,91%
Durante el periodo	1,20%	0,60%	0,60%
Acumulado Actual	70,96%	62,45%	8,51%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,60%	62,45%
Valor de la Obra Programada	$ 21.945.521,35	$ 2.284.190.593,29

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,20%	70,96%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 43.891.042,70	$ 2.595.563.696,30

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

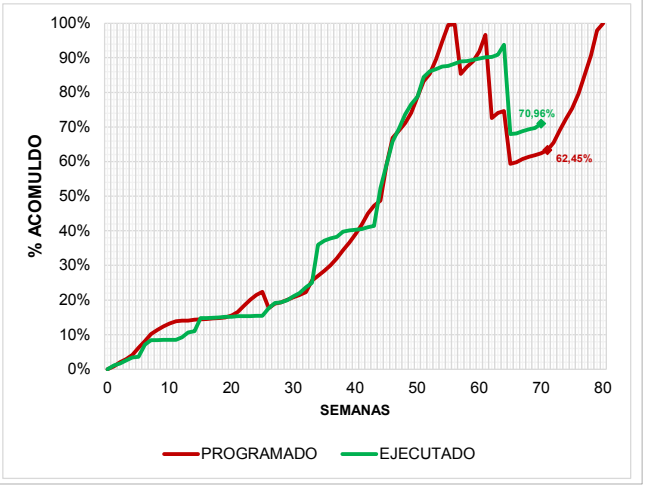

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	3	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	2	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	L
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	1	VIERNES	L
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la fundida de CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO ESP 0.10 m para andenes.
2. El contratista inicia con el retiro de material sobrante y de escombro.
3. El contratista realiza el retiro de materal saturado y conformación del terreno.
4. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoria radica ante el contratista el comunicado 029 del 5 de julio de 2024 en donde se realizan observaciones de diferentes acabados para que sean subsanados en el menor tiempo posible.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	8	7	2024	No. INFORME	70	SEMANA No.	70

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Fundida de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Terminado de placa de concreto de 3000PSI.



DESCRIPCIÓN: Terminado de placa de concreto de 3000PSI.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	8	7	2024	No. INFORME	70	SEMANA No.	70

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Desmonte de almacen temporal.



DESCRIPCIÓN: Retiro de material saturado.



DESCRIPCIÓN: Retiro de material saturado.



DESCRIPCIÓN: Reconformación del area.



DESCRIPCIÓN: Reconformación del area.



DESCRIPCIÓN: Reconformación del area.

5.3. BITÁCORA DE OBRA

002

Fecha 05 de junio 2024 / Miercoles

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se continua con el replanteo y movimiento de tierra para posterior fundida de cadenes en concreto.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CESARON
Residente obra

Fecha 06 junio 2024 / jueves

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Funcionarios de conti realizan construccion de acometido e instalacion de regulador de segunda etapa.
- Se presentan fuertes lluvias la noche anterior y se extendieron hasta las 9 am (7-9 am).
- Se continua con el replanteo y movimiento de tierras para posterior fundida
- Se hace demolicion de escombros en muro de cerramiento.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CESARON
Residente obra

Fecha 07 de junio 2024 / viernes

- El contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- Se presentan fuertes lluvias de 3pm a 5pm
- Se realizan reconformación, replanteo y compactación para fundido de malla y fundida de andenes.
- Construccion de caja de inspección de la rampa de gaseus y cuarto de aseo.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CÉSAR ONO
Residente obra

Fecha 08 de junio 2024 / sabado

- El contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- Se continua armado de malla electrosoldada para fundido de placa de contrapiso (andenes) y rampa de acceso al comedor
- Se inica reparacion y montaje de canal de aguas lluvias de la cubierta del comedor
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CÉSAR ONO
Residente obra

Fecha 11 de junio 2024 / Martes.

- El contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- Se presentan fuertes lluvias desde las 7am hasta las 9am

004

- Se realiza fundida de rampa de acceso del area del comedor y andenes
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria — CESARONP Residente obra

Fecha 12 de junio 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se realizan fundida de placa de anden pasillo trasero del comedor.
- visita de rama haciendo revision de la acometida.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria — CESARONP Residente obra

Fecha 13 de junio 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua fundida de placa de anden pasillo trasero
- Alistero de nivelacion cuarto de bombas
- Se realizaron cortes de dilatacion en andenes y placa de acceso.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria — CESARONP Residente obra

Fecha 14 de junio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se realiza aplicación de frisos en parte inferior del muro de cerramiento de la institución
- La interventoría verifico toda la ejecución de las actividades.

Residente interventoría

CESARON
Residente obra

Fecha: 15 de junio 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con el replanteo de andenes.
- Se instala malla electrosoldada para la fundida.
- Se programan 11 horas laves desde 7am a 9am
- La interventoría verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

CESARON
Residente obra

Fecha 17 de junio 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Empresa vanti realiza instalación de medidor y certificación puesta de manera de acometida de gas interna.
-

006

la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

ESPINOZA
Residente obra

Fecha 19 - junio 2024 / Miercoles.

- el contratista inicia labores a las 7am con charla de SST.
- se realiza instalacion marco de tapa del tanque del agua potable.
- se repara canal de aguas lluvias
- se realiza instalacion de malla de polipropileno para prueba (Muestra del material).
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

ESPINOZA
Residente obra

Fecha 20 de junio 2024 / Jueves

- el contratista inicia labores a la 7am con charla SST.
- se realiza demolicion de muro antiguo a la forma existente
- se continua replanteo y movimiento de material sobrante.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

ESPINOZA
Residente obra

Fecha 21 de junio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua demolicion de anden antiguo a la forma existente.
- Se continua replanteo y movimiento de material sobrante.
- Se inicia excavación para la instalacion de carcamos en concreto.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

Contratista
Residente obra

Fecha 22 de junio 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua replanteo para fundida de andenes
- Se continua excavacion para instalación de carcamos prefabricados en concreto.
- La interventoria verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

Contratista
Residente obra

Fecha 24 de junio 2024 / lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua excavacion para instalacion de carcamos prefabricados en concreto.
- Se realiza aplicación de solado para posterior

008

instalación de cercamos prefabricados en concreto.
- La interventoría verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

ESDRONY
Residente obra

Fecha 25 de junio 2024 / Martes

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la excavación para la instalación de cercamos prefabricados en concreto.
- Se continua la instalación de cercamos prefabricados en concreto.
- La interventoría verifica toda la ejecución de las actividades

Residente interventoría

ESDRONY
Residente obra

Fecha 26 de junio 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua la instalación de cercamos prefabricado
- Se realiza compactación con rana compactadora para posterior fundida de anden en concreto.
- instalacion de bajante de aguas lluvias.
- La interventoría verifica la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoría

ESDRONY
Residente obra

Fecha 27 de junio 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se realiza instalación de malla electrosoldada para fundida de andenes.
- Se instala laminas para carcamos de los arboles.
- La interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha 28 de junio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se presentan lluvias fuertes desde las 7am hasta las 9am
- Se realizan fundida de andenes en concreto de 2000 psi 15m³
- Se realiza acabado rayado de los andenes fundidos
- La interventoria verifica la ejecución de todas las actividades

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra.

Fecha 29 de junio 2024 / sabado.

- El contratista inica labores a las 7am con charla SST.
- Se continua con la excavación de carcamos pendientes
- Se realiza la fundida del solado de los carcamos pendientes.

010

- La interventoría verificó la ejecución de todas las actividades

Dra. Jenette Interventoría

(Firma)
Presidente Junta

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	783117546	9469633729	E	2024/07/23	2024/07/17	BANCO DE BOGOTA	0	$1,021,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096241286	GENEY URIBE WILSON RAFAEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	13749852	MACIAS RODRIGUEZ FABIO ANDRES																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$3,300,000	$528,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$132,000			$3,300,000	$229,700		$0	$0		$1,021,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	783117546	9469633729	E	2024/07/23	2024/07/17	BANCO DE BOGOTA	0	$1,021,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$229,700	$0	$0	$229,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$229,700	$0	$0	$229,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$132,000	$0	$0	$132,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$132,000	$0	$0	$132,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$132,000	$0	$0	$132,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**2**	**$1,021,700**	**$0**	**$0**	**$1,021,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	767205910	9469840684	E	2024/07/11	2024/07/10	BANCO DE BOGOTA	0	$585,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FMC CONSTRUCTORES (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
Centro de Trabajo: FMC CONSTRUCTORES (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
1	CC	33210596	NAVARRO VILLARRUEL MYRIAM DEL CARMEN																			0	$0	$0	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
2	CC	28060888	VILLARRUEL NAVARRO LAURY XIMENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
Total	**Afiliados(2)**																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	767205910	9469840684	E	2024/07/11	2024/07/10	BANCO DE BOGOTA	0	$585,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,000	$0	$0	$92,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$92,000	$0	$0	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$585,000	$0	$0	$585,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	767190279	9469840470	E	2024/07/11	2024/07/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,689,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																					$14,909,363	$2,458,600			$14,909,363	$596,500			$14,909,363	$596,500			$14,909,363		$1,037,900		$0	$0		$4,689,500
Centro de Trabajo: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																					$14,909,363	$2,458,600			$14,909,363	$596,500			$14,909,363	$596,500			$14,909,363		$1,037,900		$0	$0		$4,689,500
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																					$14,909,363	$2,458,600			$14,909,363	$596,500			$14,909,363	$596,500			$14,909,363		$1,037,900		$0	$0		$4,689,500
1	CC	1102370870	GARZON MARTINEZ ANDRES CAMILO																	23030 1	30	$7,281,710	$1,238,100	EPS005	30	$7,281,710	$291,300	CCF40	30	$7,281,710	$291,300	14-4	30	$7,281,710	6.960%	$506,900	30	$0	$0	Si	$2,327,600
2	CC	13570287	LUENGAS SUAREZ JHON EDINSON																	23030 1	30	$4,427,653	$708,500	EPS037	30	$4,427,653	$177,200	CCF40	30	$4,427,653	$177,200	14-4	30	$4,427,653	6.960%	$308,200	30	$0	$0	Si	$1,371,100
3	CC	37581158	TEJEDOR LAZCARRO ERLYS TATIANA																	23020 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF40	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
Total		**Afiliados(3)**																			$14,909,363	$2,458,600			$14,909,363	$596,500			$14,909,363	$596,500			$14,909,363		$1,037,900		$0	$0		$4,689,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	767190279	9469840470	E	2024/07/11	2024/07/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,689,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,458,600	$0	$0	$2,458,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,946,600	$0	$0	$1,946,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,037,900	$0	$0	$1,037,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$1,037,900	$0	$0	$1,037,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$596,500	$0	$0	$596,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$596,500	$0	$0	$596,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$596,500	$0	$0	$596,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$305,200	$0	$0	$305,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$291,300	$0	$0	$291,300
TOTAL				3	$4,689,500	$0	$0	$4,689,500

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 25 de junio de 2024 **OFICIO N° 0028**

Señor:
WRUSSY INGENERIOS S.A.S
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA”**

Asunto:	**APROBACIÓN DE FICHAS TENICAS DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, GASODOMESTICOS Y DEMAS EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DEL COMEDOR.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras responsabilidades como interventoría del proyecto, nos permitimos informar que hemos llevado a cabo la revisión detallada y exhaustiva de las fichas técnicas radicadas en el oficio N° 0087-0756 para los equipos mencionados en el contrato.

Después de una cuidadosa evaluación técnica y verificación de conformidad con las especificaciones y normativas establecidas, hemos determinado que los equipos propuestos cumplen con los requisitos exigidos. En consecuencia, procedemos a aprobar las fichas técnicas correspondientes a los siguientes equipos:

- **11,01** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA A GAS DE PISO LINEAL DE 3 PUESTOS QUEMADOR DOBLE. MUEBLES EN ACERO INOXIBDABLE PARTE SUPERIOR EN ACERO INOX CAL. 16-304 Y CUERPO EN ACERO INOX CAL 18-430. Consumo 150.000 BTU/H. Dimensiones 1.20x0.70x0.90 mts o similar.

- **11,02** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFÓN A GAS 26 PULG, CUERPO EXTERNO Y PARTES INTERNA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, Presenta un quemador de 80.000 BTU/hora, compuesto por tres anillos concéntricos con válvulas de control independientes.

- **11,03** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR VERTICAL 1P DE UNA PUERTA SÓLIDA, CONDENSADOR LIBRE DE POLVO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE. Dimensiones frente 0.71 / fondo 0.84 / altura 2.07 mts o similar.

- **11,04** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR HORIZONTAL 1PTA DE PUERTA SÓLIDA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. Dimensiones frente 0.77 / fondo 0.85 / altura 0.97 mts o similar.

- **11,05** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR HORIZONTAL 2 PTAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS

UT. INTERCOMEDOR ITSI

SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. CAPACIDAD INTERIOR DE 425LT. dimensiones frente 1.55 / fondo 0.76 / altura 0.902 mts o similar.

- **11,06** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18, PISO CON REFUERZO GALVANIZADO CAL 18, BANDEJA EXTRAÍBLE RECOLECTORA DE GRASAS Y LÍQUIDOS, CON 2 QUEMADORES INDEPENDIENTES. MARCO EN ACERO INOXIDABLE CAL 14.

- **11,07** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA, CON CONEXIÓN BAJO MESÓN. FILTRACIÓN EN TRES ETAPAS. INCLUYE REPUESTOS DE CARTUCHOS DE FILTROS POR CADA ETAPA DE PURIFICACIÓN.

- 11,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIA ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES FRENTE 1.80 / FONDO 0.45 / ALTURA 1.80 MTS.

- **11,09** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA ÓPTIMA POZ IZ TA 1.41X0.60m CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 PRESENTA SALPICADERO Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS., INCLUYE POZUELO AL LADO IZQUIERDO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 50 X 40 CMS Y PROFUNDIDAD DE 25 CMS, PATAS EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE LARGO 1.41/ ANCHO 0.60 / ALTURA 0.91 MTS.

- **11,11** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA DE MESA 12L. 1HP LICUADORA VOLCABLE, VASO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, BASE EN TUBERÍA DE ACERO PINTADA. VASO PARA 12 LTS.

- **11,12** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLINO DE CARNE EN ACERO INOXIDABLE, INTERRUPTOR A PRUEBA DE AGUA Y PARADA DE ENERGENCIA, SWICHE DE ARRANQUE Y REVERSA. BANDEJA ALIMENTADORA REMOBIBLE, PIE DE GOMA, INCLUYE CUCHILLA DE CORTE EN ACERO INOXIDABLE, UNA PLACA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE Y UN EMPUJADOR DE ALIMENTOS DE PLÁSTICO. CAP APROX 120 KG/H.

- **13,01** SUMINISTRO DE LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE CAP DE 1.5LTS MULTIFUNCIONAL, MOTOR DE 38000 r.p.m. CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE Y PULSADOR, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE. Incluye motor, vaso completo con aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor y tacador.}

- **13,02** SUMINISTRO DE BALANZA ELECTRÓNICA 5KG, PLATO EN ACERO INOXIDABLE (incluye adaptador).

- **13,03** SUMINISTRO DE TERMÓMETRO ACEITE Y CARAMELO 100A 400°F ANÁLOGO DE PUNZÓN EN ACERO INOXIDABLE, RANGO DE TEMPERATURA 100 A 400°F.

- **13,04** SUMINISTRO DE MESON DE TRABAJO COCINA: MESÓN SUPERFICIE Y ENTREPAÑO EN LAMINA CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE. PATAS Y CHAMBRANA EN TUBERÍA DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18. MEDIDAS: 50 CM DE ANCHO X 84 CM DE ALTO X 150 CM DE LARGO.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

- **13,05** SUMINISTRO CONTENEDOR ISOTÉRMICO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS 86 LTS CON 3 AZAFATES FULL X 15 CM DE ACERO INOXIDABLE Y BASE CON RUEDAS.

- **14,29** SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA TIPO AMERICANA 474 CM DE LARGO X 80 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTO, EN ACERO CALIBRE 18 REF 430.

- **14,30** SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 32" TRIFASICO CON TRANSMISION DE POLEAS Y CORREA MOTOR DE 4 HP.

- **14,31** SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA GALVANIZADA 40X40 CALIBRE 22 CON FLANCHE.

- **14,32** SUMINISTRO E INSTALACION TRANSICION PARA ANCLAJE DE EXTRACTOR.

- **14,33** SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO TIPO ISLA DE 290CM DE LARGO X 140CM DE FONDO Y 85 CM DE ALTO CON PISO Y ENTREPAÑO, TODA EN ACERO CALIBRE 18 REF 304.

- **14,34** SUMINISTRO E INSTALACION MESÓN DE TRABAJO PLEGABLE ACERO CALIBRE 18 REF 304 DEN 150 DE LARGO X 50 DE ANCHO CON FIJACIONES PARA PARED.

Esta aprobación se emite con base en la verificación de que los equipos cumplen con las características técnicas especificadas. Es importante mencionar que, durante el proceso de instalación de los equipos, la interventoría realizará una verificación exhaustiva para asegurar que todos los equipos se encuentren en óptimo estado estético y funcional. Esta revisión es fundamental para garantizar la calidad y el buen funcionamiento de las instalaciones.

Atentamente.



LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 05 de julio de 2024 **OFICIO N° 0029**

Señor:
WRUSSY INGENERIOS S.A.S
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA”**

Asunto:	**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA Y REQUERIMIENTO DE CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.**

Cordial saludo

El propósito de este comunicado es informarle sobre el estado actual de la obra "Comedor Industrial" y solicitar la corrección inmediata de varias deficiencias detectadas durante la visita de supervisión realizada el 03 de junio de 2024. Durante esta visita, se observó un avance significativo en la obra, pero también se identificaron varios aspectos que requieren atención urgente para asegurar que se cumplan los estándares de calidad y el cronograma establecido.

A continuación, detallamos las observaciones que requieren su atención urgente:

1. **Remates de Enchapes Cerámicos Exteriores:** Se observaron remates deficientes que necesitan ser corregidos ya que estos presentan desprendimiento y ausencia de uniformidad, tal como se evidencia en la siguiente fotografía.

	
Ausencia de uniformidad en los remates-enchape exterior	Desprendimiento de piezas cerámicas-enchape exterior.

	
Ausencia de remate entre acabados-enchape interior.	Ausencia de remate entre acabados-enchape interior.

2. **Remates de Piso en Concreto y Frisos Instalados:** Los acabados del piso de concreto y los frisos no son satisfactorios y requieren mejoras para cumplir con los estándares de calidad, ya que se evidencia que los remates no se encuentran terminados en su totalidad y los que están culminados carecen de uniformidad.

	
Remates no terminados y/o deficientes	Remates no terminados y/o deficientes

UT. INTERCOMEDOR ITSI

	
Remates no terminados y/o deficientes	Remates no terminados y/o deficientes

3. **Pintura de la Estructura:** La pintura de la estructura, que es uno de los elementos más destacados del comedor, presenta suciedad de potasa y mezcla de friso, lo cual afecta significativamente su presentación. Es imperativo realizar un acabado adecuado para mantener la apariencia y la calidad esperadas.

	
Estructura cubierta parcialmente de mezcla de friso	Estructura cubierta parcialmente de mezcla de friso

UT. INTERCOMEDOR ITSI

	
Estructura cubierta parcialmente de mezcla de friso	Estructura cubierta parcialmente de mezcla de friso
	
Pedestal cubierto de concreto	Pedestal cubierto de concreto
	
Pedestal cubierto de concreto	Pedestal cubierto de concreto

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

4. **Cuarto de Máquinas:** Este espacio necesita un mejor acabado ya que quedan muchos elementos a la vista y es necesario mejorar su presentación mediante la aplicación de pintura. Se solicita que se implementen las recomendaciones dadas por la supervisión.

	
Ausencia de acabados y presencia de residuos de mezcla de concreto sobre las tuberías y equipos.	Instalación de tubería EMT de manera inadecuada, no se encuentra anclada.

5. **Unificación de Pintura de la Estructura:** Algunas estructuras presentan acabados en blanco o gris, cuando se especificó un solo tono uniforme. Esto debe ser corregido para cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

	
Remates de pintura deficientes- presencia de oxido sobre el material.	Remates de pintura deficientes- presencia de oxido sobre el material.



presencia de oxido sobre la estructura del cortasol

6. **Vanos de las Ventanas:** Se encontraron vanos sin un acabado unificado y algunos sin frisar, lo que da una mala presentación. Es imperativo completar estos trabajos y asegurar la estética exterior de la obra.



Acabados deficientes



Acabados deficientes

7. **Problemas de Humedad y Acabados de Pintura:** Se identificaron problemas de humedad y burbujas en los acabados de pintura, lo cual se debe a la falta de impermeabilización de la placa de cubierta. La interventoría recomienda iniciar de inmediato con la impermeabilización para corregir esta situación de manera efectiva y salvaguardar la integridad de los elementos estructurales y acabados.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

	
Presencia de humedad en la pintura.	Presencia de humedad en la pintura.

Expuesto lo anterior esta interventoría en cumplimiento del objeto contractual y haciendo uso de sus facultades solicita que todas las observaciones mencionadas sean atendidas de manera expedita para asegurar la finalización de la obra en condiciones adecuadas. A solo dos meses de la fecha de entrega final, es crucial que todas las tareas pendientes sean ejecutadas con la mayor rapidez posible.

Aguardamos su pronta respuesta y la implementación de las acciones correctivas necesaria

Atentamente.

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 26 de junio de 2024 **OFICIO N° 0029**

Señor:
WRUSSY INGENERIOS S.A.S
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.

Ref: Contrato de interventoría N. 0757-23 “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA”**

Asunto:	**SOLICITUD DE APUS ITEMS NO PREVISTOS.**

Cordial saludo,

Con relación al contrato de obra No. 0756-23, y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el mismo, solicitamos respetuosamente la radicación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) correspondientes a los ítems no previstos, necesarios para la ejecución de las actividades adicionales detectadas en el proyecto.

Es fundamental para la adecuada gestión y control del proyecto contar con los APUs detallados, que incluyan la segregación de los costos de materiales, mano de obra, equipos y cualquier otro recurso necesario para la ejecución de dichos ítems. De esta manera, se garantiza la transparencia y el control de los costos asociados a las actividades no previstas inicialmente.

Agradecemos que los APUs sean presentados en el menor tiempo posible a fin de proceder con la revisión y aprobación correspondientes. Cualquier consulta o información adicional requerida, no dude en contactarnos.

Atentamente.

LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0580-WR-2024

Bogotá, 06 de junio de 2024

0085-0756BARRANCA

Señores
Alcaldía de Barrancabermeja
Área jurídica

Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION POLIZAS PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar las pólizas actualizadas a la prórroga al contrato de obra

Anexo:

- POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 10

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0677-WR-2024

Bogotá, 21 de junio de 2024

0087-0756BARRANCA

Señora
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION FICHAS TECNICAS

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia nos permitimos radicar las siguientes fichas técnicas para revisión y aprobación:

Anexo:

- plancha asadora industrial
- Refrigerador vertical una puerta
- Termómetro análogo
- Transición anclaje
- Campana extractora
- Congelador horizontal una puerta
- Congelador horizontal dos puertas
- Contenedor isotérmico
- Ducteria galvanizada
- Estantería industrial
- Estufa industrial un puesto
- Estufa industrial tres puestos
- Extractor tipo hongo
- Lavaplatos acero inoxidable
- Licuadora industrial
- Mesa tipo isla
- Mesón trabajo plegable
- Mesón acero inoxidable
- Molino de carne industrial
- Filtro de agua
- PLANO UBICACIÓN ELEMENTOS

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0697-WR-2024

Bogotá, 26 de junio de 2024

0088-0756BARRANCA

Señores
UT INTERCOMEDOR ITSI
Área jurídica
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: FICHA TÉCNICA MESAS COMEDOR

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia nos permitimos adjuntar la ficha técnica para las mesas del comedor con el objetivo de revisión y aprobación.

Anexos

- Ficha técnica mesas comedor

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0729-WR-2024

Bogotá, 27 de junio de 2024

0089-0756BARRANCA

Señores
Alcaldía de Barrancabermeja
Área jurídica
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACIÓN POLIZAS PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia nos permitimos radicar las pólizas actualizadas a la prorroga al contrato de obra.

Anexos

- POLIZA RCE ANEXO 6
- POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 7

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0755-WR-2024

Bogotá, 03 de julio de 2024

0091-0756BARRANCA

Señores
UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSION ÍTEMS NO PREVISTOS

De la manera más atenta y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencias nos permitimos justificar la inclusión de NPS basado en la ejecución del contrato, anexo a esto se han identificado diversas necesidades esenciales para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las mismas, las cuales se relacionan a continuación:

1.Se hace necesario incluir la instalación de buitrones para el tapado de la tubería PVC de agua lluvia proveniente de la placa de entrepiso. El cual se hace esencial de por motivos de garantizar la higiene del interior de las instalaciones. Los buitrones son hechos en lámina de fibrocemento de 6 mm con estructura anclada a los muros mediante chazos de expansión o tiros, lo cual incluye perfilería y tornillería.

2. Se informó sobre la necesidad del suministro e instalación de dintel en Superboard en lámina de fibrocemento de 6 mm, que incluye la estructura, estuco y pintura. Este ítem se considera fundamental para proporcionar un acabado estético y resistente a la humedad, adecuado para tapar los espacios entre la placa de entrepiso y el cielo raso de pvc, impidiendo a su vez el ingreso de animales al mismo.

3. Para mejorar la iluminación en el área del comedor, se necesita la instalación de luminaria industrial LED High Bay de 150W, ya que esta incluye todo lo necesario para su correcta instalación y se acopla al lugar previsto para su uso cotidiano acorde a las necesidades constantes que esta área necesita. Estas luminarias son cruciales para proporcionar una iluminación eficiente y de alta intensidad, mejorando la visibilidad y seguridad en el área de trabajo.

4. se hace necesario la instalación de enchape de muros para zonas húmedas y cocina con azulejos de formato 60x30 y brecha color blanco, en los marcos de las puertas, filos y buitrones. Este tipo de acabado es fundamental para asegurar la higiene, facilidad de limpieza y resistencia a la humedad, manteniendo condiciones sanitarias óptimas en áreas de alta exposición a la humedad.

5. Para la duración y protección de la estructura metálica se hace necesario la aplicación de mortero Grouting para los pedestales, especificado con dimensiones que van desde 0.30m x 0.30m hasta 0,60m x 0,60m y un espesor máximo de 8 cm, esencial para asegurar la estabilidad y resistencia de los pedestales y la estructura metálica.

6. Para la correcta instalación de las lámparas de 60x60 de acuerdo al cielo raso exigido en el contrato (cielo raso el pvc) , se necesita del suministro e instalación de marcos en aluminio de 60x60 cm en color blanco. Estos marcos son importantes por su durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento, proporcionando una estética limpia y moderna.

7. Finalmente, se resalta la crítica necesidad de la impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable para evitar filtraciones y contaminación, asegurando así la salubridad y calidad del agua almacenada.

8. Para controlar las fisuras y los movimientos que generan las tensiones producidas en el interior de las losas de concreto de los andenes, se recurre a la construcción de juntas de dilatación para controlar los movimientos generados por las tensiones. Dichas dilataciones son cortes rectos en las losas de concreto lo cual va a generar una extensión de su vida útil proporcionando seguridad y confort a los transeúntes que circulen por esta área.

9. Para la tubería de rebose del tanque de almacenamiento de agua potable, se hace necesario instalar una válvula anti-retorno de 2” cuya función es evitar el ingreso de agua contaminada de la caja de inspección a la cual se conecta dicha tubería.

10. Para la terminación del enchape de piso en cerámico color según la arquitectura formato 33.8x33.8 brecha color gris, se hace necesario la instalación de este en los guardas escobas para evitar daños en los muros por humedad y mantener así una homogeneidad en el proyecto.

11. se realiza la propuesta del mesón para lavamanos debido a que el contractual podría verse afectado por taponamientos, ya que por su geometría es susceptible a que se almacenes la suciedad y se obstruya.

Quedamos atentos a la respuesta.

Anexo:

- APUS NO PREVISTOS
- COTIZACIONES

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
JUNIO 2024	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**360**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** , a la(s) que se le realizaron **18** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000588 de julio de 2023. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la certificación emitida por **PURIFIC SAS**

Dada en Barrancabermeja a los 05 días del mes de julio de 2024.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1.8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME DE OBRA Nro.16

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME DE OBRA Nro.16

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE JUNIO DE 2024 – 05 DE JULIO DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5. Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 8
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 9
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas 9
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 10
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 10
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 10
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 10
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 11
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada.

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.16 correspondiente con fecha desde el 06 DE JUNIO DE 2024 – 05 DE JULIO DE 2024, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

2. INFORMACION DEL PROYECTO


2.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN



MACROLOCALIZACIÓN

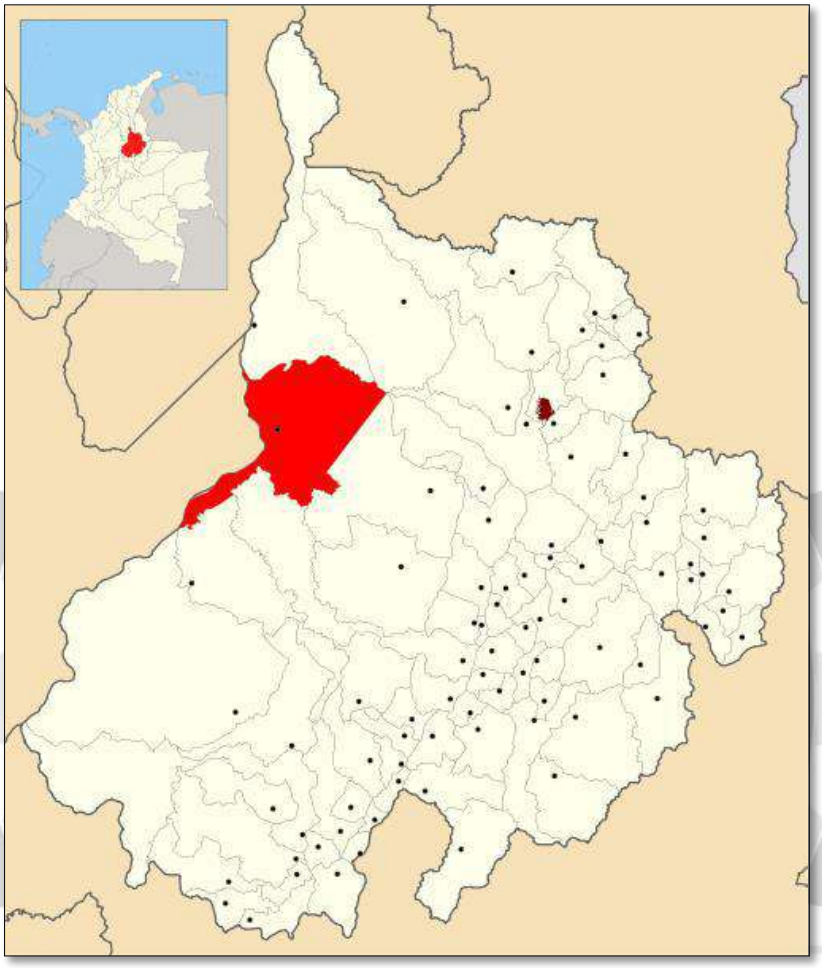

2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso,

permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**"**

2.3.3. Contratista

El contratista es WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024.

- Se tramito ante la secretaria de infraestructura una solicitud de adición en plazo por 30 días, la cual fue aprobada el día 28 de febrero del 2024 y empezó a regir a partir del día 5 de marzo del 2024.
- El día 4 de abril del 2024 se solicitó una adición en plazo #2 por un periodo de 30 días.
- El día 3 de mayo del 2024 se realiza suspensión del contrato de obra.
- El día 10 de mayo del 2024 se realiza una adición en plazo #3.
- El día 31 de mayo del 2024 se realiza una adición en plazo #4.

2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

El dia 31 de mayo del 2024 se realizó una adición en valor al contrato de obra

por un valor de MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE **($1.389.880.309,00)**

El total de la inversión es de CINCO MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($5.073.942.869,88)**.

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	05 de Junio de 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*10/03/2025*	$1.014.788.574,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*10/09/2027*	$507.394.287,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$1.014.788.574,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*10/09/2024*	$520.000.000,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Jorge Reyes Serrano	Guarda de seguridad

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1
Camión tipo mixer	2
Bomba estacionaria	1
Rana compactadora	1
Martillo demoledor	1

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Replanteo y movimiento de tierra para posterior fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.
- Instalación de malla electrosoldada y fundida de andenes y rampa de acceso al comedor.
- Funcionarios de VANTI S.A E.S.P, realizan instalación de regulador de primera etapa.
- Demolición de escombro en muro de cerramiento principal.

- Construcción de caja de inspección para trampa de grasas de 1000 litros.
- Se realiza aplicación de mortero impermeabilizado en la sala de operaciones.
- Se realiza corte de juntas de dilatación en las placas de los andenes.
- Visita técnica en la obra por parte del proveedor de los gasodomesticos y demás equipos.
- Funcionarios de VANTI S.A E.S.P realiza instalación del medidor, certificación de red interna y puesta en marcha del servicio.
- Se realiza instalación de marco y tapa del tanque de agua potable.
- Se realiza excavación y aplicación de solado para posterior instalación de cárcamos prefabricados en concreto.
- Instalación de cárcamos en concreto prefabricado.
- Instalación de bajante de canal de agua lluvia de la cubierta.
- Se realiza retiro de material sobrante, escombros y reconformación del área de trabajo.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
24 de Octubre del 2023	ACTA PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Octubre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
19 de Diciembre del 2023	ACTA PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
20 de Diciembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
26 de Diciembre del 2022	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.02	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Diciembre del 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Febrero del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Febrero del 2024	ADICIONAL No.01 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Marzo del 2024	ACTA PARCIAL Nº4	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
04 de Abril del 2024	ADICIONAL No.02 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
03 de Mayo del 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
08 de Mayo del 2024	ACTA DE REINICIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10 de Mayo del 2024	ADICIONAL No.03 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
31 de Mayo del 2024	ADICIONAL No.04 EN PLAZO Y EN VALOR Nº1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe no se tramitaron actas de recibo parcial.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se tramitaron actas de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra.

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se realizaron actividades de orden jurídico.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido en este informe se realiza el replanteo y fundida de andenes en concreto de 3000 PSI.
- Durante el periodo de tiempo que comprende este informe, VANTI S.A E.S.P realiza certificación de la red interna de gas, instalación de regulador de primera etapa, medidor y puesta en marcha del servicio.
- Se realiza retiro de material sobrante y escombros de toda la obra, adicional se realiza orden y aseo general quedando la obra totalmente limpia y despejada.



ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS NIT:901.109.885-1

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	21/06/2024	77732003	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	21/06/2024	77732003	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACIÓN:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-06-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29924091
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29924091
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 56.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.000	$ 854.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732114	$1.919.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.700	0		0		0	0	0	0	34.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.200	0		0		0	0	0	0	58.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	557.000	0	0	0	0	0	0		557.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	389.900				389.900	0	0	389.900			3.899	389.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	224.100	0	0	224.100	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	224.100	224.100
Pensión	2	1.081.700	1.081.700
Riesgos Laborales	1	389.900	389.900
CCF	1	224.100	224.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.919.800	1.919.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732114	$1.919.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-11	866.667	5	60.400	CCF38	866.667	34.700	0	0	0	0	0
2	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS002	433.334	0	14-11	433.334	5	0	CCF38	433.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
4	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.453.334	232.600	0	0	0	0	EPS005	1.453.334	58.200	14-11	1.453.334	5	101.200	CCF38	1.453.334	58.200	0	0	0	0	0
5	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S									X								230301	726.667	116.300	0	0	0	0	EPS005	726.667	0	14-11	726.667	5	0	CCF38	726.667	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77730545	$1.622.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.800	0		0		0	0	0	0	1.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	91.300	0		0		0	0	0	0	91.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.800	0		0		0	0	0	0	114.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	365.200	0	0	0	0	0	0		365.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	465.900	0	0	0	0	0	0		465.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	361.700				361.700	0	0	361.700			3.617	361.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	221.300	0	0	221.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	207.900	207.900
Pensión	2	831.100	831.100
Riesgos Laborales	1	361.700	361.700
CCF	1	221.300	221.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.622.000	1.622.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77730545	$1.622.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X								230201	2.282.057	365.200	0	0	0	0	EPS005	2.282.057	91.300	14-11	2.282.057	5	158.900	CCF38	2.282.057	91.300	0	0	0	0	0
2	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S		X						X								25-14	2.867.858	458.900	0	0	0	0	EPS037	2.867.858	114.800	14-11	2.867.858	5	199.700	CCF38	3.203.480	128.200	0	0	0	0	0
3	CC	91443395	REYES SERRANO JORGE	1	0			S	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF38	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7929154376**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	755168452

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732021	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732021	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5.9. INFORME HSE DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

INFORME SST 16

PERIODO: 06 JUNIO 2024 - 05 JULIO 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4
2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4
2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11
2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 11
2.2.2. INSPECCIONES 11
2.2.3. ACCIDENTALIDAD 12
2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 12
2.2.5. INDICADORES 12
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 17
4. CONCLUSIONES 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación Charlas 9
Tabla 3. Programación Pausas activas 10
Tabla 4. COPASST 11
Tabla 5. CCL 11
Tabla 6. Permisos de trabajo 11
Tabla 7. Programación inspecciones 12
Tabla 8. Brigada de emergencias 12

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024,,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
WILVER RUSSY LADINO	80.212.380	DIRECTOR DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
KAREN SALAMANCA ROJAS	1.057.588.784	RESIDENTE HSEQ	06/03/2023		**ACTIVO**
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ	1,098,754,093	RESIDENTE DE OBRA	09/03/2023		**ACTIVO**
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO	37,712,004	INSPECTOR HSE	15/03/2023		**ACTIVO**
YESENIA ALVAREZ MORALES	1,096,226,349	PROFESIONAL SOCIAL	09/03/2023		**ACTIVO**
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1,096,242,479	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	23/03/2024	**INACTIVO**
HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1,096,212,001	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	27/032024	**INACTIVO**
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13,565,252	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
ALFONSO VERGARA	78.323.568	MAESTRO DE OBRA	23/05/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.338	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	26/11/2023	**INACTIVO**
DOMINGO MORA	13.568.501	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELKIN REYES	1.096.218.748	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023		**ACTIVO**
GUSTAVO BUITRAGO	1.005.179.912	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	01/07/2023	**INACTIVO**
ISNARDO DE JESUS MORENO	1.096.248.874	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	15/09/2023	**INACTIVO**
JAIR CARPIO	1.096.253.724	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	OFICIAL DE OBRA	26/05/2023	09/12/2023	**INACTIVO**
ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ	94.265.684	OFICIAL DE OBRA	27/06/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
MARIO FONTALVO PEREZ	8.572.679	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
DEIBY CARPIO AGUDELO	1.001.814.868	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS	1.050.918.199	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
WILMAR ORTIZ MENDOZA	79.392.925	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	30/09/2023	**INACTIVO**
MANUEL ARTURO BANDERA	12.400.740	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
JUAN MIGUEL PEREZ FERRER	8.572.227	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
ANDRES APONTE BERGAÑO	1.016.093.871	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
EDILBERTO LERMA SOTO	1.014.265.807	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**

RONNY REYES CISNEROS	1.235.891	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	INACTIVO
ALEXANDE ESCOBAR GUEVARA	77.159.168	INSTALADOR	21/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
JUAN MANUEL HERAS DE LA HOZ	1.083.435.187	INSTALADOR	20/10/2023	25/11/2023	INACTIVO
YERSON MARTINEZ	88.217.901	VIGILANTE	20/11/2023	30/05/2024	INACTIVO
ANGEL GOMEZ	1.002.322.043	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
CESAR CASTILLO	1.096.250.390	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
EDGAR POLO	1.126.255.189	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
JAVIER ESPITIA	80.282.429	ARQUITECTO	02/01/2024		ACTIVO
JHON ZAMORA	1.096.228.666	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
LUIS LIZCANO	3.132.569	INSTALADOR	02/01/2024		ACTIVO
WILLINTON ORTIZ	91.443.547	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
YEISON NAVARRO	1.128.047.356	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	INACTIVO
ANTONIO GUIO	80.770.814	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
DANILO NOVA FORERO	1.005.179.957	GAS LOGISTICA DE LA NACIÓN	19/01/2024		ACTIVO
DAVID ZAMBRANO	9.142.543	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
DIOMEDES GARCIA	7.997.109	ENCHAPES	01/02/2024		ACTIVO
EDWARD SARMIENTO	1.018.498.751	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	INACTIVO
EDWIN TILANO	91.443.072	ENCHAPES	31/01/2024		ACTIVO
HECTOR ACOSTA	8.695.125	SOLDADOR	11/01/2024	20/01/2024	INACTIVO
JORGE REYES SERRANO	91.443.395	VIGILANTE	31/05/2024		ACTIVO

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)

- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 2.**

2.1.2.3. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, se programaron 24 charlas y se ejecutaron 24, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 2. Programación Charlas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/06/2024	06/06/2024	CUMPLE	Preparación de los trabajos	1	100%
07/06/2024	07/06/2024	CUMPLE	Como prevenir el estrés por calor	1	100%
08/06/2024	08/06/2024	CUMPLE	Riesgos para la salud	1	100%
11/06/2024	11/06/2024	CUMPLE	Causas de accidentes	1	100%
12/06/2024	12/06/2024	CUMPLE	Medidas preventivas	1	100%
13/06/2024	13/06/2024	CUMPLE	Protección de la vista	1	100%
14/06/2024	14/06/2024	CUMPLE	Primeros auxilios	1	100%
15/06/2024	15/06/2024	CUMPLE	Cerramiento	1	100%
17/06/2024	17/06/2024	CUMPLE	Posturas de pie y sentado	1	100%
18/06/2024	18/06/2024	CUMPLE	Medidas de seguridad	1	100%
19/06/2024	19/06/2024	CUMPLE	Protección de manos y pies	1	100%
20/06/2024	20/06/2024	CUMPLE	El compromiso con mi vida	1	100%
21/06/2024	21/06/2024	CUMPLE	Los accidentes son advertencia	1	100%
22/06/2024	22/06/2024	CUMPLE	Hoy no es lo mismo que ayer	1	100%
24/06/2024	24/06/2024	CUMPLE	Los avisos tienen un significado	1	100%
25/06/2024	25/06/2024	CUMPLE	No maltrate sus manos	1	100%
26/06/2024	26/06/2024	CUMPLE	Todo es cuestión de actitud	1	100%
27/06/2024	27/06/2024		Es ud un corre riesgo		
28/06/2024	28/06/2024	CUMPLE	Cuando ocurre un accidente	1	100%
29/06/2024	29/06/2024	CUMPLE	La seguridad es cosa personal	1	100%
02/07/2024	02/07/2024	CUMPLE	Que es un incendio	1	100%
03/07/2024	03/07/2024	CUMPLE	Autocuidado, una actitud	1	100%
04/07/2024	04/07/2024	CUMPLE	Peligro en la conducción	1	100%
05/07/2024	05/07/2024	CUMPLE	Uso de protección respiratoria	1	100%
				24	**100 %**

ANEXO 3: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.4. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los

días laborales, donde en periodo se ejecutaron 24 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 3. Programación Pausas activas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/06/2024	06/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
07/06/2024	07/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
08/06/2024	08/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
11/06/2024	11/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
12/06/2024	12/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
13/06/2024	13/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
14/06/2024	14/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
15/06/2024	15/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
17/06/2024	17/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
18/06/2024	18/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
19/06/2024	19/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
20/06/2024	20/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
21/06/2024	21/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
22/06/2024	22/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
24/06/2024	24/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
25/06/2024	25/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
26/06/2024	26/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
27/06/2024	27/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
28/06/2024	28/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
29/06/2024	29/06/2024	CUMPLE	1	1	100%
02/07/2024	02/07/2024	CUMPLE	1	1	100%
03/07/2024	03/07/2024	CUMPLE	1	1	100%
04/07/2024	04/07/2024	CUMPLE	1	1	100%
05/07/2024	05/07/2024	CUMPLE	1	1	100%
			24	24	**100%**

ANEXO 4: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 4. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
03/07/2024	1. Trabajo en condiciones de calor

ANEXO 5: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 5. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
13/06/2024	1. Motivación laboral

ANEXO 6 Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 6. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
ATS	4
Permiso en caliente	4

ANEXO 7 ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos

en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024,** teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 7. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección botiquín	1
Inspección herramientas manuales	2
Inspección pulidora	2

ANEXO 8: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, no se presentaron accidentes laborales.

ANEXO 9: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 8. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
27/06/2024	• Protocolo de incendios

ANEXO 10: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{7} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\boldsymbol{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{7}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024,** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\boldsymbol{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{días\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$


En el periodo de 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, no se presentó ausentismo laboral.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INFORME MENSUAL

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{24}}{\mathbf{24}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

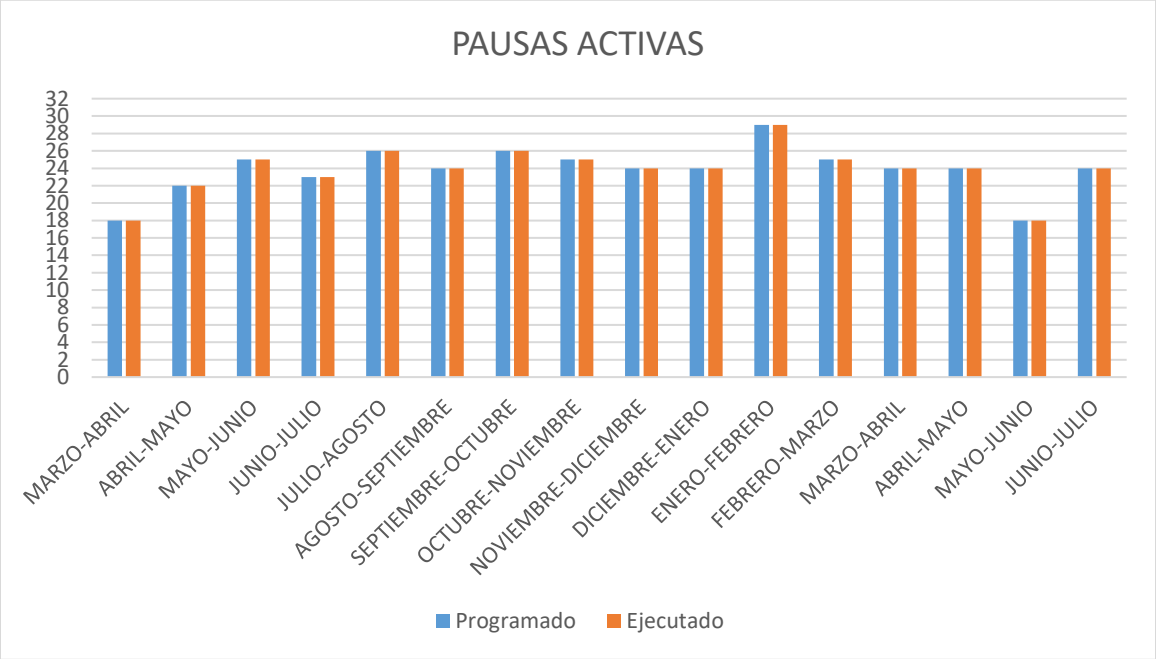


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{24}}{\mathbf{24}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

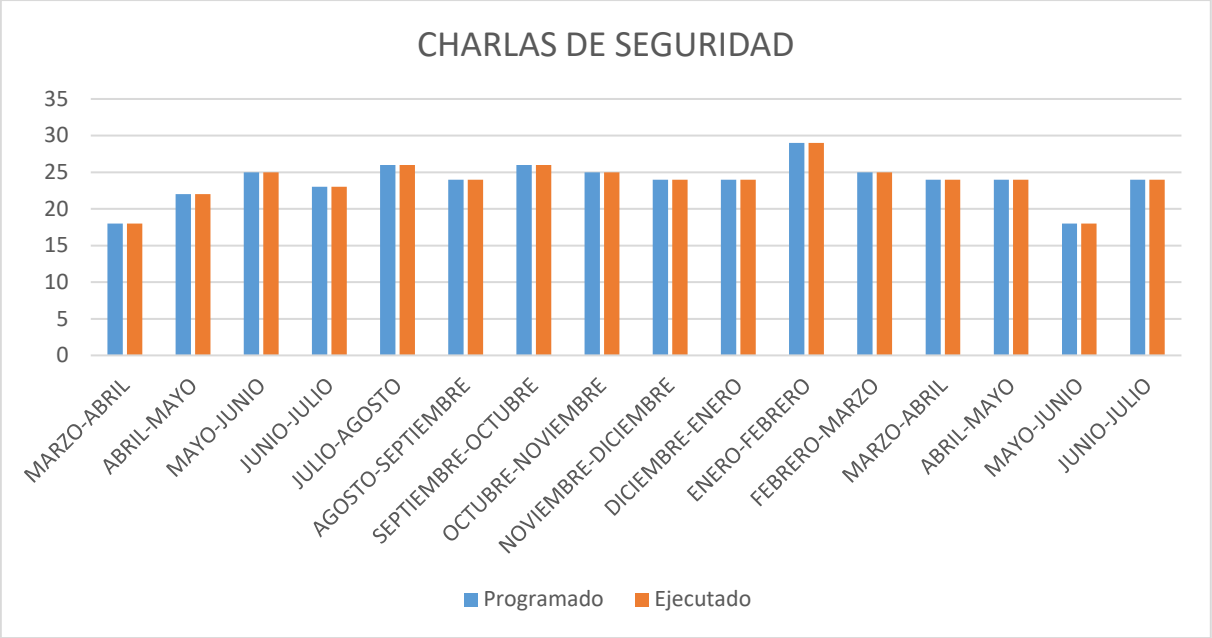


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{\ Reuniones\ \ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$


RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INFORME MENSUAL

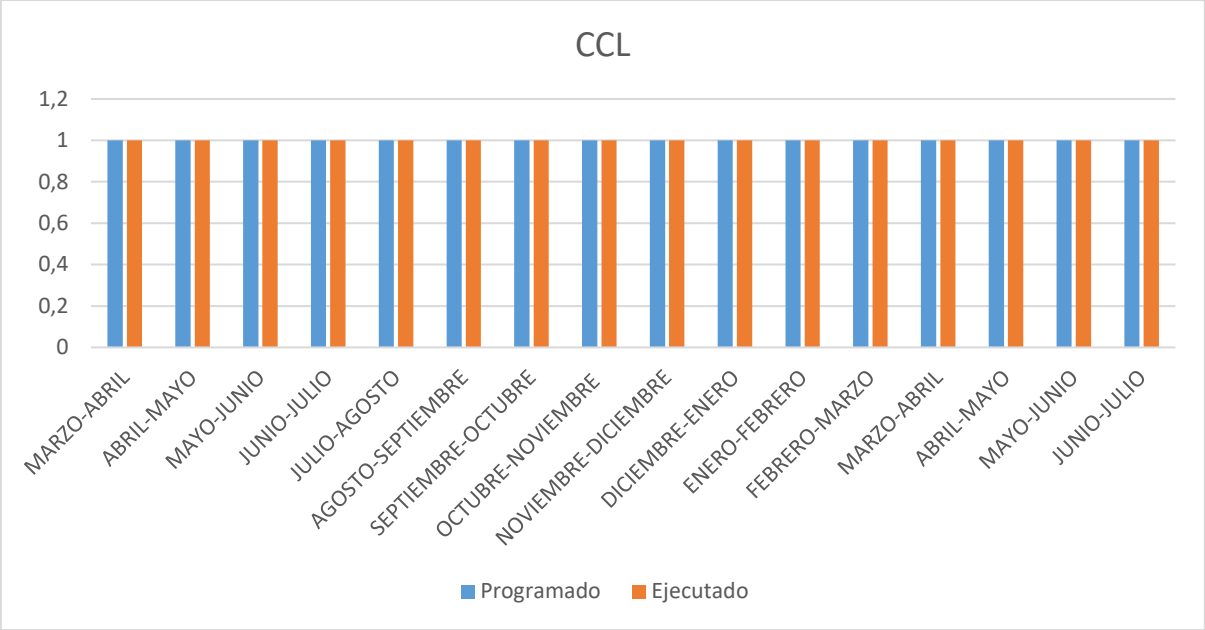

- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

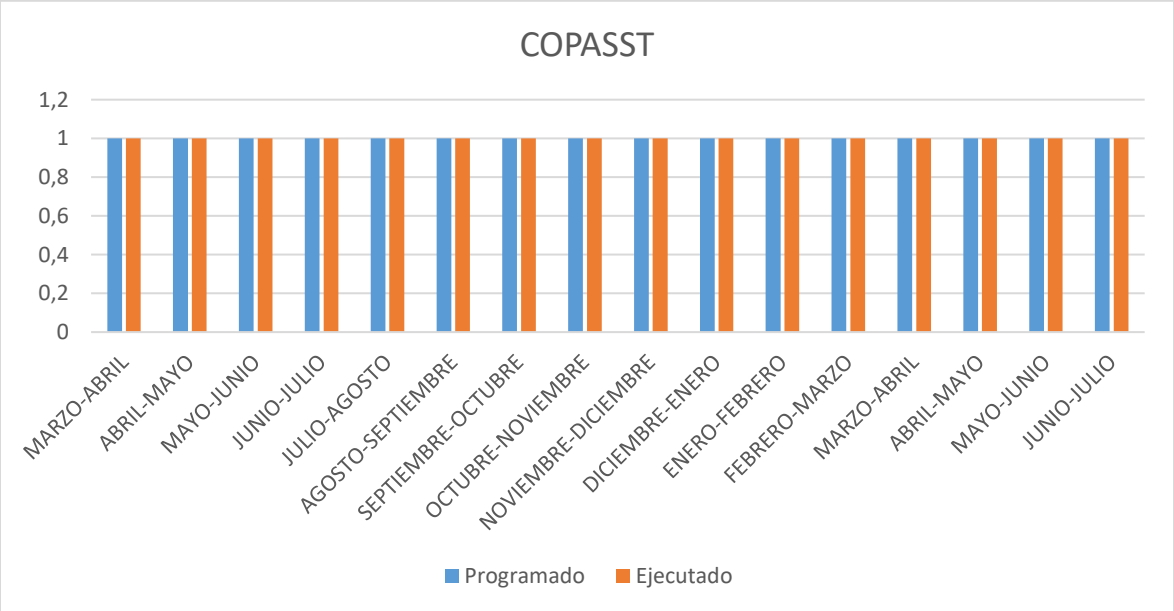

- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

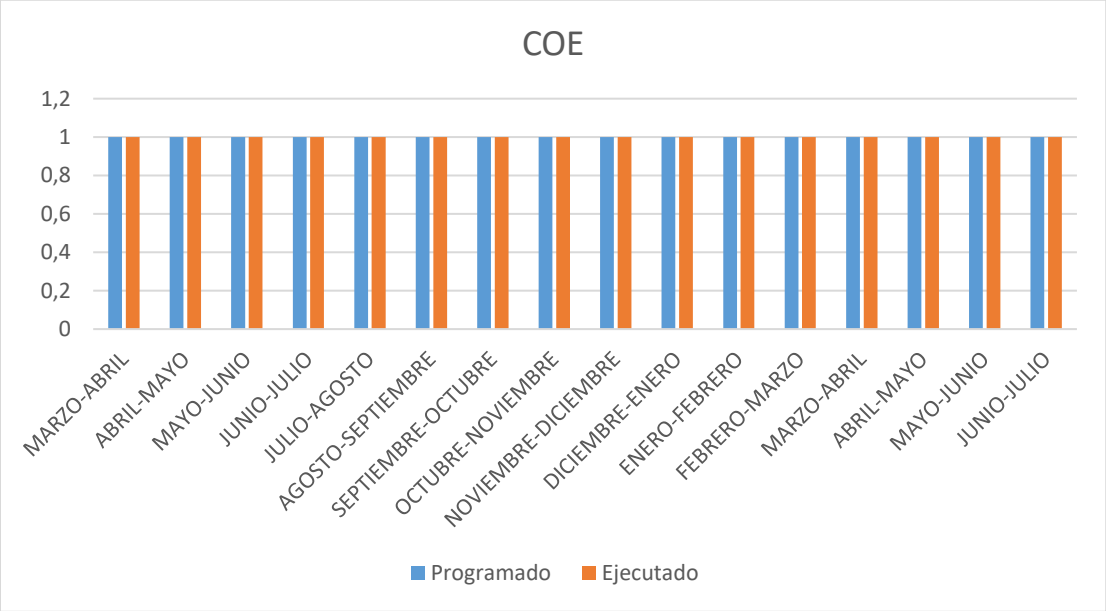

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolución 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolución 223 de 2021 y a la resolución 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 11** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024** se realizó la reunión de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

ANEXO 1. ENTREGA DE EPP

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elkin Reyes	CARGO:	Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta	Elkin Rey.	1	24-04-24.	
2	Gafas Oscuras.	Elkin Rey	1		
3	Guantes vaqueta	Elkin Reyes	1	06-06-24.	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Elkin Rey	CEDULA:	1096218748.

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Milena Santiago	CEDULA No.	37712004.
CARGO	Insp SST	FIRMA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jorge Reyes.	CARGO:	vigilante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Casco		1	01-06-24	Jorge Reyes
2	Bafon		1	01-06-24	Jorge Reyes
3	Guantes		1	01-06-24.	Jorge Reyes
4	botas con puntera.		1	01-06-24.	Jorge Reyes
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jorge Reyes	CEDULA: 9144595

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insps SST	FIRMA	

ANEXO 2. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	21/06/2024	77732003	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y	21/06/2024	77732003	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
IDENTIFICACIÓN:	CC-80212380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-21
FECHA DE PAGO:	2024-06-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29924091
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29924091
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 56.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.000	$ 854.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732114	$1.919.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.700	0		0		0	0	0	0	34.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.200	0		0		0	0	0	0	58.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	524.700	0	0	0	0	0	0		524.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	557.000	0	0	0	0	0	0		557.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	389.900				389.900	0	0	389.900			3.899	389.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	224.100	0	0	224.100	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	224.100	224.100
Pensión	2	1.081.700	1.081.700
Riesgos Laborales	1	389.900	389.900
CCF	1	224.100	224.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.919.800	1.919.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732114	$1.919.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-11	866.667	5	60.400	CCF38	866.667	34.700	0	0	0	0	0
2	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S									X								230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS002	433.334	0	14-11	433.334	5	0	CCF38	433.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S																	230201	3.279.000	524.700	0	0	0	0	EPS010	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF38	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0
4	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.453.334	232.600	0	0	0	0	EPS005	1.453.334	58.200	14-11	1.453.334	5	101.200	CCF38	1.453.334	58.200	0	0	0	0	0
5	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S									X								230301	726.667	116.300	0	0	0	0	EPS005	726.667	0	14-11	726.667	5	0	CCF38	726.667	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77730545	$1.622.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.800	0		0		0	0	0	0	1.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	91.300	0		0		0	0	0	0	91.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.800	0		0		0	0	0	0	114.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	365.200	0	0	0	0	0	0		365.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	465.900	0	0	0	0	0	0		465.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	361.700				361.700	0	0	361.700			3.617	361.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	221.300	0	0	221.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	207.900	207.900
Pensión	2	831.100	831.100
Riesgos Laborales	1	361.700	361.700
CCF	1	221.300	221.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.622.000	1.622.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77730545	$1.622.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X								230201	2.282.057	365.200	0	0	0	0	EPS005	2.282.057	91.300	14-11	2.282.057	5	158.900	CCF38	2.282.057	91.300	0	0	0	0	0
2	CC	88217901	MARTINEZ CARRASQUILLA YERSON	1	0			S		X						X								25-14	2.867.858	458.900	0	0	0	0	EPS037	2.867.858	114.800	14-11	2.867.858	5	199.700	CCF38	3.203.480	128.200	0	0	0	0	0
3	CC	91443395	REYES SERRANO JORGE	1	0			S	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF38	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7929154376**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	755168452

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 370.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732021	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	21/06/2024	77732021	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 3. CHARLAS DE SEGURIDAD

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Preparación de los trabajos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR NARVAEZ	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Lopano	obrero	Rodolfo L	
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	07-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Como prevenir el estres x calor
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: | Entrenamiento: X | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Rojas	obrero	Rodolfo R.	
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CARDIO

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08-06-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Riesgos para la salud.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rodolfo Papelucu	Bloreo		
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	11-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Causas de accidentes
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (causas actuales)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rafael Pajaro	obrero		
6	Fabian perez	obrero		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Medidas preventivas
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	✓	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5		1059218358		
6	Sabas perez.	Ayudante.	Sabas perez.	
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Protección de la vista.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).
Charla Diaria: X	Entrenamiento:	Inducción:	Capacitación: X

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	Otro EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rodolfo Rapalvo	Obrero		
6	Fabian Perez	Tutor para		
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	14-06-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Primeros Auxilios.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE			CARGO		FIRMA		EMPRESA	
1	ELKIN REYES			AYUDANTE		Elkin Reyes		WRUSSY	
2	YESENIA ALVAREZ			TRABAJO SOCIAL		Yesenia Al		WRUSSY	
3	CESAR NARVAEZ			ING. RESIDENTE		CESAR N		WRUSSY	
4	JORGE REYES			GUARDA DE SEGURIDAD		Jorge Reyes		WRUSSY	
5	Rodolfo Perdomo			Obrero		Rodolfo			
6	Fabian Perez			obrero.		Fabian P.			
7									
8									

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	15- 06- 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cerramiento.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (apoyo actual).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Posturas de pie y sentado.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Medidas de seguridad.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Jorge Reyes		Jorge Reyes	
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Proteccion de manos y pies.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas activas).

Charla Diaria: P | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin R	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar N	WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	~~GUARDA DE SEGURIDAD~~		WRUSSY
5	Jorge Reyes	Guarda Seguridad	Jorge Reyes	
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	El Compromiso con mi Vida.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	~~YERSON MARTINEZ~~	~~GUARDA DE SEGURIDAD~~		WRUSSY
5	Jorge Reyes			
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los accidentes son advertencias.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST ¿Pausas activas.

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Hoy no es lo mismo que ayer
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Papalino	obrero	Rodolfo	
6	Fabian Perez	Oficial.	Fabian Perez	
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los avisos tienen un significado
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Guillermo Ponce			
6	Anderson Cox			
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	25-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	No Maltrate sus manos (pausas activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Todo es gestión de actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Es ud un corre riesgo
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	28-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuando ocurre un accidente
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Sandra.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	29-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la seguridad es cosa personal
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Que es una Fractura.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Autoridad una actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasos actuas).
Charla Diaria	X Entrenamiento	Inducción	Capacitación / Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	04-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Peligro en la conducción
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso de protección respiratoria (pausas activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

ANEXO 4. PAUSAS ACTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Preparación de los trabajos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR NARVAEZ	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Lopano	obrero	Rodolfo L	
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	07-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Como prevenir el estres x calor
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Rojas	obrero	Rodolfo R	
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08-06-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Riesgos para la Salud.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rodolfo Papelucu	Blanco		
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	11-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Causas de accidentes
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (causas actuales)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rafael Pajaro	obrero		
6	Fabian perez	obrero		
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Medidas preventivas
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	✓	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5		1059218358		
6	Sabas perez.	Ayudante.	Sabas perez.	
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Protección de la vista.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Rodolfo Rapalino	Obrero		
6	Fabian Perez	Tutor para		
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	14-06-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Primeros Auxilios.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Al	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR N	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Pacheco	Otros	Rodolfo	
6	Fabian Perez	otros.	Fabian P.	
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	15- 06- 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cerramiento.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (apoyo actual).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Posturas de pie y sentado.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Medidas de seguridad.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasan actual)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Jorge Reyes		Jorge Reyes	
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Proteccion de manos y pies.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas activas).

Charla Diaria: ✓ | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	YERSON MARTINEZ	~~GUARDA DE SEGURIDAD~~		WRUSSY
5	Jorge Reyes	Guarda Seguridad		
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	El Compromiso con mi Vida.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE		CARGO		FIRMA		EMPRESA		
1	ELKIN REYES		AYUDANTE				WRUSSY		
2	YESENIA ALVAREZ		TRABAJO SOCIAL				WRUSSY		
3	CESAR NARVAEZ		ING. RESIDENTE				WRUSSY		
4	~~YERSON MARTINEZ~~		~~GUARDA DE SEGURIDAD~~				WRUSSY		
5	Jorge Reyes								
6									
7									
8									

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los accidentes son advertencias.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST Pausas activas.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	
No.	NOMBRE		CARGO		FIRMA		EMPRESA		
1	ELKIN REYES		AYUDANTE				WRUSSY		
2	YESENIA ALVAREZ		TRABAJO SOCIAL				WRUSSY		
3	CESAR NARVAEZ		ING. RESIDENTE				WRUSSY		
4	JORGE REYES		GUARDA DE SEGURIDAD				WRUSSY		
5									
6									
7									
8									

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Hoy no es lo mismo que ayer
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5	Rodolfo Papalino	obrero	Rodolfo	
6	Fabian Perez	oficial.	Fabian Perez	
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	los avisos tienen un significado
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5	Guillermo Fonseca			
6	Anderson Cox			
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	25-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	No Maltrate sus manos (pausas activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Todo es gestión de actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Es ud un cons riesgo
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	28-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuando ocurre un accidente
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIMPLO.

CÓDIGO: FOR-HSE-76	1
VERSION 1	
FECHA APROBACION 01/08/2019	

Fecha:	29-06-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la seguridad es cosa personal
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Que es una Fractura.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Autoridad, una actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	04-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Peligro en la conducción
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-07-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso de protección respiratoria (pausas activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X.				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	Cesar N.	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

ANEXO 5. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 03/07/2024 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 16**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 16- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Trabajo en Condiciones de Calor
2. Factores Externos
3. Desordenes por el Calor
4. Control de la Tensión por Calor

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. TRABAJO EN CONDICIONES DE CALOR

Los objetivos de esta charla son entender los términos "tensión por calor" y "fatiga por calor", para conocer los desórdenes relacionados con el calor y entender los elementos básicos para controlar la tensión por calor.

2. FACTORES EXTERNOS

- Temperatura del aire ambiental.
- Temperatura proveniente de otras fuentes.
- Velocidad del aire.
- Humedad relativa. Factores internos:
- Calor metabólico producido por el cuerpo.
- Temperatura central del cuerpo.
- Ritmo de respiración.
- Aclimatación.

3. DESORDENES POR EL CALOR

• Sarpullido por calor: caracterizado por puntos abultados en la piel.
• Calambres por calor: espasmos musculares, causados porque se reemplaza el agua, pero no la sal.
• Agotamiento por calor: piel viscosa y húmeda; sudoración.
• Ataque por calor: problema de salud serio; alta temperatura central en el cuerpo; piel roja y seca; confusión mental.

4. CONTROL DE LA TENSIÓN POR CALOR

• Reduzca la carga de calor sobre el cuerpo mecanizando oficios, compartiendo el trabajo con otros y aumentando el tiempo de descanso. • Reduzca la carga de calor por irradiación aumentando la distancia de la fuente de calor, aislando la fuente o reflejando el calor.
• Cuando la temperatura del área de trabajo sea de 95°F (35°C) o más, intente disminuir la temperatura del aire, disminuir la velocidad del aire y usar ropa que lo proteja.
• Cuando la temperatura del área de trabajo esté por debajo de 95°F (35°C), intente aumentar la temperatura del aire, incrementar la velocidad del aire y usar menos ropa.
• Aumente la pérdida de calor por evaporación (vía sudoración), incrementando la velocidad del aire y reduciendo la humedad.
• Reduzca cada período de exposición; descanse con frecuencia.
• Utilice un área de descanso con aire acondicionado, con una velocidad de aire bien ajustada.
• Permita que los trabajadores autocontrolen la exposición, basados en signos y síntomas (pero sea cuidadoso).
• Consuma una buena cantidad de agua fría; reemplace los electrolitos según las recomendaciones del personal médico.
• Use ropas que permitan un enfriamiento máximo con sudor mínimo (la ropa holgada es aconsejable).
• Bajo condiciones extremas, puede necesitarse ropa protectora enfriada.
• Eduque a los trabajadores que están expuestos a condiciones de mucho calor

CONCLUSIONES
- Hay muchos factores que influyen sobre las consecuencias de trabajar bajo condiciones de calor. Una planeación apropiada y la implementación de ciertas medidas de control pueden hacer que el trabajo bajo estas condiciones sea mucho más tolerable, desde el punto de vista de la salud.
COMPROMISOS
- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre el trabajo en condiciones de calor

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIt. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Sandra Santiago	Inspectora SST	
Elkin Reyes	Ayudante de Obra	

ANEXO 6. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 13/06/2024 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 16**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 16- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Motivación Laboral

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. La motivación laboral hace referencia a **la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento** y conseguir así, los objetivos empresariales marcados por la organización.

2. La motivación puede ser de diferentes tipos:

Origen de la motivación:

- **Motivación intrínseca:** es la motivación que se genera a partir de factores internos de la persona, como puede ser la propia satisfacción personal del empleado. En este tipo de motivación la empresa no puede influir.
- **Motivación extrínseca**: se trata de aquella motivación laboral que es inducida por elementos externos al sujeto, como un aumento de salario o un reconocimiento público. Es en este tipo de motivación donde la empresa debe actuar, incentivando la motivación del empleado con distintas técnicas que comentaremos más adelante.

Nivel de necesidad

- **Motivación primaria:** cuando la persona actúa para satisfacer sus necesidades básicas.

- **Motivación social:** si la actuación del empleado está provocada por querer estar aceptado por un determinado grupo social

3. Existen muchos factores que pueden influir en la motivación de los trabajadores de la empresa, pero los más visibles son los siguientes:

- **Puesto de trabajo:** este factor de motivación depende del puesto de trabajo que se le ofrezca al empleado, si se encuentra cómodo en él y si puede aspirar a crecer.

- **Autonomía en el trabajo**: dar responsabilidades y permitir la participación y aportación de ideas para que la empresa pueda mejorar con la visión de los empleados. De esta forma, el empleado se sentirá esencial e importante en sus labores dentro de la empresa.

CONCLUSIONES

- La motivación laboral, es un factor determinante dentro de la sociedad, es donde el hombre puede interactuar y obtener satisfacción propia, es donde el mismo descubre retos y pone en juego sus capacidades para mostrar su intelecto y así también donde las organizaciones laborales pueden crecer y dar a conocer grandes equipos laborales

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre la motivación laboral

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elkin Reyes	Ayudante	
Sandra Santiago	Inspectora SST	

ANEXO 7. ATS-PERMISOS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-163 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE INICIO: 03 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 15 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: (W) RUSSY — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Lado IISI. de bco. — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 6

ACTIVIDAD A REALIZAR: Replanteo del area para fundida de placa y anden es, Fundido de placa de contrapiso para andenes,

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2. Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3. Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carneza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	X		X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4. Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5. Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [X]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6. Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7. Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd-mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
03-06-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	1.098.954.093
03-06-2024	7:00 AM - 11:20 AM	91258439	1098954093
06-11-2024	7:00 AM 5:00 pm.	91258434	1098954093
06-12-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	91258434	1098954093
06-13-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	91258439	1098954093
06-14-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	91258434	1098954093
06-15-2024	7:00 AM - 11:30 AM.	91258434	1098954093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

1.098.954.093

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

91258434

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-163 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2019

1. GENERALIDADES

FECHA DE INICIO: 19 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 22 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: Wrussy — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Codigo IIST de bco — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 6

ACTIVIDAD A REALIZAR: Reparteo del area para fundida de placa y anden,

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Hta menores, pulidora,

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2. Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3. Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4. Requerimiento de documentos exigidos (Verificados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5. Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [X]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6. Advertencias (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7. Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
06-17-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	91258439	ESARONO 1098754093
06-18-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	ESARONO 1098754093
06-19-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	ESARONO 1098754093
06-20-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	ESARONO 1098754093
06-21-2024	7:00 AM - 5:00 PM.	91258439	ESARONO 1098754093
06-22-2024	7:00 AM - 11:30 AM	91258439	ESARONO 1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-7	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-103 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 21 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 29 (DIA dd) 06 (MES mm) 2024 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: WRUSSY — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Diego FIRI de boca. — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalacion de cercamos prefabricados en concreto, Replanteo y movimiento de tierra con maquinaria y volquetas, instalacion de bordillos en concreto.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas menores, Maquinaria, Volquetas, pulidora.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	NA
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y piso?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos mínimos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [X]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
24-06-24	7:00 AM – 5:00 PM	4128439	1098754093
25-06-2024	7:00 AM – 5:00 PM	4128439	1098754093
26-06-2024	7:00 AM – 5:00 PM	4128439	1098754093
27-06-2024	7:00 AM – 5:00 PM	4128439	1098754093
28-06-2024	7:00 AM – 5:00 PM	4128439	1098754093
29-06-2024	7:00 AM – 11:30 AM	4128439	1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

CC: 1098754093

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [NO] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

4128439

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 02 (DIA dd) 07 (MES mm) 2024 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 06 (DIA dd) 07 (MES mm) 2024 (AÑO aa)
EMPRESA EJECUTORA: Russy — Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Colegio ITI de bca. — Nº PERSONAS EJECUTORAS:
ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalacion de cercamos prefabricados en concreto, Replanteo y movimiento de tierra con maquinaria y volquetas, instalacion de bordillos en concreto
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Ellan mendez, Maquinaria, volqueta, pulidora.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?			X
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carneza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [ ] NO [X]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

Marque con "X" según aplique

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
02-07-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	1098754093
03-07-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	1098754093
04-07-2024	7:00 AM - 5:00 pm	91258439	1098754093
05-07-2024	7:00 AM - 5:00 PM	91258439	1098754093
06-07-2024	7:00 AM - 5:00 pm	91258439	1098754093
09-07-2024	7:00 AM - 5:00 pm	91258439	1098754093
09-07-2024	7:00 AM - 5:00 PM		

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA	
Fecha de inicio	07-06-2024
Fecha de finalizacion	15-06-2024.

Replanteo del area para fundida de placa, fundida de placa de contrapiso para andenes.

Descripción de la tarea a realizar:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐
CALIENTE	☒		
OTRO, CUAL?	☐		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Elkin Reyes CC. 1096218748	
Rodolfo Rapalino CC. 105222258	
Jorge Reyes 91.443.795.	
Cesar Narvaez CC. 1098.754.693	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pica, barra, pala, carretilla,
Eléctricas	X	pulidora,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Puerta trasera
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, guantes, gafas, botas
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Arena, cemento.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Si.

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
*Peligros Comunes a las actividades del trabajo. *Replanteo de area para Fundida de placa y anclajes *Fundida de placa contrapiso para anclajes.	* Particulas en suspensión Anchazos, laseraciones posturas, Incomodas del trabajo. *Despejar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpe x manipulación de htas y materiales. * Atrapamiento riesgo ergonomico * Sobre esfuerzo x caidas del mismo nivel de objetos *inhalación de particulas de polvo. * Atrapamiento, fracturas golpes, * inhalación de polvo. *Contusiones esguince y Fracturas, * Caidas al mismo nivel y a distintos niveles *Jornada de trabajo extensa *Superficie de trabajo irregulares, Deslizantes con diferentes niveles.	* inspección previamente a la zona de trabajo * inspeccion del area, uso de epp, Capacitación del personal, Sobre el uso de htas. * inspección del area * uso de epp *Divulgación de procedimientos ATS a diario y sus respectivas acciones y controles * Golpes lesiones menores, lesiones oculares * irritación en la piel * uso de tapabocas o mascarilla. * hacer uso adecuado de EPP * Realizar inspecciones	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 17-06-2024.

Fecha de finalizacion 22-06-2024.

Reporteo del area, fundida de placa y anden.

Descripción de la tarea a realizar:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO	
CALIENTE	☒		
OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Elkin Reyes	CC. 1.096.218.748
Rodolfo Rapalino	CC. 1.052.22358
Jorge Reyes	CC. 91.443.395.
Cesar Nonnez.	CC. 1098.754.693

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pica, Barra, pala, Carretilla.
Eléctricas	X	Rotadora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	puerta trasera del colegio
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, guantes, gafas, botas
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP, EPI
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Arena, Cemento, Concapillo,
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
*Peligros Comunes a las actividades del trabajo. * Instalación de cercamos prefabricados en concreto * Replanteo y Movimiento de tierra con Maquinaria y Volqueta. * instalación de bordillos en Concreto prefabricados. * Orden y aseo del área	* Partículas en suspensión pinchazos, laceraciones Posturas incomodas del trabajo. *Despejar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpe x manipulación de htas y materiales *Atrapamiento riesgo Ergonomico. * Sobre esfuerzo x caidas del mismo nivel de objetos. * inhalación de partículas golpes, machucones. * inhalación de partículas de polvo * Atrapamiento, fracturas golpes. * inhalación, de polvo * Contusiones Esguince y Fracturas. * caídas al mismo nivel y a distintos niveles * Jornada de trabajo extensa * Superficie de trabajo irregulares. * limpieza y orden en el area.	*Inspección previamente a la zona de trabajo * Inspección del area uso de epp, capacitación del personal Sobre el uso de htas * Inspección del area * uso de epp * Divulgación de procedimientos ATS asociado y sus Respectivas acciones y controles * Golpes lesiones menores, lesiones oculares * irritación en la piel. * uso de atrapamiento * uso de tapabocas o mascarillas *hacer uso adecuado de Epp * Realizar inspecciones.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 24-06-2024.

Fecha de finalizacion 29-06-2024.

Descripción de la tarea a realizar:

Instalacion de cercamos prefabricados en concreto, Replanteo y Movimiento de tierra con maquinaria y Volqueta, Instalacion de bordillos en concreto.

Htas menores, Maquinaria, volqueta, pulidora.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐
CALIENTE	☒		
OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Elkin Reyes CC. 1.096.218.748.	
Robbipo Rapalmo CC. 1.052.22358.	
Jorge Reyes CC. 91.443.395.	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pica, Barra, pala, Carretilla.
Eléctricas	X	pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	X	Pajonta. Volqueta.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	puerta trasera del colegio
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	(casco, guantes, gafas, botas
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP, EPI
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Arena, Cemento, Concayillo,
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
*Peligros Comunes a las actividades del trabajo. * Instalación de cargamos prefabricados en concreto * Replanteo y Movimiento de tierra con Maquinaria y Volqueta. * Instalación de Bordillos en Concreto Prefabricados. * Orden y aseo del área	* Particulas en suspensión pinchazos, laseraciones Posturas incomodas del trabajo. *Despejar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpe x manipulación de htas y materiales *Atrapamiento riesgo Ergonomico. * Sobre esfuerzo x caidas del mismo nivel de objetos. * Inhalación de particulas golpes, machucones. * Inhalación de particulas de polvo * Atrapamiento, fracturas golpes. * Inhalación, de polvo * Contusiones Esguince y Fracturas. * caidas al mismo nivel y a distintos niveles * Jornada de trabajo extensas * Superficie de trabajo irregulares. * Limpieza y orden en el area.	* Inspección previamente a la zona de trabajo * Inspección del area uso de EPP, capacitación del personal sobre el uso de htas * Inspección del area * uso de EPP * Divulgación de procedimientos ATS actividad y sus respectivas acciones y controles * Golpes lesiones menores, lesiones oculares * irritación en la piel. * uso de atrapamiento * uso de tapabocas o mascarillas *hacer uso adecuado de EPP * Realizar inspecciones.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 02-07-2024.

Fecha de finalizacion 06-07-2024.

Instalación de cercamos prefabricados en concreto, Replanteo y movimientos de tierra con maquinaria y volquetas, instalación de bordillos en concreto.

Descripción de la tarea a realizar:

Hfon menores, Maquinaria. Volqueta, pulidora.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA		ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Elkin Reyes	CC. 1.096.218.748
Rodolfo Rapalno	CC. 1052223758
fabian perez	CC. 1072750684.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Picas, Barra, pala Carretilla.
Eléctricas	X	pulidoras
Neumáticas		
Hidráulicas	X	pajarita.
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	puerta trasera del colegio
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, guantes, gafas, botas, EPP, EPI
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Arena, Cemento, Concapillo,
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	SI
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
*Peligros Comunes a las actividades del trabajo. * Instalación de Sardineles prefabricados en concreto * Replanteo y Movimiento de tierra con Maquinaria y Volqueta. * Instalación de Bordillos en Concreto prefabricados. * Orden y aseo del área	* Partículas en suspensión pinchazos, laceraciones Posturas incomodas de l trabajo. *Despejar el area de trabajo caidas al mismo nivel, golpe x manipulación de herramientas y materiales *Atrapamiento riesgo Ergonomico. * Sobre esfuerzo x caidas del mismo nivel de objetos. * Inhalación de partículas golpes, machucones. * Inhalación de partículas de polvo * Atrapamiento, fracturas golpes. * Inhalación, de polvo * Contusiones Esguince y Fracturas. * caídas al mismo nivel y a distintos niveles * Jornada de trabajo extensas * Superficie de trabajo irregulares. * Limpieza y orden en el area.	* Inspección previamente a la zona de trabajo * Inspección del area uso de EPP, capacitación del personal Sobre el uso de herramientas * Inspección del area * uso de EPP * Divulgación de procedimientos ATS adecuado y sus Respectivas acciones y controles * Golpes lesiones menores, lesiones oculares * irritación en la piel. * uso de atrapamiento * uso de tapabocas omnicanillas * hacer uso adecuado de EPP * Realizar inspecciones.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

ANEXO 8. INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del Colegio IESA de bajo.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	alcaldía.	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros SAS.	**NIT:**	901098835-1.
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil	Fijo	**Señalización:** Tiene / No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025.	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	**Guantes látex desechables** (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25.	
6	**Tapabocas desechables** (empaque individual)	4	✓		
7	**Monogafas** (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		No hay
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	X		No hay
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	X		No hay
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	X		No hay
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	X		No hay.
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	X		No hay.
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO:	**FECHA DE INSPECCION:** 04-06-2024 / 15-06-2024.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO:	**FECHA DE INSPECCION:**	
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITST.		
N° CONTRATO	0756 - 23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Elkin Ruiz

MES Junio 6 - 2024 / 13 - Junio TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del Colegio ETSI.		
N° CONTRATO	0956-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Adelu Reyes

MES 20-06- / 27-06-2024. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio FIST		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros	NIT	901109885-1

PULIDORA No. OPERADOR Elver Reyes

MES 11-06- al 15-06- 2024. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Elver		Elver		Elver		Elver	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ETDI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros	NIT	9101098851

PULIDORA No. OPERADOR Yeffa Reyes

MES 25-06- al 29-06-2024. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

ANEXO 9. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-86
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA: 05 de Junio al 05 de Julio del 2024

UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes de 05 de Junio al 05 de Julio del 2024 no se presentaron accidentes laborales

Empresa	Descripción	Accidentes ocurridos dentro de la jornada laboral				No de accidentes mortales	Días de cargados con dicho accidente a Accidentes Graves	No de accidentes con días cargados	Días de cargados con dicho accidente	No de accidentes sin días cargados	Total de accidentes	Accidentes a terceros con daños				No de personas a cargo	Días perdidos Totales en el mes	Horas hombre trabajadas	Tiempo perdido a causa de accidentes	Indicadores Gestión		Indicadores Gestión	
		Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)								
RUSSY INGENIERIA SAS	001,108,845-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	88, 0.00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	88, 0.00	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

Clasificación laboral	Empresa	Nº de empleados	Tipo de accidentes				Tipo de accidentes sin días cargados	Nº de enfermedad con días cargados	Total de accidentes con días cargados	Tipo de accidentes				Total de accidentes y enfermedades	Total días mes pasado	Total de horas hombre trabajadas	Tiempo perdido a causa de accidentes	Índices de Frecuencia		Índices de Severidad	
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)				Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)								
Directos	RUSSY INGENIERIA SAS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 0.00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88, 0.00	0,0	0,0	0,0	0,0

























Fecha Elaboró:	Revisó y Aprobó:	Vo.Bo:
Maikol Leonardo Salamanca Rueda 1.067.958.754 Director HSEQ	Maikol Leonardo Salamanca Rueda 1.067.958.754 Director HSEQ	William Francisco Rangel Lastra 88.212.880 Gerente General

ANEXO 10. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 27/06/2024	HORA: 9:00 AM	LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA	ACTA NO. 16

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 16- GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Protocolo de Incendios
2. Pasos para seguir en caso de incendio

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Protocolo de Incendios

El desarrollo de un incendio depende en gran medida combustible y del elemento iniciador, siendo su evolución muy diversa en función de las condiciones presentes en cada edificio y el momento de la detección.

2. Pasos para seguir en caso de incendio

- Pasos en caso de incendio
- Mantenga la calma
- Llame al departamento de bomberos
- Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo con el tipo de extinguidor apropiado o por otros medios. No ponga en peligro su seguridad personal.
- No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida.
- Desconecte el equipo eléctrico si está en llamas y si no fuese peligroso hacerlo.
- Notifíquelo a su supervisor y al coordinador de evacuación si fuese posible.
- Evacue la instalación si no puede extinguir el fuego. Ayude a las personas discapacitadas.
- No rompa las ventanas.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

- No abra las puertas que estén calientes (antes de abrir una puerta toque el pomo. Si está caliente o hay humo visible, no la abra)

CONCLUSIONES

- En todo lugar, ya sea hogar, trabajo, empresa, institución, etc., es imprescindible que todas las personas conozcan los elementos básicos sobre lo que es el fuego, su prevención y combate. Solo de esta forma estaremos sentando las bases para prevenir algún siniestro de cualquier tipo, por lo tanto, estaremos previniendo daño alguno para las personas e instalaciones.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre el protocolo de incendios.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elkin Reyes	Ayudante	
Sandra Santiago	Inspectora SST	

ANEXO 11. COVID19

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 08-06-2024

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas? 1. Fiebre mayor a 38 grados?	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor muscular	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas condiciones: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, inmunosupresión, obesidad mórbida (IMC mayor a 40), hipertensión arterial, enfermedad cardiaca, mayor de 60 años, gestante, madre lactante, puérpera?	Aislamiento con otra persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has estado cerca(a) de una persona que sea un caso confirmado de COVID-19?	Observaciones
YESENIA ALVAREZ	1.098.326.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Yesenia
CESAR NARVAEZ	1.098.540.091	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Cesar
SANDRA SANTIAGO	37.713.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Sandra
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Elkin
JORGE REYES	9.144.839		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Jorge Luis

Observaciones (información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIERIA S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 13-06-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, Diabetes mal controlada con corticoides, dislipidemias en el cáncer (hematológico/inmunodeficiencia, cancer de cualquier tipo, cardiopatía o obesidad, desnutrición, hongos, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, hepatopatía, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	FIEBRE		ATENCIÓN TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto		Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?.	ASISTENCIAL	SERVIA	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PROPIO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.099	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 14-06-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago.

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tiroideas, cardiacas, de coagulación, diabéticos o en el sistema inmunológico(inmunosupresión), cancer de cualquier tipo, sobrepeso u obesidad, desnutrición, tuberculosis, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (leucopenia, trasplante previo, lupus, entre otras)?	FIRMA							FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho cercano (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y de cara) durante un periodo de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?,	AUTOMOVIL	BUSETA	A PIE	MOTO	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X					
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X						
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X				
JORGE REYES	9.144.399		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X				

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY MENSAJEROS S.A.S

SANEADO

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 15- Oct 2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, toman medicamentos de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico(inmunosupresión), cancer de cualquier tipo, cobrepeso o obesidad, desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosuprasoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguna persona(s) a confirmada de tener COVID-19?."	MEDIO DE TRANSPORTE					FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratorio	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.849	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.099	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 17-06-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago.

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tienen medicacion de enfermedades, deficiencias en el sistema inmunológico,consumo deficiencia, cancer de cualquier tipo, cualquiera o obesidad, desnutrición, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo transplante previo, hepatic, entre otras)?	FIEBRA		MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratorio	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convivo con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros) y sin usar elementos de protección personal con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?.	AUTOMOVIL	BUSETO	A PIE	MOTO/BTA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.849	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY INGENIEROS S.A.S

FECHA: 13-06-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas autocriticas: enfermedades autoinmunes, daños cardiacos de cualquier tipo, cáncer de cualquier tipo, cefalgeas o dolores de cabeza, desmayos, mareos, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunocomprometidas (embarazo, trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convivir con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días han tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?,	AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.326.949	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	57.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVAEPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
jorge Reyes																					Jorge Reyes

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 19-06-2024

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedad cardiovascular, toma medicación de corticoides, inmunosupresores en el último mes, enfermedad pulmonar crónica, cáncer de cualquier tipo, cirrosis, obesidad, desnutrición, tuberculosis, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (trasplante, transplante previo, lupus, entre otros)?	FIEBRE: Convivió con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días han tenido contacto estrecho por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y de casi asintomático de probable positividad con algún compañero o conocido de tener COVID-19?.	AUTOAISLADO	CASA	A HOSPITAL	RECUPERADO	TRASLADADO DE PUNTO DE TRABAJO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.849	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
HEADON MARTINEZ CORRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVAEPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
Joyce Reyes																			X		Joyce Reyes

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

RUSSY INGENIERO S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 25-06-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes enfermedades autoinmunes, tomar medicación de controlados, deficiencias en el sistema inmunológico(enfermedades renales, cancer de cualquier tipo, enfermedad o vih sida), desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras(incluyendo trasplante previo, lupus, entre otras)?	Convive con otra persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?.	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUS/TPC	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.085	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ANEXO 12. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	06 de Junio de 2024



Descripcion	Actividades de Excavaciones Manuales
Fecha	06 de Junio de 2024



Descripcion	Eliminación de aguas residuales en excavación
Fecha	06 de Junio de 2024



Descripcion	Instalación de conexión para gas natural
Fecha	06 de Junio de 2024



Descripcion	Señalización y uso de extintor como prevención
Fecha	06 de Junio de 2024



Descripcion	Demolición menor y fina
Fecha	06 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	07 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de suelo con maquinaria
Fecha	07 de Junio de 2024



Descripcion	Instalación de cajas de inspección
Fecha	07 de Junio de 2024



Descripcion	Corte de malla electrosoldada
Fecha	07 de Junio de 2024



Descripcion	Adquisición de andamio multidireccional
Fecha	07 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de pasillo con maquinaria
Fecha	07 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Instalación de tapa de cajas de inspección
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Instalación de tapa de cajas de inspección
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Verificación de medidas del área a intervenir
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de material
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024



Descripcion	Armado de comedor de patio
Fecha	19 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de material
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de material
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de material
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de terreno de manera manual
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de terreno de manera manual
Fecha	20 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Verificación de medidas
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Verificación de medidas
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Verificación de medidas
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Remoción de concreto pobre
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Actividades de Orden y Aseo
Fecha	21 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación del terreno
Fecha	21 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	22 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	22 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de sobrepiso para canal
Fecha	22 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de sobrepiso para canal
Fecha	22 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de sobrepiso para canal
Fecha	22 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de sobrepiso para canal
Fecha	22 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	24 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	24 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de materiales
Fecha	24 de Junio de 2024



Descripcion	Fundida de sobrepiso - canal de aguas lluvias
Fecha	24 de Junio de 2024



Descripcion	Fundida de sobrepiso - canal de aguas lluvias
Fecha	24 de Junio de 2024



Descripcion	Fundida de sobrepiso - canal de aguas lluvias
Fecha	24 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de Materiales
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Recepción de Materiales
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Instalacion de Bordillos
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de zanja del canal de aguaslluvias
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de zanja del canal de aguaslluvias
Fecha	25 de Junio de 2024



Descripcion	Instalacion de canal de aguaslluvias
Fecha	25 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de canal de aguuas lluvias
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de canal de aguuas lluvias
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de canal de aguuas lluvias
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Elaboración de canal de aguuas lluvias
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Instalacion de encerramiento
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Instalacion de encerramiento
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Instalación de separador
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de terreno a intervenir
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de terreno a intervenir
Fecha	26 de Junio de 2024



Descripcion	Nivelación de terreno a intervenir
Fecha	26 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	28 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	28 de Junio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	28 de Junio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	28 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	28 de Junio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	28 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	29 de Junio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	29 de Junio de 2024



Descripcion	Vaciado de mezcla para refuerzo
Fecha	29 de Junio de 2024



Descripcion	Vaciado de mezcla para refuerzo
Fecha	29 de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	02 de Julio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	02 de Julio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	02 de Julio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	02 de Julio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	02 de Julio de 2024



Descripcion	Vaciado de concreto
Fecha	02 de Julio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Actividades de Fundida
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Actividades de Fundida
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Actividades de Fundida
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Actividades de Fundida
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Limpieza final de área
Fecha	3 de Julio de 2024



Descripcion	Limpieza final de área
Fecha	3 de Julio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Cargue de material residual
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Remoción de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Charlas y Pausas Activas
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Excavaciones menores
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Excavaciones menores
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Excavaciones menores
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Excavaciones menores
Fecha	04 de Julio de 2024

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

INFORME AMBIENTAL 16

PERIODO: 06 JUNIO 2024 - 05 JULIO 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5

4. COMPONENTE AMBIENTAL 6

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6

4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 8

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 8

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 8

4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 9

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 10

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 10

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 10

4.9. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS 11

5. COMPONENTE SOCIAL 11

5.1. ACTAS DE REUNIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5.2. INFORME SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6. CONCLUSIONES 11

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 9

INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024 se ejecutaron actividades que requerían permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalización preventiva e informativa, además se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Orden y aseo	Orden y aseo
	
Orden y aseo	Orden y aseo
	
Aseo baños	Aseo baños

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME MENSUAL

	
Orden y aseo	Aseo baños
	
Aseo baños	Retiro de escombros
	
Retiro de escombros	Retiro de escombros





Retiro de escombros



4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, se realizaron actividades con referencia a este programa como se evidencia en el registro fotográfico.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, se realizaron retiros de escombro. **ANEXO 6.**

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ \ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{0}{0} * 100 = 0\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	416	416
OCTUBRE-NOVIEMBRE	0	0	0
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0	105	105
DICIEMBRE-ENERO	0	0	0
ENERO-FEBRERO	0	0	0
FEBRERO-MARZO	0	0	0
MARZO-ABRIL	0	0	0
ABRIL-MAYO	0	0	0
MAYO-JUNIO	0	0	0
JUNIO-JULIO	0	232	232
TOTAL	**0**	**1429**	**1429**

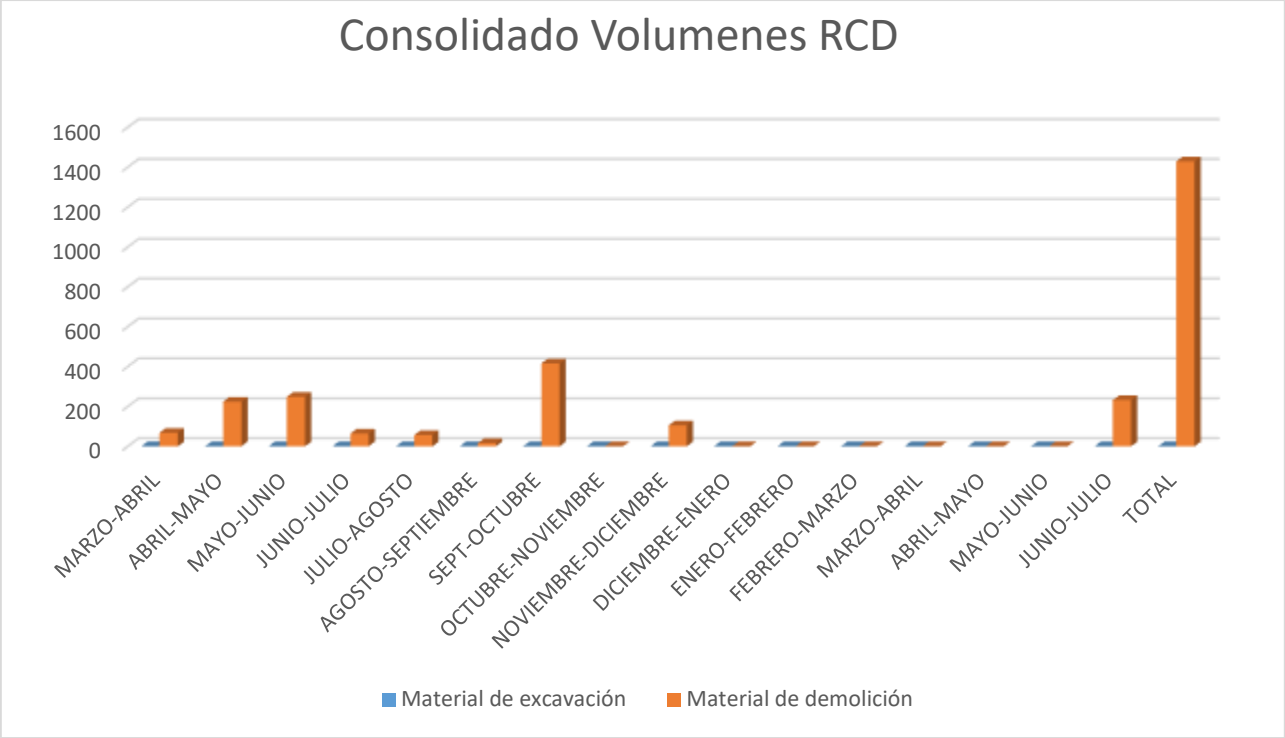

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, se generaron residuos sólidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecológicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recolección la realizó la empresa de servicios públicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos líquidos de los baños **ANEXO 1.**

4.9. REGISTRO DE MATERIALES

Durante el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 2.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se describen las actividades de la gestión social que se realizó en el periodo del 06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de abril 2024 al 05 mayo de 2024, se realizaron reuniones de socialización con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 3**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 4**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de junio 2024 al 05 julio de 2024.**

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

ANEXO 1. CERTIFICADO MANEJO DE VERTIMIENTOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/07/01) - Fecha Servidor: (2024/07/01)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal	
1096212725	

Resumen

Hora: 07:56:49

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06407779, -73.85057008

Servicio realizado

Ok

idea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/07/04) - Fecha Servidor: (2024/07/04)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 09:09:06

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06417159, -73.85053958

Servicio realizado

Ok

idea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/06/06) - Fecha Servidor: (2024/06/06)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal	
1096212725	

Resumen

Hora: 09:19:17

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06407275, -73.85054385

Servicio realizado

Ok

idea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2024/06/20) - Fecha Servidor: (2024/06/20)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor	
Juan Francisco Perez Leiva	
92189988	

Resumen

Hora: 11:56:51

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



CANTIDAD DE LIQUIDOS RECOLECTADOS
40 litros de agua residual

CERTIFICACION

NOMBRE QUIEN RECIBE
no hay personal

CARGO QUIEN RECIBE
no hay personal

FIRMA CLIENTE

UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06403782, -73.85053469

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

idea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/06/24) - Fecha Servidor: (2024/06/24)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 09:01:38

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06408787, -73.85058012

Servicio realizado

Ok

idea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/06/27) - Fecha Servidor: (2024/06/27)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 08:54:50

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06410617, -73.85052834

Servicio realizado

Ok

idea

ANEXO 2. REGISTRO DE MATERIALES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES	CODIGO	HSE-FOR-119
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACION	8/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
13-06-24	ARYSAN	Malla	36 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Cemento	10 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Tubo 4"	3 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Tela verde	1 rollo	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Codos PVC 4"	10 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Semicodo 4"	5 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
13-06-24	ARYSAN	Union 4"	3 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON
02-07-24	ARYSAN	Cemento	15 und	ARYSAN	ESARCON	Si	ESARCON

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

ANEXO 3. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 03/07/2024	HORA: 8:00 AM	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Cesar Narvaez, Wilson Geney.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance de obra
Actividades por ejecutar
Verificación de las actividades ejecutadas

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Avance de obra programado 61.91%
Avance de obra ejecutado 69.76%

Personal en obra contratista
Ing. Residente: 1
Insp. SST = 1
Profesional Social = 1
Obrero = 1
Vigilante = 1
Subcontratista = 5

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Actividades en ejecución.
- Realización de instalación de andenes, cargamos
- Retiro de material resultante de las excavaciones de la obra

En visita realizada por supervisor de obra se observo la necesidad de realizar mejoras en detalles de acabados y pintura de la obra.
En primer lugar se identificaron imperfecciones en la pintura en varias areas como lo son la pintura de la pintura de la estructura metalica, la cual se encuentra cubierta por residuos de concreto; por otra parte se observa que la pintura de los muros se encuentra afectada por la humedad lo cual genero desprendimiento del mismo. Ademas, se observan defectos en los acabados superficiales, tales como superficies mal niveladas, acabados incompletos.

La supervisión recomienda que estos trabajos de mejora se realicen de manera inmediata para esta forma cumplir con los plazos previstos y establecidos

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Wilson Rafael Gomez O.	Inspector	
Cesar O. Narvaez	Ing. Residente RUSSY	
Yesenia Alvarez	Profe-Social	
DISTRIBUIDO ENRIQUEZ M.	SUPERVISOR	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PETICION, QUEJAS Y RECLAMOS	CÓDIGO: DE-FOR-12
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 08/01/2019

PROYECTO	FECHA:

N° CONTRATO	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y dotación del comedor del I.T.S.I del Distrito Especial Bi Bermeja
ENTIDAD	Wkussy Ingenieros S.A.S

MEDIO DE RECEPCION

Escrita	Telefónica	Presencial	Correo	Otra
☒	☐	☐	☐	_____

NOMBRE PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD:	EMPRESA:
Alonso Robles	ITSI

TIPO DE SOLICITUD

Peticion	Queja	Reclamo
☒	☐	☐

Quejas: Manifestación de descontento por parte del cliente referente al servicio acordado

Reclamo: Manifestación de descontento por parte del cliente referente al incumplimiento de lo

DESCRIPCION PQR

Se solicita ayuda con el equipo retroexcavadora que actualmente esta en la obra, para retirar de unidad de la cancha escombro que se encuentran enterrados

PROGRAMACION

Actividades	Fecha de cumplimiento	Nombre y cargo del responsable

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Nombre: Yesenia Alarcon	Nombre: César Narváez	Nombre: César Narváez
Cargo: Profesional Social	Cargo: Ing. Residente	Cargo: Ing. Residente
Firma: Yesenia Alarcon	Firma: CÉSAR O.	Firma: CÉSAR O.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 04/07/2024	HORA: 10:30 AM	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Solicitud Docente Educaciòn Fisica ITSI
TIPO DE REUNIÓN	Peticiòn por parte de docentes
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	

TEMAS DE DISCUSIÓN

Solicitud equipo retrocargador

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Se atiende la solicitud por parte de los Docentes Alonso Robles y Jorge Buendia quienes solicitan ayuda con el equipo retrocargador que se encuentra en obra para ayudar con el retiro ole un area de la cancha escombros que estan enterados, Se hace la salvedad qce la empiesa no se hace responsable por futuros Problemas o inconvenientes qe llegase apresentar el terreno.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Alonso Robles C.	Docente Edu. física	
JOCGE E BOLIVAR	DOCENTE EDUFISICA	
Yesenia Akarei M.	Profesional Social	
Cesar Navarez	Ing. Residente WRUSSY	
Oscar Briceño	Rector	

ANEXO 4. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de junio de 2024 a 06 de julio de 2024	No. Contrato: 0756-23

Actividades Ejecutadas

- **Actas de entorno y de vecindad:**

Actividad ejecutada durante el primer mes de ejecución de la obra.

- **Accesibilidad a viviendas y establecimientos**

La zona por intervenir en un diámetro de 30 metros no contempla alrededor con casas y/o establecimientos que puedan ser afectados por el proyecto.

- **Caracterización social**

Actividad ejecutada durante el primer y segundo mes de ejecución del proyecto.

- **Punto de atención a la comunidad.**

El punto de atención se encuentra ubicado en las adecuaciones del proyecto.

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)

Comunidad I.T.S.I

-Se recibe solicitud de apoyo con el equipo retrocargador que se encontraba en obra para realizar retiro en la cancha de escombros.

Reuniones.

Reunión de seguimiento.

- En el periodo comprendido se realiza reunión de seguimiento por parte de la supervisión del contrato donde dejar puntos en observación sobre la ejecución del contrato.

Recorrido en Obra.

- Se recibe visita por parte del grupo de docentes quienes realizan visita en el área del proyecto.

Anexos Fotográficos.













ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Acopio adecuado de escombro
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Recolección manual de escombros
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Desinfeccion Unidades Sanitarias
Fecha	20 de Junio de 2024



Descripcion	Despacho de tierra residual
Fecha	03 de Julio de 2024



Descripcion	Reubicación de área sanitaria
Fecha	03 de Julio de 2024



Descripcion	Separación de residuos pesados
Fecha	03 de Julio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Acopio de tierra residual
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Separación de residuos
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Limpieza de aguas lluvias residuales
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Despacho de tierra residual
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Separación de residuos pesados
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Limpieza de acopio de tierra
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Separación de residuos livianos
Fecha	04 de Julio de 2024



Descripcion	Filtracion para aguas lluvias
Fecha	04 de Julio de 2024

ANEXO 6. RCD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 | PROPIETARIO Luis palomino
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 05 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA FC6 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro Escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 05 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024. | N°
PIN DE OBRA
PLACA FC6 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Wilson Gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88268 669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA FC6 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Wilson Gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 786 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA FC6 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Wilson Gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Sja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAD 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669. | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719. | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024, | N°
PIN DE OBRA
PLACA FCG 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: wilson gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAD 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bca-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719. | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA FCG 848 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Wilson Gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Luis palomino | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 88.268.669 | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: 13.854.719. | CEDULA:
FIRMA | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bja | DIA 03 | MES 07 | AÑO 2024. | N°
PIN DE OBRA
PLACA FCG 848. | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Wilson Gomez | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja. DIA 04 MES 07 AÑO 2024 N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino
CEDULA: 88.268.669.
FIRMA:
PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA:
FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja DIA 04 MES 07 AÑO 2024. N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino
CEDULA: 88.268.669.
FIRMA:
PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA:
FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja DIA 04 MES 07 AÑO 2024 N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino
CEDULA: 88.268.669.
FIRMA:
PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA:
FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja DIA 04 MES 07 AÑO 2024 N°
PIN DE OBRA
PLACA UAO 483 PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: luis palomino
CEDULA: 88.268.669.
FIRMA:
PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA:
FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 04 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA EJK 785 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: Leonardo Machado | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: B.854.719. | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 04 | MES 07 | AÑO 2024 | N°
PIN DE OBRA
PLACA SAA 864. | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: J. Carlos Garcia | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja | DIA 04. | MES 07 | AÑO 2024. | N°
PIN DE OBRA
PLACA SAA 864 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: J. Carlos Garcia | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

RETIRO DE ESCOMBROS

CÓDIGO HSE-FOR-25
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja. | DIA 04 | MES 07 | AÑO 2024. | N°
PIN DE OBRA
PLACA SAA 864 | PROPIETARIO
CONCEPTO Retiro de escombro
METROS DE ESCOMBROS 8mt3
PERSONA QUE ENTREGA: J Carlos Garcia | PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA: | CEDULA:
FIRMA: | FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-Bja	DIA 04	MES 07	AÑO 2024	N°
PIN DE OBRA				
PLACA SAA 864		PROPIETARIO		
CONCEPTO Retiro de escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA: J. carlos barrera.		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°
PIN DE OBRA				
PLACA		PROPIETARIO		
CONCEPTO				
METROS DE ESCOMBROS				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°
PIN DE OBRA				
PLACA		PROPIETARIO		
CONCEPTO				
METROS DE ESCOMBROS				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°
PIN DE OBRA				
PLACA		PROPIETARIO		
CONCEPTO				
METROS DE ESCOMBROS				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		
