1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

ACTA PARCIAL [X] NÚMERO 1 PERIODO: 17 de junio al 19 de julio de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	209 - 2024	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	09/04/2024
Nombre completo del contratista:		Técnica y Proyectos de Ingeniería	
Documento de identificación:		NIT 900773490-7	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETIVO ES REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 SUR HACIA LOS GUABOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	17	Mes	06	Año	2024	Día	30	Mes	09	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	*NA*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2223	Fecha de CDP: 16/11/2023	Valor: $ 872.153.016
Número de RP: 1024	Fecha de RP: 09/05/2024	Valor: $ 40.864.005

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS M/CTE ($40.864.005).	$ 40.864.005
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 40.864.005

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: *(marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 40.864.005	$ 5.827.499	$ 5.827.499	$ 35.036.506
...				

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
..					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
	N° PIN	Referencia	Autorización
	9469942583		

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$ 1.042.100	9469942583
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	15/07/2024	Junio 2024	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (junio) de (2024), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (junio) de (2024). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TÉCNICO

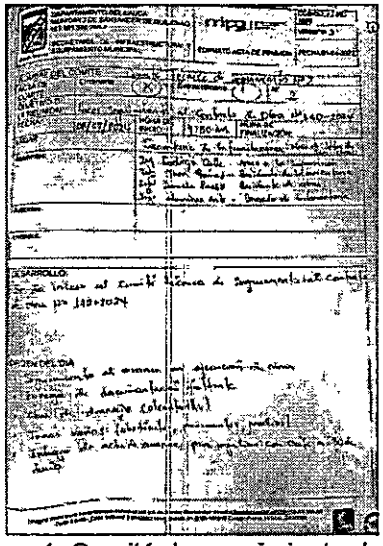


Imagen 1. Comité de seguimiento de obra


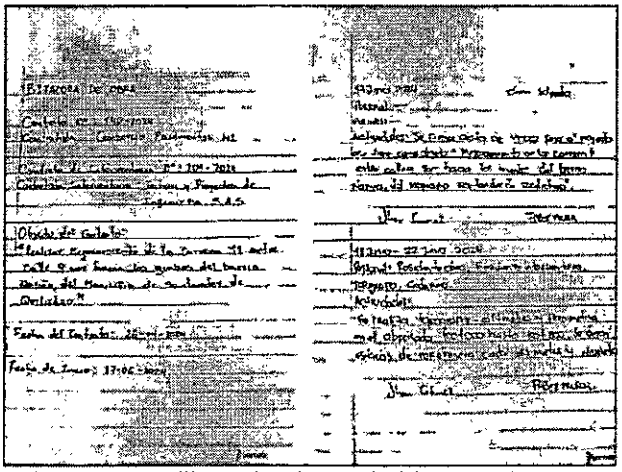


Imagen 2. Diligenciamiento de bitácora de obra

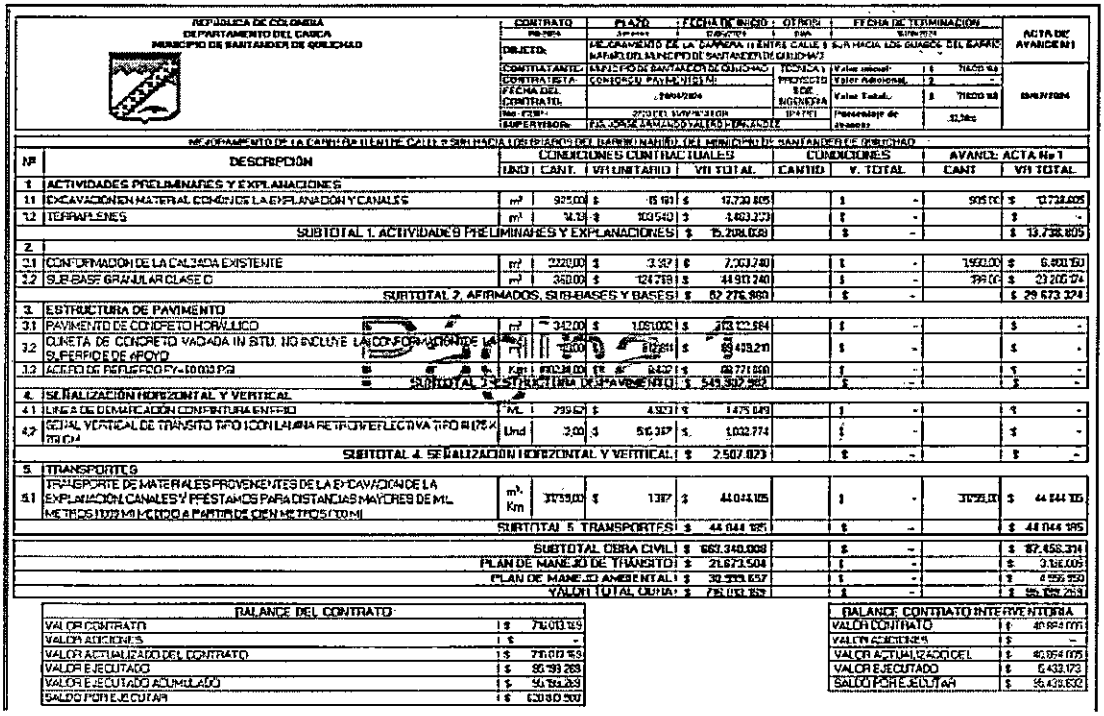

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO	PLAZO	FECHA DE INICIO	OTROSI	FECHA DE TERMINACION	ACTA DE AVANCE N1
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA ENTRE CALLE 5 Y 6A HACIA LOS BARRIOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO				
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	TECNICA 1	Valor inicial:	$ 79.000.00	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS ML	PROYECTO DE INGENIERIA	Valor Adicional:	$ -	
	FECHA DEL CONTRATO:	09/04/2024		Valor Total:	$ 79.000.00	09/04/2024
	No. CDP:	2710 DEL 09/04/2024		Plazo/dias de ejecucion:	30 dias	
	SUPERVISOR:	IVA JOHANA SALAZAR FERNANDEZ				

MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA ENTRE CALLE 5 Y 6A HACIA LOS BARRIOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Nº	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UNID	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANTID	V. TOTAL	AVANCE ACTA No 1 CANT	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES								
1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	925,00	$ 15.191	$ 13.738.805		$ -	905,00	$ 13.738.805
1.2	TERRAPLENES	m³	34,13	$ 103.540	$ 3.533.273		$ -		$ -
	SUBTOTAL 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES				$ 15.288.038		$ -		$ 13.738.805
2									
2.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	2220,00	$ 3.257	$ 7.230.540		$ -	1.990,00	$ 6.481.230
2.2	SUB BASE GRANULAR CLASE D	m³	340,00	$ 124.719	$ 44.910.240		$ -	199,00	$ 23.209.374
	SUBTOTAL 2. AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES				$ 52.275.980		$ -		$ 29.673.324
3.	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HORAULICO	m²	342,00	$ 1.051.000	$ 359.532.984		$ -		$ -
3.2	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	1000,00	$ 112.681	$ 69.439.210		$ -		$ -
3.3	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI	Kgr	6000,00	$ 8.432	$ 60.771.000		$ -		$ -
	SUBTOTAL 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				$ 549.302.982		$ -		$ -
4.	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL								
4.1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ENTRE	ML	299,67	$ 4.921	$ 1.475.049		$ -		$ -
4.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (POSTE METALICO)	Und	3,00	$ 50.257	$ 1.032.774		$ -		$ -
	SUBTOTAL 4. SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL				$ 2.507.823		$ -		$ -
5.	TRANSPORTE								
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) HASTA DE CIEN METROS (100 M)	m³, Km	31759,00	$ 1.387	$ 44.044.105		$ -	31759,00	$ 44.044.105
	SUBTOTAL 5. TRANSPORTE				$ 44.044.105		$ -		$ 44.044.105
	SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 662.340.008		$ -		$ 87.456.334
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 21.671.504		$ -		$ 3.166.005
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 32.339.657		$ -		$ 4.956.950
	VALOR TOTAL OBRA				$ 716.151.169		$ -		$ 95.579.289

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 716.151.169
VALOR ADICIONES	$ -
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 716.151.169
VALOR EJECUTADO	$ 95.579.289
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 95.579.289
SALDO POR EJECUTAR	$ 620.571.880

BALANCE CONTRATO INTERVENTORIA	
VALOR CONTRATO	$ 40.954.005
VALOR ADICIONES	$ -
VALOR ACTUALIZADO DEL	$ 40.954.005
VALOR EJECUTADO	$ 6.432.173
SALDO POR EJECUTAR	$ 34.521.832

Seguimiento y control de obra

Imagen 3. Realización de informe de interventoría

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 209 del 09 de abril de 2024.

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental
Observaciones al informe técnico: Sin observaciones.
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
Sin recomendaciones.
7. FIRMAS RESPONSABLES
JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ Supervisor del contrato
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, julio 25 de 2024.
