Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-01 17:18:13
Documento generado el: 2024-04-01 17:18:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA			COP
TASA DE CAMBIO			
Subtotal			24.300.844,75
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			24.300.844,75
IVA			4.617.160,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.617.160,50
Total neto factura (=)			28.918.005,25
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	28.918.005,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053048846 Rango desde: 29 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-08-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUBIKO S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
fdaefbd6b3e8286f9b378f3cff24fb51b3ede5c2d27a3318b2f4790888b93b912560801305e19be109c396a7c10815d6

Número de Factura: CBK-123
Fecha de Emisión: 01/04/2024
Fecha de Vencimiento: 01/05/2024
Tipo de Operación: 10 Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

Datos del Emisor

Razón Social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nombre Comercial: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nit del Emisor: 900686385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 10 18 44 P 11 OF 1101
Teléfono / Móvil: 7041562
Correo: financiera.cubiko@gmail.com

Datos del Adquirente

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE DAGUA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100514
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vivienda@dagua-valle.gov.co

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1037	SERVICIO DE INTERVENTORIA	94	1,00	$ 24.300.844,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.617.160,50	19.00			$ 24.300.844,75

Notas Finales

OBJETO "INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"
PERIODO 1 FACTURA MAYOR: DEL 11 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO
NO TA: Favor consignar en BANCOLOMBIA en la cuenta de ahorros N°05318239501
Línea de negocio: 2023746

	ACTA PARCIAL INTERVENTORIA
	Secretaria de Infraestructura
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura

Acta Final [ ] Acta Parcial [x] No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023746

"INTERVENTORÍADEOBRAPÚBLICAPARALAEJECUCIÓNDELPROYECTOCONSTRUCCIÓNDEPAVIMENTORÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DAGUA	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	901503188-3	
INTERVENTOR (A)	CUBIKO OBRAS Y COSULTORIA S.A.S	
SUPERVISOR (A)	FRANCISCO ANTONIO CALVACHE	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	40.247.745,65
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	40.247.745,65
PLAZO CONTRACTUAL	2 MESES	
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	N/A	
FECHA DE REINICIO Nº 1	N/A	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2023	
ADICIONAL EN TIEMPO	39 DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	08 DE FEBRERO DE 2024	

NOTA: En caso de que exista mas de una sus pensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiónes y reinicios realizadas

El día 22 de enero de 2024, se reunieron en la alcaldia del municipio de Dagua, **KAROL VILLAREJO** en calidad de alcaldesa del municipio de Dagua, la Arquitecta **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** en calidad de contratista y el Ingeniero **FRANCISCO ANTONIO CALVACHE** en calidad de supervisor del contrato , con el fin de suscribir el acta parcial Numero 1 del Contrato de Interventoria **No. 2023746**

El Contratista entrega el resultado del estudio mediante los siguientes soportes en Medio Magnético e Impreso:

Descripción del contenido final del estudio recibido.

BALANCE DEL CONTRATO	$	40.247.745,65
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	40.247.745,65
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	40.247.745,65
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	$	28.918.005,25
VALOR ACTA PARCIAL Nº 2	$	-
VALOR ACTA PARCIAL Nº 3	$	-
VALOR ACTA PARCIAL Nº 4	$	-
ACUMULADO ACTAS	$	28.918.005,25
VALOR ACTA FINAL	-	
VALOR TOTAL ANTICIPO		N/A
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA		N/A
ANTICIPO AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		N/A
SALDO ANTICIPO		N/A
VALOR SALDO DEL CONTRATO	$	11.329.740,40
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$	28.918.005,25

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO ANTONIO CALVACHE
SUPERVISOR (A)

DANIEL ARCE GALVEZ
ING CIVIL.PROFESIONAL UNIVERSITARIO

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023



	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023

ELABORÓ:

ING. FELIPE CALDERON HERRERA

Residente de Interventoría

APROBÓ:

ING. YICELA YASMIN MEDINA

Yicel Medina

Directora de interventoría

DAGUA

CUBIKO S.A.S

DAGUA (VALLE DEL CAUCA)
ENERO 2024.

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
5. FINALIDAD DEL PROYECTO 8
6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO 9
   7.1 ACTAS DE OBRA 9
   7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA 9
8. CURVA S 11
9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE 12
10. PROGRAMACION DE OBRA 15
11. BALANCE DE OBRA 19
12. ENSAYOS 27
13. ITEMS NO PREVISTOS 34
14. DETALLE DE ACTIVIDADES 40
15. REGISTRO FOTOGRAFICO 43
16. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 58
17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 58
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

1. INTRODUCCIÓN

Una vía urbana se define como una vía publica dentro de una población bien sea un pueblo o una ciudad. En este contexto, la planificación, mantenimiento y mejora de las vías urbanas se revela en este sentido la calidad de vida de una sociedad.

El presente informe mensual correspondiente al proyecto de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES VIAN.1, N.2, N.3 N.4 DEL MUNICIPIO DE DAGUA, una iniciativa que busca transformar y mejorar significativamente la infraestructura vial de la comunidad del Municipio de Dagua. Patrocinada por el programa fondo de regalías CBR-NBI. El documento expuesto a continuación denota de los avances, superados y logros obtenidos durante el último mes, destacando el compromiso continuo con la excelencia y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

El presente documento constituye el informe mensual de Interventoría No. 01, periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 y 10 de enero de 2024, de conformidad a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2023746 y demás anexos que hacen parte integral del contrato, dando cumplimiento al objeto contractual: INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.		2023746
Objeto Contractual:		INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
Valor Inicial Del Contrato De Interventoría		$ 40.272.745,65
Valor Adicional (Modificación 01) Obra		N/A
Valor Total Actualizado		N/A
Plazo Inicial		2 meses
Fecha de Inicio		11 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial		31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Suspensión Temporal de Plazo 01		N/A
Prorroga 01		21 DE DICIEMBRE 2023
Acta de Reinicio		N/A
Tiempo Total Suspendido		N/A
Tiempo Adicional (Modificación 01) de Interventoría		39 DIAS
Nueva fecha de Terminación		08 DE FEBRERO DE 2024
Contratista		CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT		900.686.385-9
Representante Legal		ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Director de Obra		ING. YICELA YASMIN MEDINA
Residente de Obra		ING. FELIPE CALDERON HERRERA

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.		2023758
Objeto Contractual:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA
Valor Inicial Del Contrato De Obra		$ 427.909.551,28
Valor Adicional (Modificación 01) Obra		N/A
Valor Total Actualizado		N/A
Plazo Inicial		45 DIAS
Fecha de Suscripción del Contrato de Interventoría		N/A
Fecha de Inicio		11 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial		31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Suspensión Temporal de Plazo 01		N/A
Prorroga		21 DE DICIEMBRE DE 2024
Acta de Reinicio		N/A
Tiempo Total Suspendido		N/A
Tiempo Adicional (Modificación 01) de Interventoría		24 DIAS
Nueva fecha de Terminación		24 DE ENERO DE2024
Contratista		PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NIT		901.503.188-3
Representante Legal		LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Director de Obra		JUAN CARLOS SANABRIA
Residente de Obra		LISSY PAOLALLANOS MARTINEZ

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro de las metas del plan de desarrollo "APOSTEMOS TODOS A CRECER POR DAGUA 2020-2023", en el sector: vías y transporte, cuyo objeto especifico contribuye al desarrollo económico local sostenible, mediante el mejoramiento de vías de comunicación y condiciones de movilidad de la población, en la zona urbana y rural, para un tránsito seguro y en paz, con enfoque de derechos, diferencial, víctimas y demás grupos de inclusión social. Se logró celebrar el contrato que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA

Para la ejecución del contrato y cumplimiento de su objeto contractual, se contemplan las siguientes actividades construcción de vía nueva en este barrio:

- Excavación a máquina (Cajeo).
- Retiro escombros a maquina <= 10kms.
- Conformación compactada subrasante CBR=95
- Relleno - Roca muerta compactada con material seleccionado de sitio.
- Sub-base compactada 10km tipo INVIAS.
- Pavimento en concreto MR=38 E=20cms
- Sardinel en concreto.
- Refuerzos en hierro de 60.000PSI.

De acuerdo al plazo contractual la duración total inicial del proyecto se ha planteado para 45 días, para el contrato de obra y 2 meses para el contrato de Interventoría. El presente informe tiene un periodo de cobertura inicial del11 de diciembre de 2023 y 10 de enero de 2024.

5. FINALIDAD DEL PROYECTO

Construcción de vías en concreto rígido MR=38 en el barrio los Arrayanes en el municipio de Dagua, en el departamento del Cauca.

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Dagua.



La dirección física del frente de obra es el siguiente:

BARRIO LOS ARRAYANES
Vía 1,2,3,4

7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO

A la fecha del presente periodo de cobertura del informe mensual, el contratista de obra tramito el pasado 26 de diciembre el acta parcial numero 1 por un valor de $81.976.731.00. Interventoría no tramito cuenta en ese momento, en el presente informe se reacciona la cuenta número 1 de interventoría.

7.1 ACTAS DE OBRA

	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 425.403.021,89	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 0.00	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 425.403.021,89	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 81.976.731,00	19,27%
ACTA PARCIAL 02	$ 0.00	0.00%
ACTA PARCIAL 03	$ 0.00	0.00%
ACTA PARCIAL 04	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0.00**	0.00%


7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA

	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INT	$ 40.272.745,65	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 0.00	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 40.272.745,65	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 0.00	0.00%
ACTA PARCIAL 02	$ 0.00	0.00%


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

ACTA PARCIAL 03	$ 0.00	0.00%
ACTA PARCIAL 04	$ 0.00	0.00%
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0.00**	0.00%

Curva "S" avance financiero contrato de obra.

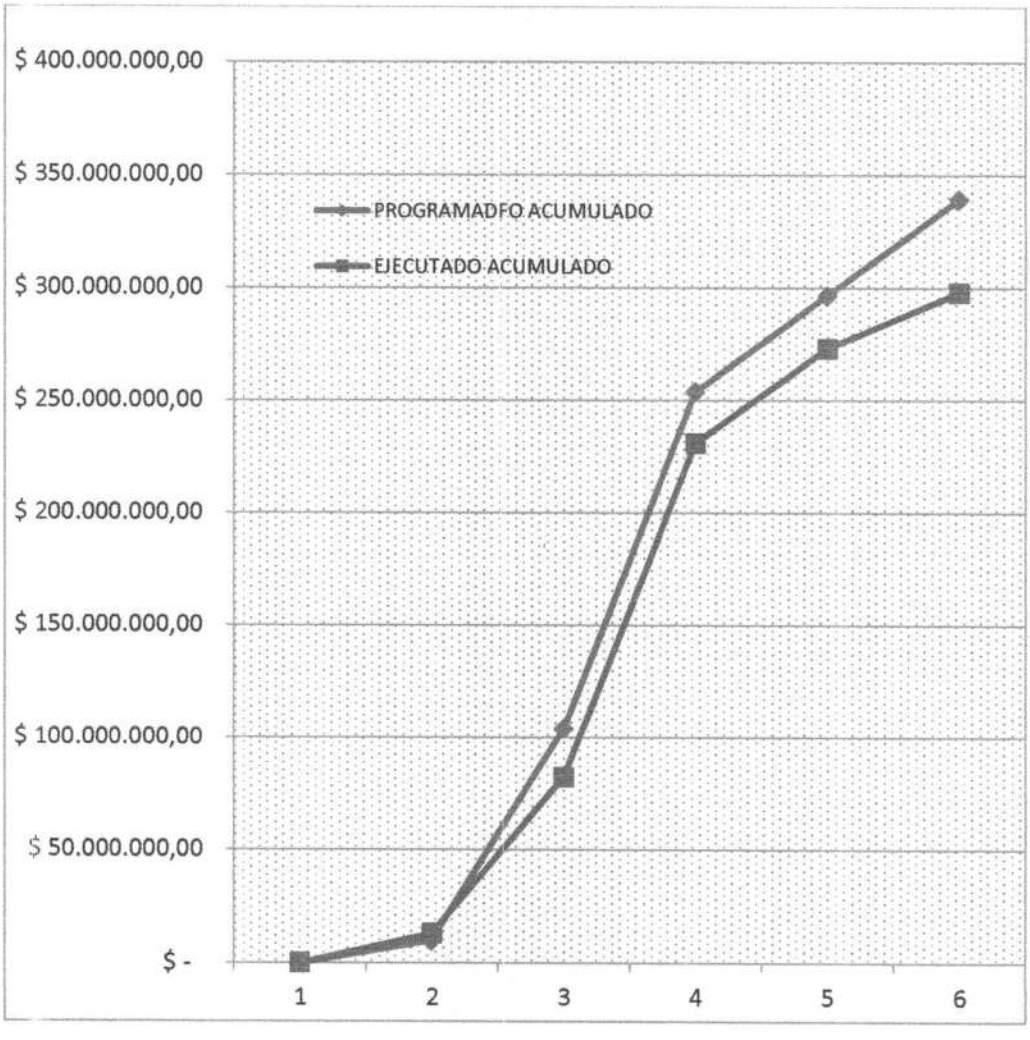

8. CURVA S

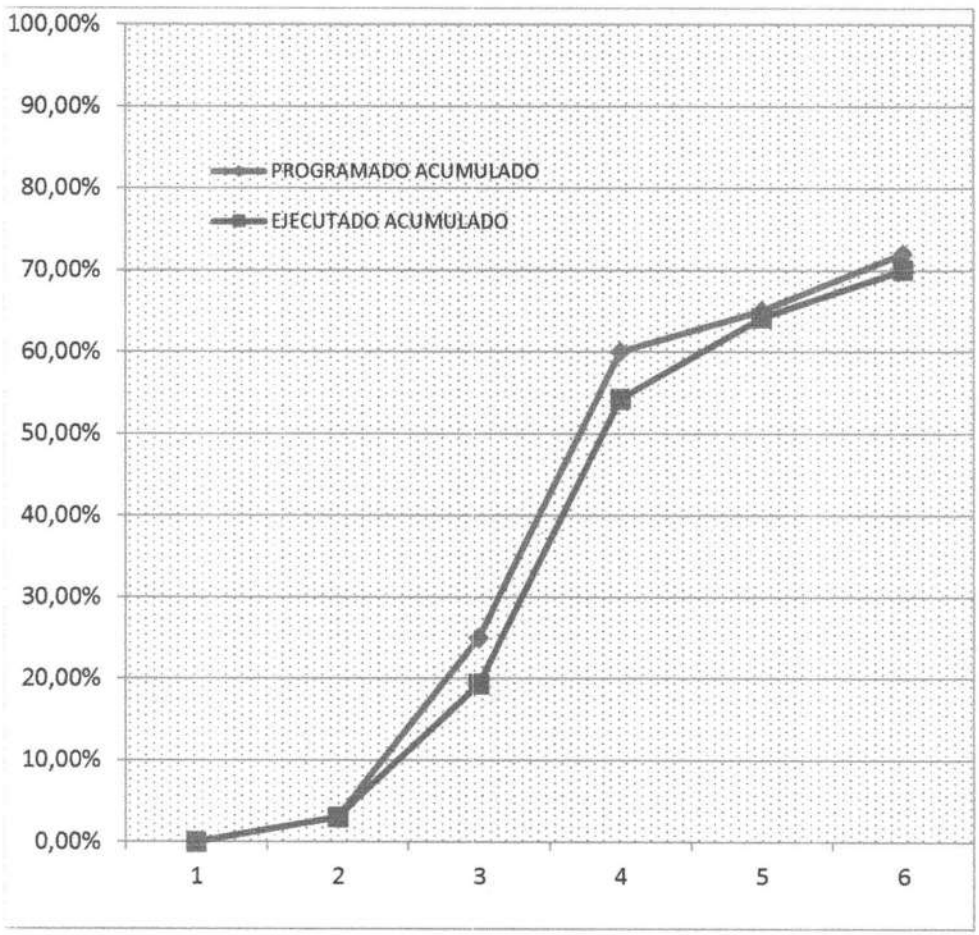

Se evidencia un 72.04% de actividades programadas acumuladas vs un 70.04% de actividades ejecutadas acumuladas a la fecha, presentando así un atraso del 2%. Es de aclarar que este atraso no es imputable al contratista debido a que es por reparaciones de redes domiciliarias que se encuentran por encima del nivel de excavación requerido, estas actividades, aunque no hacen parte del objeto contractual ni están incluidas en los ítems contractuales.

9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE

El contrato de obra dio inicio el día 11 de diciembre de 2023, con un plazo contractual de 45 días.

A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 30 días calendario para el contrato de interventoría y 30 días calendario para el contrato de obra.

El pasado 21 de diciembre 2023 se suscribe prorroga por 24 días calendario para así cumplir con el tiempo contractual inicial, ya que por cuestiones administrativas internas de la entidad el contrato se firmo hasta el pasado 11 de diciembre de 2023.

CONTRATO DE OBRA				
FECHA DE INICIO	11-dic-2023			
FECHA INICIAL DE TERMINACION	31-dic-2023			
DURACION	45 DIAS			
	DESDE	**HASTA**	**DURACION**	
SUSPENSION	N/A	N/A	N/A	
PRORROGA 01	01/01/24	24/01/24	24 DIAS	
ACTA DE REINICIO 01	N/A	N/A	N/A	
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	0 DIAS			
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	24 DIAS			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	24 ENERO 2024			
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	10 ENERO 2024			
% TIEMPO TRANSCURRIDO	43,48 %			

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10



CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se da inicio al contrato de interventoría el día 11 de diciembre de 2023, con un plazo contractual inicial de 2 meses.

A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 30 días calendario para el contrato de interventoría y 30 días calendario para el contrato de obra.

El pasado 21 de diciembre 2023 se suscribe prorroga por 39 días calendario para así cumplir con el tiempo contractual inicial, ya que por cuestiones administrativas internas de la entidad el contrato se firmó hasta el pasado 11 de diciembre de 2023.

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

CONTRATO DE INTERVENTORIA				
FECHA DE INICIO	11-dic-2023			
FECHA INICIAL DE TERMINACION	31-dic-2023			
DURACION	2 MESES			
	DESDE	**HASTA**	**DURACION**	
SUSPENSION	N/A	N/A	N/A	
PRORROGA 01	01/01/24	08/02/24	39 DIAS	
ACTA DE REINICIO 01	N/A	N/A	N/A	
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	0 DIAS			
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	39 DIAS			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	08 DE FEBRERO 2024			
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	10 ENERO 2024			
% TIEMPO TRANSCURRIDO	30,30 %			




10. PROGRAMACION DE OBRA

PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	77,04%
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	82,04%
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	87%
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	92%
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	96%
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	102%

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

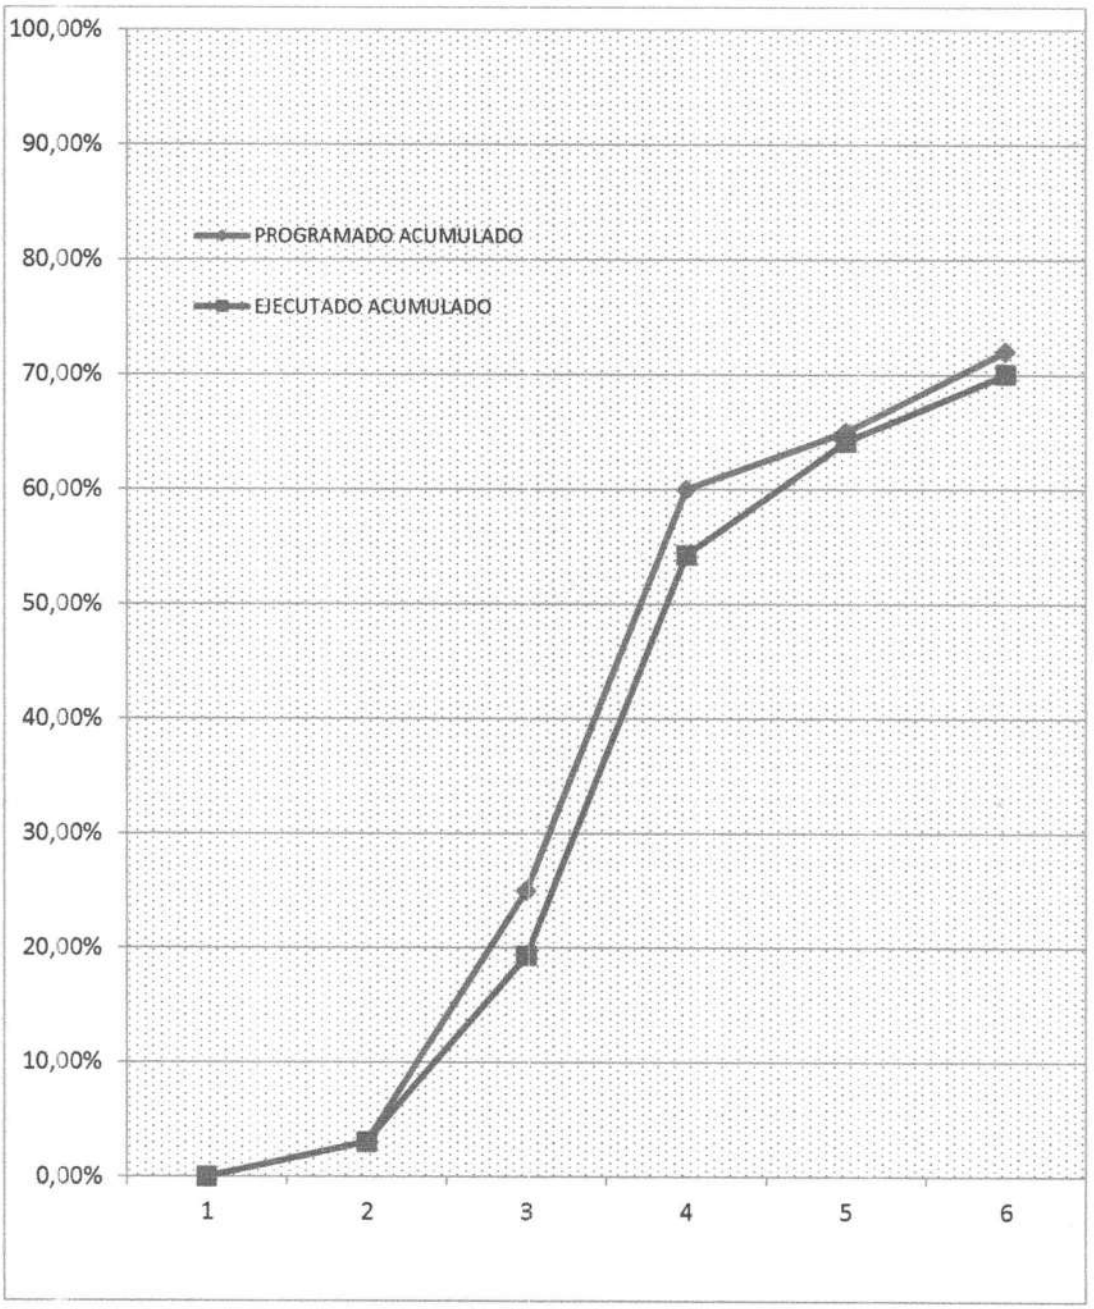


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

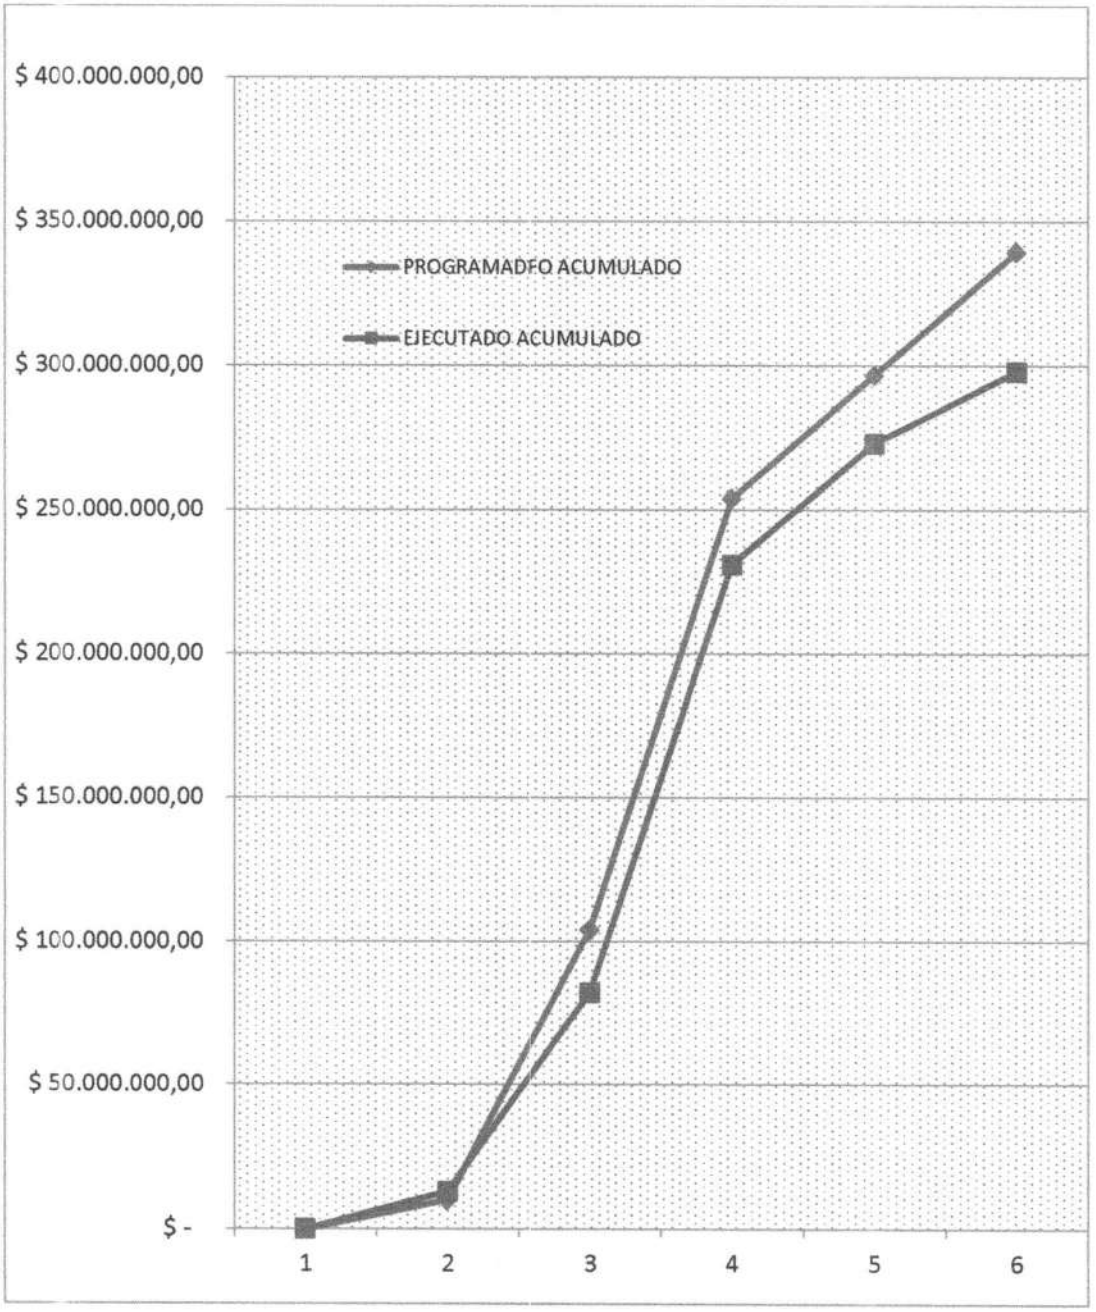

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

11. BALANCE DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$242.265,00	
$484.530,00	$484.530,00	$484.530,00	$484.530,00	$484.530,00	$732.654,55	
$2.302.628,57	$2.302.628,57	$2.302.628,57	$2.302.628,57	$2.302.628,57	$391.446,86	
		$782.893,71	$782.893,71	$782.893,71	$3.310.028,57	
$6.620.057,14	$6.620.057,14	$6.620.057,14	$6.620.057,14	$6.620.057,14	$3.310.028,57	
		$638.498,82	$638.498,82	$638.498,82	$0,00	
		$3.251.874,40	$3.251.874,40	$3.251.874,40	$319.249,41	
				$650.018,33	$0,00	

$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				
	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731
	$60.943.214				
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%
	18,61%				
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%
	62,17%				

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731
	$59.666.216				
					$227.090.353
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%
	18,22%				
					69,33%
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%
	80,39%				
					112,89%

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	

$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						

4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						

84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		

4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		

106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		


12. ENSAYOS

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	8725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Humeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

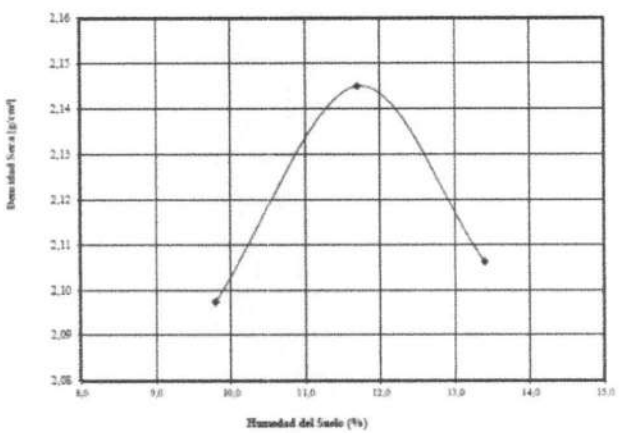

Densidad Seca Máxima: 2,145 g/cm³ Hum. Óptima del suelo: 11,70 %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SUB-BASE NORMA INV E 213, 202 ART-320	Código: IO-FR-22 Versión 02 Fecha: 8-ENE-19 Página 1 de 1


Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-1255406
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11/01/2024

Material:	Sub base	Cantera	El Chocho
Fecha de ingres	2/01/2024	Fecha de ensayo:	9/01/2024
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

TAMIZ No	PESO RETENIDO (gr)	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA TAMIZ	Especificacion (%) Lim. inferior	SG-B-38 Lim. superior
4"	0,0	0,00	0,00	100,00		
3½"	0,0	0,00	0,00	100,00		
3"	0,0	0,00	0,00	100,00		
2½"	0,0	0,00	0,00	100,00		
2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
1½"	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
1"	0,0	0,00	0,00	100,00	75	95
1/2	986,0	18,76	18,76	81,24	55	85
3/8"	246,0	4,66	23,43	76,57	45	75
N°4	975,5	18,56	41,99	58,01	30	60
N°10	1008,0	19,18	61,17	38,83	20	45
N°40	1191,5	22,67	83,84	16,16	8	30
N°200	435,5	8,29	92,13	7,87	2	15
FONDO	413,5	7,87	100,00	0,00		
TOTAL		100,00				

Peso seco antes de lavar:	5255	Peso seco despues de lavar:	4.542
Peso seco limpio (gr)	4841,5		

GRANULOMETRIA



Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
		CONTRATO No	2023746
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NORMA NTC 4630	Código: IO-FR-10 Versión: 02 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155407
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11-ene-24

Descripción:	Sub base	Cantera:	
Fecha entrada:	2-ene-24	Fecha de ensayo:	9/01/2024

LIMITE LIQUIDO					
DETERMINACION No.	1	2	3	4	5
No. de golpes					
Molde No					
Peso Molde + Muestra Húmeda en gr.					
Peso Molde + Muestra Seca en gr.					
Peso molde en gr.					
Humedad en %					
Límite Líquido					

LIMITE PLASTICO					
DETERMINACION No.	1	2	3	4	5
Molde No					
Peso Molde + Muestra Húmeda en gr.					
Peso Molde + Muestra Seca en gr.					
Peso molde en gr.					
Humedad en %					

Resultados del Ensayo

Límite Líquido: NO LIQUIDO


Límite Plástico: NO PLASTICO

Indice de Plasticidad: NO PLASTICO

Clasificación de la Fracción Fina:

% Pasa Tamiz No 200: **7,87**

Sistema USC: **GP-GM**

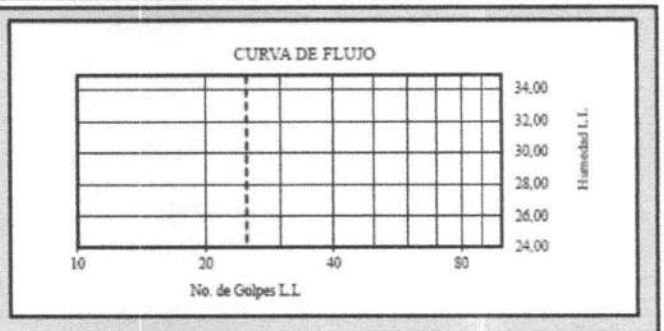

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
		CONTRATO No	2023746
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Versión: 03 Fecha: 8-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155405
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11-ene-24

Material:	Sub base	Cantera:	Chocho
Fecha de ingreso:	2-ene-24	Fecha de ensayo:	3-ene-24
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	8352	8587	8586
Peso molde	[g]	3399	3399	3399
Peso Muestra Compactada	[g]	4953	5188	5187
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,340	2,451	2,451
Humedad	[%]	5,00	7,22	9,71
Densidad Seca	[g/cm³]	2,229	2,286	2,234

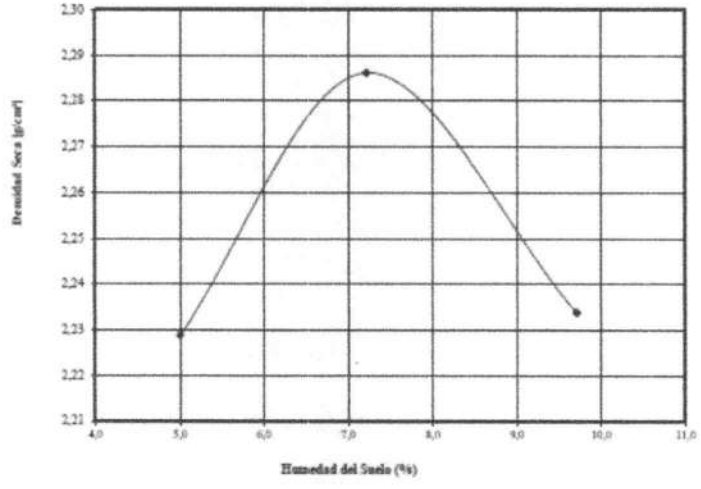

Densidad Seca Máxima: **2,286** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **7,22** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGE OMAC

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE Ddensidad DE CAMPO

Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-16
Versión 08
Fecha: 08-ENE-19
Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155402-1DE2
Cliente: Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de realización: 2/01/2024
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3	4	5	6	7
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	6622	6611	6602	6593	6580	6561	6538
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	3584	3269	3316	3166	2910	2655	2801
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3038	3342	3286	3427	3670	3906	3737
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1457	1761	1705	1846	2089	2325	2156
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1076	1301	1259	1363	1543	1717	1592
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	2840	3416	3297	3507	4029	4490	4177
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360	360	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	2480	3056	2937	3147	3669	4130	3817
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,30	2,35	2,33	2,31	2,38	2,41	2,40
L. Humedad del suelo		[%]	11,0	11,6	11,2	11,4	7,2	6,6	6,8
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,08**	**2,11**	**2,10**	**2,07**	**2,22**	**2,26**	**2,24**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145	2,145	2,286	2,286	2,286
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**96,8**	**98,2**	**97,8**	**96,6**	**97,0**	**98,7**	**98,2**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95	95	95	95	95

Observaciones:

Punto 1: Vía abscisa K0+120 costado derecho roca muerta
Punto 2: Vía abscisa K0+110 costado derecho roca muerta
Punto 3: Vía abscisa K0+090 costado izquierdo roca muerta
Punto 4: Vía abscisa K0+080 costado derecho roca muerta
Punto 5: Vía abscisa K0+020 costado derecho sub base
Punto 6: Vía abscisa K0+030 costado izquierdo sub base
Punto 7: Vía abscisa K0+040 eje sub base

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena	Código: IO-FR-15 Version 00 Fecha: 09-ENE-19 Página 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	**Consecutivo:**	DE-155402-2DE2
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	**Elaborado por:**	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	**Fecha de realización:**	2/01/2024
Descripción del material:	Roca muerta		

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 8						
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	6522						
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	2962						
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3560						
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581						
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1979						
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354						
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1462						
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3809						
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360						
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3449						
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,36						
L. Humedad del suelo		[%]	6,9						
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,21**						
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,286						
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**96,6**						
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	98						

Observaciones: Punto 8: Vía abscisa K0+060 costado derecho sub base

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-16
Versión 00
Fecha: 09-ENE-18
Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorías Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{\frac{(100+L)}{100}}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Vía abs K0+040 eje
Punto 2 Vía abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Vía abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

13. ITEMS NO PREVISTOS

NP NUMERO 1: El pasado 02 de enero se remite a la entidad el NP 01 (GEOTEXTIL) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-001 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: De acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante, se hace necesario adicionar este ítem, requerido con el fin de aislar la estructura del pavimento de la plataforma de apoyo o mejoramiento del terreno.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO	PROMEDIO
1	DISTRIBUCIONES PVC	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	$ 8,324	$ 9,690
2	GEOSINC	GEOTEXTIL T2100. ANCHO 3,85M X140M	M2	$ 4,495	
3	CALYPSO	GEOTEXTIL T250 / 2100 ANCHO 3,85M X140M	M2	$ 16,250	

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	m2	1,074.56

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					34.07
					34.07

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GEOTEXTIL TEJIDO PAVCO 2100	M2	1.100	9,690.00	10,659.00
			SUBTOTAL $	10,659.00

III. TRANSPORTES

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (2)	77,333.33	1.85	143,066.67	400.00	357.67
OFICIAL (1)	70,000.00	1.85	129,500.00	400.00	323.75
				SUBTOTAL $	681.42
				TOTAL COSTO DIRECTO $	11,374

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Percentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24.17%	2,749.10	
IMPREVISTOS	1%	113.74	
UTILIDAD	6%	682.44	
		SUBTOTAL $	3,545.28
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	14,919.00

Aprobación de la entidad:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1	
		CÓDIGO:	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
		TRD 4.10	DAGUA

Dagua, Enero 2 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2023-016

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el ítem no previsto NP-01 GEOTEXTIL 2100 el cual fue revisado y avalado por la interventoría y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyectó: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario.

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

NP NUMERO 2: El pasado 11 de enero se remite a la entidad el NP 02 (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-003 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: Toda obra de reposición de pavimento requiere de su respectiva topografía. La administración de este contrato no contempló la topografía. Por tanto, esta es de vital importancia contar con la topografía para cumplir cabalmente el objeto contractual.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO
1	MC Servicios topograficos de precision	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 3,900,110
2	Ing. Topógrafo Jose Camargo	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 5,300,000
3	Ing. Andrés Plazas	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 5,230,000

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR)			360,000.00	0.022	7,826.09
					7,826.09

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	VALOR/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TOPOGRÁFICA (1 TOPOGRAFO - 2 CADENEROS) INCLUYE TRANSPORTE			350,000.00	0.026	9,130.43
				SUBTOTAL $	9,130.43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16,957

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26.89%	4,559.74	
IMPREVISTOS	1%	169.57	
UTILIDAD	5%	847.85	
		SUBTOTAL $	5,577.16
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	22,534.00

Aprobación de la entidad:

DAGUA	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1	DAGUA
		CÓDIGO:	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
		TRD 4.10	

Dagua, Enero 16 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2024-004

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el ítem no previsto NP-02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO y el ítem no previsto NP-03 REALCE DE RECAMARA el cual fue revisado y avalado por la interventoría y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación teniendo en cuenta que el balance del proyecto no requiere adiciones presupuestales.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyectó: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario.

NP NUMERO 3: El pasado 11 de enero se remite a la entidad el NP 03 (REALCE DE RECAMARA) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-003 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: La topografía evidencia que las recamaras requieren ser realzadas para que las tapas queden al nivel de la vía, con el peraltado o bombeo o inclinación respectiva.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO
1	JUAN DAVID OSORIO	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 1,689,357
2	OSCAR ANSISAR	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 1,856,386
3	ANDRES MACIAS	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 2,107,249

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 03	REALCE DE RECAMARA	M3	2.51

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					3,407.08
RETROEXCAVADORA			95,400.00	2.51	239,323.30
VIBRADOR			8,925.00	0.10	892.50
					243,622.89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA)	M3	1.000	361,653.00	361,653.00
			SUBTOTAL $	361,653.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (2)	77,333.33	1.85	143,066.67	0.25	35,766.67
OFICIAL (1)	70,000.00	1.85	129,500.00	0.25	32,375.00
				SUBTOTAL $	68,141.67
				TOTAL COSTO DIRECTO $	673,418

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26.89%	181,082.10	
IMPREVISTOS	1%	6,734.18	
UTILIDAD	5%	33,670.90	
		SUBTOTAL $	221,487.18
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	894,905.00

Aprobación de la entidad:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1	
		CÓDIGO:	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
		TRD 4.10	

Dagua, Enero 16 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2024-004

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el ítem no previsto NP-02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO y el ítem no previsto NP-03 REALCE DE RECAMARA el cual fue revisado y avalado por la interventoría y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación teniendo en cuenta que el balance del proyecto no requiere adiciones presupuestales.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyecto: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario.

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

14. DETALLE DE ACTIVIDADES

Semana del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2023

11 DE DICIEMBRE DE 2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTE,TOMA DE NIVELES
12-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPARACION TUBERIA AN,NIVELACION EN LAS VIAS
13-DICIEMBRE -2023
. EXCAVACION CAJEO, RETIRO DE SOBRANTES, NIVELACION DE VIAS REPARACION TUBERIA AN
14-DICIEMBRE-2023
EXACAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPRACION TUBERIA AN
15-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPARACION DE TUBERIA AN
16-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTE, SUMINISTRO ROCA MUERTA

Semana del 18 de diciembre al 23 de diciembre de 2023

18 DE DICIEMBRE DE 2023
COMPACTACION DE LA SUBRRASANTE CBR 95%,SUMINISTRO ROCA MUERTA
19 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,NIVELACION DE VIAS,REPARACION DE TUBERIA AN
20 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
21 DE DICIEMBRE DE 2023

SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTAREPARACION TUBERIA AN
22 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA Y COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
23 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION DE ROCA MUERTA


Semana del 26 de diciembre al 31 de diciembre de 2023

26 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTA
27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
28 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,SUMINISTRO EXTEMNDIDA DE GEOTEXTIL T 2100
30 DE DICIEMBRE DE 2023
CORECCION DE TUBERIA AVERIADA AN SACADA DE FALLOS EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SUB BASE TIPO INVIAS
2 DE ENERO DE 2024
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE SUBBASE TIPO INVIAS COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,REPARACION TUBERIA AN .TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

3 DE ENERO DE 2024
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE SUBBASE TIPO INVIAS,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
4 DE ENERO DE 2024
SE INICIA EXCAVACION VIA N.1 NARRAYANES, COMPACTACION SUBBASE INVIAS EN LA VIA N,2 TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
5 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,CORRECION TUBERIA DE AGUA POTABLE
6 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES,REPARACION DE FALLO,REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE.TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
7 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTA,COMPACTACION VIA N.3
8 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,COMPACTACION Y PERFILADA DE ROCA MUERTA TOMA MUESTRA DE DENSIDADES SUBBASETIPO INVIAS 4 ARRAYANES
9 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA, COMPACTACION VIA N.3. TOMA MUESTRA DE DENSIDADES ROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
10 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,COMPACTACION VIA N.2 TOMA MUESTRA DE DENSIDADES ROCA MUERTA VIA 3 ARRAYANES


15. REGISTRO FOTOGRAFICO

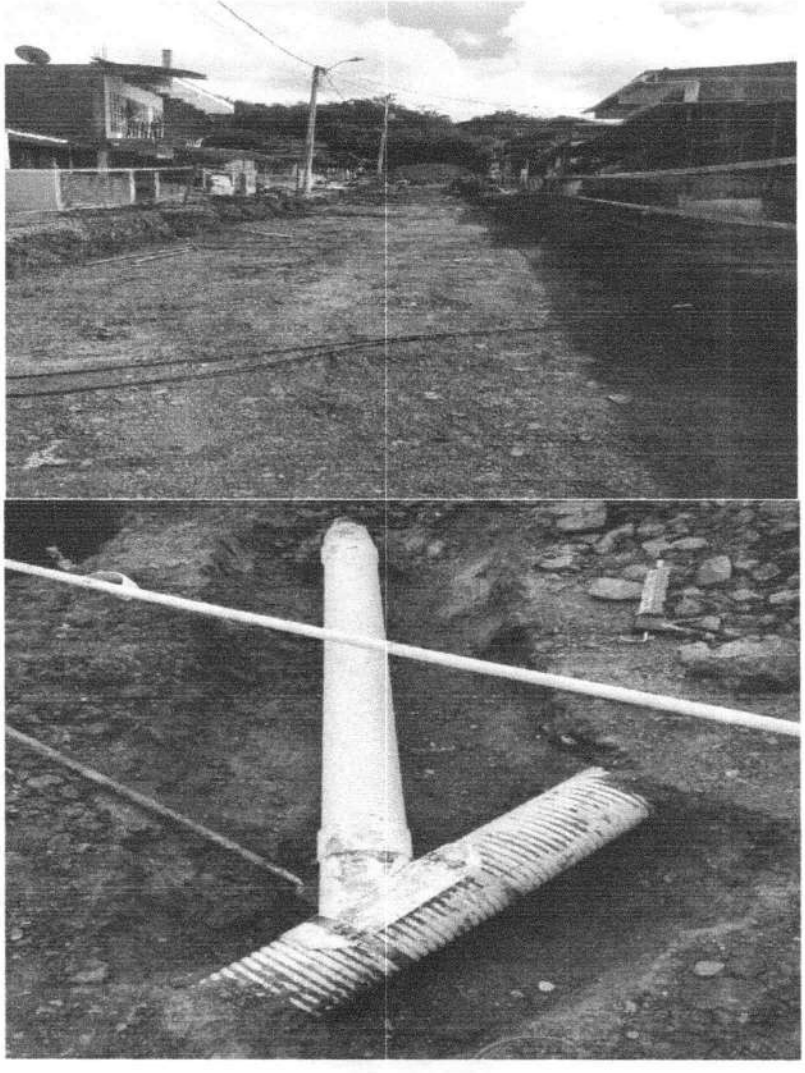


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

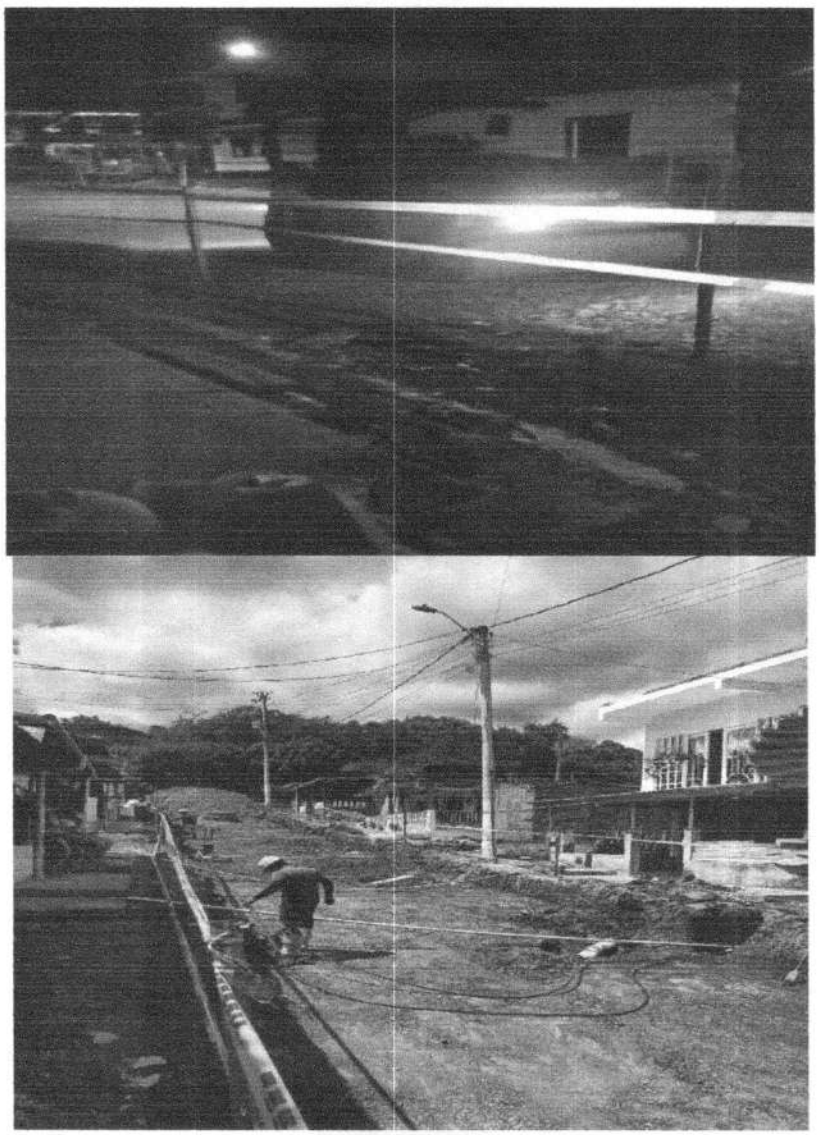


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

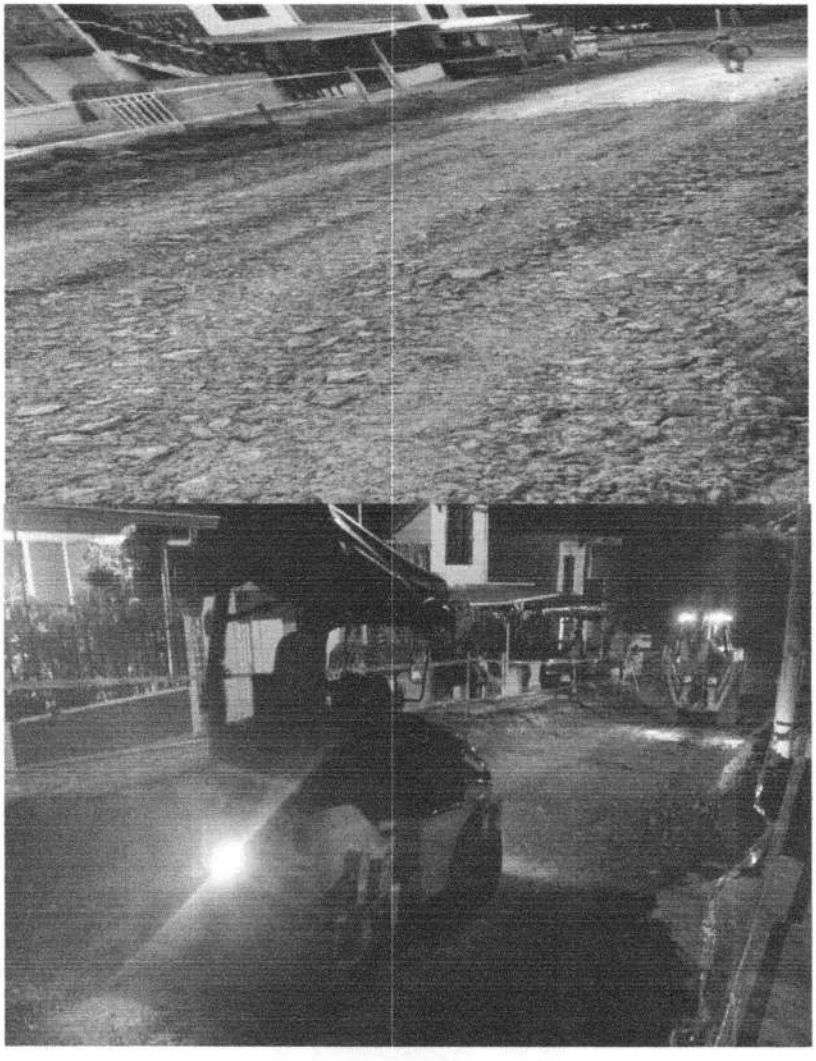

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

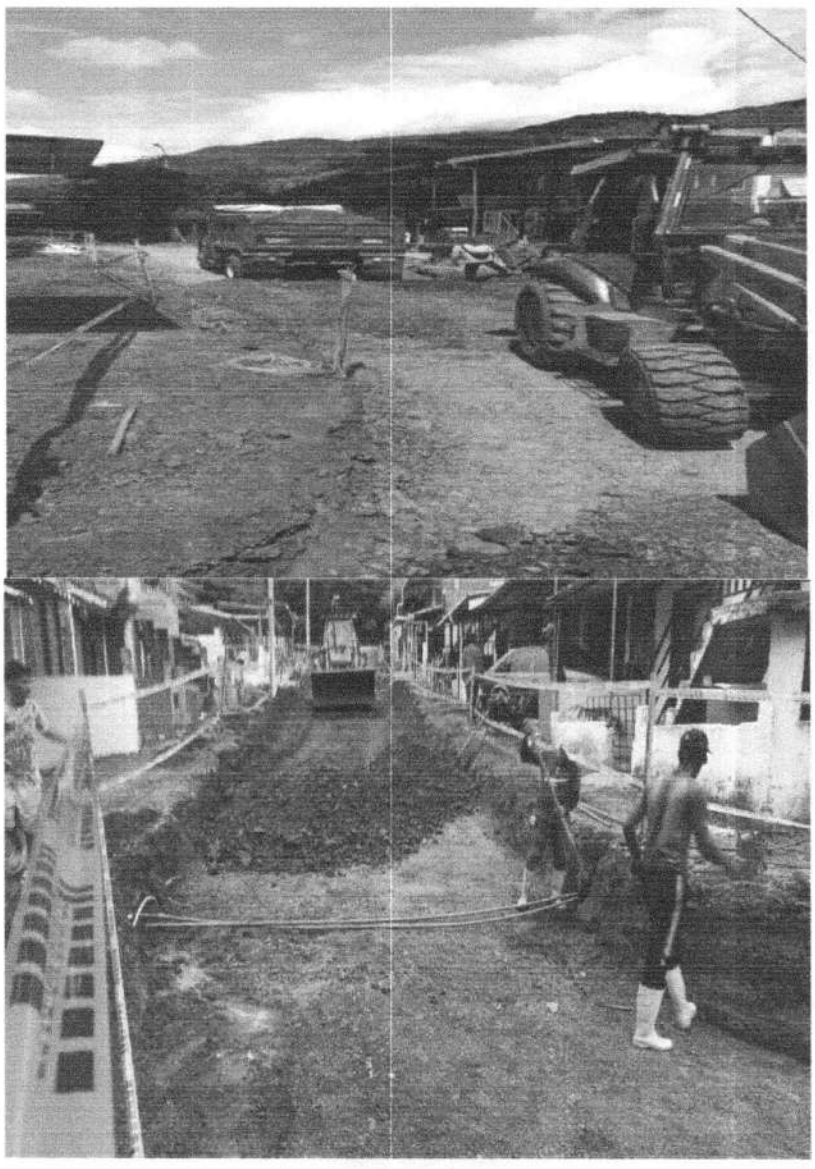


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

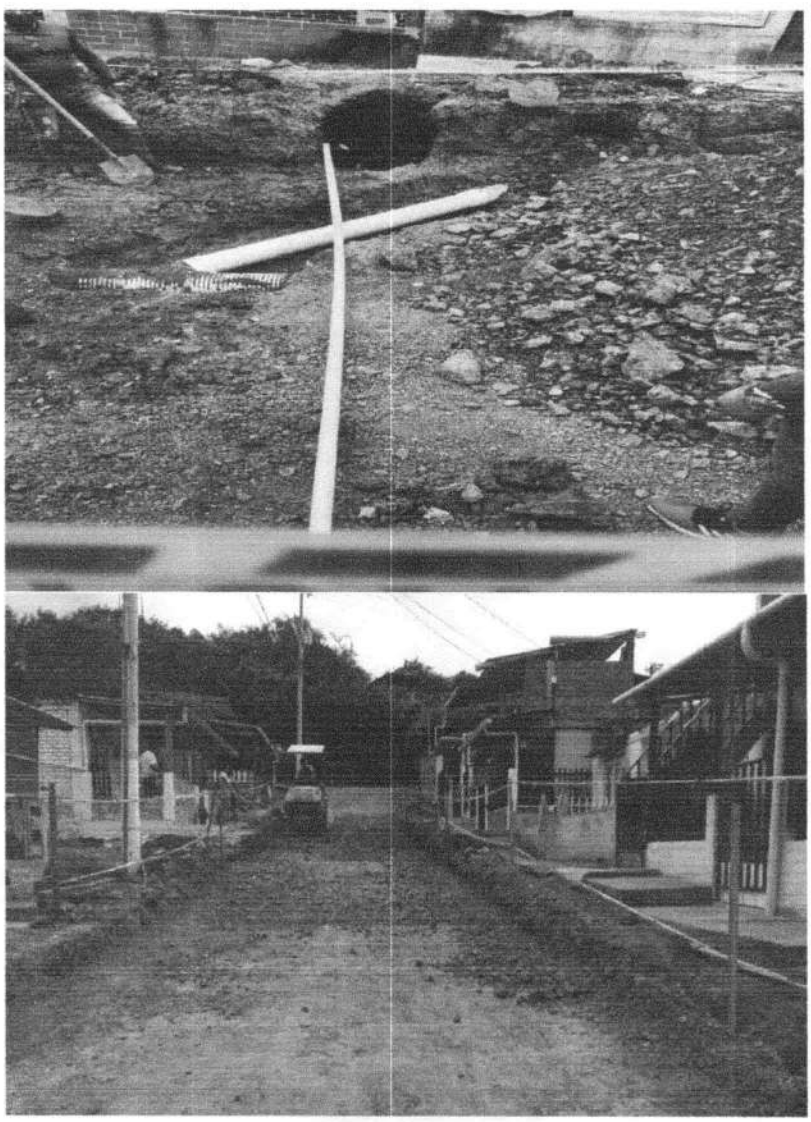


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10




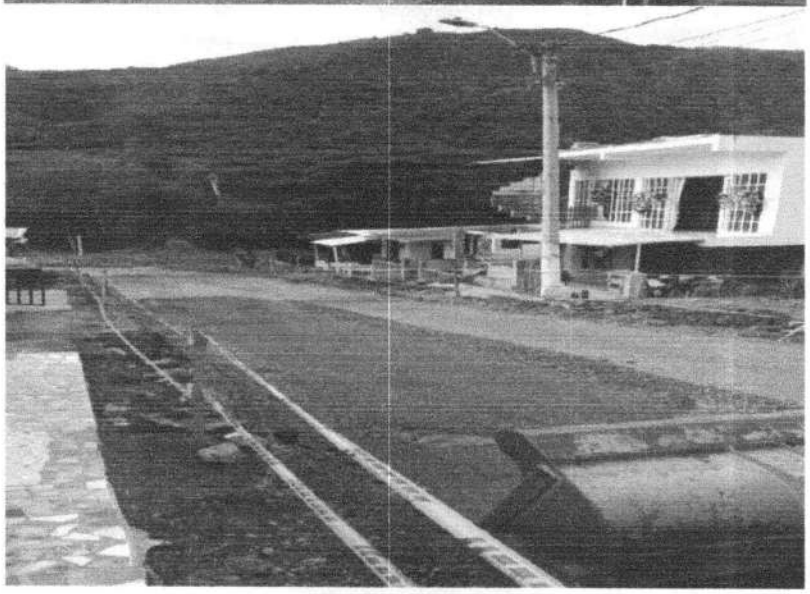


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

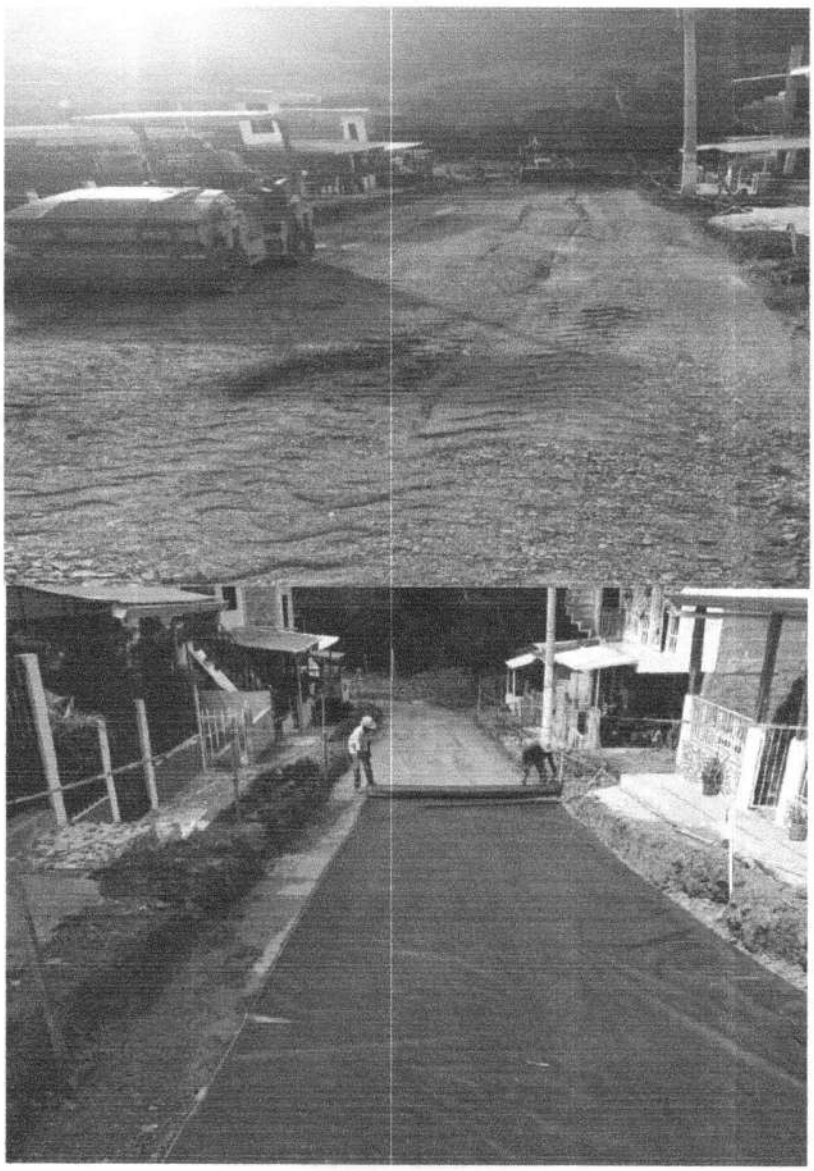


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

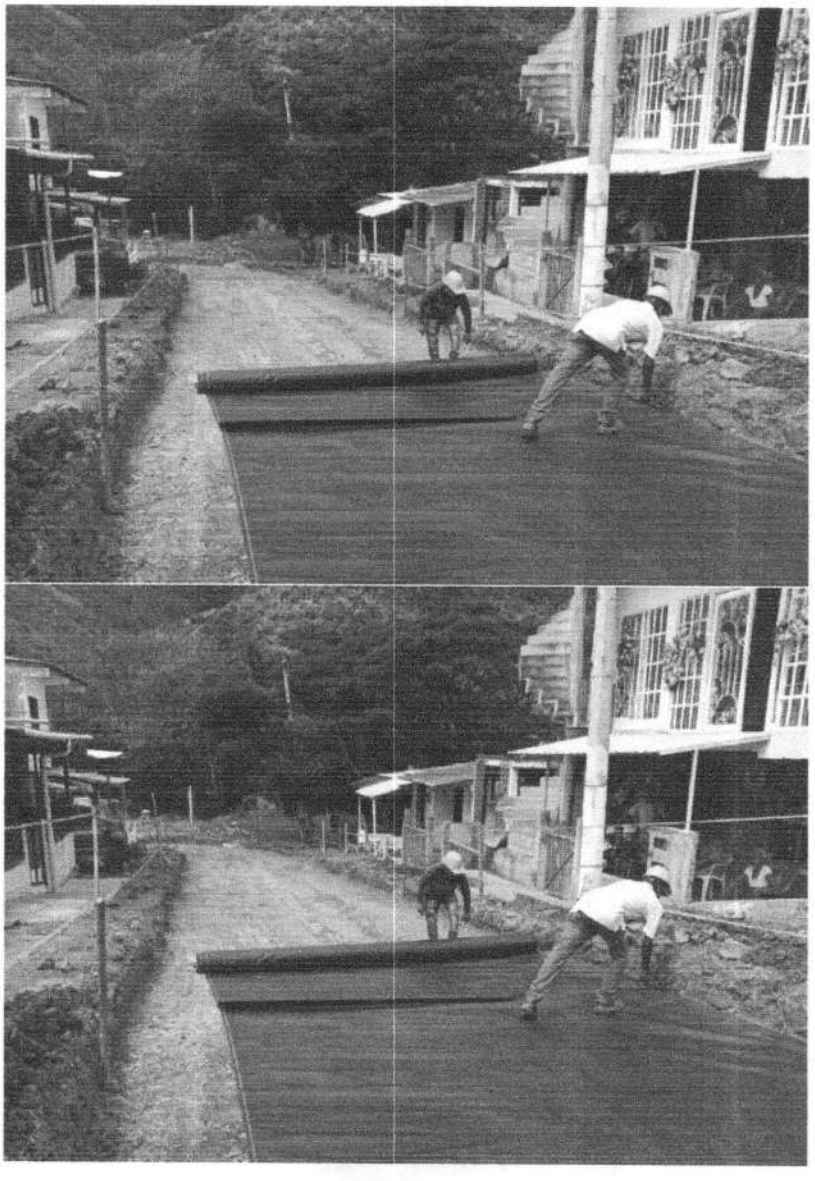

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

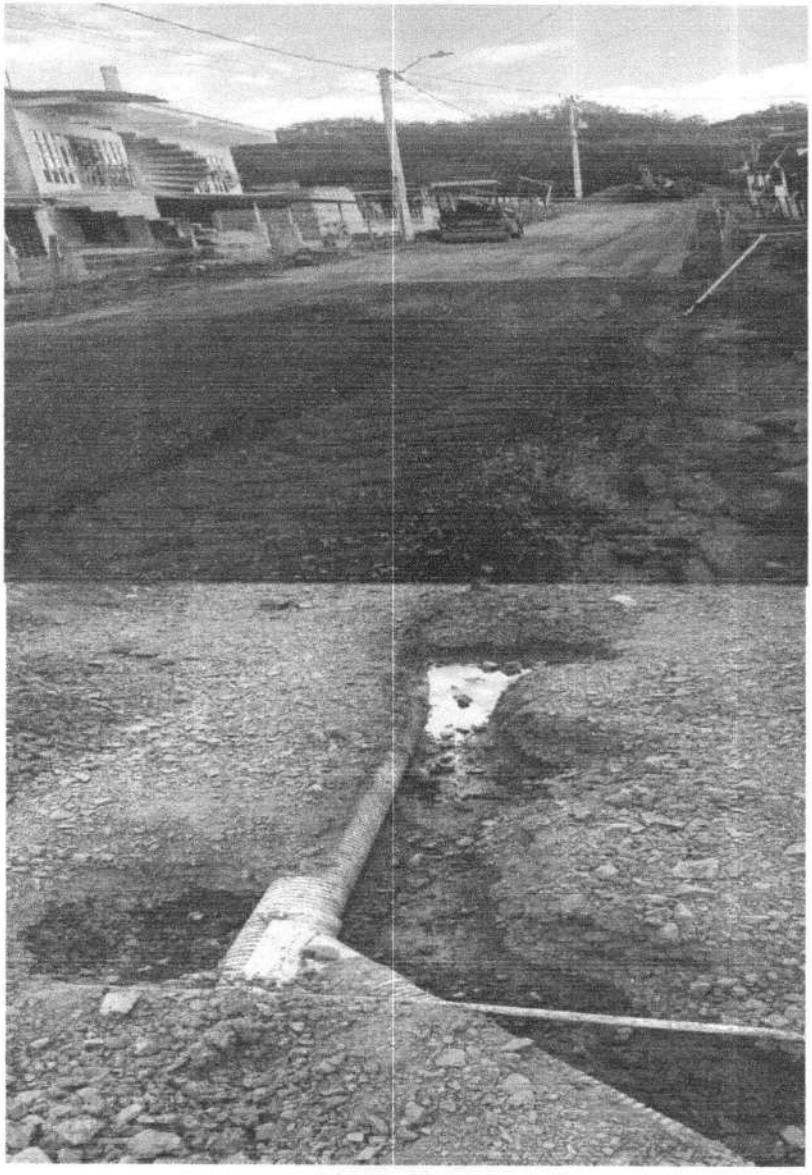

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

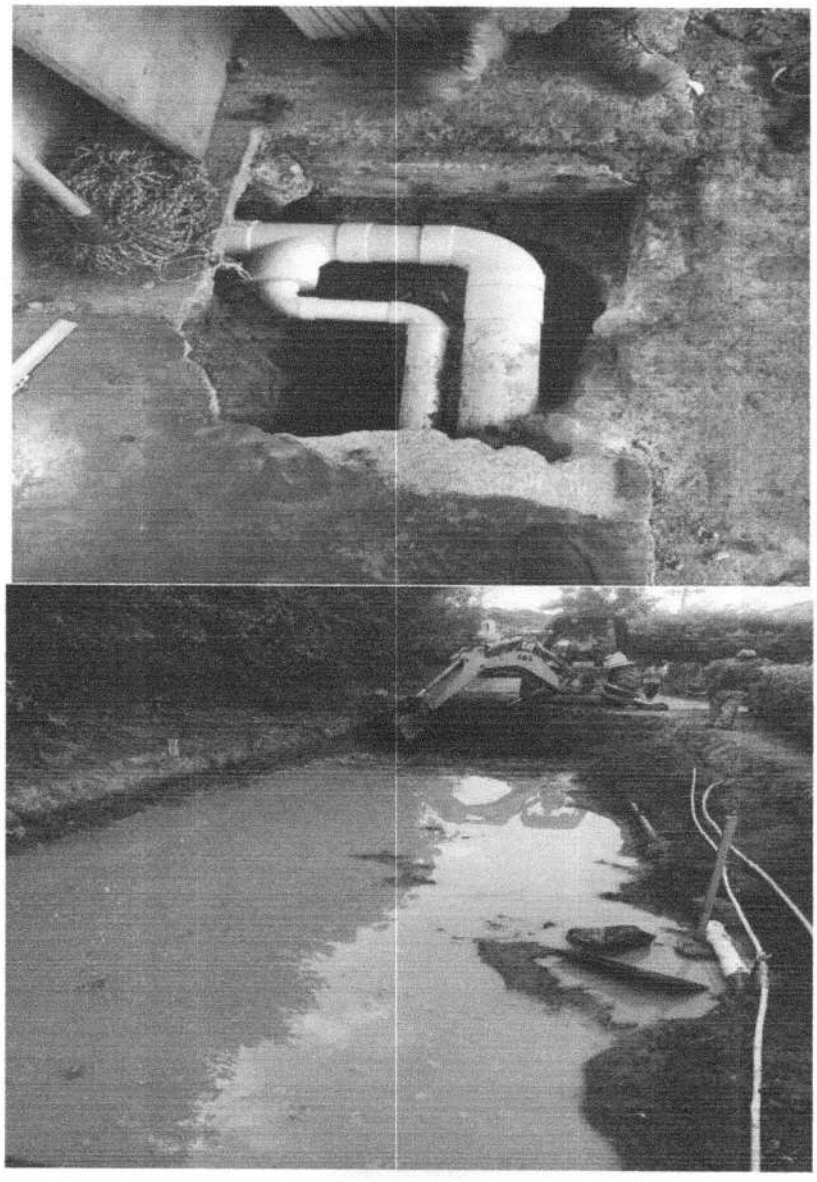


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10







CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

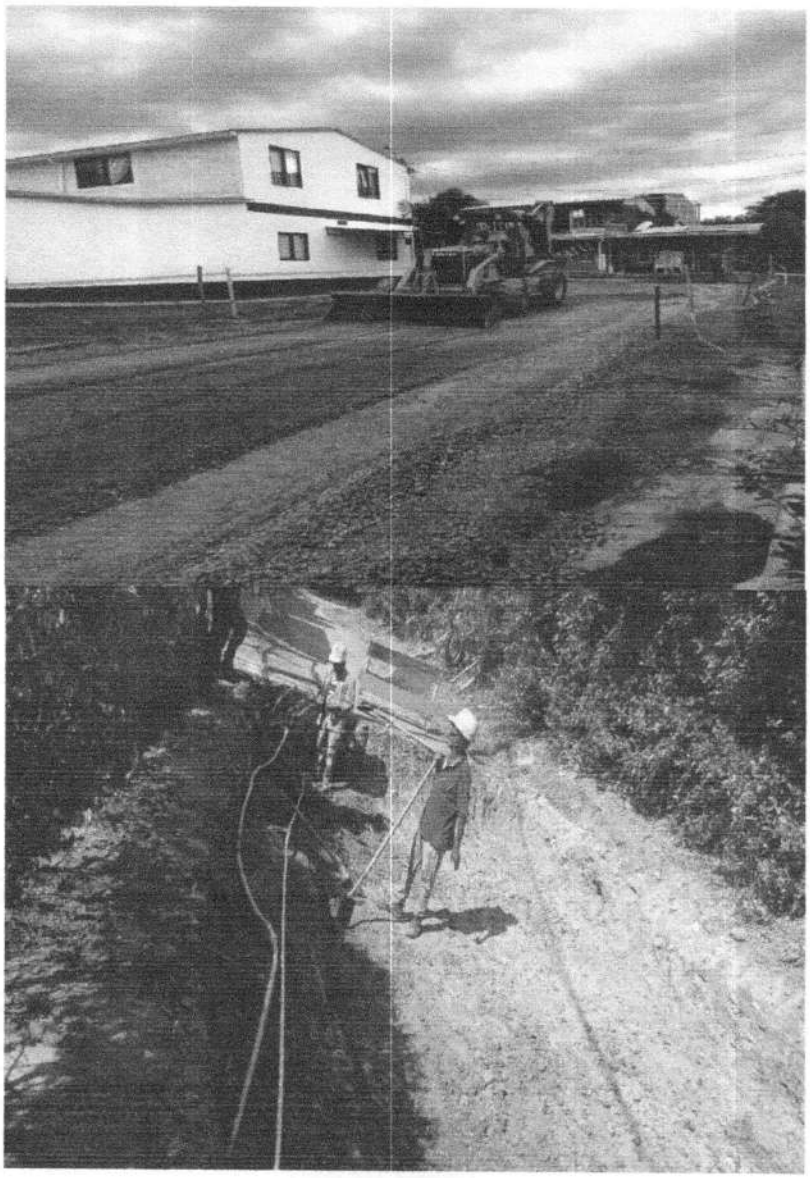


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

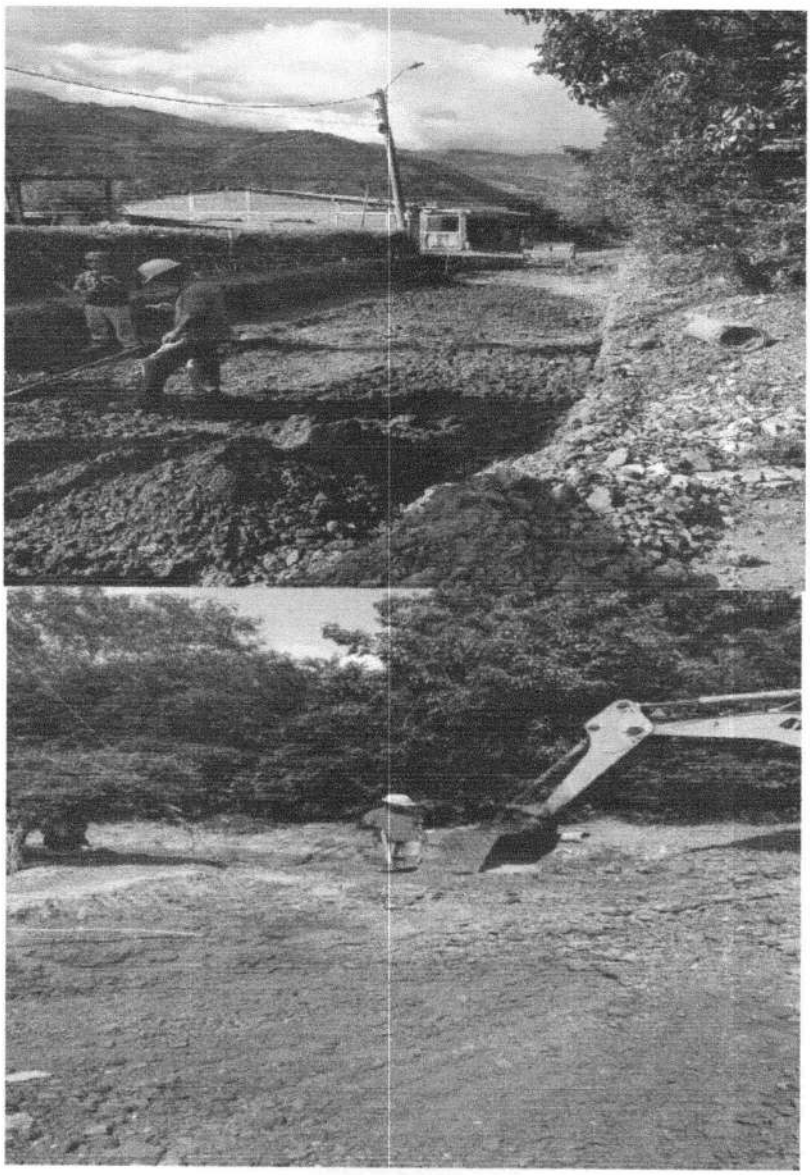

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

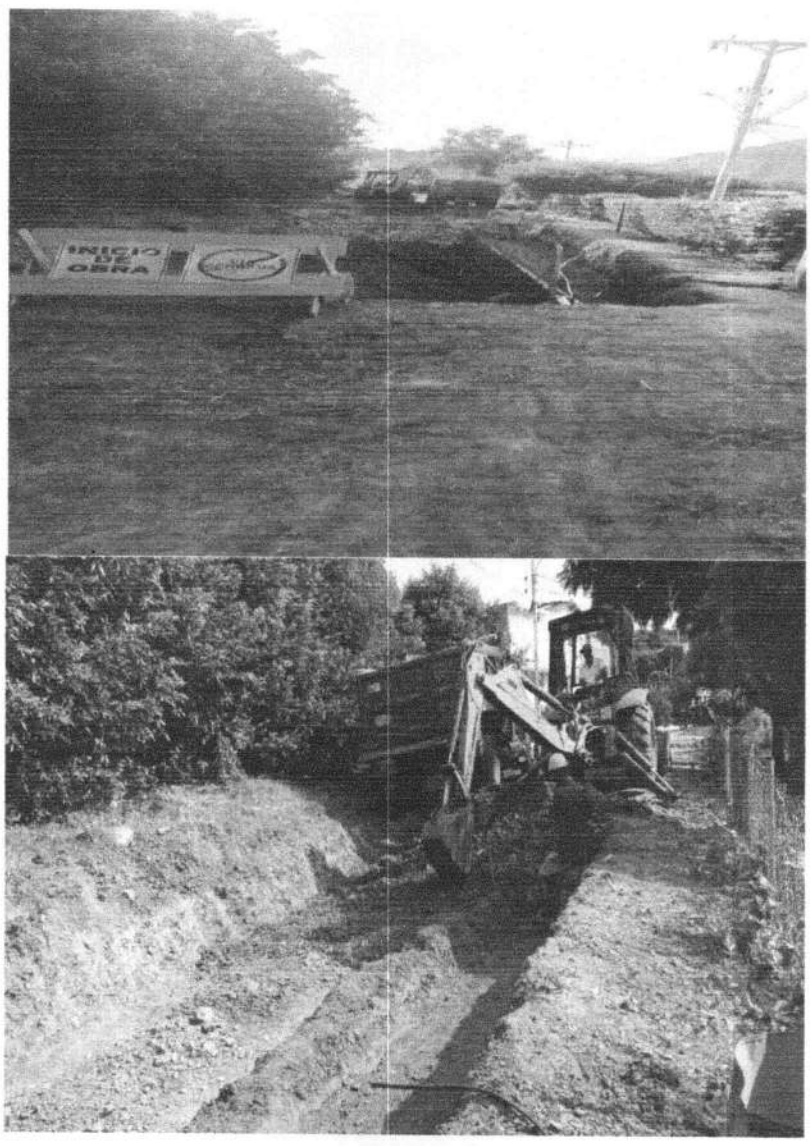

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

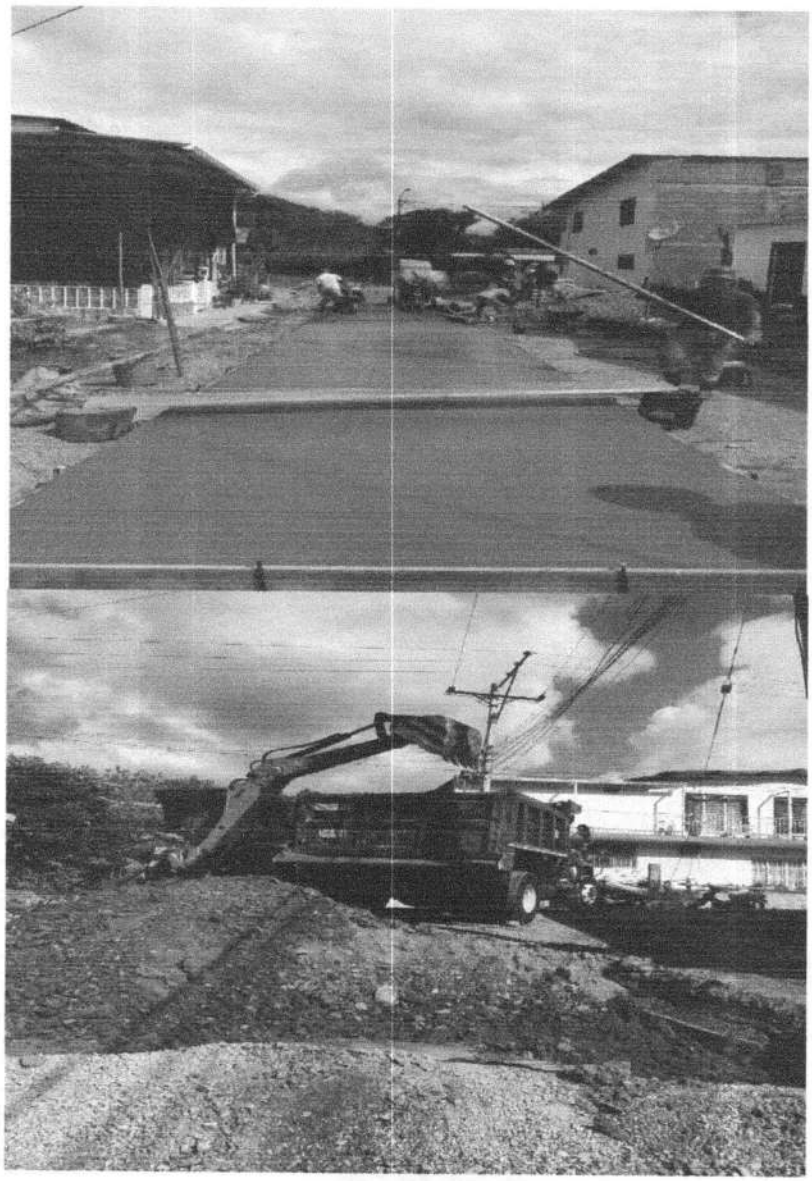

16. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

No	Nombre y Apellido	Dedicación	Cargo	Fecha de Ingreso
1	JUAN CARLOS SANABRIA	50%	DIRECTOR DE OBRA	11-12-2023
2	LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	100%	RESIDENTE DE OBRA	11-12-2023

17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

No	Nombre y Apellido	Dedicación	Cargo	Fecha de Ingreso
1	YICELA YASMIN MEDINA	50%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	11-12-2023
2	FELIPE CALDERON	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	11-12-2023
3	MARCO CONTRERAS	50%	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA	11-12-2023

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. La Interventoría realiza control al procedimiento constructivo y calidad de materiales el contratista cumple con la dedicación de tiempo en la obra.

B. El contratista se encuentra al 43.48% del plazo del contrato.

C. El contratista presenta un atraso de 2%con respecto al cronograma actual con el que se está evaluando el contrato.

D. Es necesario el traslado de la tubería de agua potable en la vía N,1.

E. El contratista comenzara la fundición de la placa de concreto en la vía N.3 como plan de contingencia para acelerar el desarrollo de la obra.

F. Se ha cumplido con los requerimientos exigidos para comprobar la calidad del material, se solicitaron los ensayos de caracterización del material los cuales fueron aportados por el contratista y se encuentran consignados en los informes semanales y en este mismo informe.

G. Se han presentado roturas en las tuberías de aguas negras debido a la poca profundidad que se encontraban esta las mismas lo cual era a 65cm aproximadamente y la profundidad de la excavación según diseño entregado por la entidad contratante corresponde a 80cm, sin embargo, los daños fueron reparados por el contratista para evitar el atraso de la obra.

H. La obra ya cuenta con dicho equipo para obtener los niveles de compactación requeridos en el material granular.

DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023

[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado

FECHA:	Semana: 1	11/12/2023	17/12/2023	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA**			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	**INTEVENTOR**	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	**FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:**	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:**	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-EXCAVACION
2-RETIRO DE ESCOMBROS
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA
4-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ROCA MUERTA


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los angulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico

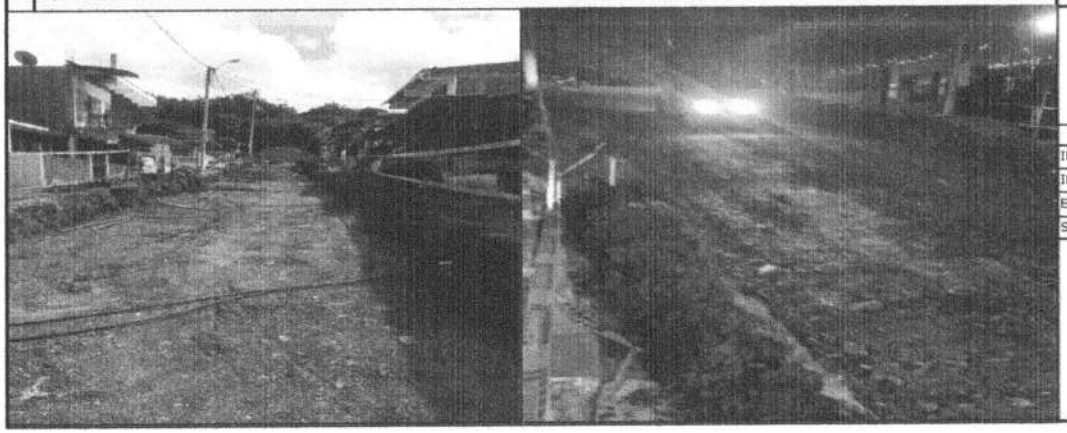

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	**7**	**15,56%**
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ **9.948.832,39**		**2%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ **9.948.832,39**		**2%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -		**0%**
Se presenta un atraso en la Obra	SIN ATRASO		0,00%

NOTAS: EL CONTRATISTA A LA FECHA NO PRESENTA ATRASO CONTRACTUAL

ROCA MUERTA EXTENDIDA







REPARACION DE TUBERIAS

COMPACTACION ROCA MUERTA



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



COMPACTACION ROCA MUERTA



PANORAMICA ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	13,00

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	25,04%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	60,04%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	65,04%
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	75,04%
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	80,04%
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	85,04%
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	90,04%
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	94,04%
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	100,04%

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

EJECUTADO ACUMULADO	SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
$ -		$ -	$ -
$ 0,00	1	$ 0,00	$ 0,00
$ 94.140.101,22	2	$ 94.140.101,22	$ 94.140.101,22
$ 243.908.444,07	3	$ 149.768.342,85	$ 243.908.444,07
$ 265.303.921,62	4	$ 21.395.477,55	$ 265.303.921,62
$ 286.699.399,17	5	$ 21.395.477,55	$ 286.699.399,17
$ 308.094.876,72	6	$ 21.395.477,55	$ 308.094.876,72
$ 329.490.354,27	7	$ 21.395.477,55	$ 329.490.354,27
$ 350.885.831,82	8	$ 21.395.477,55	$ 350.885.831,82
$ 372.281.309,37	9	$ 21.395.477,55	$ 372.281.309,37
$ 389.397.691,41	10	$ 17.116.382,04	$ 389.397.691,41
$ 417.896.467,51	11	$ 28.498.776,10	$ 417.896.467,51

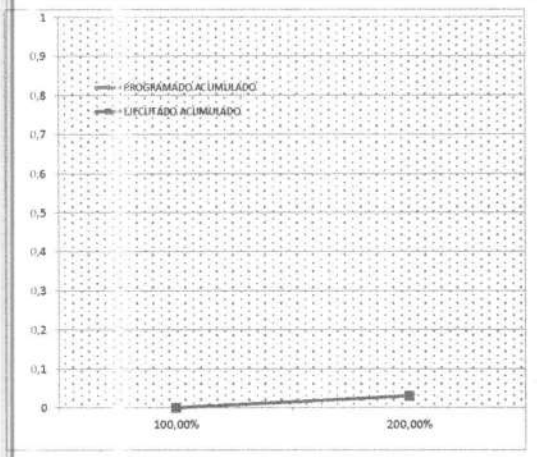

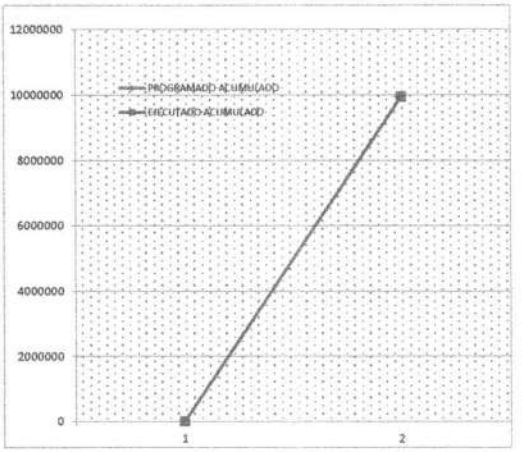

ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 252022/8795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Periodo de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022.

Atentamente

ANCISCO ANTONIO CALVACHEZ PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversión

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS)

ANEXO 4

Proyecto Nº.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La Interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-19	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Código: 6725
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Elaborado por: Jenny Grajales
Descripción del material: Roca muerta
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4991	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1.354	1.354	1.354				
G VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)}$ 100	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2.145	2.145	2.145				
O. Porcentaje de compactación	M x 100 / N	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.


Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-26 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de Ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

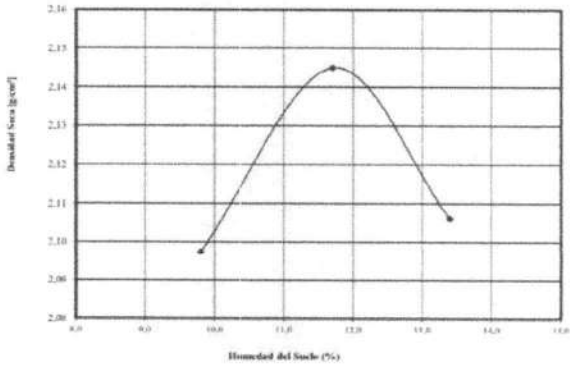

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número CO18.0/2947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____

SI	NO
x	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



REPARACION TUBRIA AN



COMPACTACIO DE ROCA MUERTA



TOMA NIVELESSUBRRASANTE



PANORAMICA SUBRRASANTE



ROCA MUERTA COMPACTADA



EXTENSION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA COMPACTADA



VERIFICACIO DE NIVELES



ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



COMPACTACION ROCA MUERTA



EXTENSION ROCA MUERTA



EXTENDIDA ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



COLMPOACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA EXRENDIDA



EXTENDIDA ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	

$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						

2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

INTERVENTORIA: DUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO: 4 MESES

CONTRATO No. 2023746

CONTRATO No. 2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA / CARGO	MES																															OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1																
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1																
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO: 86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1																38	44,19%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			13	15,12%	
MANO OBRA CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1																13	15,12%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																0	0,00%	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2				1																26	30,14%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																0	0,00%	
En proceso de reincorporación social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																																0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normarfidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 11/Dic/2023

INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA

[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado

FECHA:	Semana: 2 — 17/12/2023 — 24/12/2023		
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA		
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.



4. Curva "S"




PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

2. Registro Fotográfico

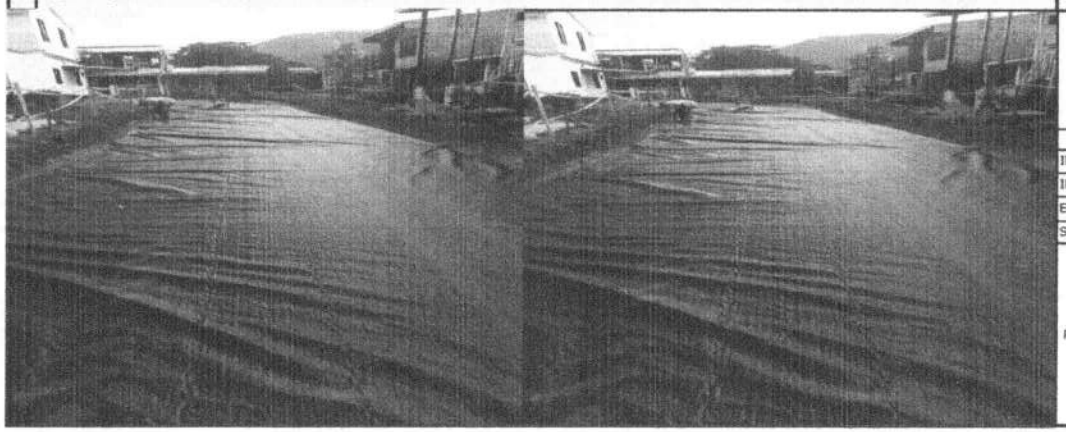


5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	14	31,11%


	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 104.088.933,61	24,47%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 82.272.944,43	19,34%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -21.815.989	-5,13%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO	5,70%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 5,70%, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

COLOCACION GEOTEXTIL T2100



COLOCACION GEOTEXTIL T2100



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



COMPACTACION DE BASE GRANULAR



COMPACTACION DE BASE GRANULAR



REPARACION DE TUBERIAS

PANORAMICA ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

EJECUTADO ACUMULADO	SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
$ -		$ -	$ -
$ 12.932.251,87	1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
$ 82.272.944,43	2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
$ 230.866.219,98	3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
$ -	4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
$ -	5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
$ -	6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
$ -	7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

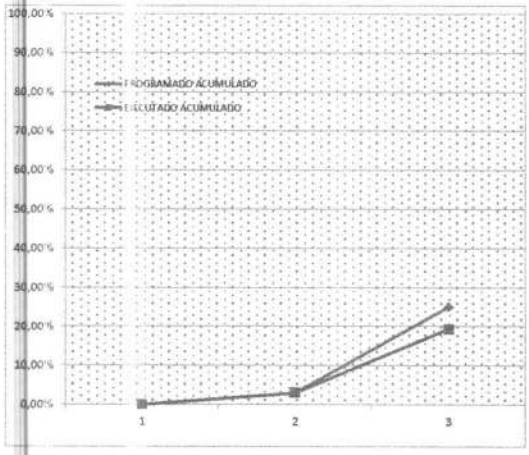

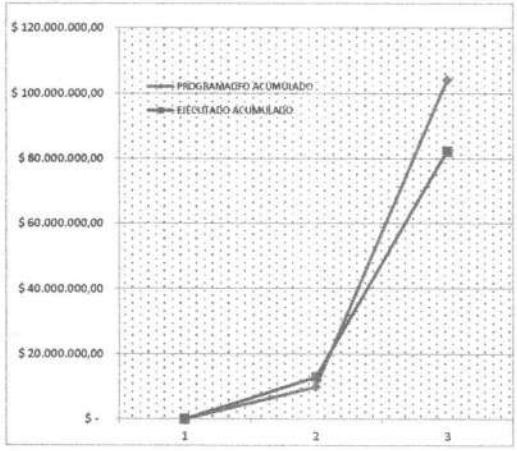

ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Periodo de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Grupo de Valoración y proyectos de Inversión

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto Nº.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La Interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-19	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4981	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1546	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2.14**	**2.10**	**2.09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2.145	2.145	2.145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M}{N} \times 100$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947


INGEOMAC S.A.S
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-29 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2.303	2,396	2.388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13.40
Densidad Seca	[g/cm³]	2.097	2,145	2.106

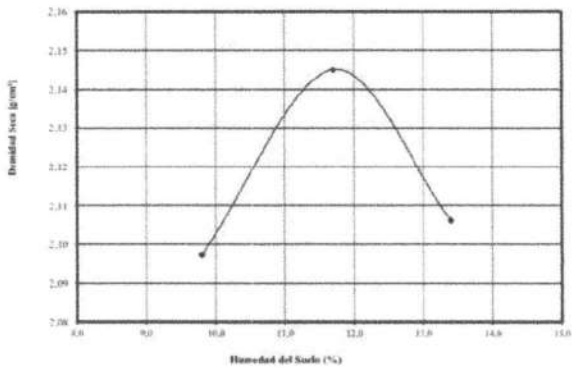

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristobal Colon Telefonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No. _____**

SI	NO
X	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA COMPACTADA



EXTENSION DE GEOTEXTIL T2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100



COMPACTACION SUBBASE TIPO INVIAS



COMPACTACION SUB BASE TIPO INVIAS



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACIONTUBERIA AN



COMPACTACION SUBBASE TIPO INVIAS



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



SUPERFICIE COMPACTADA DE ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN

COMPACTACION DE ROCA MUERTA

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT.2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No. 1					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO:	4 MESES
CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS				CONTRATO No.	2023746
INTERVENTORIA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS				CONTRATO No.	2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA / CARGO	MES														OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	18	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	TOTAL PERIODO: 86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																	0	0,00%	
De la region	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1	39	45,34%	
De fuera de la region	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	15	17,44%	
MANO OBRA CALIFICADA																	0	0,00%	
De la region																	0	0,00%	
De fuera de la region	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	14	16,28%	
PROFESIONALES - TECNICOS																	0	0,00%	
De la region																	0	0,00%	
De fuera de la region	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1	25	29,07%	
POBLACIÓN VULNERABLE																	0	0,00%	
En proceso de reincorporación social																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento																	0	0,00%	
MUJERES:																	0	0,00%	
Mano de Obra no calificada																	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																	0	0,00%	
Profesionales - Tecnicos																	0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Local																			
Nacional																			
Internacional																			

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrollo en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 3	25/12/2023	31/12/2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico

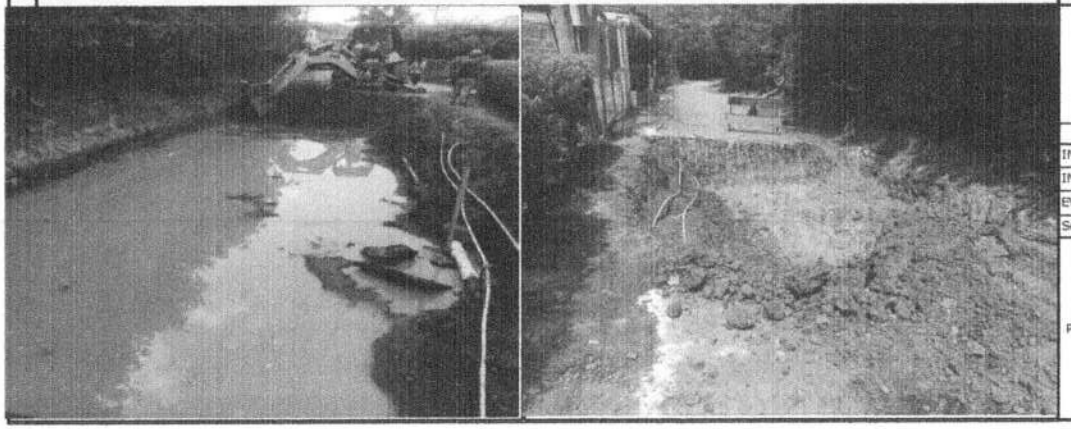

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	21	46,67%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 253.857.276,46		59,67%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 230.866.219,98		54,27%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -22.991.056		-5,40%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		5,77%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 5,77%, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



REPARACION TUBERIA APOTABLE VIAN.1 ARRAYANES



DETALLE FALLO TUBERIA A POTABLE



REPARACION DE TUBERIAS AN

REPARACION DE TUBERIAS AN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA


SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

EJECUTADO ACUMULADO
$ -
$ 12.932.251,87
$ 82.272.944,43
$ 230.866.219,98
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86

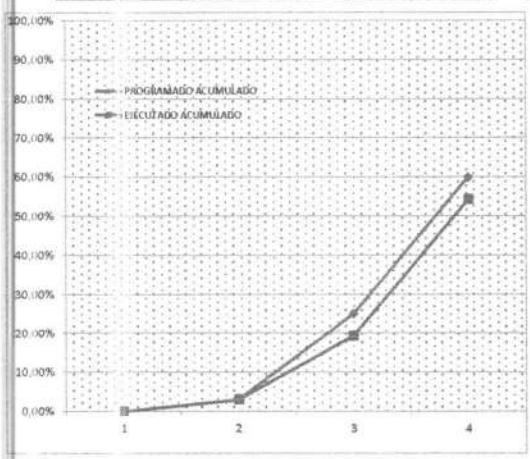

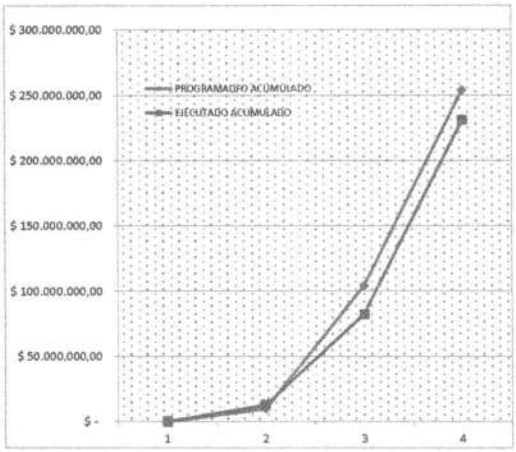


ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Periodo de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

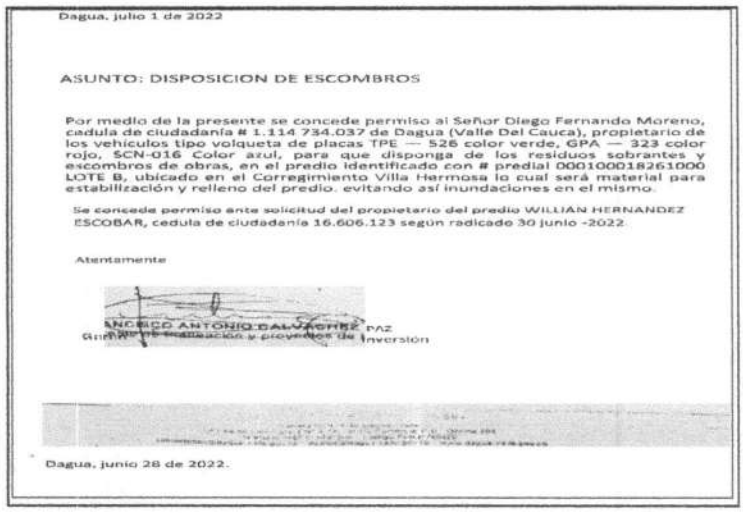

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022.

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO DALVACHE PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversión

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-19	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sonabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedòmetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)					
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1546	1630
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO					
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2.14**	**2.10**	**2.09**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Numero : CO18.02947


INGEOMAC S.A.S
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Telefonos: 373.3707 Celular: 315.527.5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

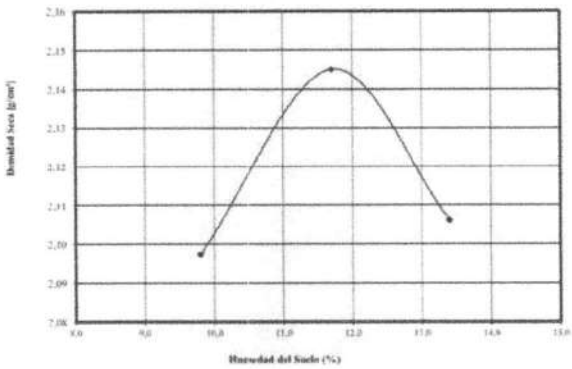

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com; laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No. _____**


SI	NO
X	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



EXTENSION BASE INVIAS

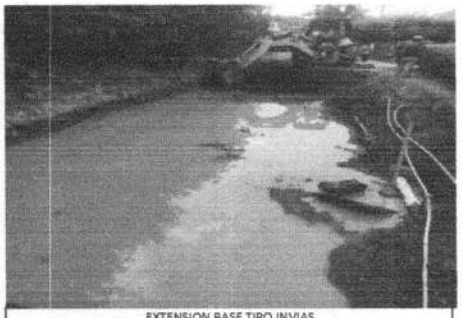

EXTENSION BASE TIPO INVIAS



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



COMPACTACION SUB BASE TIPO INVIAS



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXTENSION SUBBASE TIPO INVIAS



TOMA DE DENSIDADES K0+040



SUBBASE TIPO INVIAS COMPACTADA



EXTENSION SUBBASE TIPO INVIAS



EXTENSION YCOMPACTACION SUBBASE INVIAS




EXTENSION SUBBASE INVIAS



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

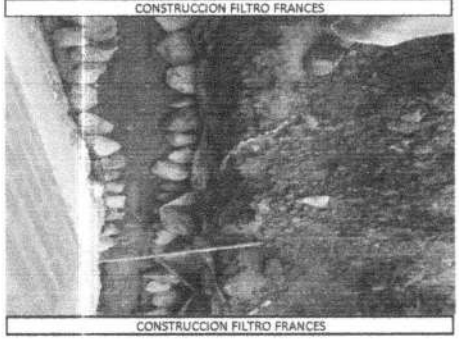

CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17

		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

CR

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

DAGUA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO: 4 MESES

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS — CONTRATO No. 2023746

INTERVENTORIA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS — CONTRATO No. 2023759

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	FECHA / MES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	OBSERVACIONES
	CARGO																	
DIRECTOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	TOTAL PERIODO: 88
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																	SUMATORIA / PORCENTAJE / CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																		0 — 0,00%
De la región		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1			1	40 — 45,5%
De fuera de la región		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				13 — 14,8%
MANO OBRA CALIFICADA																		0 — 0,00%
De la región																		0 — 0,0%
De fuera de la región		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	14 — 15,9%
PROFESIONALES - TÉCNICOS																		0 — 0,00%
De la región																		0 — 0,0%
De fuera de la región		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1	32 — 36,4%
POBLACIÓN VULNERABLE																		0 — 0,00%
En proceso de reincorporación social																		0 — 0,0%
En condición de desplazamiento																		0 — 0,0%
MUJERES																		0 — 0,00%
Mano de Obra no Calificada																		0 — 0,0%
Mano de Obra Calificada																		0 — 0,0%
Profesionales - Técnicos																		0 — 0,0%
PROVEEDORES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Local																		
Nacional																		
Internacional																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

DAGUA	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023

[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado

FECHA:	Semana: 4 — 1/01/2024 — 7/01/2024		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA**		
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	2023746
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	**INTEVENTOR**	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 40.247.745,65
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	**FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:**	31 DE DICIEMBRE/2023
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	**NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:**	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	2 MESES


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana




2. Registro Fotográfico

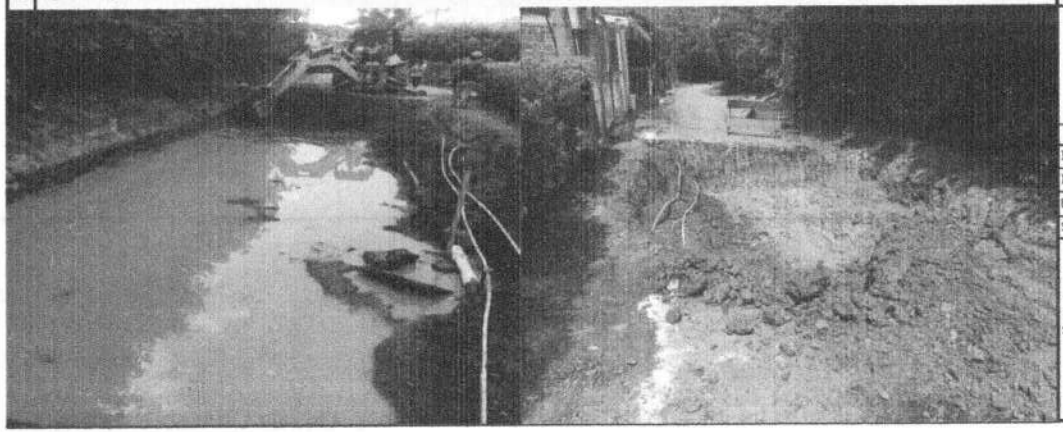

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	**28**	**62,22%**
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 296.648.231,56**		**69,73%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 273.023.659,45**		**64,18%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**$ -23.624.572**		**-5,55%**
Se presenta un atraso en la Obra	**SE PRESENTA ATRASO**		**0,86%**

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 0,86%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 3 SE SUPERA EL ATRASO EN GRAN PORCENTAJE DEBIDO A LAS REPARACIONES Y FRENTES DE OBRA INICADOS POR EL CONTRATISTA, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



REPARACION TUBERIA APOTABLE VIAN.1 ARRAYANES



DETALLE FALLO TUBERIA A POTABLE



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ -
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ -
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

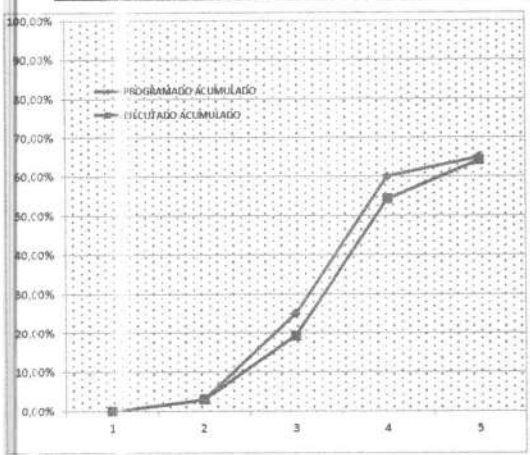

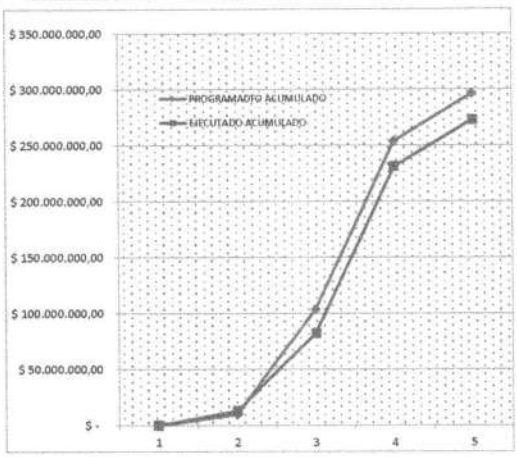

ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Periodo de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022.

Atentamente

[redacted] PAZ
Gestión de Prestación y proveedor de Inversión

[redacted]

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto Nº.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-19	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-135308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sonabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4861	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+ recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)}$ ton	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.


Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.0Z947

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-20 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

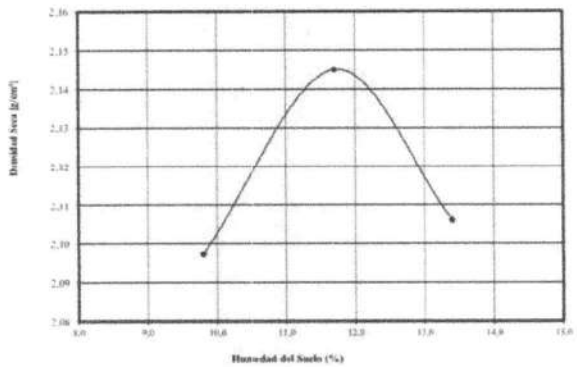

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colon Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No. _____**

SI [X] NO [ ]

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No. _____**

SI [x] NO [ ]

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70




EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

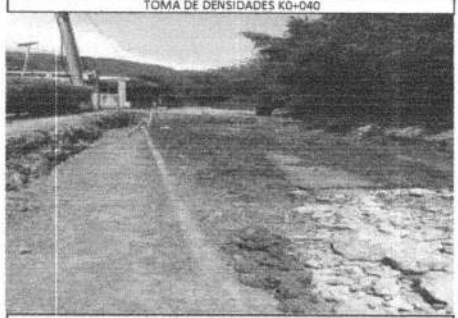

EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES




EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

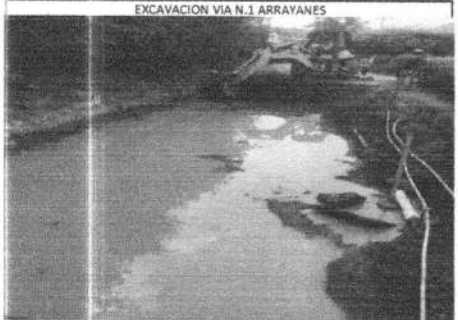

CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731	
$60.943.214					
4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%	
18,61%					
47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%	
62,17%					

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
	$59.666.216					
					$227.090.353	
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
	18,22%					
					69,33%	
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
	80,39%					
					112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	

$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						

4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						

84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO: 4 MESES

CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS — CONTRATO No. 2023746

INTERVENTORIA DUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS — CONTRATO No. 2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	FECHA / MES	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	OBSERVACIONES
	CARGO																	
DIRECTOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
RESIDENTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1					1	
PERSONAL CONTRATISTA		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	

TOTAL PERIODO: 86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																		SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																		0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3				1		38	44,19%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						13	15,12%	
MANO OBRA CALIFICADA																		0	0,00%	
De la región																		2	2,33%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		4	4,65%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																		0	0,00%	
De la región																		0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2				1		21	24,42%	
POBLACIÓN VULNERABLE																		0	0,00%	
En proceso de reincorporación social																		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																		3	3,49%	
MUJERES																		0	0,00%	
Mano de Obra No Calificada																		1	0,00%	
Mano de Obra Calificada																		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																		4	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Local																				
Nacional																				
Internacional																				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 11/Dic/2023

INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA

[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado

FECHA:	Semana: 5 — 8/01/2024 — 14/01/2024		
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA		
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.



4. Curva "S"




PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

2. Registro Fotográfico

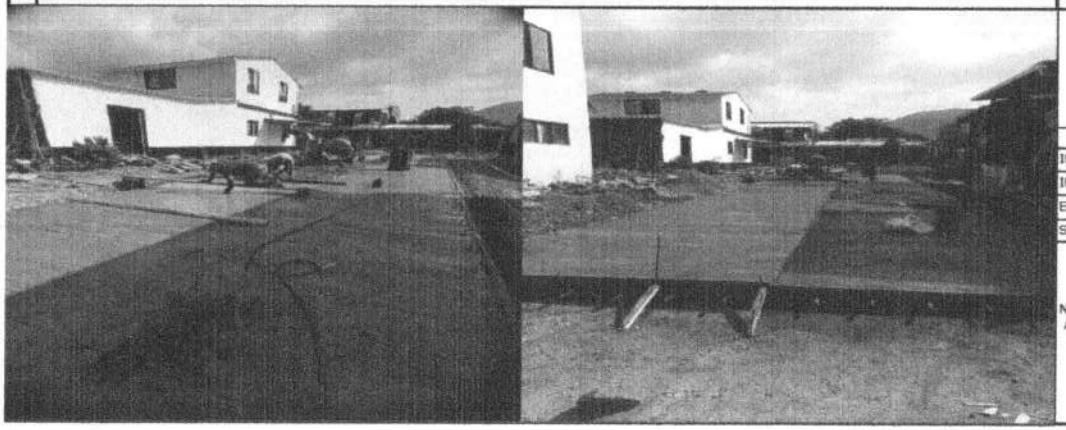


5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	34	75,56%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 339.439.186,66		79,79%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 297.952.276,53		70,04%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -41.486.910		-9,75%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		2,00%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 2,00%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 4 SE AUMENTA EL ATRASO DEBIDC A LAS REPARACIONES Y FRENTES DE OBRA INICADOS POR EL CONTRATISTA, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES







CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES







CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA

REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA


SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	77,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	82,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	87%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	92%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	96%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	102%	

EJECUTADO ACUMULADO
$ -
$ 12.932.251,87
$ 82.272.944,43
$ 230.866.219,98
$ 273.023.659,45
$ 297.962.276,53
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86

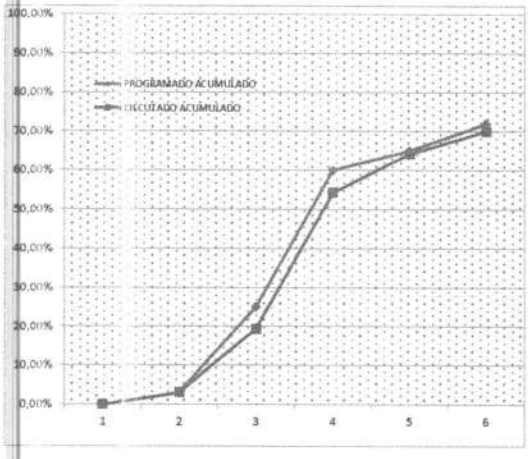

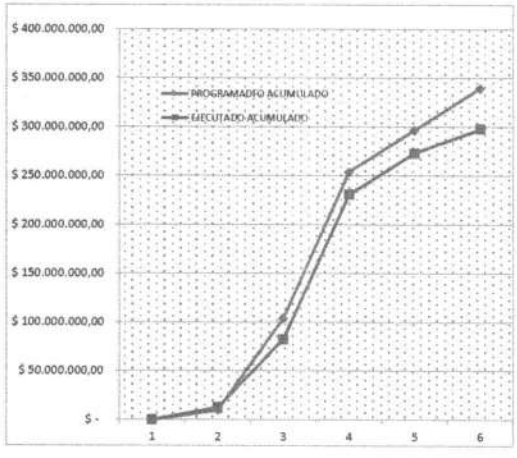

ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520226795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Periodo de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 0001000182610000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio, evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Director de Planeación y proyectos de inversión

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentía y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto Nº.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-19	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Numero : CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristobal Colón Telefonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-29 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

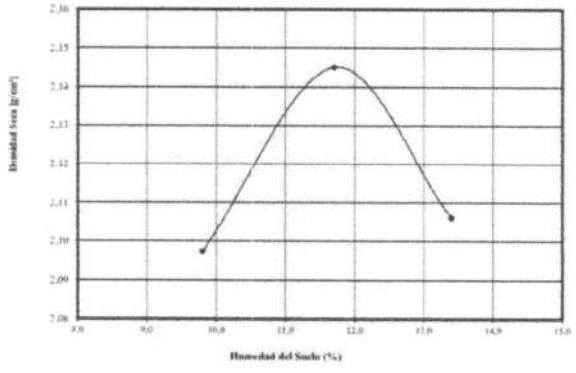

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colon Telefonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com; laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	NO
x	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



REPARACION TUBERIA AN VIA N.1



REUNION INFORMATIVA DE SEGURIADAD



RELEVACION INFORMATIVA DE SEGURIDAD



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



ALMACENAMIENTO MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETO



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



CHARLA INFORMATIVA DE SEGURIDSAD



CHARLA INFORMATIVA DE SEGURIDSAD

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	

$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						

2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731	
	$60.943.214					
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%	
	18,61%					
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%	
	62,17%					

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
	$59.666.216					
					$227.090.353	
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
	18,22%					
					69,33%	
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
	80,39%					
					112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO:	4 MESES
CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS				CONTRATO No.	2023745
INTERVENTORIA CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS				CONTRATO No.	2023756

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA / CARGO	MES 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO	86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN — MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1	53	61,63%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				13	15,12%	
MANO OBRA CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región																	0	0,00%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	14	16,28%	
PROFESIONALES TÉCNICOS																	0	0,00%	
De la región																	0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1	26	30,23%	
POBLACION VULNERABLE																	0	0,00%	
En proceso de reinserción social																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento																	0	0,00%	
MUJERES																	0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada																	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																	0	0,00%	
Profesionales Técnicos																	0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Local																			
Nacional																			
Internacional																			

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág.
		CÓDIGO:
	INFORME PARCIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERSION
		TRD. 4.5.01.18

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DEL CONTRATO N° 2023746

Fecha de presentación (01-**abril-2024**) Período del informe: Desde (11-12-2023) Hasta (10-01-2024)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS NIT: 900.686.385-9

NOMBRE SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ **CC: 6.248.473 de DAGUA (V)**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2023746

OBJETO:
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

PLAZO: HASTA EL 24 DE ENERO DE 2024 **VALOR CONTRATO; ($40.272.745,65) M/CTE**

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:24 DE ENERO DEL 2024**

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL: 50006 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
RUBRO FINANCIACION: 2.1.3.2.01.01.001.03.02.1
FUENTE: 2.2.8.2.00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 50006 DEL 9/11/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo: ____X____ Fecha de la Prórroga: ____31/12/2023____

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información)


Anticipo $ Ejecución de Anticipo $

Saldo por amortizar $ ____0____ Rendimientos financieros generados: $____0____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soporte detallado de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	La interventoría desarrollo las siguientes actividades en el periodo de tiempo del presente informe. 1. Revisión de procesos constructivos. 2. Revisión y aprobación de acta parcial. 3. Revisión de ensayos de calidad de la estructura del pavimento. 4. Revisión de planillas de seguridad social del contratista. 5. Entrega de informes semanales correspondientes al primer mes. 6. Entrega de informe mensual.	Se anexan: • Acta parcial de interventoria. • Informes semanales • Informe mensual.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que

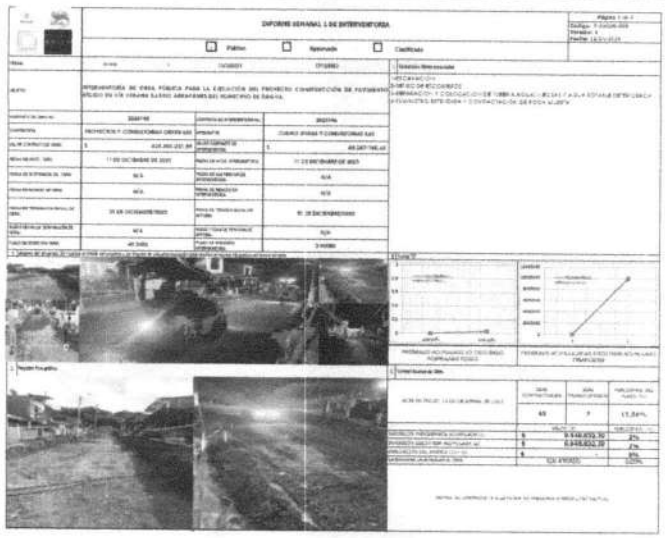

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023



se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.		

AUTORIZACION DE PAGO

Por su parte en el Municipio de Dagua, a los primer (01) días del mes de abril del año 2024, el Señor FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ identificado con **C.C. 6.248.473** DE DAGUA, como supervisor del contrato No 2023 a nombre de, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **pago parcial 1**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato.

FORMA DE PAGO PACTADA

"El Municipio de Dagua pagará actas parciales por avance de obra, cada una que será cancelada al contratista previa presentación de un informe desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, comprobante de pago de los aportes relativos al Sistema General Integral de Seguridad Social de cada mes

Valor contrato	$ 40.247.745,65
Pagos realizados	$ 0,oo
Pago a realizar	$ 28. 918.005,25
Saldo a pagar	$ 11.329.740,4

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág.
		CÓDIGO:
	INFORME PARCIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERSION
		TRD. 4.5.01.18

El Gerente de Planeación y proyectos de inversión del Municipio de Dagua certifica que en contrato **2023746** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Resolución de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacén	NA
Cuenta de Cobro	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista, **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS** declara que: SI ___ /NO X__ es responsable de iva.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ **CC:6.248.473 de Dagua** **Supervisor contrato** **Secretario de Infraestructura**	**ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA** **Contratista** **Contrato 2023746** **Pago parcial 1**

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NIT: 900.686.385-9

CUBIKO S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.013.695 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado con Nit 900.686.385-9 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607 de 2012)*, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Bogotá D.C, a los diecinueve uno (19) días del mes de octubre de 2023.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C. 1.019.013.695 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

YUDY ALEXANDRA DÍAZ MORENO
CONTADOR PÚBLICO
TP 274876-T

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3203426278
MAIL: cubikoint@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal
CR 10 18 44 P 11 OF 1101

42. Correo electrónico financiera.cubiko@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 0 4 1 5 6 2	3 2 0 2 4 0 9 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 1 1 1	2 0 2 1 0 1 0 1	4 1 1 1	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 30 / 17 : 30: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANABRIA NIETO ADRIANA CAROLINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 2 6	2 0 1 6 0 2 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 5 1 0	2 0 1 6 0 2 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 2 2 1 2 8 3 8	0 2 2 1 2 8 3 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 1 2 2 6	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 8 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) **000001492367501 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 1 3 6 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	NIETO	ADRIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 3 8 7 9 4 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NIETO	CASTIBLANCO	LAURA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANIL
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	
2024-01	2023-12	E

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mo Cotizaci
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	78.000	0		0		0	4	300
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	111.800	0		0		0	4	500
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	62.300	0		0		0	4	300
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	42.000	0		0		0	4	200
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	38.000	0		0		0	4	200

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor M Cotiza
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	123.800	0	0	0	0	4	50
230301	Porvenir	800224808-8	643.000	0	0	0	0	4	2.4
231001	Colfondos	800227940-6	87.200	0	0	0	0	4	40
25-14	Colpensiones	900336004-7	473.900	0	0	0	0	4	1.8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Sa Fav
				No. Autorización	Valor							
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	577.900				577.900	4	2.100	580.000		

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	332.100	4

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANIL
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	
2024-01	2023-12	E

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TO	
Tipo Administradora	No. Admi Rep
Salud	
Pensión	
Riesgos Laborales	
CCF	
ESAP	
ICBF	
MEN	
SENA	
TOTALES	

PAGA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANIL
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	
2024-01	2023-12	E

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Salario	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotiza
1	CC	1033806955	CASTELLANOS SANTOS MARIA CAMILA	1	0			S	X																230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS005	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.1
2	CC	1067876820	BUILES RODRIGUEZ DAVID ENRIQUE	1	0			S	X																230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS041	950.000	38.000	14-23	950.000	5	66.2
3	CC	1073516815	GALVIS BUENAVENTURA ROSARIO DE LOS ANGELES ROMELIA	1	0			S	X	X															230301	1.049.534	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.049.534	42.000	14-23	1.048.534	5	73.1
4	CC	1074417229	MEDINA PEÑA YICELA YASMIN	1	0			S	X																230301	2.018.334	323.000	0	0	0	0	EPS005	2.018.334	80.800	14-23	2.018.334	5	140.
5	CC	1114730537	FRANCO GELVEZ MICHAEL DOUGLAS	1	0			S	X	X															231001	544.950	87.200	0	0	0	0	EPS008	544.950	21.800	14-23	544.950	5	38.(
6	CC	19472865	CALDERON HERRERA FELIPE ALFONSO	1	0			S	X																25-14	1.949.134	311.900	0	0	0	0	EPS002	1.949.134	78.000	14-23	1.948.134	5	135.
7	CC	79483953	CONTRERAS ROJAS MARCO ANTONIO	1	0			S	X																25-14	1.012.650	162.000	0	0	0	0	EPS008	1.012.650	40.500	14-23	1.012.650	5	70.5

PAGAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.275.543
DIAZ MORALES

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRES
Yudy Diaz M

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

14-SEP-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00332675 F-1026275543-20110910 0027991869A 1 1371454459

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E27664664F4C3E1B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA DIAZ MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026275543 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 274876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274876-T



YUDY ALEXANDRA
DIAZ MORALES
C.C. 1026275543
RES. INSCRIPCION 1872 DEL 09/10/2020
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296163 **310**

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 1800482/01/19

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	**Página 1 de 1**
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA *CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO*	VERSION:
	MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA	TRD: 2.05.13.21

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DAGUA

CERTIFICA

Que, en el archivo de contratación, expediente del contrato Nro. **2023746** reposan los siguientes documentos.

Estudios previos
Declaración de bienes y renta
Certificado banco de proyectos (si aplica)
Invitación y propuesta
Cedula de ciudadanía y Rut
Antecedentes penales y disciplinarios
Pago seguridad social
Hoja de vida con Soportes Sigep II
CDP No 50006
Contrato 2023746
Registro presupuestal No 50006
Póliza
Autorización de Póliza
Acta de inicio
Factura No 1
Autorización de pago
Planilla Seguridad social – Certificación parafiscales

Se certifica que la contratista, **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS, identificado con NIT 900.686.385-9** cuyo representante legal es **CAROLINA SANABRIA** cumplió con el desarrollo de sus actividades y pago de seguridad social de acuerdo a la normatividad vigente. Por lo anterior y una vez revisado los documentos soportes se autoriza el presente pago.

Valor contrato	$ 40.247.745,65
Pagos realizados	$ 0,00
Pago a realizar	$ 28. 918.005,25
Saldo a pagar	$ 11.329.740,4

Para constancia se firma en Dagua a los diez (10) día del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024)

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura

Elaboro: Daniel Arce Ing. civil / Profesional Universitario.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1E27664B6F4C3E1B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA DIAZ MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026275543 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 274876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.275.543
DIAZ MORALES

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRES
Judy Diaz M

FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-SEP-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00332515 P 1026275543-20110913 0027991964A 1 1371414459

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274876-T



YUDY ALEXANDRA
DIAZ MORALES
C.C. 1026275543
RES. INSCRIPCION 1872 DEL 09/10/2020
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296163 310021

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ D. C	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	19/01/2024	74122716	$2.579.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	332.100	333.600
Pensión	4	1.327.900	1.333.000
Riesgos Laborales	1	577.900	580.000
CCF	1	332.100	333.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.570.000	2.579.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por el Comité de Control y Operador de información

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				7	0
2024-01	2023-12	E	19/01/2024	74122716	TOTAL A PAGAR	
					$2 579.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIoN COTIZANTE								INFORMACIoN NOVEDADES																PENSIoN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Depend	Estudiante	Docente	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1003906955	CASTELLANOS SANTOS MARIA CAMILA	1	0			S	X															230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS005	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.500	CCF56	773.334	31.000	0	0	0	0	0
CC	1057817820	BUILES RODRIGUEZ DAVID ENRIQUE	1	0			S	X															230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS041	950.000	38.000	14-23	950.000	5	66.200	CCF56	950.000	38.000	0	0	0	0	0
CC	1073516815	GALVIS BUENAVENTURA ROSARIO DE LOS ANGELES ROMELIA	1	0			S	X	X														230301	1.049.534	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.049.534	42.000	14-23	1.049.534	5	73.100	CCF56	1.049.534	42.000	0	0	0	0	0
CC	1074417229	MEDINA PENA YICELA YASMIN	1	0			S	X															230301	2.018.334	323.000	0	0	0	0	EPS005	2.018.334	80.800	14-23	2.018.334	5	140.500	CCF56	2.018.334	80.800	0	0	0	0	0
CC	1114730937	FRANCO GELVEZ MICHAEL DOUGLAS	1	0			S	X	X														231001	544.950	87.200	0	0	0	0	EPS009	544.950	21.800	14-23	544.950	5	38.000	CCF56	544.950	21.800	0	0	0	0	0
CC	19472865	CALDERON HERRERA FELIPE ALFONSO	1	0			S	X															25-14	1.949.134	311.900	0	0	0	0	EPS002	1.949.134	78.000	14-23	1.949.134	5	135.700	CCF56	1.949.134	78.000	0	0	0	0	0
CC	79403653	CONTRERAS ROJAS MARCO ANTONIO	1	0			S	X															25-14	1.012.050	162.000	0	0	0	0	EPS001	1.012.050	40.500	14-23	1.012.050	5	70.500	CCF56	1.012.050	40.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PÚBLICO por parte de Compensar | Operador de Información

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302947637

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000063665 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	11	2023	09	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.686.385-9

DIRECCIÓN: CR 10 NO. 18 - 44 P 11 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2810966

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/11/2023	30/04/2024	8,049,549.13
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/11/2023	31/12/2026	2,012,387.28
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	30/06/2024	8,049,549.13

BENEFICIARIOS
NIT 800100514 - MUNICIPIO DE DAGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA, DE FECHA 01/11/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****18,111,485.54	$ **********95,823	$****15,000.00	$ *******21,056	$ **********131,879

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430294763

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB207A060BFB785C CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Ca... favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
