DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUBIKO S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
431dee36a846abb35f2f070c7e714d6b7c282da8d45d5eeb3b3219b4be7f4f907f855d6dda71228fbca84f71cd42b5c8

Número de Factura: CBK-124
Fecha de Emisión: 01/04/2024
Fecha de Vencimiento: 01/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nombre Comercial: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nit del Emisor: 900686385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 10 18 44 P 11 OF 1101
Teléfono / Móvil: 7041562
Correo: financiera.cubiko@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE DAGUA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100514
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: vivienda@dagua-valle.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1038	SERVICIO DE INTERVENTORIA	NIU	1,00	$ 9.520.790,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.808.950,15	19.00			$ 9.520.790,25

Notas Finales

OBJETO "INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"
PERIODO 2 FACTURA MENOR: DEL 23 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO
NO TA: Favor consignar en BANCOLOMBIA en la cuenta de ahorros N° 053-318239501
Linea de negocio: 2023746



Documento validado por la DIAN 2024-04-01 17:22:32
Documento generado el: 2024-04-01 17:22:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			9.520.790,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			9.520.790,25
IVA			1.808.950,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.808.950,15
Total neto factura (=)			11.329.740,40
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.329.740,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053048846 Rango desde: 29 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-08-04

CONTRATO No 2023746

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT o C.C.:	900.686.385-9
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($40.247.745,65)
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($40.247.745,65)
DURACIÓN:	DOS (02) MESES CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACION 01:	TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	08 DE FEBRERO DE 2024

En el municipio de Dagua, el día 08 de febrero de 2024, se reunieron el ingeniero FRANCISCO CALVACHE como supervisor y la arquitecta ADRIANA CAROLINA SANABRIA como representante legal de la firma interventora CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S, con el fin de suscribir esta acta de recibo de obra entre las partes a satisfacción.

A esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos exigidos en el pliego de condiciones y en el contrato, para el recibo del mismo, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar por recibido al contrato de la referencia.

Para constancia, se firma la presente acta a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2024 por quienes en ella intervinieron:

FRANCISCO CALVACHE
Supervisor

ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Contratista Interventor

	ACTA FINAL INTERVENTORIA
	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA
	CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta Final [X] Acta Parcial [ ] No.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023746

"INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE DAGUA	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	901503188-3	
INTERVENTOR (A)	CUBIKO OBRAS Y COSULTORIA S.A.S	
SUPERVISOR (A)	FRANCISCO ANTONIO CALVACHE	
VALOR INICIAL CONTRATO	$	40 247.745,65
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	40 247.745,65
PLAZO CONTRACTUAL	2 MESES	
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	N/A	
FECHA DE REINICIO Nº 1	N/A	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2023	
ADICIONAL EN TIEMPO	39 DIAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	08 DE FEBRERO DE 2024	

NOTA: En caso de que exista mas de una sus pensión y reiniciación, se debe anexar el numero de filas que contengan la información de las suspensiones y reinicios realizadas

El día 21 de marzo de 2024, se reunieron en la alcaldía del municipio de Dagua, **KAROL VILLAREJO** en calidad de alcaldesa del municipio de Dagua, la Arquitecta **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** en calidad de contratista y el Ingeniero **FRANCISCO ANTONIO CALVACHE** en calidad de supervisor del contrato , con el fin de suscribir el acta final del Contrato de Interventoria **No. 2023746**

El Contratista entrega el resultado del estudio mediante los siguientes soportes en Medio Magnético e Impreso:

Descripción del contenido final del estudio recibido.

BALANCE DEL CONTRATO	$	40 247.745,65
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	40 247.745,65
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	40 247.745,65
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	$	28 918.005,25
VALOR ACTA FINAL	$	11 329.740,40
ACUMULADO ACTAS	$	40 247.745,65
VALOR TOTAL ANTICIPO		N/A
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA		N/A
ANTICIPO AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		N/A
SALDO ANTICIPO		N/A
VALOR SALDO DEL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$	11 329.740,40

ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
CONTRATISTA

ING. FRANCISCO ANTONIO CALVACHE
SUPERVISOR (A)

DANIEL ARCE GALVEZ
ING CIVIL APOYO A SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.019.013.695

SANABRIA NIETO
APELLIDOS

ADRIANA CAROLINA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1987

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO


05-ABR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-00894995-F-1019013695-20170408 0054852790A 1 9999584202

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023

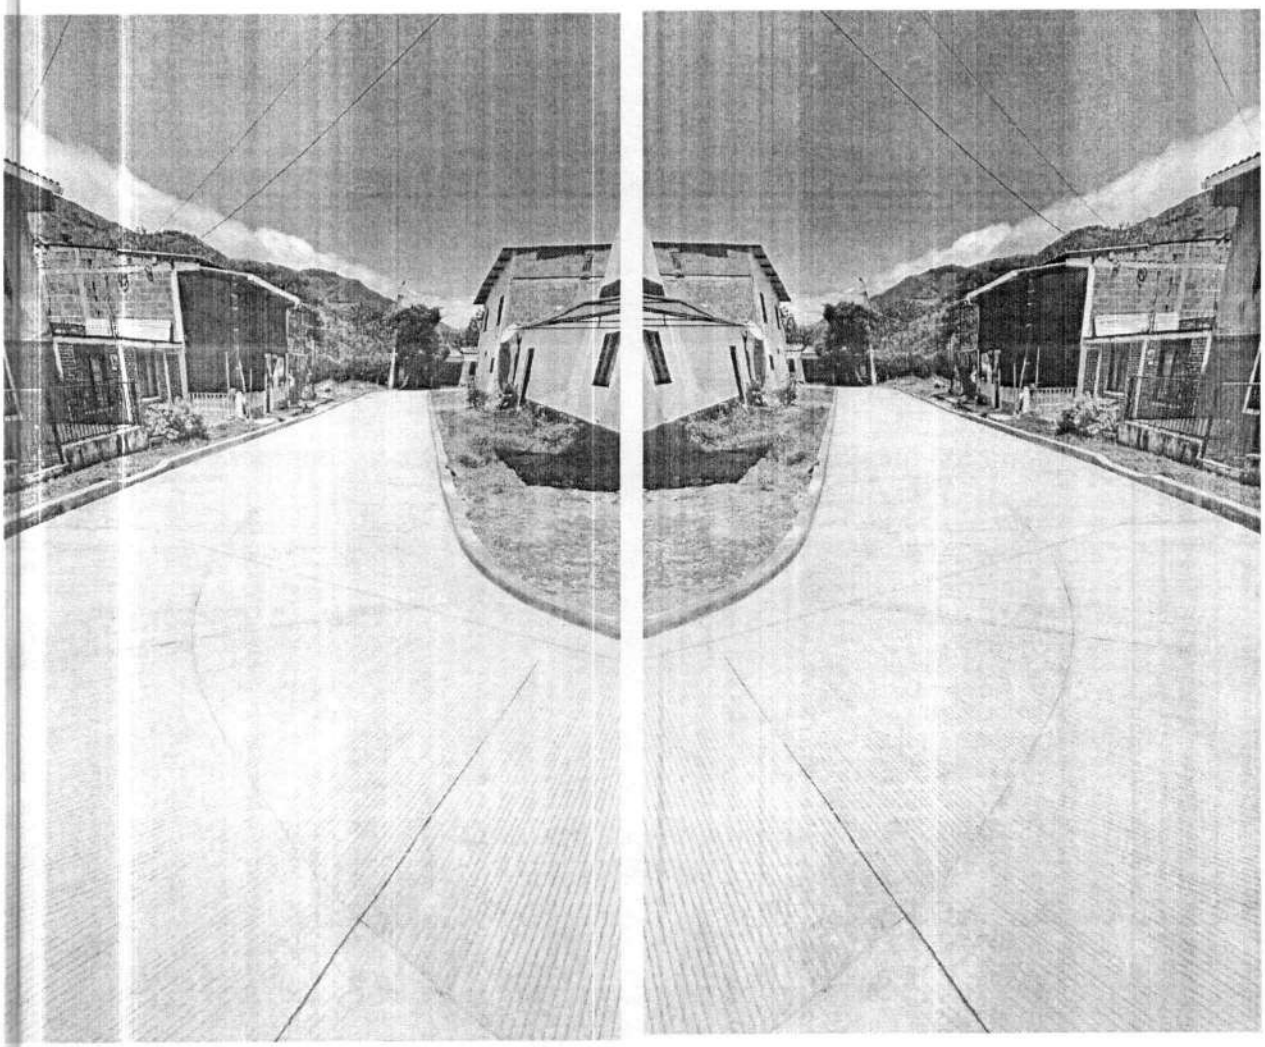

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023

ELABORÓ:

ING. FELIPE CALDERON HERRERA

Residente de Interventoría

APROBÓ:

ING. YICELA YASMIN MEDINA

Yicel Medina

Directora de interventoría

DAGUA

CUBIKO S.A.S

DAGUA (VALLE DEL CAUCA)
FEBRERO 2024.

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
5. FINALIDAD DEL PROYECTO 8
6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO 9
   7.1 ACTAS DE OBRA 9
   7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA 9
8. CURVA S 11
9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE 12
10. PROGRAMACION DE OBRA 15
11. BALANCE DE OBRA 17
12. ENSAYOS 25
13. ITEMS NO PREVISTOS 33
14. DETALLE DE ACTIVIDADES 39
15. REGISTRO FOTOGRAFICO 43
16. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 55
17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 55
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55

1. INTRODUCCIÓN

Una vía urbana se define como una vía publica dentro de una población bien sea un pueblo o una ciudad. En este contexto, la planificación, mantenimiento y mejora de las vías urbanas se revela en este sentido la calidad de vida de una sociedad.

El presente informe mensual correspondiente al proyecto de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES VIAN.1, N.2, N.3 N.4 DEL MUNICIPIO DE DAGUA, una iniciativa que busca transformar y mejorar significativamente la infraestructura vial de la comunidad del Municipio de Dagua. Patrocinada por el programa fondo de regalías CBR-NBI. El documento expuesto a continuación denota de los avances, superados y logros obtenidos durante el último mes, destacando el compromiso continuo con la excelencia y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

El presente documento constituye el informe mensual de Interventoría No. 01, periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 y 10 de enero de 2024, de conformidad a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2023746 y demás anexos que hacen parte integral del contrato, dando cumplimiento al objeto contractual: INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No.		2023746
Objeto Contractual:		INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
Valor Inicial Del Contrato De Interventoría		$ 40.272.745,65
Valor Adicional (Modificación 01) Obra		N/A
Valor Total Actualizado		N/A
Plazo Inicial		2 meses
Fecha de Inicio		11 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial		31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Suspensión Temporal de Plazo 01		N/A
Prorroga 01		21 DE DICIEMBRE 2023
Acta de Reinicio		N/A
Tiempo Total Suspendido		N/A
Tiempo Adicional (Modificación 01) de Interventoría		39 DIAS
Nueva fecha de Terminación		08 DE FEBRERO DE 2024
Contratista		CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT		900.686.385-9
Representante Legal		ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Director de Obra		ING. YICELA YASMIN MEDINA
Residente de Obra		ING. FELIPE CALDERON HERRERA

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.		2023758
Objeto Contractual:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA
Valor Inicial Del Contrato De Obra		$ 427.909.551,28
Valor Adicional (Modificación 01) Obra		N/A
Valor Total Actualizado		N/A
Plazo Inicial		45 DIAS
Fecha de Suscripción del Contrato de Interventoría		N/A
Fecha de Inicio		11 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Terminación Inicial		31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Suspensión Temporal de Plazo 01		N/A
Prorroga		21 DE DICIEMBRE DE 2024
Acta de Reinicio		N/A
Tiempo Total Suspendido		N/A
Tiempo Adicional (Modificación 01) de Interventoría		24 DIAS
Nueva fecha de Terminación		24 DE ENERO DE2024
Contratista		PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NIT		901.503.188-3
Representante Legal		LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Director de Obra		JUAN CARLOS SANABRIA
Residente de Obra		LISSY PAOLALLANOS MARTINEZ

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dentro de las metas del plan de desarrollo "APOSTEMOS TODOS A CRECER POR DAGUA 2020-2023", en el sector: vías y transporte, cuyo objeto especifico contribuye al desarrollo económico local sostenible, mediante el mejoramiento de vías de comunicación y condiciones de movilidad de la población, en la zona urbana y rural, para un tránsito seguro y en paz, con enfoque de derechos, diferencial, víctimas y demás grupos de inclusión social. Se logró celebrar el contrato que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA

Para la ejecución del contrato y cumplimiento de su objeto contractual, se contemplan las siguientes actividades construcción de vía nueva en este barrio:

- Excavación a máquina (Cajeo).
- Retiro escombros a maquina <= 10kms.
- Conformación compactada subrasante CBR=95
- Relleno - Roca muerta compactada con material seleccionado de sitio.
- Sub-base compactada 10km tipo INVIAS.
- Pavimento en concreto MR=38 E=20cms
- Sardinel en concreto.
- Refuerzos en hierro de 60.000PSI.


De acuerdo al plazo contractual la duración total inicial del proyecto se ha planteado para 45 días, para el contrato de obra y 2 meses para el contrato de Interventoría. En el presente informe se podrá encontrar la información total de los contratos hasta su finalización.

5. FINALIDAD DEL PROYECTO

Construcción de vías en concreto rígido MR=38 en el barrio los Arrayanes en el municipio de Dagua, en el departamento del Cauca.

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Dagua.

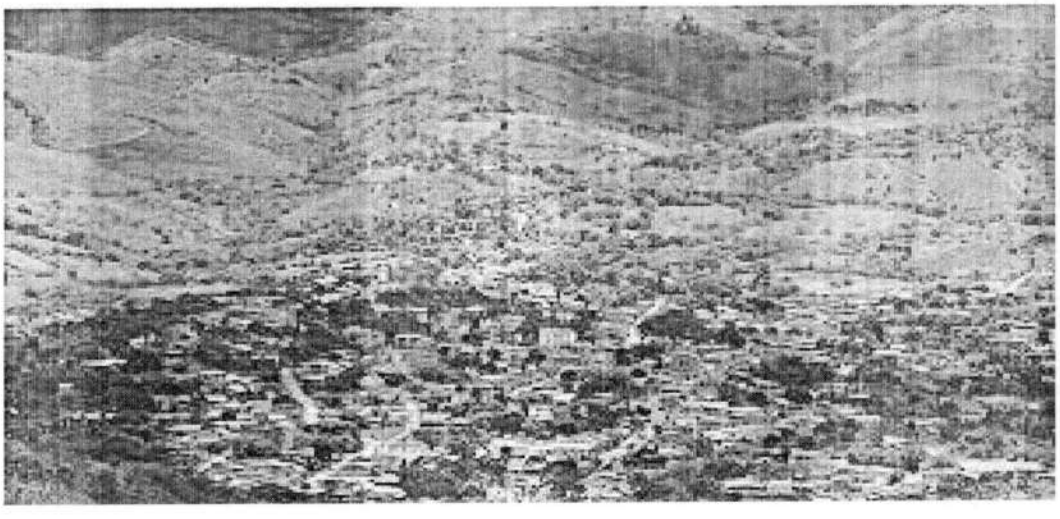

La dirección física del frente de obra es el siguiente:

BARRIO LOS ARRAYANES
Vía 1,2,3,4

7. ACTAS DEL PROYECTO Y ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO

A la fecha del presente periodo de cobertura del informe mensual, el contratista de obra tramito el pasado 26 de diciembre el acta parcial numero 1 por un valor de $81.976.731.00. Interventoría no tramito cuenta en ese momento, en el presente informe se reacciona la cuenta número 1 de interventoría.

7.1 ACTAS DE OBRA

	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 425.403.021,89	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 0.00	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 425.403.021,89	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 81.976.731,00	19,27%
ACTA PARCIAL 02	$ 214.398.108,00	50,40%
ACTA FINAL	$ 129.028.182,89	30,33%
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0.00**	0.00%
VALOR TOTAL POR PAGAR	$ 425.403.021,89	100%


7.2 ACTAS DE INTERVENTORIA

	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INT	$ 40.272.745,65	100%
VALOR MODIFICACION 01	$ 0.00	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 40.272.745,65	100%
ACTAS PARCIALES		
ACTA PARCIAL 01	$ 28.918.005,25	71.81%
ACTA FINAL	$ 11.354.740,40	28.19%


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0.00**	0.00%
VALOR TOTAL POR PAGAR	$ 40.272.745,65	100%

Curva "S" avance financiero contrato de obra.

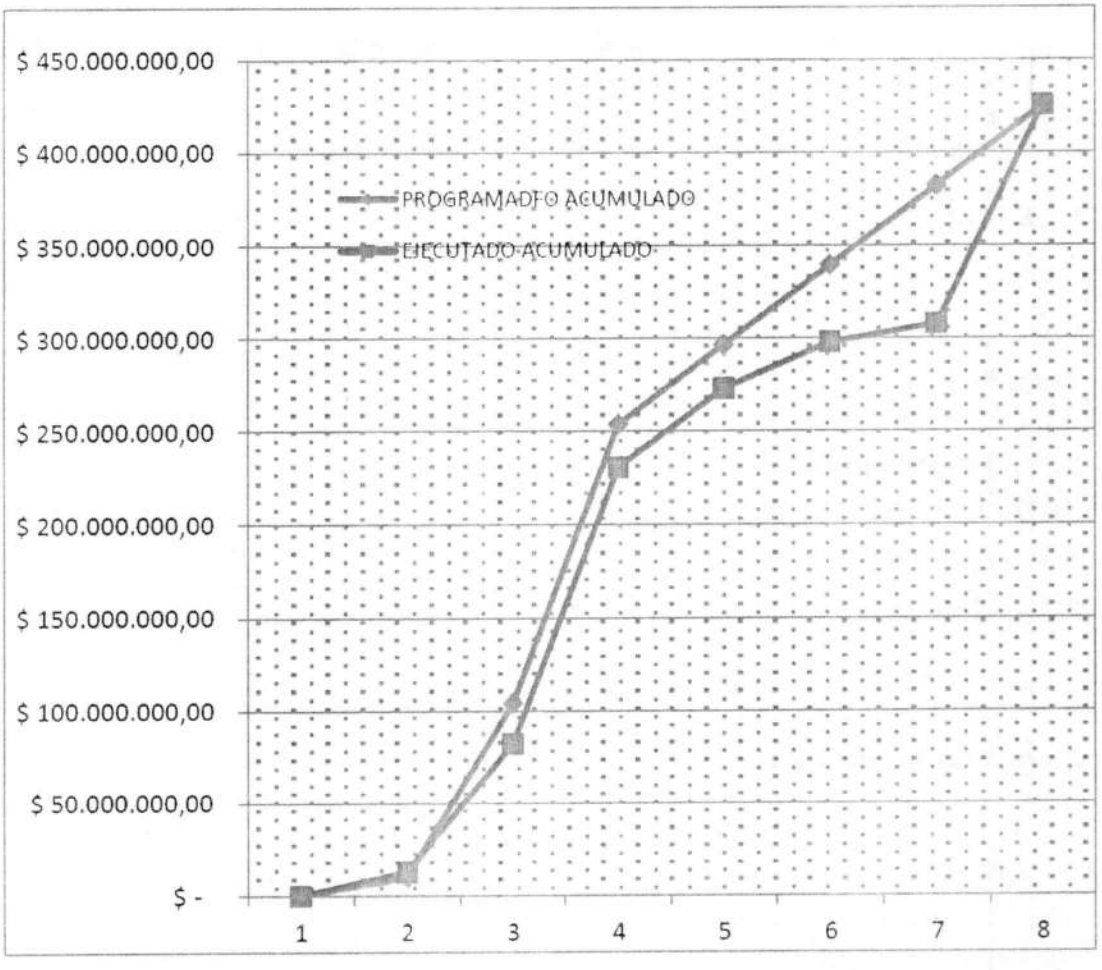

8. CURVA S

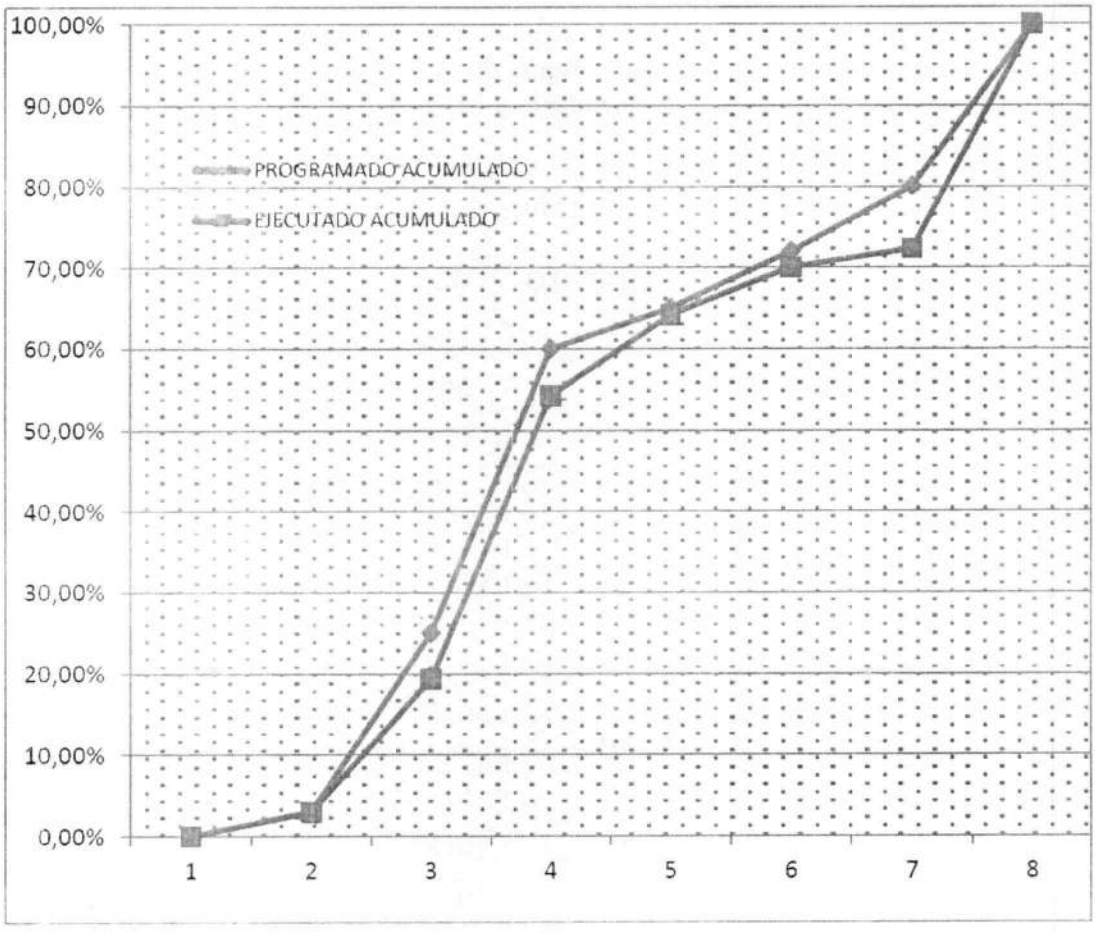

Se evidencia un 100% de actividades programadas acumuladas vs un 100% de actividades ejecutadas acumuladas a la fecha, es de aclarar que el contratista de obra termino su ejecución 10 días después, razón por la cual se debió pagar una mayor permanencia de la interventoría y se informa que este atraso se dio por el

NO pago del acta 1 y 2 del contratista de obra y se puede entender que durante toda la ejecución del contrato de obra, este no obtuvo su pago a tiempo. Es de aclarar que este atraso no es imputable al contratista.

9. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION Y AVANCE


El contrato de obra dio inicio el día 11 de diciembre de 2023, con un plazo contractual de 45 días.

A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 55 días calendario para el contrato de interventoría y 55 días calendario para el contrato de obra.

El contratista culmina sus actividades contractuales el 3 de febrero de 2024.

CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO	11-dic-2023		
FECHA INICIAL DE TERMINACION	31-dic-2023		
DURACION	45 DIAS		
	DESDE	**HASTA**	**DURACION**
SUSPENSION	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 01	01/01/24	24/01/24	24 DIAS
ACTA DE REINICIO 01	N/A	N/A	N/A
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	0 DIAS		
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	24 DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	24 ENERO 2024		
FECHA DE TERMINACION FINAL	3 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	08 FEBRERO 2024		
% TIEMPO TRANSCURRIDO	100%		

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

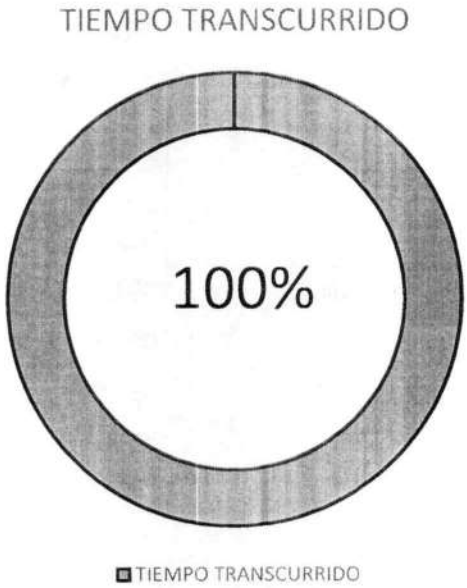

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se da inicio al contrato de interventoría el día 11 de diciembre de 2023, con un plazo contractual inicial de 2 meses.

A la fecha de corte del presente periodo de cobertura han trascurrido 55 días calendario para el contrato de interventoría y 55 días calendario para el contrato de obra.

El pasado 21 de diciembre 2023 se suscribe prorroga por 39 días calendario para así cumplir con el tiempo contractual inicial, ya que por cuestiones administrativas internas de la entidad el contrato se firmó hasta el pasado 11 de diciembre de 2023.

El contratista culmina sus actividades contractuales el 3 de febrero de 2024.

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10


CONTRATO DE INTERVENTORIA				
FECHA DE INICIO	11-dic-2023			
FECHA INICIAL DE TERMINACION	31-dic-2023			
DURACION	2 MESES			
		DESDE	HASTA	DURACION
SUSPENSION		N/A	N/A	N/A
PRORROGA 01		01/01/24	08/02/24	39 DIAS
ACTA DE REINICIO 01		N/A	N/A	N/A
TOTAL, DE DIAS SUSPENDIDOS	0 DIAS			
TIEMPO ADICIONADO MODIFICACION 01	39 DIAS			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	08 DE FEBRERO 2024			
FECHA CORTE PRESENTE INFORME	08 DE FEBRERO 2024			
% TIEMPO TRANSCURRIDO	100%			



10. PROGRAMACION DE OBRA

PORCENTAJES SEMANA


SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	8,00%	80,04%
7	22/01/24 - 24/01/24	20,00%	100,00%

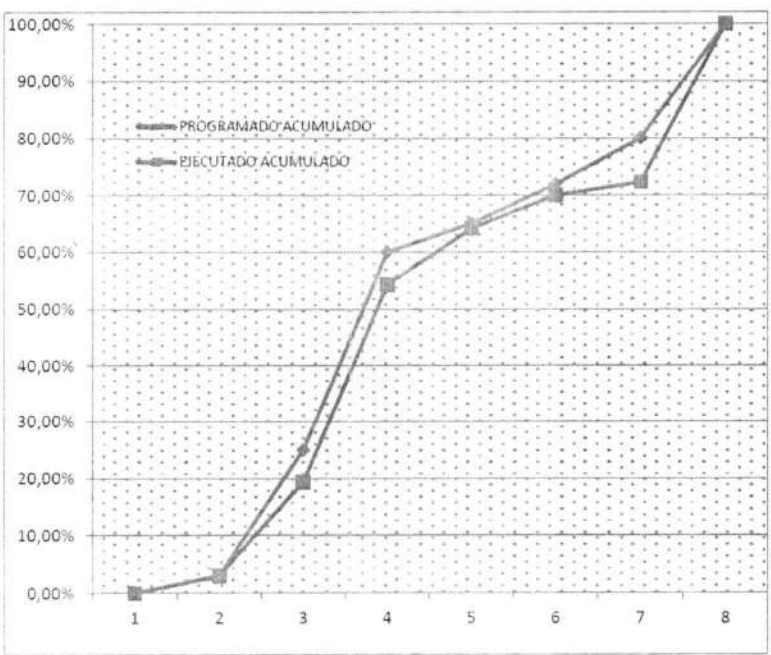

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86

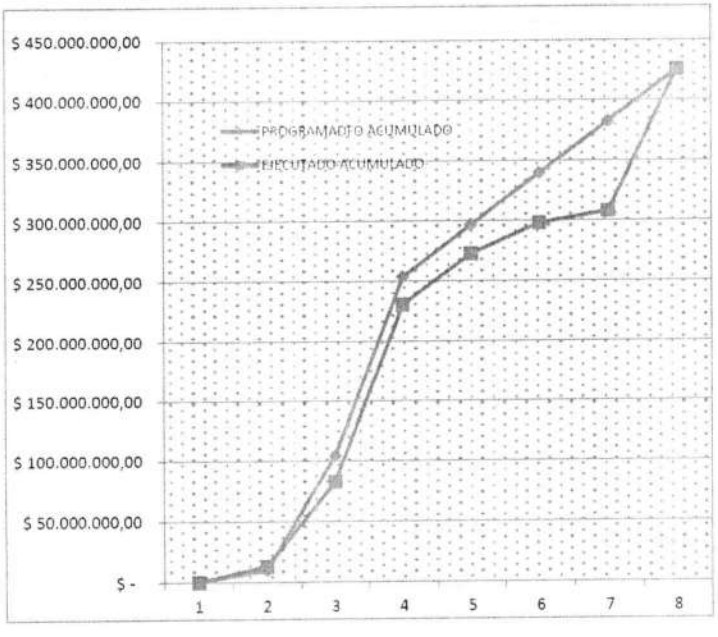

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

11. BALANCE DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17

		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	

$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673
$70.011.571					

2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%
21,37%					
43,57%					
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%
24,46%					
71,12%					

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731	
	$60.943.214					
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%	
	18,61%					
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%	
	62,17%					

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731
	$59.666.216				
					$227.090.353
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%
	18,22%				
					69,33%
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%
	80,39%				
					112,89%

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	

$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						

4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						

84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

12. ENSAYOS


RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO
NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70

Código: IO-FR-20			
Versión: 08			
Fecha: 9-ENE-18			
Página: 1 de 1			

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5056
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

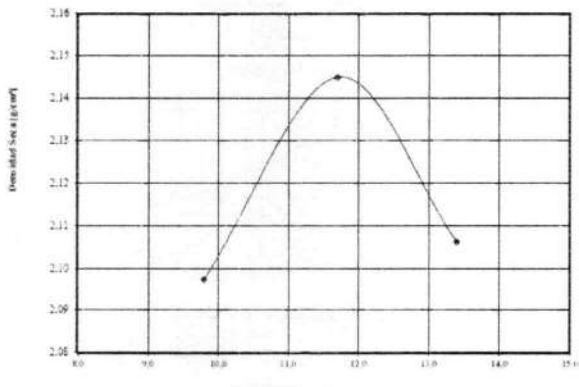

Densidad Seca Máxima: 2,145 g/cm³ Hum. Óptima del suelo: 11,70 %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número : CO16.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
		CONTRATO No	2023746
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

	RESULTADOS DE LABORATORIO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO SUB-BASE NORMA INV E 213, 202 ART-320	Código: IO-FR-22 Versión 02 Fecha: 9-ENE-19 Página 1 de 1


Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-1265406
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	8725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11/01/2024

Material:	Sub base	Cantera	El Chocho
Fecha de ingres	2/01/2024	Fecha de ensayo:	9/01/2024
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

TAMIZ No	PESO RETENIDO (gr)	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% PASA TAMIZ	Especificacion (%) Lim. inferior	SG-B-38 Lim. superior
4"	0,0	0,00	0,00	100,00		
3½"	0,0	0,00	0,00	100,00		
3"	0,0	0,00	0,00	100,00		
2½"	0,0	0,00	0,00	100,00		
2"	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
1½"	0,0	0,00	0,00	100,00	100	100
1"	0,0	0,00	0,00	100,00	75	95
1/2	986,0	18,76	18,76	81,24	55	85
3/8"	245,0	4,66	23,43	76,57	45	75
N°4	975,5	18,56	41,99	58,01	30	60
N°10	1008,0	19,18	61,17	38,83	20	45
N°40	1191,5	22,67	83,84	16,16	8	30
N°200	435,5	8,29	92,13	7,87	2	15
FONDO	413,5	7,87	100,00	0,00		
TOTAL		100,00				

Peso seco antes de lavar:	5255	Peso seco despues de lavar:	4.542
Peso seco limpio (gr)	4841,5		

GRANULOMETRIA



Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Geoteonologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NORMA NTC 4630	Código: IO-FR-10 Versión: 02 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155407
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11-ene-24

Descripción:	Sub base	Cantera:	
Fecha entrada:	2-ene-24	Fecha de ensayo:	9/01/2024

LIMITE LIQUIDO

DETERMINACION No.	1	2	3	4	5
No. de golpes					
Molde No					
Peso Molde + Muestra Húmeda en gr.					
Peso Molde + Muestra Seca en gr.					
Peso molde en gr.					
Humedad en %					
Límite Líquido					

LÍMITE PLÁSTICO

DETERMINACION No.	1	2	3	4	5
Molde No					
Peso Molde + Muestra Húmeda en gr.					
Peso Molde + Muestra Seca en gr.					
Peso molde en gr.					
Humedad en %					

Resultados del Ensayo

Límite Líquido: NO LIQUIDO


Límite Plástico: NO PLASTICO

Indice de Plasticidad: NO PLASTICO

Clasificación de la Fracción Fina:

% Pasa Tamiz No 200: **7,87**

Sistema USC: **GP-GM**



Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobo	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Version: 03 Fecha: 8-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155405
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	11-ene-24

Material:	Sub base	Cantera:	Chocho
Fecha de ingreso:	2-ene-24	Fecha de ensayo:	3-ene-24
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	8352	8587	8596
Peso molde	[g]	3399	3399	3399
Peso Muestra Compactada	[g]	4953	5188	5197
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,340	2,451	2,451
Humedad	[%]	5,00	7,22	9,71
Densidad Seca	[g/cm³]	2,229	2,286	2,234

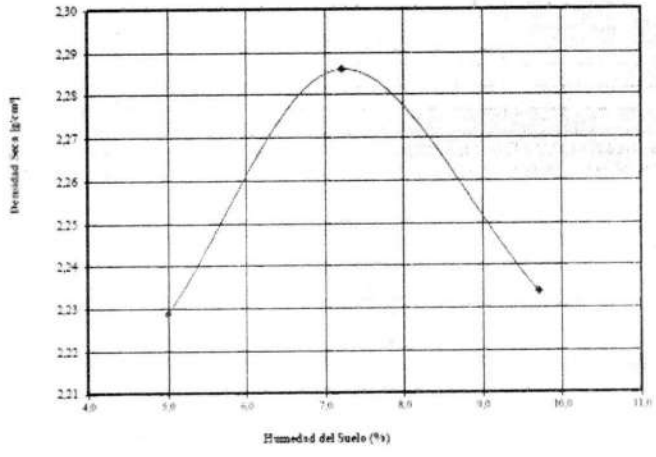

Densidad Seca Máxima: 2,286 g/cm³ Hum. Óptima del suelo: 7,22 %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-16
Version 08
Fecha: 08-ENE-19
Página 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155402-1DE2
Código:	6725	Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Descripción del material:	Roca muerta	Fecha de realización:	2/01/2024

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3	4	5	6	7
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	6622	6611	6602	6593	6580	6561	6538
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	3564	3269	3316	3166	2910	2655	2801
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3038	3342	3286	3427	3670	3906	3737
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1457	1761	1705	1846	2089	2325	2156
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1076	1301	1259	1363	1543	1717	1592
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	2940	3416	3297	3507	4029	4490	4177
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360	360	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	2460	3056	2937	3147	3669	4130	3817
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,30	2,35	2,33	2,31	2,38	2,41	2,40
L. Humedad del suelo		[%]	11,0	11,6	11,2	11,4	7,2	6,6	6,8
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,08**	**2,11**	**2,10**	**2,07**	**2,22**	**2,26**	**2,24**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145	2,145	2,286	2,286	2,286
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M}{N} \times 100$	[%]	**96,8**	**98,2**	**97,8**	**96,6**	**97,0**	**98,7**	**98,2**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95	95	98	98	98

Observaciones:

Punto 1: Vía abscisa K0+120 costado derecho roca muerta
Punto 2: Vía abscisa K0+110 costado derecho roca muerta
Punto 3: Vía abscisa K0+090 costado izquierdo roca muerta
Punto 4: Vía abscisa K0+080 costado derecho roca muerta
Punto 5: Vía abscisa K0+020 costado derecho sub base
Punto 6: Vía abscisa K0+030 costado izquierdo sub base
Punto 7: Vía abscisa K0+040 eje sub base

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	*Certificado Número*: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
		CONTRATO No	2023746
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

INGEOMAC	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena	Código: IO-FR-16 Version 03 Fecha: 09-ENE-19 Página 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155402-2DE2
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	8725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de realización:	2/01/2024
Descripción del material:	Roca muerta		

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedòmetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 8
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)			
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	6522
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	2962
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3560
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1979
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1462
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO			
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3809
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3449
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,36
L. Humedad del suelo		[%]	6,9
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	2,21
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,286
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	96,6
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	98

Observaciones: Punto 8: Vía abscisa K0+090 costado derecho sub base

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
		CONTRATO No	2023746
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena	Código: IO-FR-15 Versión 03 Fecha: 08-ENE-18 Página 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155308
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Jenny Grajales
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de realización:	26/12/2023
Descripción del material:	Roca muerta		

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)					
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO					
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3623	3503
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	2,14	2,10	2,09
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	99,8	97,9	97,5
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95

Observaciones:

Punto 1 Vía abs K0+040 eje
Punto 2 Vía abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Vía abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

INCIPAC

INFORME PROVISIONAL DE DENSIDADES

Código: IO-FR-16
Versión 01
Fecha: 07-FEB-12
página 1 de 1

Obra: Barrio los Arrayanes Consecutivo:
Municipio de Dagua Cliente: CUBIKO
Código: 6725 Elaborado por: Edwyn Cortes
Ordenado por: Ing. Felipe C. Fecha de elaboración: 19 ENERO 2024

Descripción del material: Sub Base

Dens.seca máx. del próctor: 2.286 [g/cm³] Humedad óptima: 7.22 [%]

Punto No.	Ubicación	Densidad seca [g/cm³]	Humedad [%]	% Comp.
1	Arrayanes Via 1 K0+0.05 en eje	2263	7.0	99.0
2	Arrayanes Via 1 K0+0.20 Borde Der.	2256	6.5	98.7
3	Arrayanes Via 1 K0+0.40 Borde Izq.	2261	6.0	98.9
4	Arrayanes Via 1 K0+0.5500 en eje	2243	6.3	98.1

OBSERVACIÓN: ESTE INFORME ESTÁ SUJETO A REVISIÓN.

13. ITEMS NO PREVISTOS

NP NUMERO 1: El pasado 02 de enero se remite a la entidad el NP 01 (GEOTEXTIL) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-001 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: De acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante, se hace necesario adicionar este ítem, requerido con el fin de aislar la estructura del pavimento de la plataforma de apoyo o mejoramiento del terreno.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO	PROMEDIO
1	DISTRIBUCIONES PVC	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	$ 8,324	$ 9,690
2	GEOSINC	GEOTEXTIL T2100. ANCHO 3,85M X140M	M2	$ 4,495	
3	CALYPSO	GEOTEXTIL T250 / 2100 ANCHO 3,85M X140M	M2	$ 16,250	

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	m2	1.074,56

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					34.07
					34.07

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GEOTEXTIL TEJIDO PAVCO 2100	M2	1.100	9.690,00	10.659,00
			SUBTOTAL $	10.659,00

III. TRANSPORTES

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (2)	77,333.33	1.85	143,066.67	400.00	357.67
OFICIAL (1)	70,000.00	1.85	129,500.00	400.00	323.75
				SUBTOTAL $	681.42
				TOTAL COSTO DIRECTO $	11,374

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24.17%	2,749.10	
IMPREVISTOS	1%	113.74	
UTILIDAD	6%	682.44	
		SUBTOTAL $	3,545.28
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	14,919.00

Aprobación de la entidad:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1	
		CÓDIGO:	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
		TRD 4.10	

Dagua, Enero 2 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2023-016

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el item no previsto NP-01 GEOTEXTIL 2100 el cual fue revisado y avalado por la interventoria y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyecto: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario

NP NUMERO 2: El pasado 11 de enero se remite a la entidad el NP 02 (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-003 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: Toda obra de reposición de pavimento requiere de su respectiva topografía. La administración de este contrato no contempló la topografía. Por tanto, esta es de vital importancia contar con la topografía para cumplir cabalmente el objeto contractual.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO
1	MC Servicios topograficos de precision	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 3,900,110
2	Ing. Topógrafo Jose Camargo	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 5,300,000
3	Ing. Andrés Plazas	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ML	$ 5,230,000

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	200.00

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR)			360,000.00	0.022	7,826.09
					7,826.09

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	VALOR/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TOPOGRÁFICA (1 TOPOGRAFO - 2 CADENEROS) INCLUYE TRANSPORTE			350,000.00	0.026	9,130.43
				SUBTOTAL $	9,130.43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	16,957

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26.89%	4,559.74	
IMPREVISTOS	1%	169.57	
UTILIDAD	5%	847.85	
		SUBTOTAL $	5,577.16
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	22,534.00

Aprobación de la entidad:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1
		CÓDIGO:
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN
		TRD 4.10

Dagua, Enero 16 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2024-004

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el ítem no previsto NP-02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO y el ítem no previsto NP-03 REALCE DE RECAMARA el cual fue revisado y avalado por la interventoria y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación teniendo en cuenta que el balance del proyecto no requiere adiciones presupuestales.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyectó: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario

NP NUMERO 3: El pasado 11 de enero se remite a la entidad el NP 03 (REALCE DE RECAMARA) con el radicado número INT-DAGUA-CUB-2024-003 ya que se evidencia que este ítem no hace parte de los ítems contractuales y es necesario para la correcta instalación de la estructura requerida para la construcción de la vía, a continuación, se detalla el mismo.

Justificación técnica: La topografía evidencia que las recamaras requieren ser realzadas para que las tapas queden al nivel de la vía, con el peraltado o bombeo o inclinación respectiva.

Cuadro comparativo cotizaciones:

COTIZACIÓN	PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	PRECIO
1	JUAN DAVID OSORIO	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 1,689,357
2	OSCAR ANSISAR	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 1,856,386
3	ANDRES MACIAS	REALCE DE RECAMARA	M3	$ 2,107,249

Análisis de Precios Unitarios (APU):

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 03	REALCE DE RECAMARA	M3	2.51

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)					3,407.08
RETROEXCAVADORA			95,400.00	2.51	239,323.30
VIBRADOR			8,925.00	0.10	892.50
					243,622.89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA)	M3	1.000	361,653.00	361,653.00
			SUBTOTAL $	361,653.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (2)	77,333.33	1.85	143,066.67	0.25	35,766.67
OFICIAL (1)	70,000.00	1.85	129,500.00	0.25	32,375.00
				SUBTOTAL $	68,141.67
				TOTAL COSTO DIRECTO $	673,418

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26.89%	181,082.10	
IMPREVISTOS	1%	6,734.18	
UTILIDAD	5%	33,670.90	
		SUBTOTAL $	221,487.18
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	894,905.00

Aprobación de la entidad:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Página 1 de 1	
		CÓDIGO:	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
		TRD 4.10	

Dagua, Enero 16 de 2024.

Arq. Carolina Sanabria
Representante Legal
CUBIKO SAS

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2023758

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO INT-DAGUA-CUB-2024-004

Por medio del presente teniendo en cuenta la solicitud se aprueba por parte de la supervisión el ítem no previsto NP-02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO y el ítem no previsto NP-03 REALCE DE RECAMARA el cual fue revisado y avalado por la interventoría y cumple con todos los requisitos técnicos para su aprobación teniendo en cuenta que el balance del proyecto no requiere adiciones presupuestales.

Atentamente:

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Dagua

Proyectó: Ing civil Daniel Arce-Profesional universitario.

14. DETALLE DE ACTIVIDADES

Semana del 11 de diciembre al 17 de diciembre de 2023

11 DE DICIEMBRE DE 2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTE,TOMA DE NIVELES
12-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPARACION TUBERIA AN,NIVELACION EN LAS VIAS
13-DICIEMBRE -2023
. EXCAVACION CAJEO, RETIRO DE SOBRANTES, NIVELACION DE VIAS REPARACION TUBERIA AN
14-DICIEMBRE-2023
EXACAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPRACION TUBERIA AN
15-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTES,REPARACION DE TUBERIA AN
16-DICIEMBRE-2023
EXCAVACION CAJEO,RETIRO DE SOBRANTE, SUMINISTRO ROCA MUERTA

Semana del 18 de diciembre al 23 de diciembre de 2023

18 DE DICIEMBRE DE 2023
COMPACTACION DE LA SUBRRASANTE CBR 95%,SUMINISTRO ROCA MUERTA
19 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,NIVELACION DE VIAS,REPARACION DE TUBERIA AN
20 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
21 DE DICIEMBRE DE 2023

SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTAREPARACION TUBERIA AN
22 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA Y COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
23 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION DE ROCA MUERTA

Semana del 26 de diciembre al 10 de enero de 2024

26 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTA
27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
28 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
29 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,SUMINISTRO EXTEMNDIDA DE GEOTEXTIL T 2100
30 DE DICIEMBRE DE 2023
CORECCION DE TUBERIA AVERIADA AN SACADA DE FALLOS EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SUB BASE TIPO INVIAS
2 DE ENERO DE 2024
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE SUBBASE TIPO INVIAS COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,REPARACION TUBERIA AN .TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

3 DE ENERO DE 2024
SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE SUBBASE TIPO INVIAS,COMPACTACION,REPARACION TUBERIA AN
4 DE ENERO DE 2024
SE INICIA EXCAVACION VIA N.1 NARRAYANES, COMPACTACION SUBBASE INVIAS EN LA VIA N,2 TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
5 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,CORRECION TUBERIA DE AGUA POTABLE
6 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES,REPARACION DE FALLO,REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE.TOMA MUESTRA DE DENSIDADESROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
7 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION ROCA MUERTA,COMPACTACION VIA N.3
8 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,COMPACTACION Y PERFILADA DE ROCA MUERTA TOMA MUESTRA DE DENSIDADES SUBBASETIPO INVIAS 4 ARRAYANES
9 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA, COMPACTACION VIA N.3. TOMA MUESTRA DE DENSIDADES ROCA MUERTA VIA 4 ARRAYANES
10 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA,COMPACTACION,SACADA DE FALLOS,COMPACTACION VIA N.2 TOMA MUESTRA DE DENSIDADES ROCA MUERTA VIA 3 ARRAYANES

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

Semana del 11 de enero al 18 de enero de 2024


11 DE ENERO DE 2024
EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES SUMIMNISTRO EXTENDIDA DE ROCA MUERTA, COMPACTACION, SE COMIENZA A ARMAR LA FORMALETA EN LA VIA N.3 PARA FUNDIR LA PLACA DE CONCRETO. SE TERMINA LA COMPACTACION EN LA VIA N.4
12 DE ENERO DE 2024
SE CONTINUA SEREANDO LA VIA N.1 Y SE SACAN FALLOS.SE COMIENZA A FUNDIR LA PLACA DE CONCRETO MR 38 EN LA VIA N.3
13 DE ENERO DE 2024
SE CONTINUA CON LA EXCAVACION EN LA VIA N.1, SE COMIENZA A EXTENDER Y COMPACTAR ROCA MUERTA EN LA VIA N.1.SE CONTINUA LA FUNDICION DE LA PLACA DE CONCRETO MR38 EN LA VIA N.3
16 DE ENERO DE 2024
SE CONTINUA LA EXCAVACION EN LA VIA N.1,S TOMAN DENSIDADES DE ROCA MUERTA EN LA VIA N.1,SE CONTINUA CON LA FUNDICION DE LA PLACA DE CONCRETO EN LA VIA N.2,SE COMPACTA LA VIA N.1 CON SUB BASE TIPO INVIAS.
17 DE ENERO DE 2024
SE CONTINUA CON LA COMPACTACION DE SUBBASE TIPO INVIAS EN LA VIA N.1, FUNDICION DE PLACA DE CONCRETO MR38 EN LA VIA N.2, SE COMIENZA A FUNDIR EL SARDINEL EN LA VIAN.3
18 DE ENERO DE 2024
ARMADA DE FORMALETA EN LA VIA N.2, SE CONTINUA LA FUNDICION DE SARDINEL EN LA VIA N.3 Y N.2

Semana del 19 de enero al 24 de enero de 2024


19 DE ENERO DE 2024
SE ARMA LA FORMALETA PARA LA FUNDICION DE LA PLACA DE CONCRETO MR38 EN LA VIA N.2.ARAMADA FORMALETA PARA LA FUNDICION DE SARDINELEN LA VIA N.3,SE COMIENZA A ARMAR LA FORMALETA PARA FUNDIR LA PLACA DE CONCRETO EN LA VIA N.4


20 DE ENERO DE 2024
SE EFECTUAN CORTES EN LA PLACA DE CONCRETO PA RA LAS JUNTAS DE DILATACION, SE INICIA LA FUDICION DE LA PLACA DE CONCRETO EN LA VIA N.4, SE TOMAN MUESTRAS DE DENSIDADES EN LA VIA N.1
22 DE ENERO DE 2024
SE COMIENZAN ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO EN LOS HOMBROS DE LA VIA N.4, ARRIBO DEL CEMENTO PARA CONTINUAR CON LA FUNDICION DEL CONCRETO
23 DE ENERO DE 2024
FUNDICION DE PLACA DE CONCRETO MR38 EN LA VIA N.4, FUDICION DE SARDINAL EN LA VIA N.2
24 DE ENERO DE 2024
SE ALISTA LA FORMALETA PARA LA FUNDICION DE SARDINEL EN VIA N.2, SE ALISTA FORMALETA PARA LA FUNDICION DE LA PLACA DE CONCRETO EN LA VIA N.4

15. REGISTRO FOTOGRAFICO

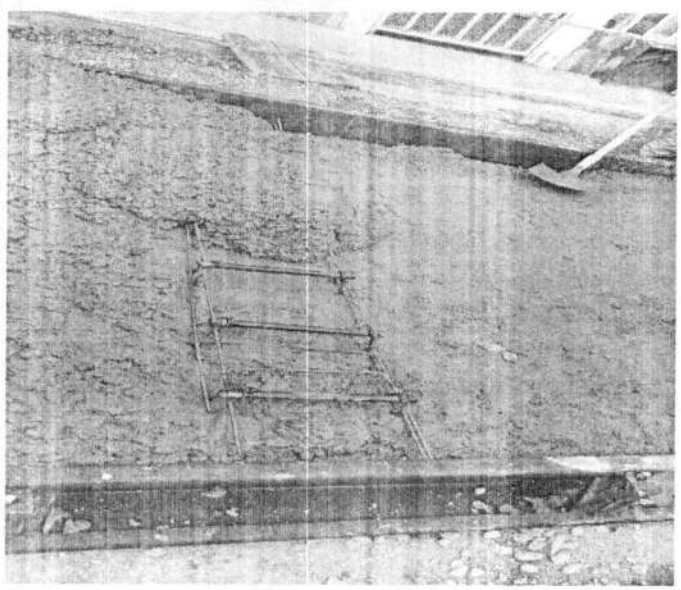


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

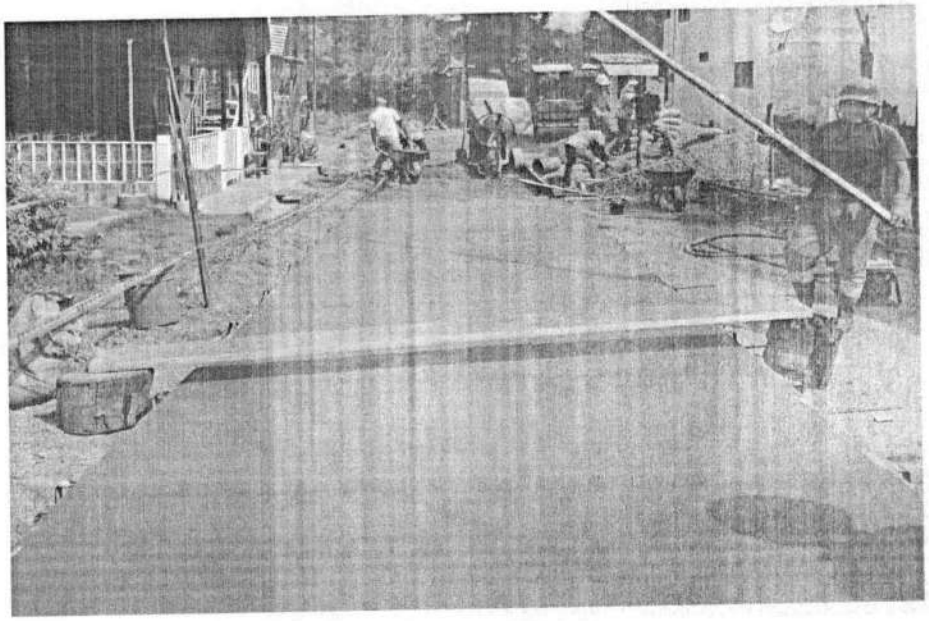


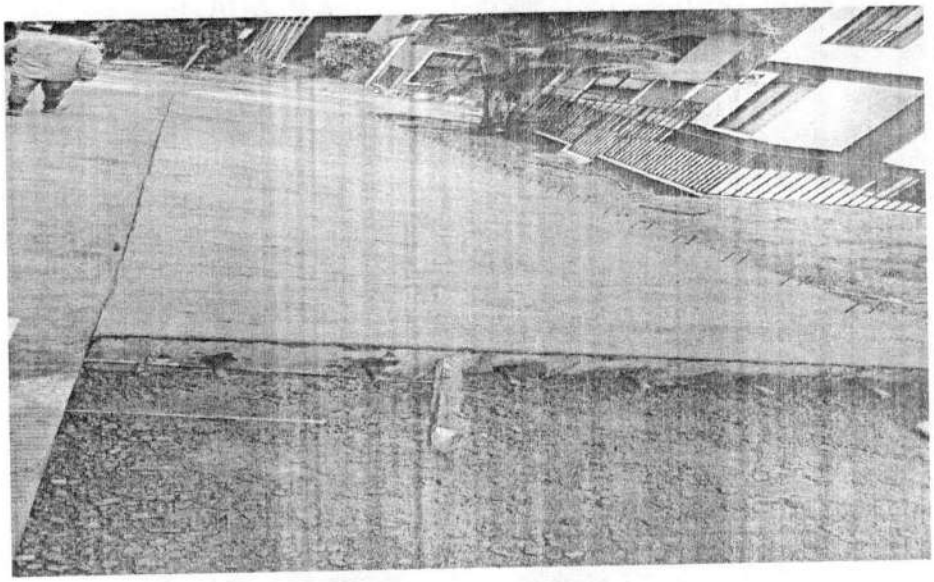


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

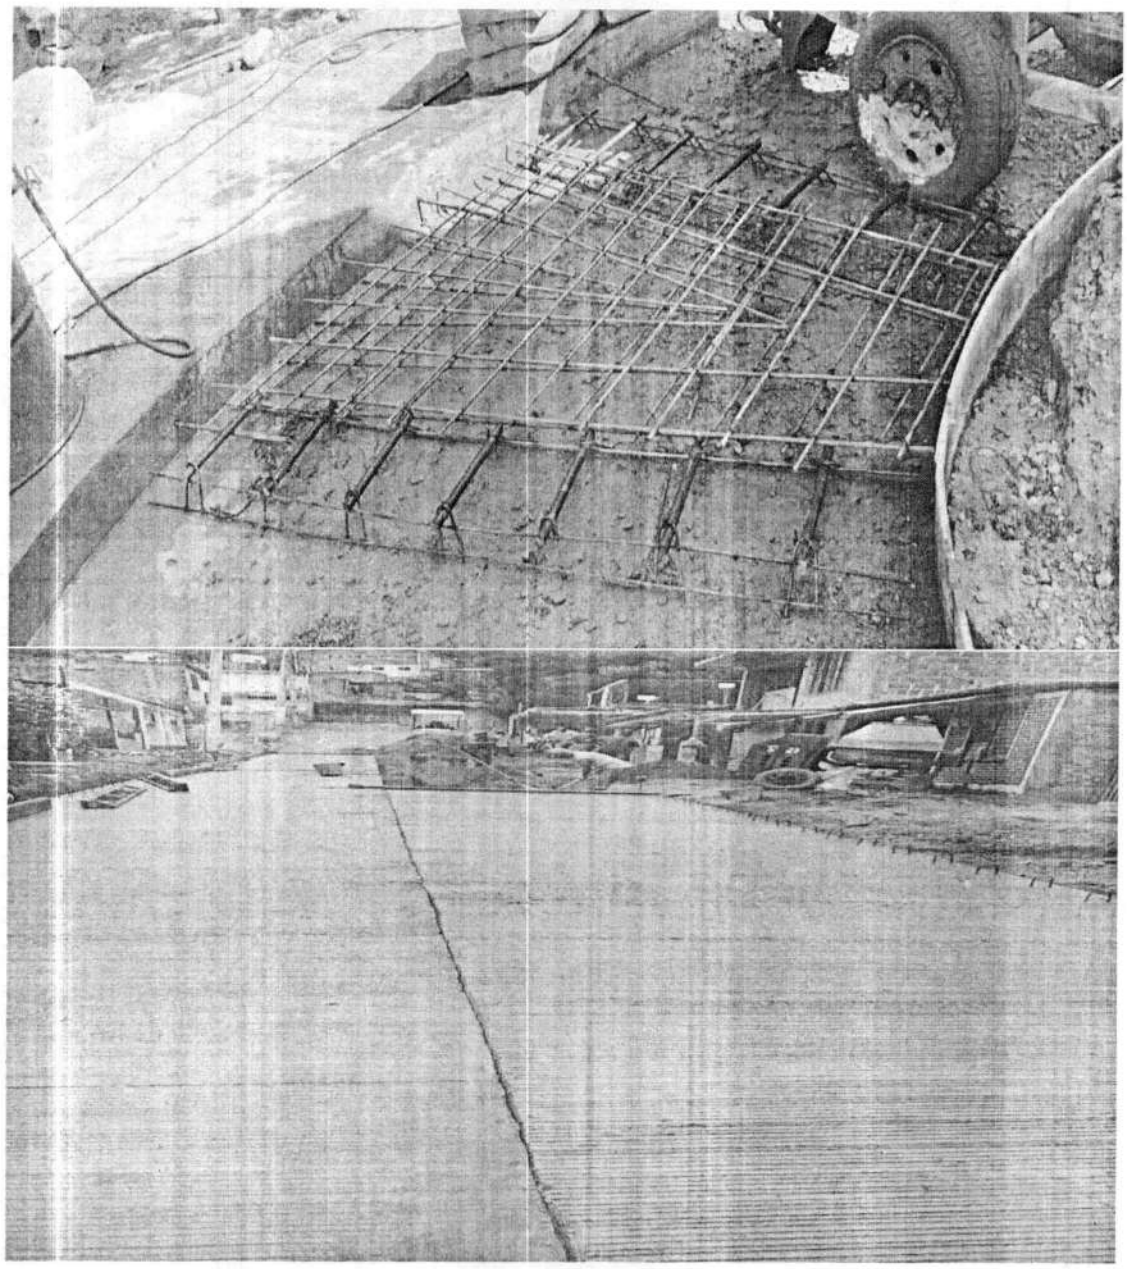


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

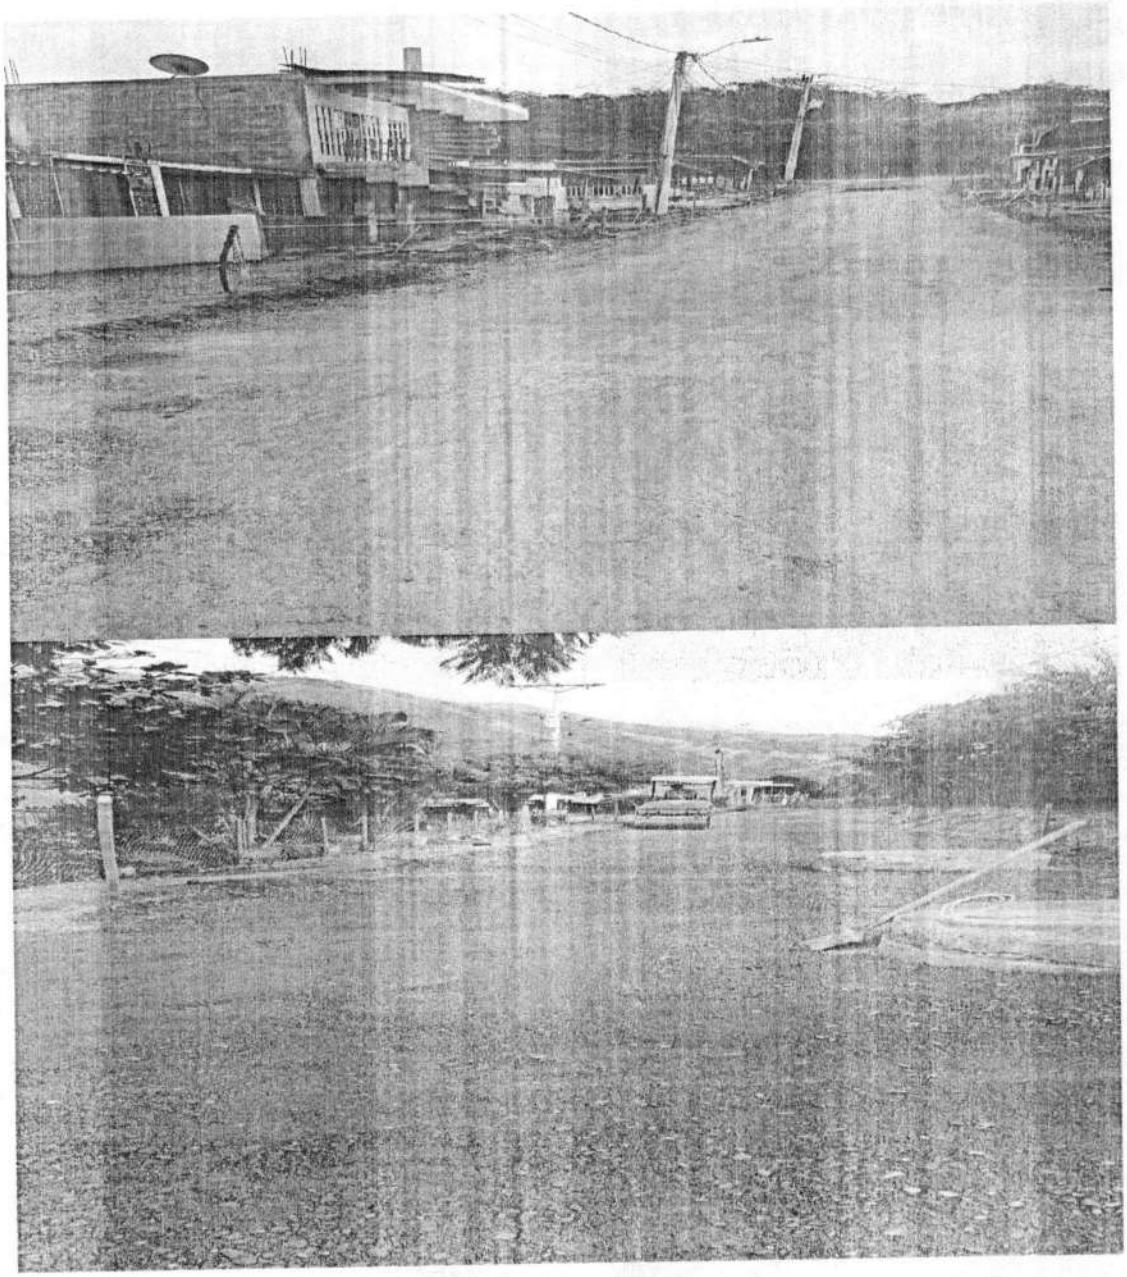


CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

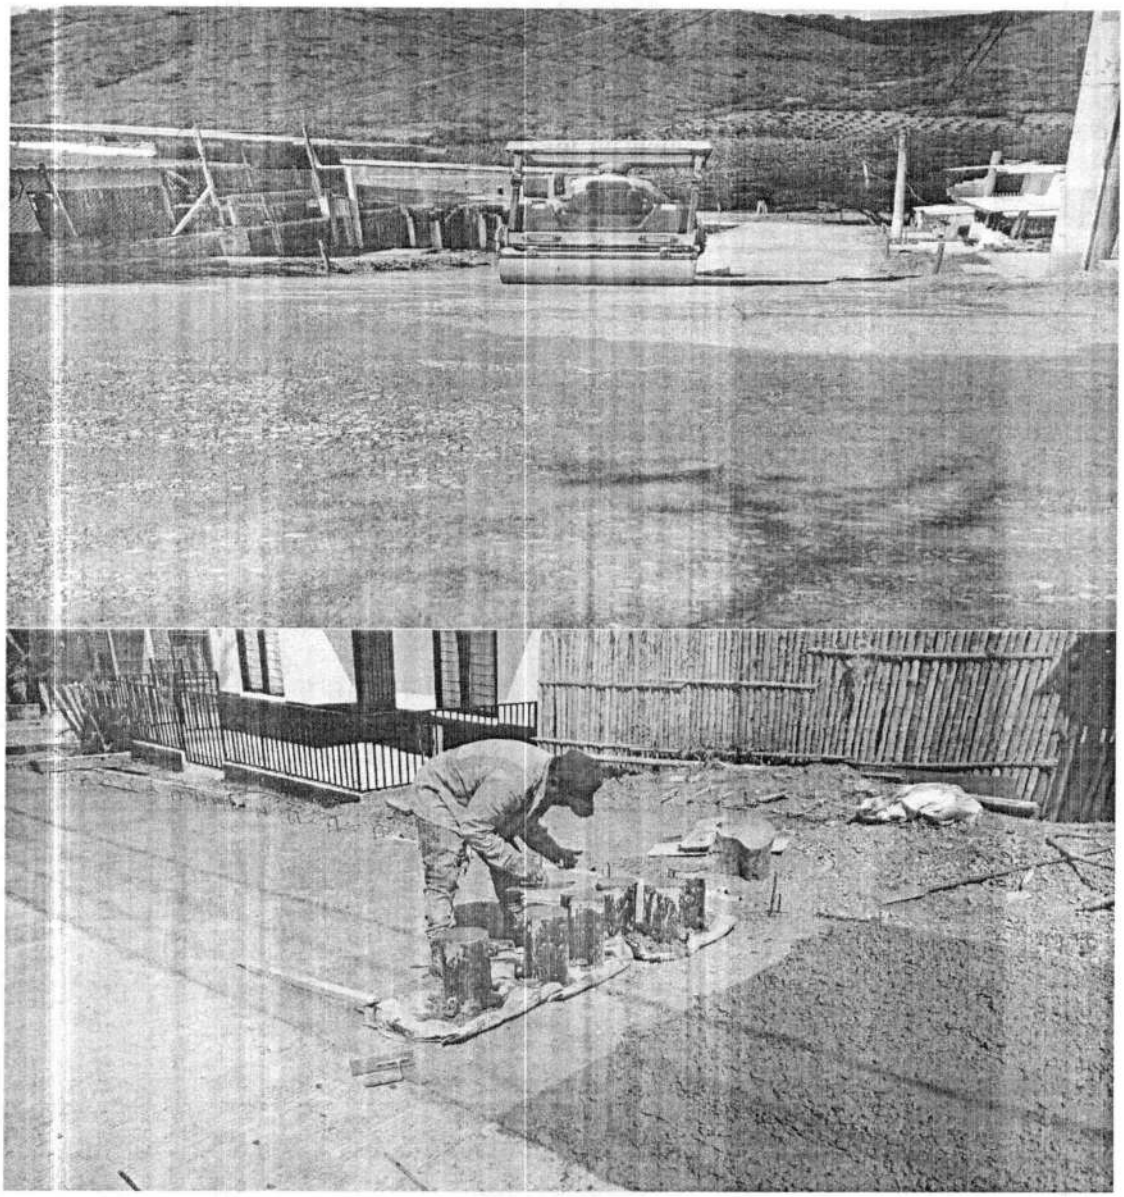


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

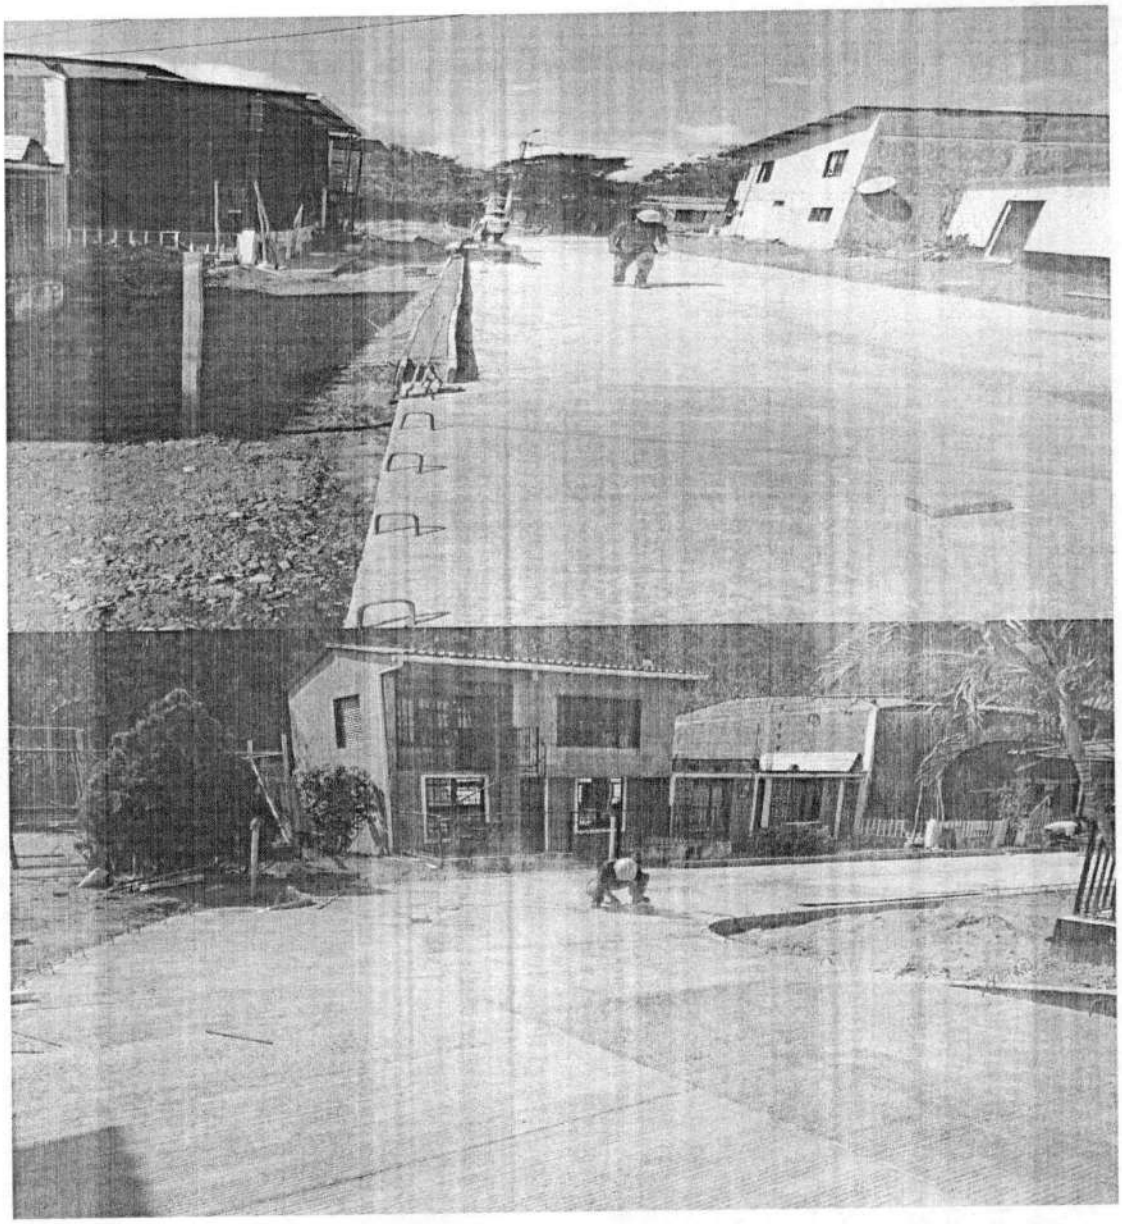


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

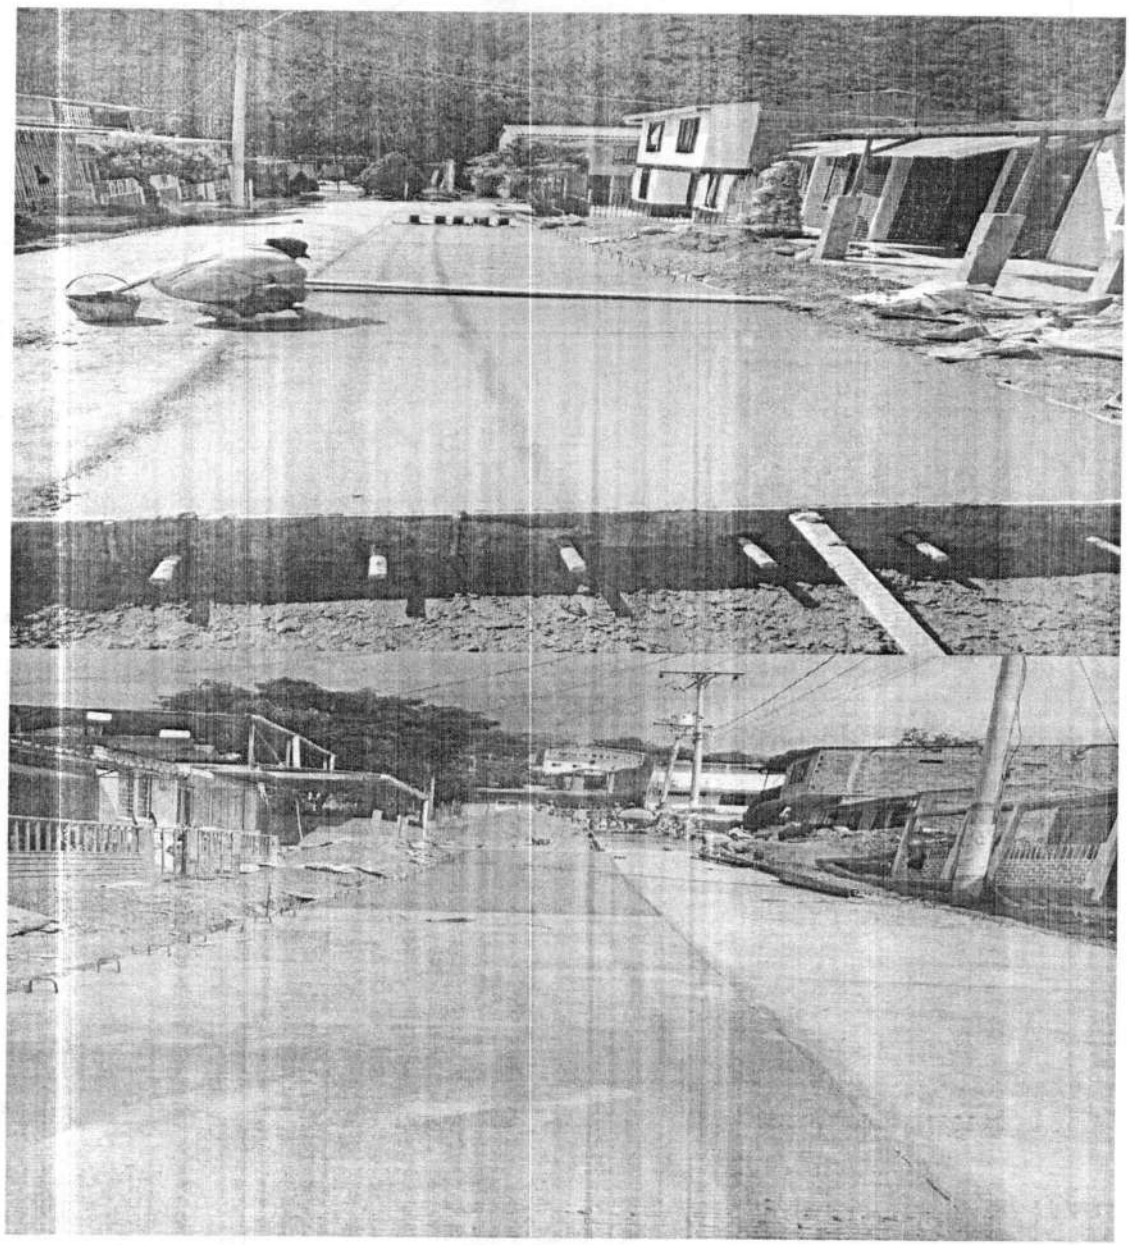


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

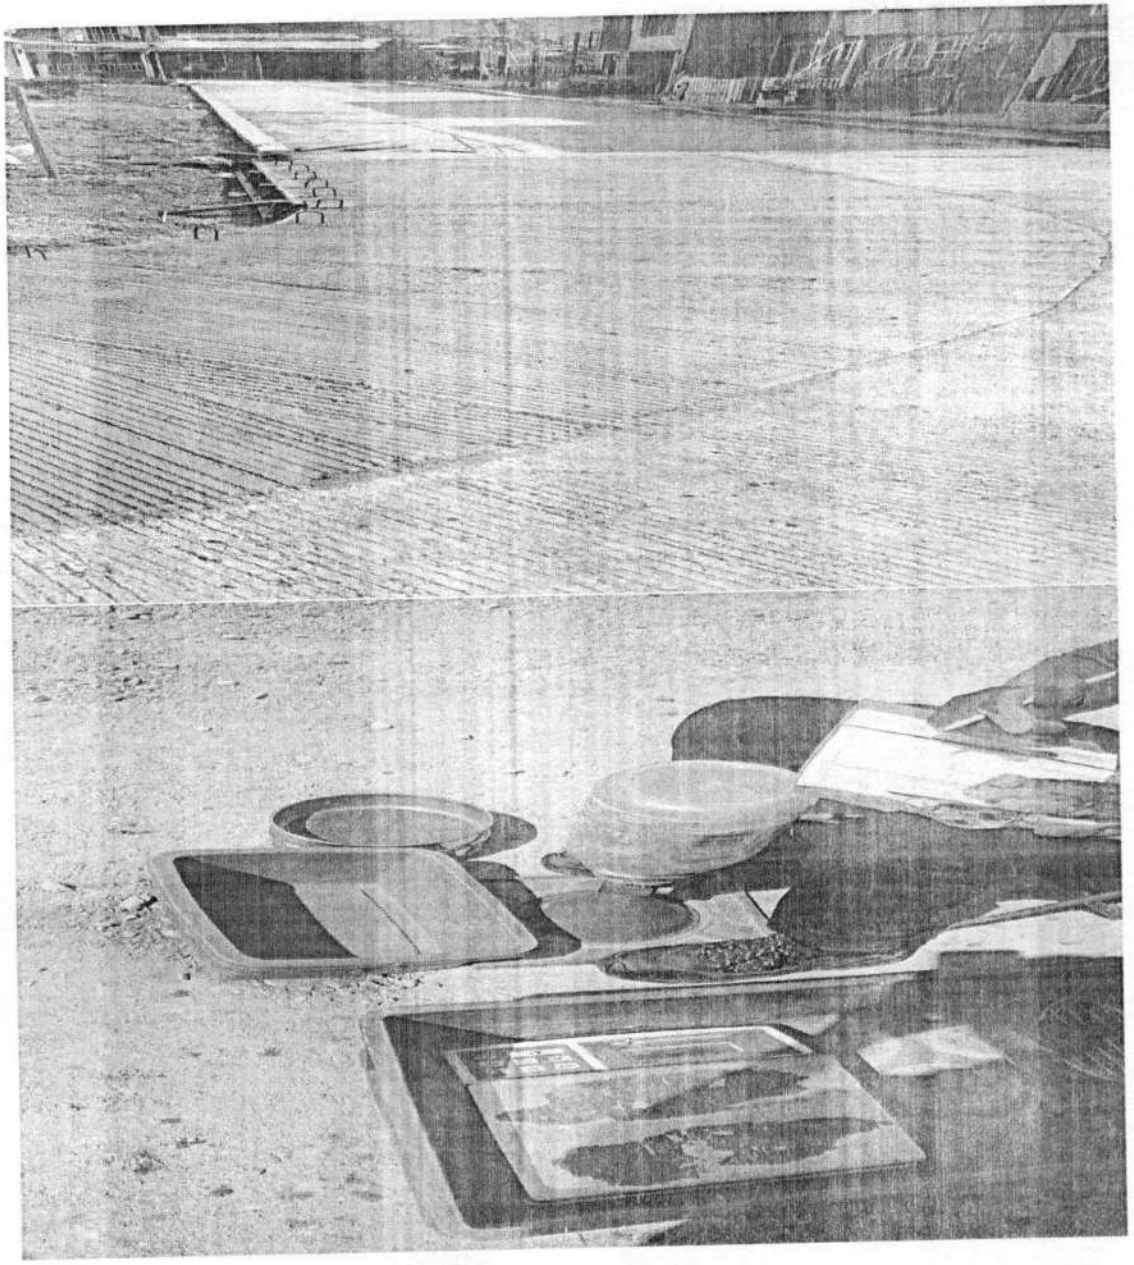


	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

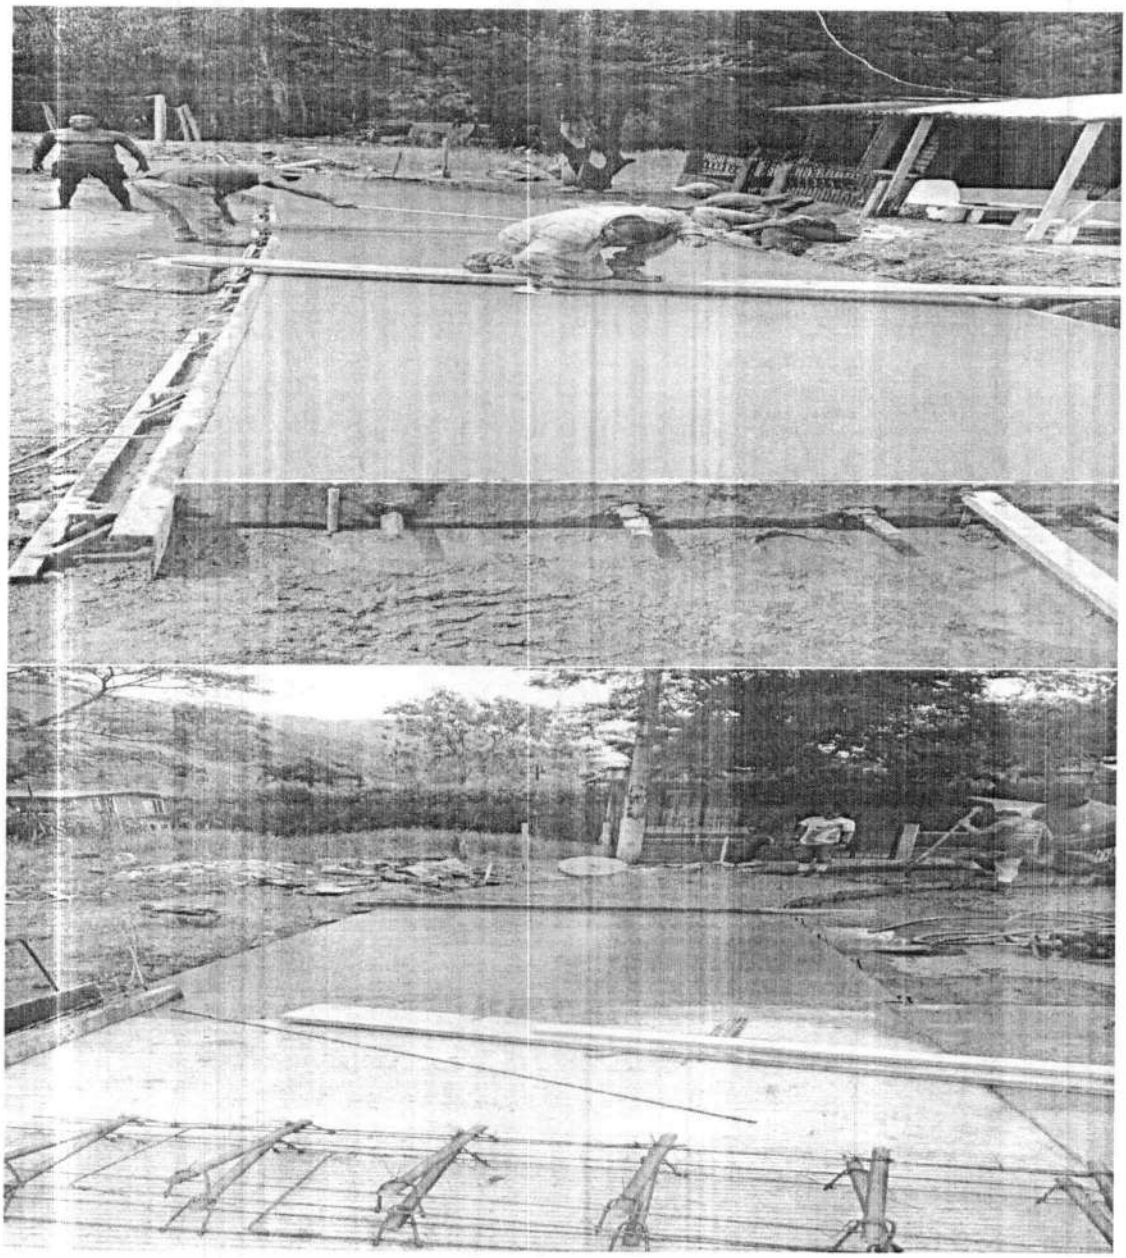

CUBIKO S.A.S	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

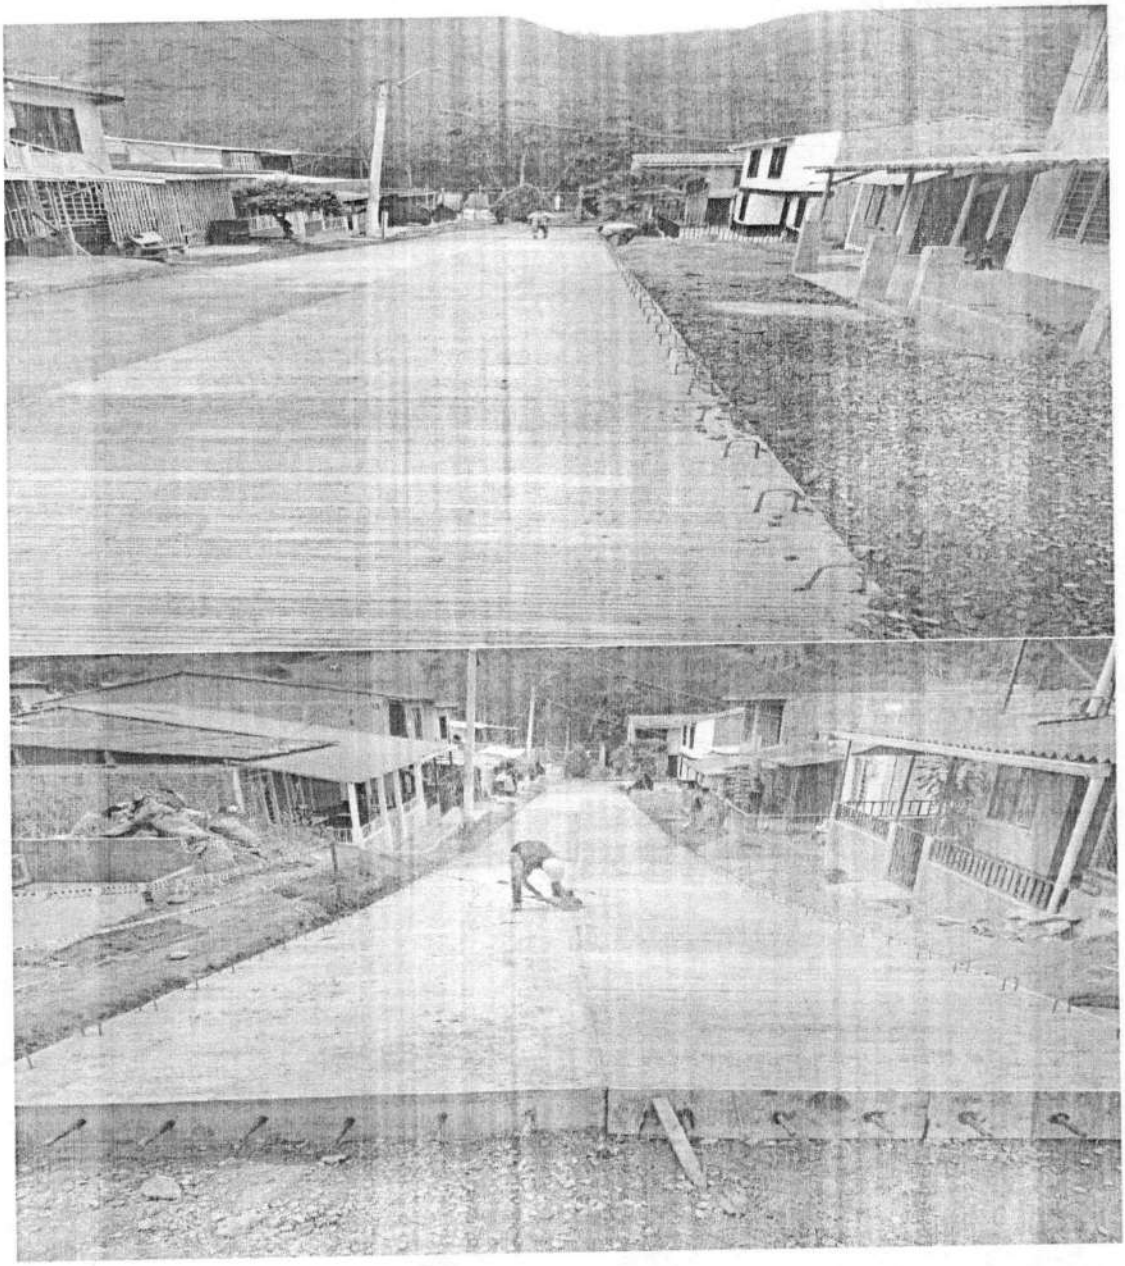

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10

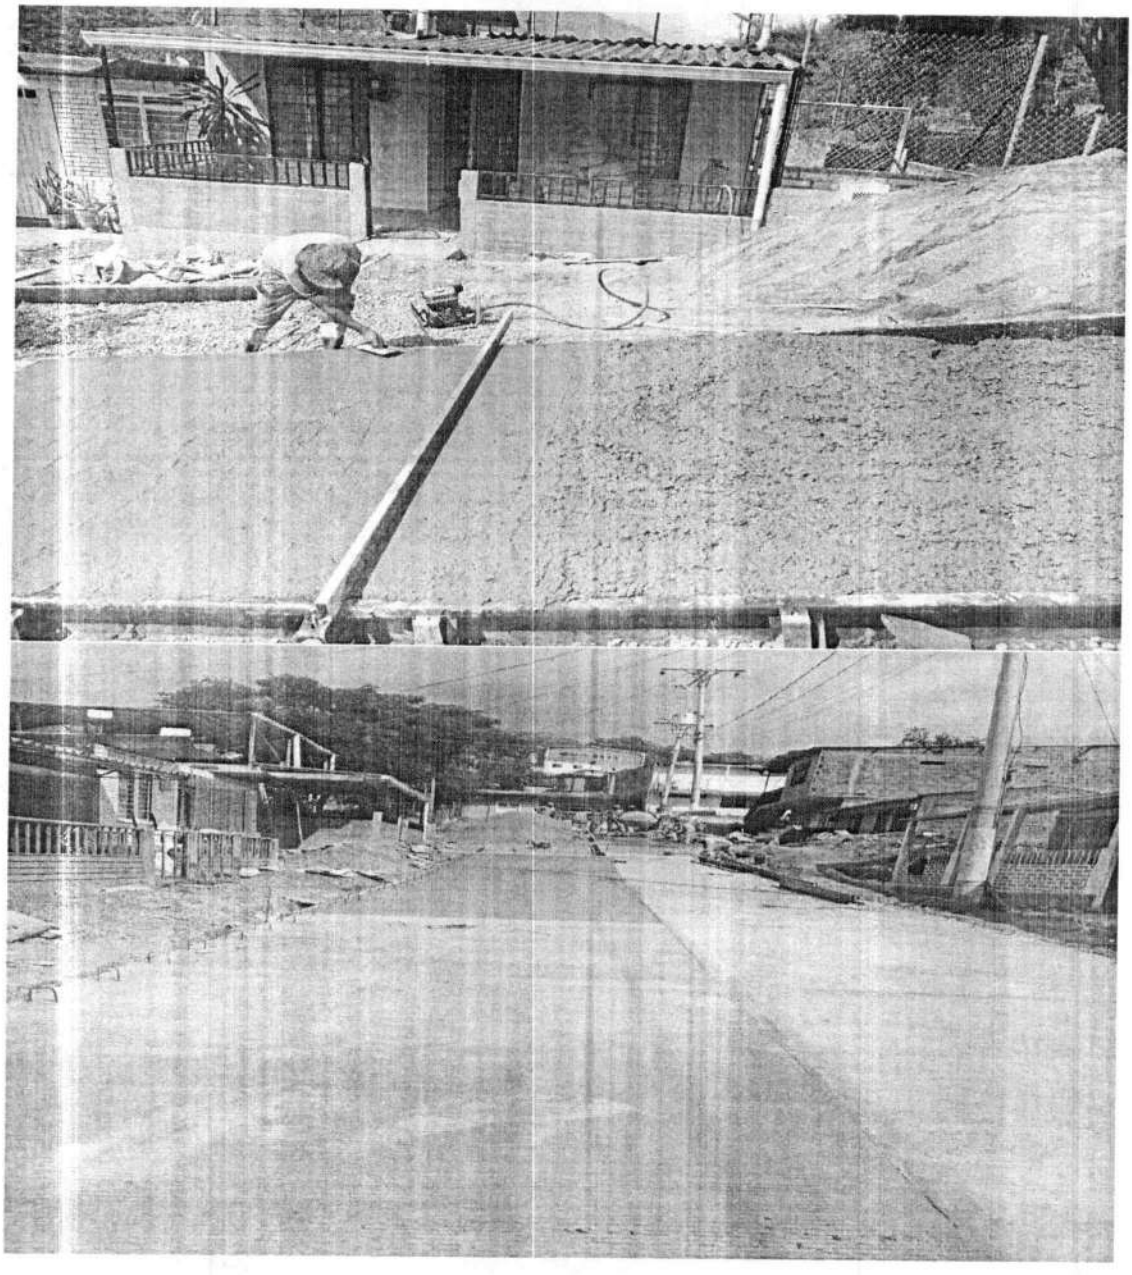

	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S NIT 900.686.385-9		
CUBIKO S.A.S	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	CONTRATO No	2023746
		ALCALDIA DE DAGUA	
INFORME MENSUAL 1		FECHA	2024-01-10





16. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

No	Nombre y Apellido	Dedicación	Cargo	Fecha de Ingreso
1	JUAN CARLOS SANABRIA	50%	DIRECTOR DE OBRA	11-12-2023
2	LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	100%	RESIDENTE DE OBRA	11-12-2023
3	CRISTIAN PAREDES	100%	APOYO ADMINISTRATIVO	19-12-2023
	JONATHAN GONZALEZ	100%	APOYO TÉCNICO	11-12-2023
	RICARDO CARO	100%	MAESTRO DE OBRA	11-12-2023
	ANDRES BRAVO	100%	OPERADOR ENSAYOS	11-12-2023
	JHON JADER	100%	OPERADOR EXCAVACIÓN	11-12-2023
	MIGUEL MARTINEZ	100%	OFICIAL	11-12-2023
	JUAN PEDROZA	100%	EQUIPO DE 15 AYUDANTES	11-12-2023

17. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

No	Nombre y Apellido	Dedicación	Cargo	Fecha de Ingreso
1	YICELA YASMIN MEDINA	50%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	11-12-2023
2	FELIPE CALDERON	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	11-12-2023
3	MARCO CONTRERAS	50%	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA	11-12-2023

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. La Interventoría realiza control al procedimiento constructivo y calidad de materiales el contratista cumple con la dedicación de tiempo en la obra.
B. El contratista se encuentra al 43.48% del plazo del contrato.

C. El contratista presenta un atraso de 2%con respecto al cronograma actual con el que se está evaluando el contrato.
D. Es necesario el traslado de la tubería de agua potable en la vía N,1.
E. El contratista comenzara la fundición de la placa de concreto en la vía N.3 como plan de contingencia para acelerar el desarrollo de la obra.
F. Se ha cumplido con los requerimientos exigidos para comprobar la calidad del material, se solicitaron los ensayos de caracterización del material los cuales fueron aportados por el contratista y se encuentran consignados en los informes semanales y en este mismo informe.
G. Se han presentado roturas en las tuberías de aguas negras debido a la poca profundidad que se encontraban esta las mismas lo cual era a 65cm aproximadamente y la profundidad de la excavación según diseño entregado por la entidad contratante corresponde a 80cm, sin embargo, los daños fueron reparados por el contratista para evitar el atraso de la obra.
H. La obra ya cuenta con dicho equipo para obtener los niveles de compactación requeridos en el material granular.

DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Página** 1 de 9 **Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 1	11/12/2023	17/12/2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INTORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INTORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-EXCAVACION
2-RETIRO DE ESCOMBROS
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA
4-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ROCA MUERTA


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico

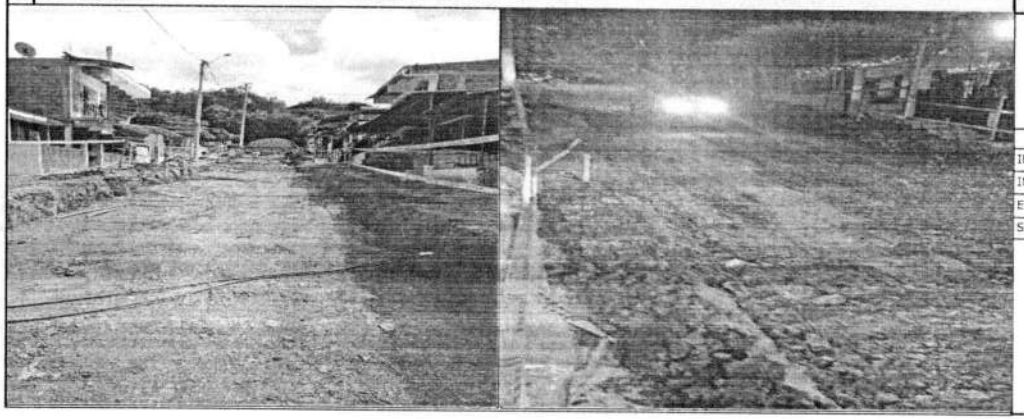

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	7	15,56%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 9.948.832,39		2%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 9.948.832,39		2%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -		0%
Se presenta un atraso en la Obra	SIN ATRASO		0,00%

NOTAS: EL CONTRATISTA A LA FECHA NO PRESENTA ATRASO CONTRACTUAL

ROCA MUERTA EXTENDIDA



COMPACTACION ROCA MUERTA



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



COMPACTACION ROCA MUERTA



REPARACION DE TUBERIAS



PANORAMICA ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	13,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	25,04%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	60,04%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	65,04%
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	75,04%
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	80,04%
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	85,04%
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	90,04%
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	94,04%
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	100,04%

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	$ 94.140.101,22	$ 94.140.101,22	$ 94.140.101,22
3	$ 149.768.342,85	$ 243.908.444,07	$ 243.908.444,07
4	$ 21.395.477,55	$ 265.303.921,62	$ 265.303.921,62
5	$ 21.395.477,55	$ 286.699.399,17	$ 286.699.399,17
6	$ 21.395.477,55	$ 308.094.876,72	$ 308.094.876,72
7	$ 21.395.477,55	$ 329.490.354,27	$ 329.490.354,27
8	$ 21.395.477,55	$ 350.885.831,82	$ 350.885.831,82
9	$ 21.395.477,55	$ 372.281.309,37	$ 372.281.309,37
10	$ 17.116.382,04	$ 389.397.691,41	$ 389.397.691,41
11	$ 28.498.776,10	$ 417.896.467,51	$ 417.896.467,51

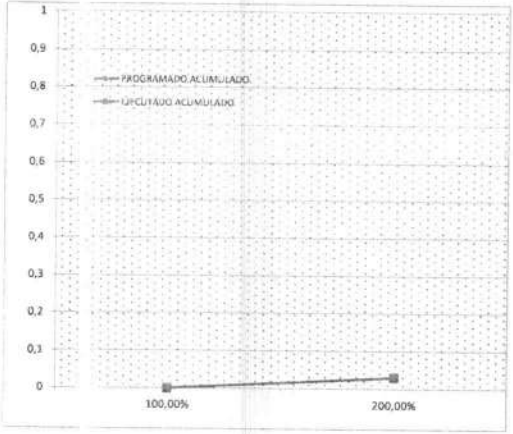

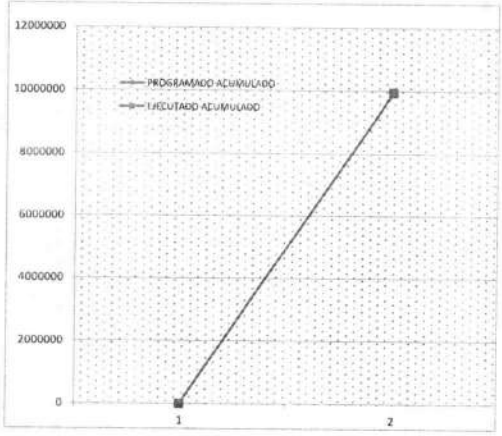

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadania # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadania 16.606.123 según radicado 30 junio -2022.

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHEZ PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversión

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material do arrastre, madera,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS)

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Codigo: IO-FR-15	
Version 03	
Fecha: 09-ENE-18	
Página 1 de 1	

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)}$ 100	[g/cm³]	2,14	2,10	2,09				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	99,8	97,9	97,5				
P. Porcentaje de compactacion requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via aos K0+040 eje
Punto 2 Via aos K0+070 lado derecho
Punto 3 Via aos K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.


Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-20 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

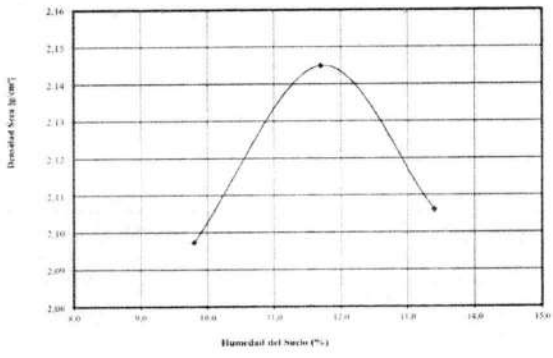

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 38-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 318 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer


3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.

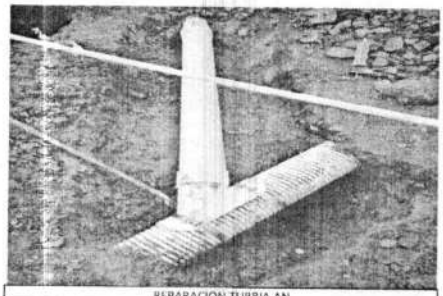

REPARACION TUBRIA AN



COMPACTACIO DE ROCA MUERTA



TOMA NIVELESSUBRRASANTE



PANORAMICA SUBRRASANTE



ROCA MUERTA COMPACTADA



EXTENSION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA




ROCA MUERTA COMPACTADA



VERIFICACIO DE NIVELES



ROCA MUERTA

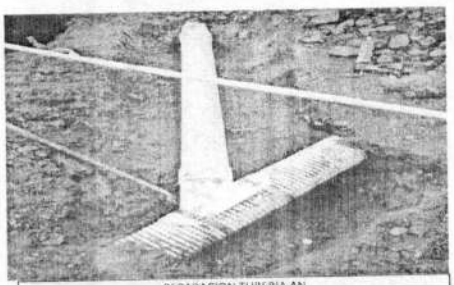

REPARACION TUBERIA AN



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



COMPACTACION ROCA MUERTA



EXTENSION ROCA MUERTA



EXTENDIDA ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



COLMPOACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA EXRENDIDA



EXTENDIDA ROCA MUERTA



COMPACTACION DE ROCA MUERTA

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				
$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO 4 MESES
CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

CONTRATO No. 2023/46
CONTRATO No. 2023/58

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES															OBSERVACIONES
CARGO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	

TOTAL PERIODO 86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1			
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
MANO OBRA CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región																			
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			
PROFESIONALES - TÉCNICOS																	0	0,00%	
De la región																			
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1			
POBLACIÓN VULNERABLE																	0	0,00%	
En proceso de reinserción social																			
En condición de desplazamiento																	0	0,00%	
MUJERES																			
Mano de Obra no Calificada																			
Mano de Obra Calificada																			
Profesionales - Técnicos																			
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Local																			
Nacional																			
Internacional																			

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 2	17/12/2023	24/12/2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INTORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INTORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	

3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico



4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra


ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	14	31,11%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 104.088.933,61		24,47%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 82.272.944,43		19,34%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -21.815.989		-5,13%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		5,70%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 5,70%, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

COLOCACION GEOTEXTIL T2100



COLOCACION GEOTEXTIL T2100



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



COMPACTACION DE BASE GRANULAR



COMPACTACION DE BASE GRANULAR



REPARACION DE TUBERIAS

PANORAMICA ROCA MUERTA EXTENDIDA Y COMPACTADA

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ -
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ -
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ -
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

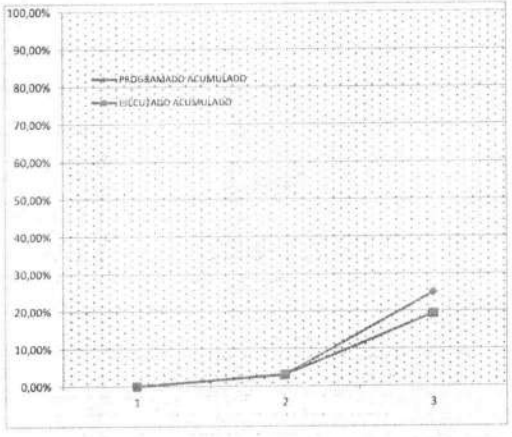

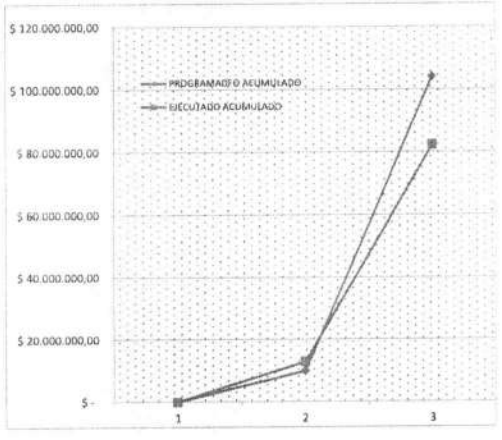

ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-036 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE II, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio 2022

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAL

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15 | Versión 03 | Fecha: 08-ENE-19 | Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Codigo: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedometro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo humedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo humedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad humeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,8	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Advertencia: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Telefonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-26 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Codigo:	6725	Elaborado por:	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

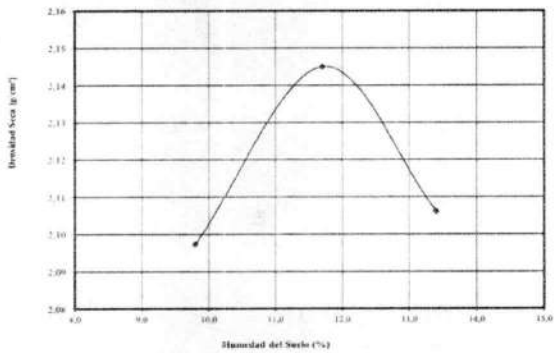

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **SI** [x] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



ROCA MUERTA COMPACTADA



EXTENSION DE GEOTEXTIL T2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T2100



EXTENSION DE GEOTEXTIL T 2100



COMPACTACION SUBBASE TIPO INVIAS



COMPACTACION SUB BASE TIPO INVIAS



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACIONTUBERIA AN



COMPACTACION SUBBASE TIPO INVIAS



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



SUPERFICIE COMPACTADA DE ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN

COMPACTACION DE ROCA MUERTA

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 252022879S CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO: 4 MESES

CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

CONTRATO No. 2023746

CONTRATO No. 2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES														OBSERVACIONES
CARGO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023

[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado

FECHA:	Semana: 3	25/12/2023	31/12/2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico

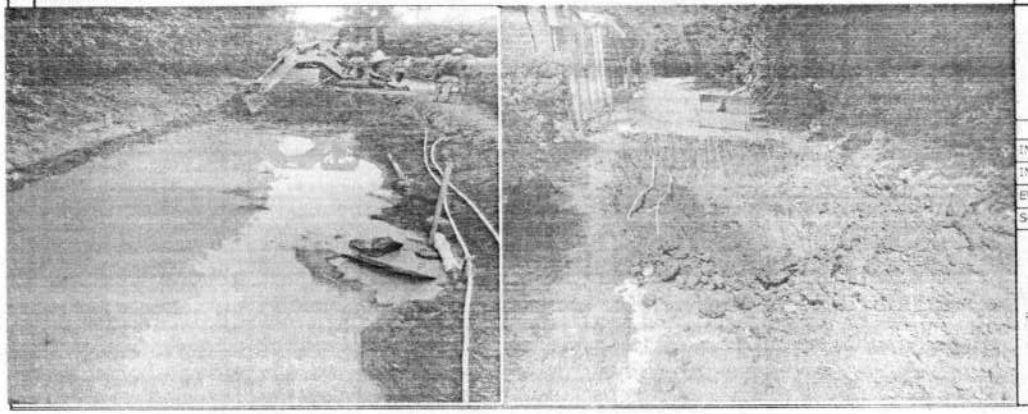

4. Curva "S"

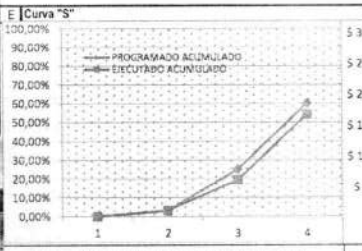

PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	21	46,67%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 253.857.276,46		59,67%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 230.866.219,98		54,27%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -22.991.056		-5,40%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		5,77%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 5,77%. LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



REPARACION TUBERIA APOTABLE VIAN.1 ARRAYANES



DETALLE FALLO TUBERIA A POTABLE



REPARACION DE TUBERIAS AN

REPARACION DE TUBERIAS AN

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

EJECUTADO ACUMULADO	SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
$ -		$ -	$ -
$ 12.932.251,87	1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39
$ 82.272.944,43	2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61
$ 230.866.219,98	3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46
$ -	4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56
$ -	5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66
$ -	6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76
$ -	7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86
$ -			
$ -			
$ -			
$ -			

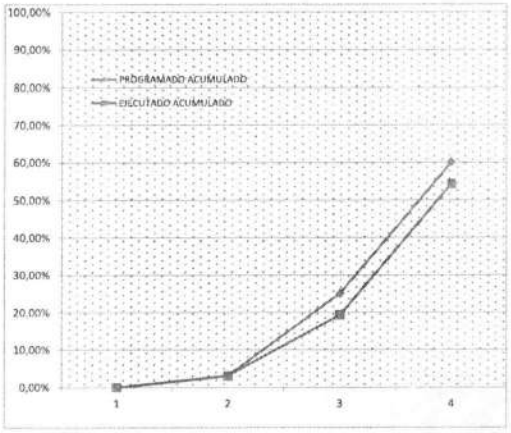

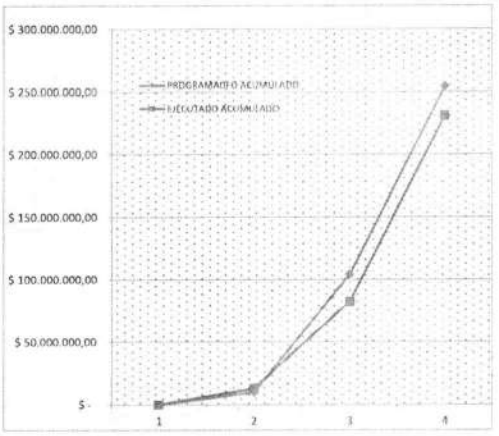

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1		
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

MARCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Gerente de Planificación y proyectos de Inversión

Dagua, junio 28 de 2022

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoria Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTG) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15
Versión 03
Fecha: 09-ENE-19
Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)					
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO					
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-20 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
Cliente:	Proyectos y Consultorias Onon SAS	Código:	6725
Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar	Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de elaboración:	29-dic-23		

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

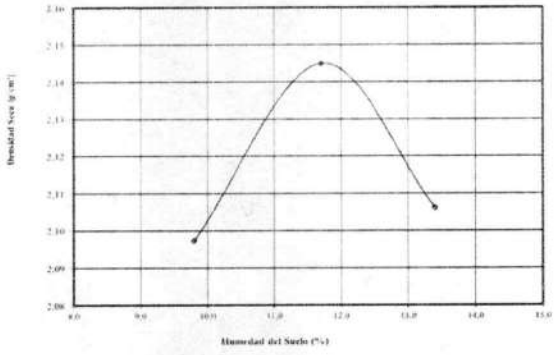

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
ssuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. **ENSAYOS**

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____

SI	NO
x	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



EXTENSION BASE INVIAS



EXTENSION BASE TIPO INVIAS



COMPACTACION DE ROCA MUERTA



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



REPARACION TUBERIA AN



COMPACTACION SUB BASE TIPO INVIAS



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXTENSION SUBBASE TIPO INVIAS



TOMA DE DENSIDADES K0+040



SUBBASE TIPO INVIAS COMPACTADA



EXTENSION SUBBASE TIPO INVIAS



EXTENSION YCOMPACTACION SUBBASE INVIAS



EXTENSION SUBBASE INVIAS



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1					
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO: 4 MESES	
CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS				CONTRATO No.	2023748
INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS				CONTRATO No.	2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES														OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
CARGO																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO	86
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1																38	44,19%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			13	15,12%	
MANO OBRA CALIFICADA																																0	0,00%	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1																13	15,12%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																0	0,00%	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1																24	27,91%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																0	0,00%	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																																0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normarlidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

	INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 4	1/01/2024	7/01/2024	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.




2. Registro Fotográfico

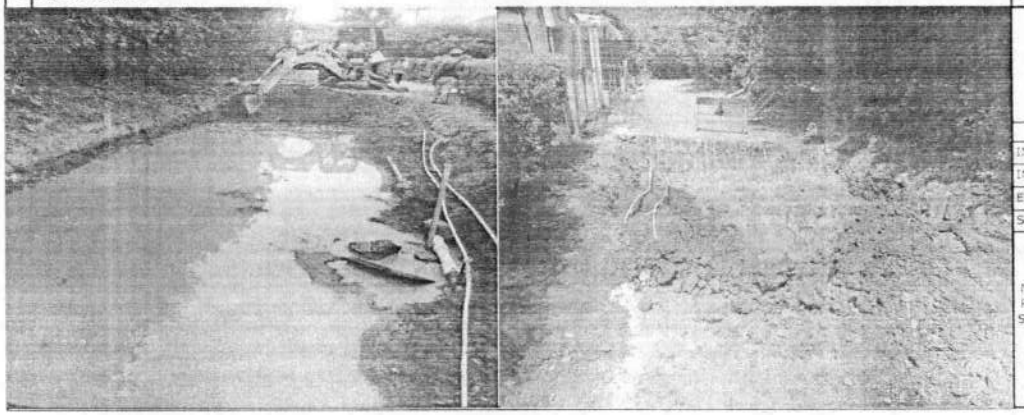

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	28	62,22%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 296.648.231,56		69,73%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 273.023.659,45		64,18%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -23.624.572		-5,55%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		0,86%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 0,86%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 3 SE SUPERA EL ATRASO EN GRAN PORCENTAJE DEBIDO A LAS REPARACIONES Y FRENTES DE OBRA INICADOS POR EL CONTRATISTA, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR, ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA 1 ARRAYANES



EXTENSION BASE GRANULAR



EXTENDIDA DE ROCA MUERTA PARA PROTECCION DE TUBERIA



REPARACION TUBERIA APOTABLE VIAN.1 ARRAYANES



DETALLE FALLO TUBERIA A POTABLE



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	5,00%	70,04%	
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	75,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	80,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	85%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	90%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	94%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ -
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ -
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

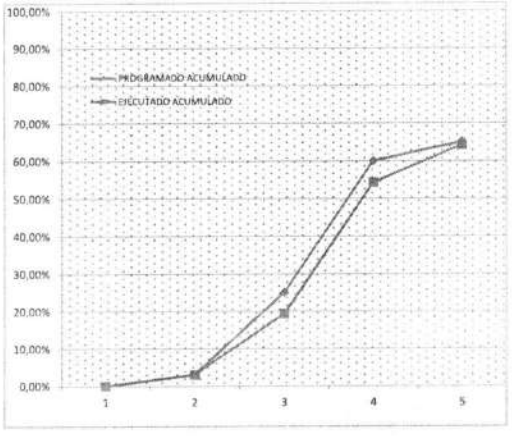

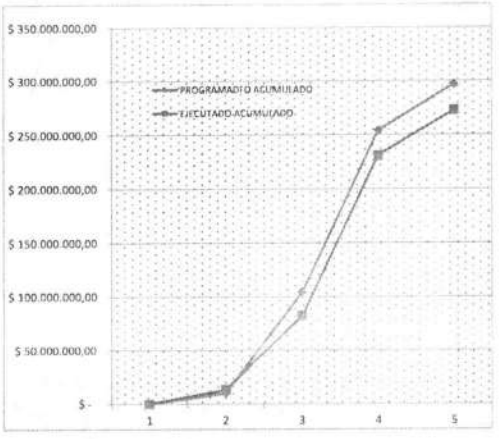

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadania # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color roja, SCN 016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE 8, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio, evitando asi inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversion

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Codigo: IO-FR-15 | Versión 03 | Fecha: 09-ENE-19 | Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,8	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 827 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-26 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes -	Consecutivo:	LA-155526
	Municipio de Dagua	Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Codigo:	6725	Elaborado por:	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Humeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

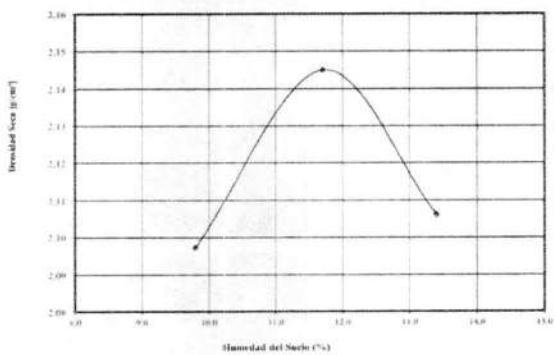

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoria certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **SI** [x] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES




EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70

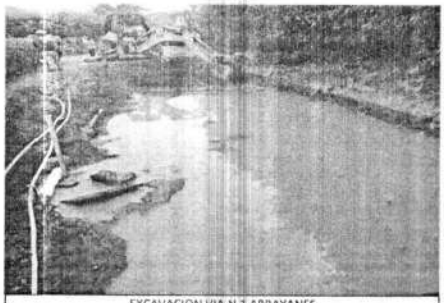

EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES



CONSTRUCCION FILTRO FRANCES

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

CR

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731	
$60.943.214					
4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%	
18,61%					
47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%	
62,17%					

Enero de 2024					
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$59.666.216					
				$227.090.353	
4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
18,22%					
				69,33%	
66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
80,39%					
				112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29
$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1						
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO:	4 MESES	CONTRATO No. 2023746
CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS						CONTRATO No. 2023758
INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS						

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES														OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
CARGO																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	

TOTAL PERIODO		86
MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
PROCEDENCIA / CONDICIÓN			
MANO OBRA NO CALIFICADA			
De la región	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3	1		0	0,00%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
MANO OBRA CALIFICADA				0	0,00%	
De la región						
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1				
PROFESIONALES - TÉCNICOS				0	0,00%	
De la región						
De fuera de la región	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2	1				
POBLACIÓN VULNERABLE				0	0,00%	
En proceso de reinserción social						
En condición de desplazamiento						
MUJERES				0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada						
Mano de Obra Calificada						
Profesionales - Técnicos						
PROVEEDORES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Local						
Nacional						
Internacional						

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%


DAGUA / ORION	**INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA**	**Código:** F-DAGUA-001 **Versión:** 1 **Fecha:** 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 5	8/01/2024	14/01/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA		
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INITORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INITORIA:	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

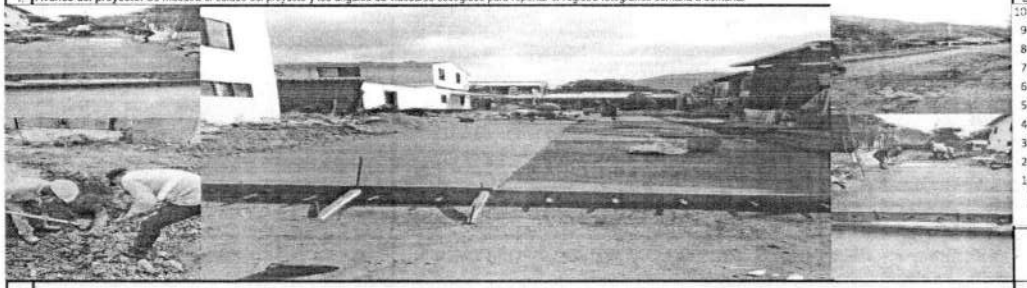


2. Registro Fotográfico

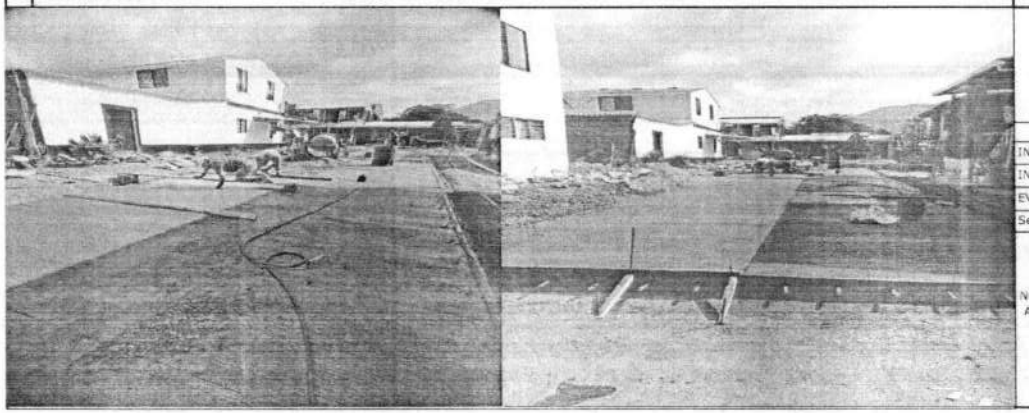

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	34	75,56%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 339.439.186,66		79,79%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 297.952.276,53		70,04%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -41.486.910		-9,75%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		2,00%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 2,00%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 4 SE AUMENTA EL ATRASO DEBIDO A LAS REPARACIONES Y FRENTES DE OBRA INICADOS POR EL CONTRATISTA, LAS RAZONES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA YA QUE SE PRESENTAN DAÑOS EN LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS QUE SE HAN ENTRADO A REPARAR. ESTAS ACCIONES NO HACEN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL NI SON ITEMS CONSTRACTUALES

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES



CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES



CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	5,00%	77,04%	
7	22/01/24 - 24/01/24	5,00%	82,04%	
8	25/01/24-1/02/24	5,00%	87%	
9	1/02/24-08/02/24	5,00%	92%	
10	09/02/24-15/02/24	4,00%	96%	
11	16/02/24-24/02/24	6,00%	102%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ 297.952.276,53
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ -
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

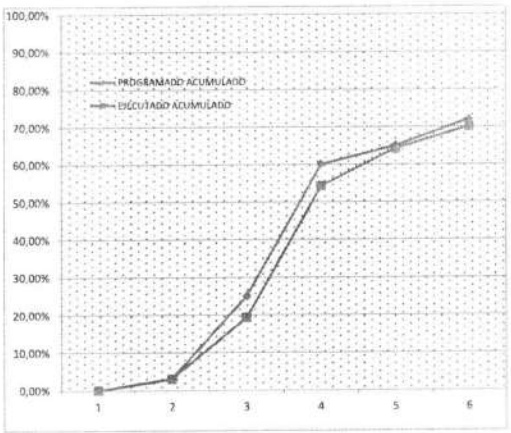

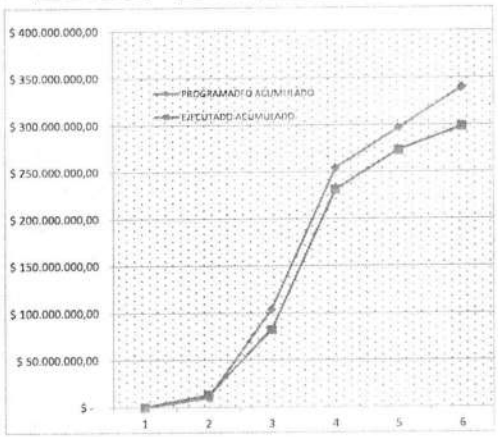

ING FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

1		
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadania # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando asi inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadania 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

INGRID ANTONIO CALVACHEZ PAZ
Gestión de Inversiones y Proyectos de Inversión

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto Nº.	2023758
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
Semana Reportada:	1
Perido de Informe:	11/12/2023 — 23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____**

SI	NO
X	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15 | Versión 03 | Fecha: 09-ENE-19 | Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- **Arena normalizada**
- **Balanza de precisión**
- **Bolsas plásticas**
- **Equipo de densidad de campo**
- **Humedómetro (Speedy)**
- **Herramienta menor**

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)					
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO					
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95

Observaciones:

Punto 1 Vía abs K0+040 eje
Punto 2 Vía abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Vía abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Codigo: IO-FR-20 Version: 03 Fecha: 9-ENE-19 Pagina: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes -	Consecutivo:	LA-155526
	Municipio de Dagua	Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Codigo:	6725	Elaborado por:	Geol. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Humeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

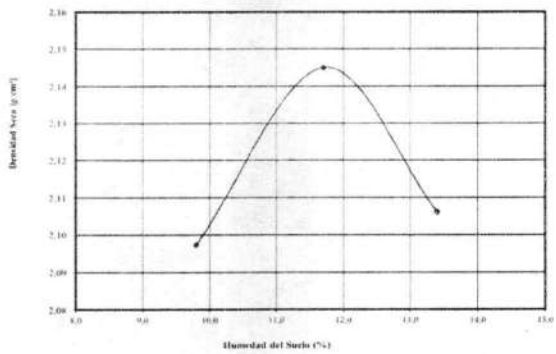

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. **ENSAYOS**

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **SI** [x] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



REPARACION TUBERIA AN VIA N.1



REUNION INFORMATIVA DE SEGURIDAD



REUNION INFORMATIVA DE SEGURIDAD



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



ALMACENAMIENTO MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETO



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



CHARLA INFORMATIVA DE SEGURIDSAD



CHARLA INFORMATIVA DE SEGURIDSAD

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	

$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						

2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731
	$60.943.214				
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%
	18,61%				
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%
	62,17%				

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			
	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
			$59.666.216			
					$227.090.353	
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
			18,22%			
					69,33%	
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
			80,39%			
					112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29
$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1							
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO.	4 MESES	CONTRATO No.	2023746
CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS						CONTRATO No.	2023758
INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS							

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES																																OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
CARGO																																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1																	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1																	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTAL PERIODO		86
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		0	0,00%	
De la región	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1	18	20,93%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		7	8%	
De la región		4	4,65%	
De fuera de la región	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		26	30%	
De la región		25	29,07%	
De fuera de la región	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		0	0,00%	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normarlidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%


DAGUA / ORION	INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 11/Dic/2023
	[x] Público [ ] Reservado [ ] Clasificado	

FECHA:	Semana: 5	15/01/2024	21/01/2024	
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA			
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2023746	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 40.247.745,65	
FECHA DE INICIO OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERICIÓN INICIAL DE INTORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023	
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERICIÓN DE INTORIA:	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:	2 MESES	


3. Descrición Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.


1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de visuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.

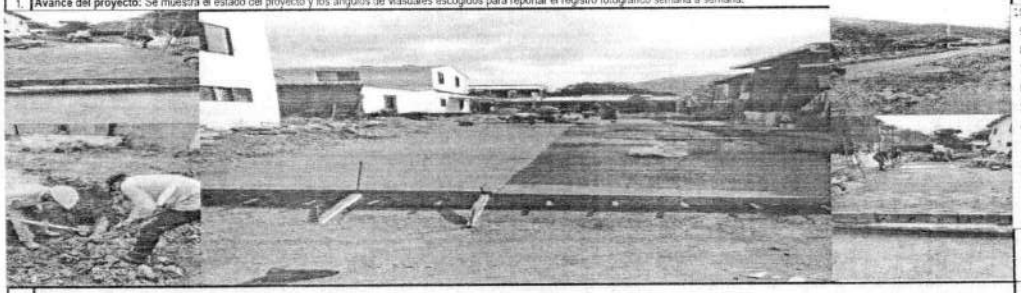


2. Registro Fotográfico

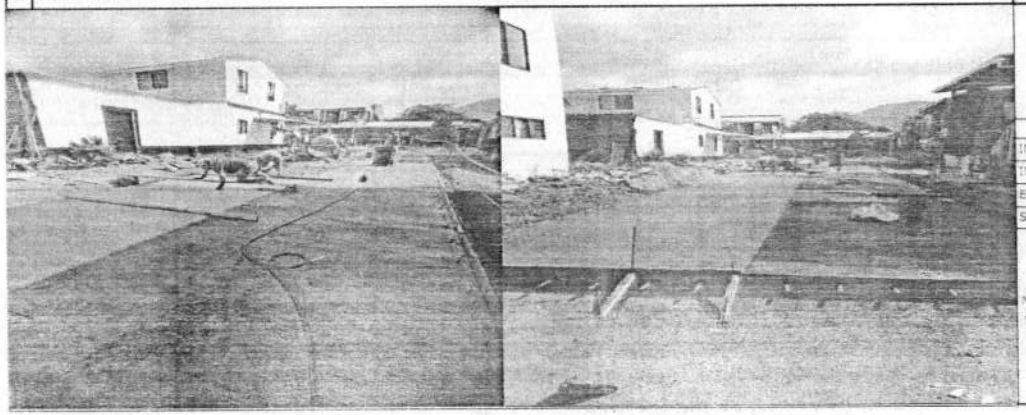

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	34	75,56%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 339.439.186,66		79,79%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 297.952.276,53		70,04%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -41.486.910		-9,75%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		7,69%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 7,69%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 6 SE AUMENTA EL ATRASO DEBIDO AL NO PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE YA QUE SE REQUIEREN RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 V.A N.3 ARRAYANES








CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 V.A N.3 ARRAYANES







CHARLA INFORMATIVA SEGURIDAD

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	8,00%	80,04%	72,35%
7	22/01/24 - 24/01/24	7,00%	87,04%	
8	25/01/24-1/02/24	13,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ 297.952.276,53
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ 307.779.086,34
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -

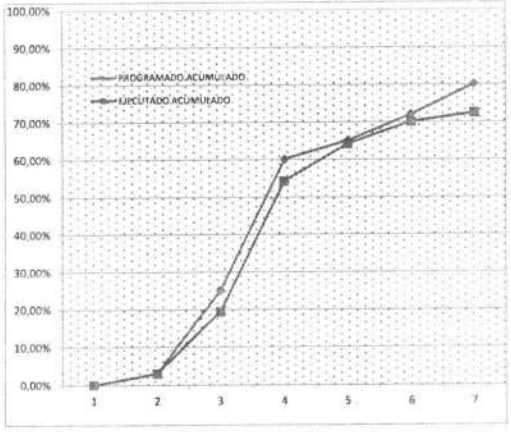

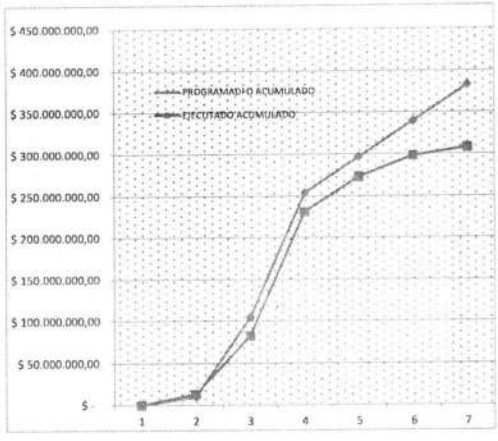

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadania # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000310003826 1000 LOTE 8, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio, evitando asi inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadania 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

INGRID ANTONIO CALVACHE PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversion

Dagua, junio 28 de 2022

3. ADQUISICION DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra. **Según Formato No. _____** .

SI	NO
X	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15 | Versión 03 | Fecha: 09-ENE-19 | Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Código: 6725
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Descripción del material: Roca muerta

Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Elaborado por: Jenny Grajales
Fecha de realización: 26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FÓRMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)					
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO					
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,6	11,0
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO


NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70

Código: IO-FR-29	
Versión: 03	
Fecha: 9-ENE-19	
Página: 1 de 1	

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Humeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

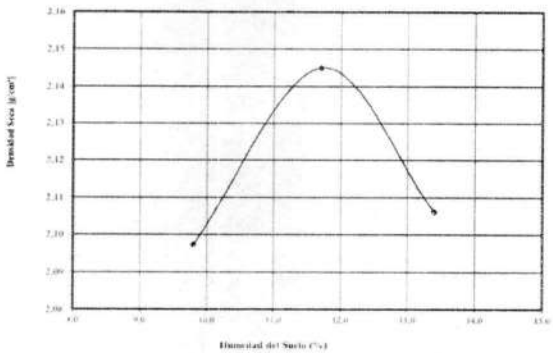

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Numero: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 316 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



REUNION PROGRAMACION SEGURIDAD



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.2 ARRAYANES



ALMACENAMIENTO MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETO

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	**Descripcion**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Plazo (Días)**
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				
$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

	$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
	$62.571.017					
	6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
	19,10%					
	30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
	43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731
	$60.943.214				
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%
	18,61%				
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%
	62,17%				

					Enero de 2024	
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			
	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
			$59.666.216			
					$227.090.353	
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
			18,22%			
					69,33%	
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
			80,39%			
					112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	V
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

DAGUA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1						
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023	11/12/2023	Y EL	25/12/2023	PLAZO:	4 MESES	CONTRATO No. 2023746
CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS						CONTRATO No. 2023758
INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS						

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES														OBSERVACIONES
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
CARGO																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO	86
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																															0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1															58	54,19%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		13	15,12%	
MANO OBRA CALIFICADA																															0	0,00%	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1															14	17,28%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																															0	0,00%	
De la región																															0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1															20	17,23%	
POBLACIÓN VULNERABLE																															0	0,00%	
En proceso de reinserción social																															0	0,00%	
En condición de desplazamiento																															0	0,00%	
MUJERES																															0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada																															0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																															0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																															0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: el contrato se desarrolla en normarlidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 11/Dic/2023

INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA

☒ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 1	15/01/2024	21/01/2024		
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA				
CONTRATO DE OBRA No.:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2023746		
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$ 40.247.745,65		
FECHA DE INICIÓ OBRA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORIA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A		
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERCIÓN INICIAL DE INTORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023		
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERCIÓN DE INTORIA:	N/A		
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORIA:	2 MESES		

1. Descripción Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMPIZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y las angulos de visuales recogidos para reportar el registro fotográfico semana a semana.



2. Registro Fotográfico



PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES



PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES




PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES




PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES

4. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	34	75,56%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 339.439.186,66		79,79%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 297.952.276,53		70,04%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -41.486.910		-9,75%
Se presenta un atraso en la Obra	SE PRESENTA ATRASO		7,69%

NOTAS: SE PRESENTA ATRASO DEL 7,69%, CON RELACION A LA SEMANA NUMERO 6 SE AUMENTA EL ATRASO DEBIDO AL NO PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE YA QUE SE REQUIEREN RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	0
		0
		0
		0
		0
		5
	MAESTRO	1
TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA		11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA MAT 2520228795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	8,00%	80,04%	72,36%
7	22/01/24 - 24/01/24	7,00%	87,04%	
8	25/01/24-1/02/24	13,00%	100%	

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ 297.952.276,53
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ 307.779.086,34
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ -
			$ -

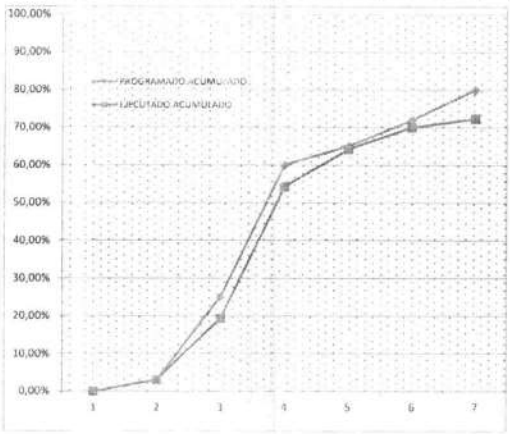

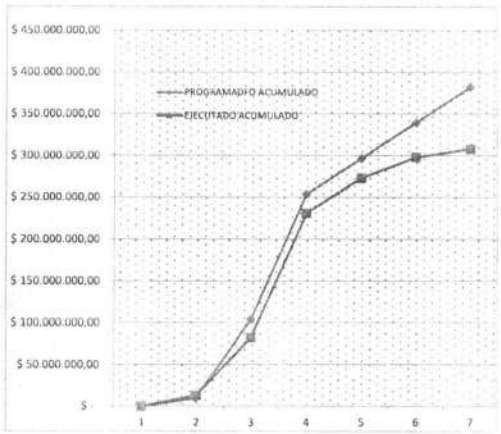


ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520226795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

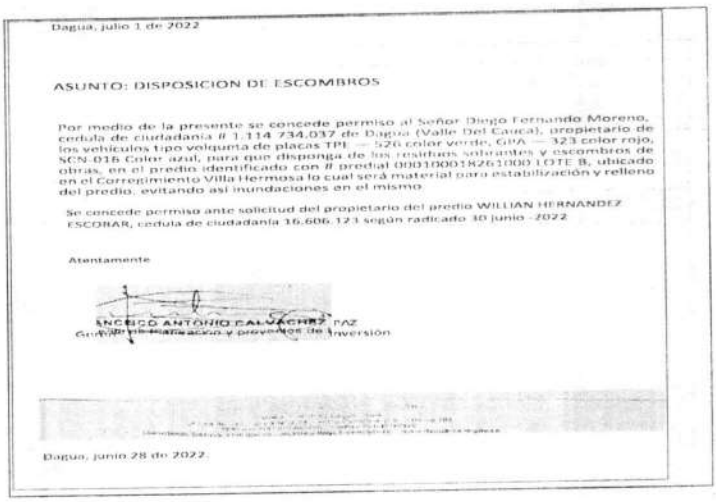

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadania # 1.114.734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehiculos tipo volqueta de placas TPI — 526 color verde, GUA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos solidrales y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio, evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadania 16.606.121 según radicado 30 junio - 2022

Atentamente

INCRICO ANTONIO CALVACHEZ PAZ
Gerente de Planeación y proyectos de Inversión

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. **CALIDAD DE MATERIALES**

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Código: IO-FR-15	
Versión 03	
Fecha: 09-ENE-18	
Página 1 de 1	

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	DE-155308
Código:	6725	Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Elaborado por:	Jenny Grajales
Descripción del material:	Roca muerta	Fecha de realización:	26/12/2023

EQUIPO DE ENSAYO

- Arena normalizada
- Balanza de precisión
- Bolsas plásticas
- Equipo de densidad de campo
- Humedómetro (Speedy)
- Herramienta menor

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1.354	1.354	1.354				
G. VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo humedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo humedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad humeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2.40	2.34	2.32				
L. Humedad del suelo		[%]	12.0	11.6	11.0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2.145	2.145	2.145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,5**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Via abs K0+040 eje
Punto 2 Via abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Via abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobo	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Versión: 03 Fecha: 5-ENE-15 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorías Orion SAS
Código:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Húmeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

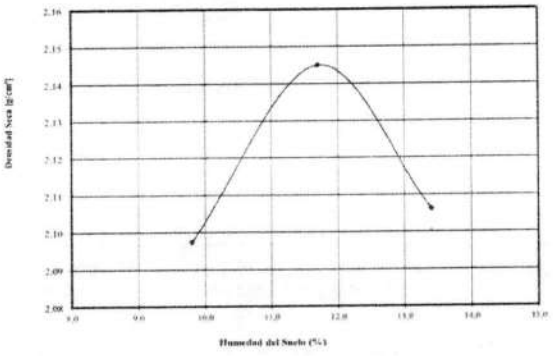

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Andres Belalcazar		
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **SI** [X] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **SI** [x] **NO** [ ]
Según Formato No. _____

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor


Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.



REUNION COMUNIDAD



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES

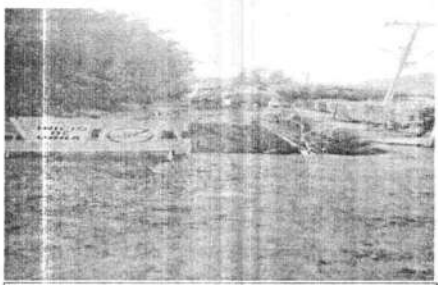

EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+70



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



TOMA DE DENSIDADES K0+040



EXCAVACION VIA N.1 ARRAYANES



ALMACENAMIENTO MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETO

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

CR

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731	
$60.943.214					
4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%	
18,61%					
47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%	
62,17%					

Enero de 2024					
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

	$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
	$59.666.216					
					$227.090.353	
	4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
	18,22%					
					69,33%	
	66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
	80,39%					
					112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29
$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

DAGUA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	Código: F-DAGUA-001 Versión: 1 Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2023 Y 25/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 25/12/2023 PLAZO: 4 MESES

CONTRATISTA:PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS — CONTRATO No. 2023746

INTERVENTORIA :CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS — CONTRATO No. 2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA / CARGO	MES 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL PERIODO	86

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2			1	48	64,79%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				13	18,03%	
MANO OBRA CALIFICADA																	0	0,00%	
De la región																	0	0,00%	
De fuera de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	14	19,44%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																	0	0,00%	
De la región																	0	0,00%	
De fuera de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1	26	37,23%	
POBLACIÓN VULNERABLE																	0	0,00%	
En proceso de reinserción social																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento																	0	0,00%	
MUJERES																	0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada																	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos																	0	0,00%	
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Local																			
Nacional																			
Internacional																			

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%

INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

INFORME SEMANAL 1 DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 11/Dic/2023

☒ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: 1	22/01/2024	3/02/2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA		
CONTRATO DE OBRA No:	2023758	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2023746
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	INTEVENTOR	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 425.403.021,89	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$ 40.247.745,65
FECHA DE INICIO OBRA	11 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIO INTERVENTORIA:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	N/A	FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	N/A	FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31 DE DICIEMBRE/2023	FECHA DE TERCIÓN INICIAL DE INTORIA:	31 DE DICIEMBRE/2023
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	N/A	NUEVE FECHA DE TERCIÓN DE INTORIA:	N/A
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	45 DIAS	PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORIA:	2 MESES


1. Descripción Obras ejecutadas

1-SUMINISTRO EINSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2100.
2-SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS.
3-REPARACION Y COLOCACION DE TUBERIA AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE DETERIORADA.
4-SE EMEPZO CON EL REALCE DE RECAMARAS.
5-SE REALIZO RELLENO - ROCAMUERTA COMPACTADA.

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y las anguias de obsiones escogidas para reportar el registro fotográfico semana a semana.



3. Curva "S"



PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FISICO


PROGRADO ACUMULADO VS EJECUTADO ACUMULADO FINANCIERO

2. Registro Fotográfico



PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES

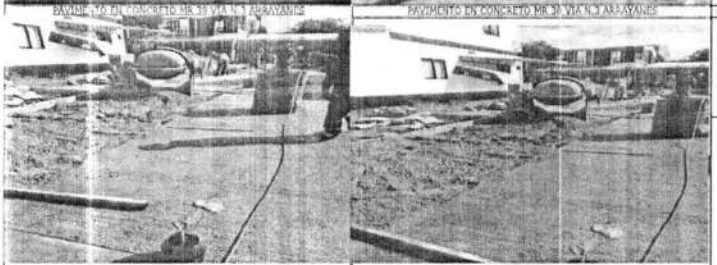

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 38 VIA N.3 ARRAYANES

5. Control Avance de Obra

ACTA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2023	DIAS CONTRACTUALES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	45	45	100,00%
	VALOR ($)		PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1):	$ 425.021.096,86		99,91%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2):	$ 425.403.021,89		100,00%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ -		0,00%
Se presenta un atraso en la Obra	SE FINALIZA LA OBRA		

NOTAS: SE FINALIZA LA OBRA EL SABADO 3 DE FEBRERO DEBIDO AL NO PAGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE CON RELACION A LAS ACTAS PARCIALES DE OBRA E INTERVENTORIA, SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA PAGO LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA POR 10 DIAS.

6. Personal de obra e interventoria

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
	TOPOGRAFO	1

	CARGO	CANT
CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTE DE OBRA	1
	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1
	OPERADOR CILINDRO	1
	AYUDANTES	3
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	MAESTRO	1

TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA	11,00

RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. FELIPE CALDERON HERRERA MAT 2520225795 CND

REPRESENTANTE LEGAL - ARQ. CAROLINA SANABRIA


REPROGRAMACIÓN DE OBRA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	FECHAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
		0,00%	0,00%	0,00%
1	11/12/23 - 16/12/23	3,04%	3,04%	3,04%
2	18/12/23 - 23/12/23	22,00%	25,04%	19,34%
3	26/12/23 - 30/12/23	35,00%	60,04%	54,27%
4	02/01/24 - 06/01/24	5,00%	65,04%	64,18%
5	09/01/24 - 13/01/24	7,00%	72,04%	70,04%
6	15/01/24 - 20/01/24	8,00%	80,04%	72,35%
7	22/01/24 - 24/01/24	20,00%	100,00%	100,00%

CANTIDADES FINANCIERA SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	$ -	$ -	$ -
1	$ 9.948.832,39	$ 9.948.832,39	$ 12.932.251,87
2	$ 94.140.101,22	$ 104.088.933,61	$ 82.272.944,43
3	$ 149.768.342,85	$ 253.857.276,46	$ 230.866.219,98
4	$ 42.790.955,10	$ 296.648.231,56	$ 273.023.659,45
5	$ 42.790.955,10	$ 339.439.186,66	$ 297.952.276,53
6	$ 42.790.955,10	$ 382.230.141,76	$ 307.779.086,34
7	$ 42.790.955,10	$ 425.021.096,86	$ 425.403.021,89

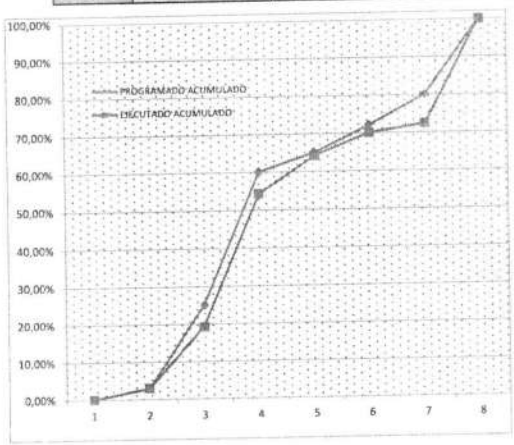

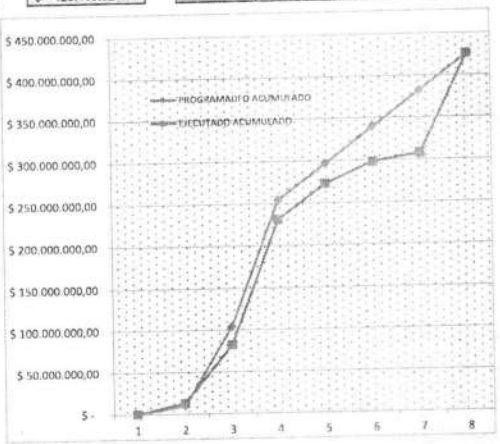

ING.FELIPE CALDERON HERRERA-MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	1		
	Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
	Constructor:	PROYECTOS Y CONSUKTORIAS ORION SAS	
	Semana Reportada:	1	
	Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA

Dagua, julio 1 de 2022

ASUNTO: DISPOSICION DE ESCOMBROS

Por medio de la presente se concede permiso al Señor Diego Fernando Moreno, cedula de ciudadanía # 1.114 734.037 de Dagua (Valle Del Cauca), propietario de los vehículos tipo volqueta de placas TPE — 526 color verde, GPA — 323 color rojo, SCN-016 Color azul, para que disponga de los residuos sobrantes y escombros de obras, en el predio identificado con # predial 000100018261000 LOTE B, ubicado en el Corregimiento Villa Hermosa lo cual será material para estabilización y relleno del predio. evitando así inundaciones en el mismo.

Se concede permiso ante solicitud del propietario del predio WILLIAN HERNANDEZ ESCOBAR, cedula de ciudadanía 16.606.123 según radicado 30 junio -2022

Atentamente

FRANCISCO ANTONIO CALVACHEZ PAZ
Gerente de Estructuración y proyectos de Inversión

Dagua, junio 28 de 2022.

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre,

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEG

ANEXO 4

Proyecto N°.	2023758	
Interventor:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
Constructor:	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	
Semana Reportada:	1	
Perido de Informe:	11/12/2023	23/12/2023

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	NO
x	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad:ROCA MUERTA

RESULTADOS DE LABORATORIO
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
Norma (NTC) 1667 Determinación de la densidad y el peso unitario en el terreno por el método del cono y la arena

Codigo: IO-FR-15 | Version 03 | Fecha: 09-ENE-19 | Página 1 de 1

Obra: Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua
Consecutivo: DE-155308
Cliente: Proyectos y Consultorias Orion SAS
Código: 6725
Elaborado por: Jenny Grajales
Ordenado por: Ing. Juan Carlos Sanabria
Fecha de realización: 26/12/2023
Descripción del material: Roca muerta

EQUIPO DE ENSAYO

- **Arena normalizada**
- **Balanza de precisión**
- **Bolsas plásticas**
- **Equipo de densidad de campo**
- **Humedómetro (Speedy)**
- **Herramienta menor**

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

	FORMULA	UNIDAD	PUNTOS DE ENSAYO 1	2	3				
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ORIFICIO (HUECO)									
A. Peso de (frasco+cono+arena) INICIAL		[g]	4961	4954	4944				
B. Peso de (frasco+cono+arena) FINAL		[g]	1476	1545	1530				
C. Peso de arena usada (Arena en cono+Arena hueco)	[A-B]	[g]	3485	3409	3414				
D. Peso de arena en cono (Constante Cono)		[g]	1581	1581	1581				
E. Peso de arena en orificio (hueco)	[C-D]	[g]	1904	1828	1833				
F. Densidad arena suelta (Laboratorio)		[g/cm³]	1,354	1,354	1,354				
G VOLUMEN DEL ORIFICIO (hueco)	[E/F]	[cm³]	1406	1350	1354				
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SUELO									
H. Peso de suelo húmedo+recipiente (tara)		[g]	3730	3523	3503				
I. Peso de recipiente (tara)		[g]	360	360	360				
J. Peso de suelo húmedo	[H-I]	[g]	3370	3163	3143				
K. Densidad húmeda del suelo	[J / G]	[g/cm³]	2,40	2,34	2,32				
L. Humedad del suelo		[%]	12,0	11,8	11,0				
M. Densidad seca del suelo	$\frac{K}{(100+L)/100}$	[g/cm³]	**2,14**	**2,10**	**2,09**				
N. Densidad del Próctor		[g/cm³]	2,145	2,145	2,145				
O. Porcentaje de compactación	$\frac{M \times 100}{N}$	[%]	**99,8**	**97,9**	**97,5**				
P. Porcentaje de compactación requerido (especificación)		[%]	95	95	95				

Observaciones:

Punto 1 Vía abs K0+040 eje
Punto 2 Vía abs K0+070 lado derecho
Punto 3 Vía abs K0+070 lado izquierdo

Aclaración: Se prohibe la reproducción total o parcial de éste informe sin la autorización de Ingeomac S.A.S.

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Cargo: Director de Laboratorio	Nombre:	Certificado Número : CO18.02947


INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Telefonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO NORMA DE REFERENCIA: ASTM D698-70	Código: IO-FR-20 Versión: 03 Fecha: 9-ENE-19 Página: 1 de 1

Obra:	Barrio Los Arrayanes - Municipio de Dagua	Consecutivo:	LA-155526
		Cliente:	Proyectos y Consultorias Orion SAS
Codigo:	6725	Elaborado por:	Geot. Andres Belalcazar
Ordenado por:	Ing. Juan Carlos Sanabria	Fecha de elaboración:	29-dic-23

Material:	Roca Muerta	Cantera:	
Fecha de ingreso:	26-dic-23	Fecha de ensayo:	27-dic-23
Realizado por:	Camilo Estupiñan		

PUNTO No.		1	2	3
Peso Molde + Muestra Compactada	[g]	11704	11913	11897
Peso molde	[g]	6830	6842	6842
Peso Muestra Compactada	[g]	4874	5071	5055
Volumen Muestra Compactada	[cm³]	2116,5	2116,5	2116,5
Densidad Humeda	[g/cm³]	2,303	2,396	2,388
Humedad	[%]	9,80	11,70	13,40
Densidad Seca	[g/cm³]	2,097	2,145	2,106

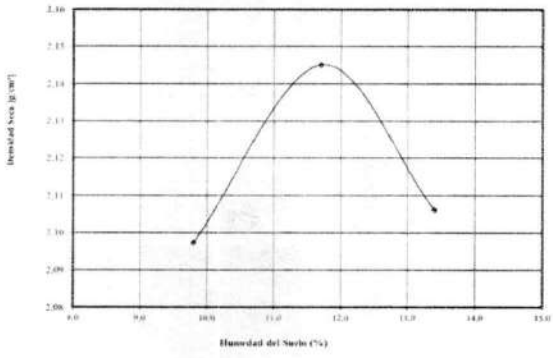

Densidad Seca Máxima: **2,145** g/cm³ Hum. Óptima del suelo: **11,70** %

Firmas de aprobación		Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Geotecnologo	Nombre:	Certificado Número: CO18.02947

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 318 627 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

val

La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra. **Según Formato No.** _____

SI	NO
X	

Enumere los equipos calibrados: BALANZA,MAQUINA DE ENSAYOS 1 ,MAQUINA DED ENSAYOS 2Certificado De Calibración

LABORATORIO EMISOR
Issuing Laboratory
DIRECCIÓN
Address
LABORATORIO :
Laboratory
INSTRUMENTO :
Instrument
FABRICANTE :
Manufacturer


3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales. **Según Formato No.** _____

SI	NO
x	

DENSIDADES,PROCTOR,GRANULOMETRIA se exigio certificacion emitida por el proveedor

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.

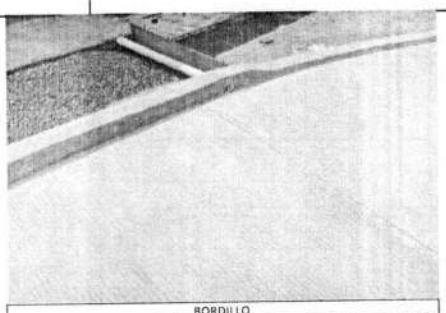


BORDILLO




TRAMO 1




TRAMO 2

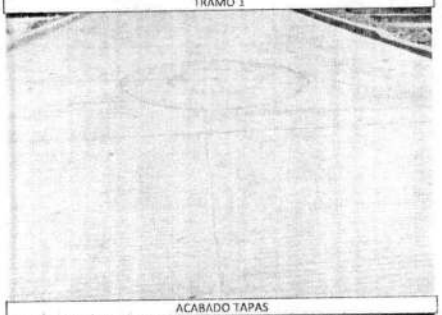

ACABADO TAPAS

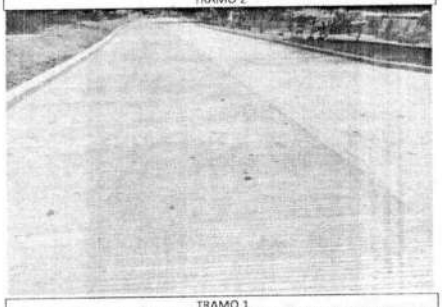

TRAMO 1

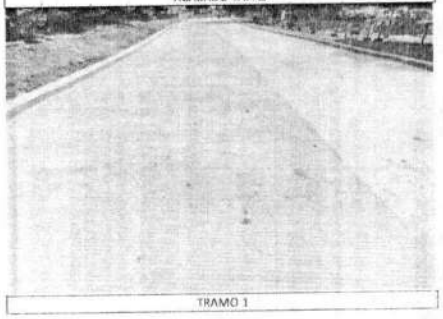

TRAMO 1



TRAMO 2

TOMA DE DENSIDADES K0+040

ING.FELIPE CALDERON HERRERA MAT 2520228795 CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA, BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA"			INICIO	11/12/2023	FIN	24/01/2024
			PLAZO DE EJECUCIÓN		33 DÍAS	
Item	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Plazo (Días)
1,00	BARRIO ARRAYANES					33
1,01	Excav. a maquina (Cajeo) (SR)	M3	859,65	$6.200	$ 5.329.830,00	11
1,02	Retiro escombros a maquina <=10 Km.	M3	805,92	$20.000	$ 16.118.400,00	11
1,03	Conformacion compactada subrasante CBR=95	M2	1074,56	$5.100	$ 5.480.256,00	7
1,04	Sub-base compactada 10 Km tipo Invias	M3	268,64	$172.500	$ 46.340.400,00	7
1,05	Relleno-Rocamuerta Comp. Mat. Selecc. (ST)	M3	429,82	$126.500	$ 54.372.230,00	7
1,06	Pav. en concreto MR=38 E=20 Cms	M2	1074,56	$114.500	$ 123.037.120,00	21
1,07	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ML	452,27	$24.000	$ 10.854.480,00	17
1,08	Refuerzo en hierro de 60.000 PSI.	KG	5606,68	$8.700	$ 48.778.116,00	15
NP-01	GEOTEXTIL PAVCO 2100	M2	1047,94	$ 11.118,00	$ 11.651.005,00	7
NP-02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ML	230,00	$ 16.957,00	$ 3.900.110,00	6
NP-03	REALCE DE RECAMARA	M3	2,51	$ 673.418,00	$ 1.689.357,00	3

COSTO DIRECTO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE DIARIO
	SEMANAL
	MENSUAL

L	M	M	J	V	S	D
11	12	13	14	15	16	17
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
		$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
				$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29				

$1.664.429	$1.664.429	$2.148.959	$484.530	$2.787.159	$1.366.366	
$10.115.873						
0,51%	0,51%	0,66%	0,15%	0,85%	0,42%	
3,09%						
0,51%	1,02%	1,67%	1,82%	2,67%	3,09%	
3,09%						

Diciembre de 2023						
L	M	M	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.265,00	
$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 484.530,00	$ 732.654,55	
$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 2.302.628,57	$ 391.446,86	
		$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57	
$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57	
		$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
		$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41	
				$ 650.018,33	$ 0,00	
$9.407.216	$9.407.216	$14.080.483	$14.080.483	$14.730.501	$8.305.673	
$70.011.571						
2,87%	2,87%	4,30%	4,30%	4,50%	2,54%	
21,37%						
43,57%						
5,96%	8,83%	13,13%	17,43%	21,93%	24,46%	
24,46%						
71,12%						

C R

L	M	M	J	V	S	D
25	26	27	28	29	30	31
	$ 0,00	$ 0,00				
	$ 484.530,00	$ 484.530,00				
	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 782.893,71	$ 3.310.028,57		
	$ 6.620.057,14	$ 3.310.028,57				
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	
	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 3.251.874,40	$ 319.249,41		
				$ 1.664.429,29		
	$ 650.018,33	$ 0,00				

$20.195.334	$16.235.287	$12.440.728	$13.699.668	$0	
$62.571.017					
6,17%	4,96%	3,80%	4,18%	0,00%	
19,10%					
30,63%	35,58%	39,38%	43,57%	43,57%	
43,57%					

ONOGRAMA DE OBRA

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00	

	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$14.264.871	$3.883.731
	$60.943.214				
	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	1,19%
	18,61%				
	47,92%	52,28%	56,63%	60,99%	62,17%
	62,17%				

Enero de 2024					
L	M	M	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$ 638.498,82	$ 638.498,82	$ 0,00			

$14.264.871	$14.264.871	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$59.666.216					
				$227.090.353	

4,36%	4,36%	4,16%	4,16%	1,19%	
18,22%					
				69,33%	

66,53%	70,88%	75,04%	79,20%	80,39%	
80,39%					
				112,89%	

L	M	M	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21
$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	$ 0,00	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71	
$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$13.626.372	$3.883.731	
$72.015.590						
4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	1,19%	
21,99%						
84,55%	88,71%	92,87%	97,03%	101,19%	102,37%	
102,37%						

L	M	M
22	23	24

$ 7.767.461,43	$ 7.767.461,43	
$ 5.858.910,48	$ 5.858.910,48	$ 3.883.730,71
	$ 1.664.429,29	$ 1.664.429,29

$13.626.372	$15.290.801	$5.548.160
$34.465.333		
4,16%	4,67%	1,69%
10,52%		
106,53%	111,20%	112,89%
112,89%		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-DAGUA-001
Versión: 1
Fecha: 02/Sep/2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 1
PERIODO: COMPRENDIDO EN: DE 11/12/2023 Y 29/12/2023 — 11/12/2023 Y EL 29/12/2023 PLAZO: 4 MESES
CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS — CONTRATO No. 2023746
INTERVENTORIA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS — CONTRATO No. 2023758

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA / CARGO	MES 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	OBSERVACIONES
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
AYUDANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1			1	
PERSONAL CONTRATISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	3	0	0	2	TOTAL PERIODO 86
PROCEDENCIA / CONDICIÓN — MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																	SUMATORIA / PORCENTAJE / CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																	0 — 0,00%
De la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3			1	38 — 44,19%
De cerca de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12 — 13,95%
MANO OBRA CALIFICADA																	0 — 0,00%
De la región																	0 — 0,00%
De cerca de la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	14 — 16,28%
PROFESIONALES - TECNICOS																	0 — 0,00%
De la región																	0 — 0,00%
De cerca de la región	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2			1	32 — 37,21%
POBLACIÓN VULNERABLE																	0 — 0,00%
En proceso de reinsercion social																	0 — 0,00%
En condicion de desplazamiento																	0 — 0,00%
MUJERES																	0 — 0,00%
Mano de Obra no Calificada																	0 — 0,00%
Mano de Obra Calificada																	0 — 0,00%
Profesionales - Técnicos																	0 — 0,00%
PROVEEDORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Local																	
Nacional																	
Internacional																	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA: el contrato se desarrolla en normalidad con falta de maquinaria para lograr rendimientos esperados

OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JUAN CARLOS SANABRIA	DIRECTOR DE OBRA	50%
LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
YISELA YASMIN MEDINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
FELIPE CALDERON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%
MARCO CONTRERAS	TOPOGRAFO	50%

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302947637

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000063665 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	11	2023	09	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.686.385-9

DIRECCIÓN: CR 10 NO. 18 - 44 P 11 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2810966

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/11/2023	30/04/2024	8,049,549.13
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/11/2023	31/12/2026	2,012,387.28
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	30/06/2024	8,049,549.13

BENEFICIARIOS
NIT 800100514 - MUNICIPIO DE DAGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA, DE FECHA 01/11/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ****18,111,485.54	$ **********95,823	$****15,000.00	$ *******21,056	$ **********131,879

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430294763

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A060BFB785

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302947637

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000063665 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	11	2023	09	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.686.385-9

DIRECCIÓN: CR 10 NO. 18 - 44 P 11 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2810966

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/11/2023	30/04/2024	8,049,549.13
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/11/2023	31/12/2026	2,012,387.28
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	30/06/2024	8,049,549.13

BENEFICIARIOS
NIT 800100514 - MUNICIPIO DE DAGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA, DE FECHA 01/11/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****18,111,485.54	$ **********95,823	$****15,000.00	$ *******21,056	$ **********131,879

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430294763

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A060BFB785C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302947637

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000063665 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	11	2023	16	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.686.385-9

DIRECCIÓN: CR 10 NO. 18 - 44 P 11 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2810966

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/11/2023	30/06/2024	8,049,549.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/11/2023	31/12/2026	2,012,387.30
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	30/06/2024	8,049,549.20

BENEFICIARIOS
NIT 800100514 - MUNICIPIO DE DAGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA, DE FECHA 01/11/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****18,111,485.70	$ **********10,409	$*********0.00	$ ********1,978	$ **********12,387

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430294763

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A050AFD7C59

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302947637

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000063665 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2024	22	03	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 900.686.385-9

DIRECCION: CR 10 NO. 18 - 44 P 11 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2810966

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE DAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.514-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/11/2023	08/08/2024	8,049,549.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/11/2023	08/02/2027	2,012,387.30
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2023	08/08/2024	8,049,549.20

BENEFICIARIOS
NIT 800100514 - MUNICIPIO DE DAGUA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA, DE FECHA 01/11/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430294763

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207B0F0CFB7D5C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 18 44 P 11 OF 1101

42. Correo electrónico financiera.cubiko@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 0 4 1 5 6 2	3 2 0 2 4 0 9 2 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 7 1 1	2 0 2 1 0 1 0 1	4 1 1 1	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 14 42 48 52 55

05- Impto renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 30 / 17 : 30: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANABRIA NIETO ADRIANA CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 2 6	2 0 1 6 0 2 1 3
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 5 1 0	2 0 1 6 0 2 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 2 2 1 2 8 3 8	0 2 2 1 2 8 3 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 1 2 2 6	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 8 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) **000001492367501 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 1 1 1 2 2 6	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 1 9 0 1 3 6 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	NIETO	ADRIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 1 1 1 2 2 6	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 3 8 7 9 4 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NIETO	CASTIBLANCO	LAURA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764058098504

(415)7707212489984(8020) 001876405809850 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900686385	9				

11. Razón social
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 10 18 44 P 11 OF 1101

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-10-17 / 02:40:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: SANABRIA NIETO ADRIANA CAROLINA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1019013695 — 1004. DV: 5
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

997. Fecha formalización: 2023-10-17 14:40:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058098504

(415)7707212489984(8020) 001876405809850 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900686385	9				

11. Razón social

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS CR 10 18 44 P 11 OF 1101	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CBK	201	401	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NIT: 900.686.385-9

CUBIKO S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.013.695 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado con Nit 900.686.385-9 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607 de 2012)*, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Bogotá D.C, a los diecinueve uno (19) días del mes de marzo de 2024.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C. 1.019.013.695 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

YUDY ALEXANDRA DÍAZ MORENO
CONTADOR PÚBLICO
TP 274876-T

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3203426278
MAIL: cubikoint@gmail.com

Alcaldia de Dagua
NIT.800100514-5
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2023

Número RP 50006

Copia No. 1

Fecha de Elaboración: 09/11/2023

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp. No.	Concepto	Codigo	Descripción	Valor
50006	Seccion	9		
	Rubro	2.3.2.01.01.001.03.02.1	Proyecto: Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas D	
	Fuente Recurso	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00	2.2.8.2.00 - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI	
	Sector	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0	NO APLICA	
	Programa	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0	No aplica	$ 40.247.745,65
	SubPrograma	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0	NA	
	Producto	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0	NA	
	Cpc	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0-0	NA	
	Politica	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0-0-0	NO APLICA	
			Valor Total	**$ 40.247.745,65**
			Total Ajustes	**$ 0,00**
			Total RP	**$ 40.247.745,65**

El presente **certificado se expide a solicitud de**Gerente de Planeacion

A favor de: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

CC/NIT: 900686385

Objeto: MINUTA DEL CONTRATO 2023746 DE INTERVENTORÍA. CLÁUSULA 2. OBJETO: El objeto del contrato es INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

Hernan Alonso Ramirez
Gerente **Administrativo y Financiero**

Ana Maria Sanclemente Jaramillo
Alcaldesa

Elaboró: Cristian Molina

Certificado
Bancario

Viernes, 29 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado(a) con NIT 900686385, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05318239501	2014/01/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.275.543
DIAZ MORALES

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRES
Yudy Diaz M

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

14-SEP-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00332575 F-1026275543-20110910 0027991869A 1 1371454459

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274876-T



UDY ALEXANDRA
IAZ MORALES
.C. 1026275543
ES. INSCRIPCION 1872 DEL 09/10/2020
ORPORACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

96163 310021

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0110

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0AED3650367B5152

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA DIAZ MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026275543 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 274876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Alcaldia de Dagua
NIT.800100514-5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA AÑO 2023

Número CDP 50006
Copia No. 1
Solicitud NO APLICA

Fecha de Elaboración: 01/09/2023 **Tipo cuenta:** Regalías

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos para la vigencia 2023 existe partida presupuestal disponible de libre afectación para amparar compromiso,de acuerdo con la(s) siguiente(s) imputacion(es):

Concepto	Codigo	Descripción	Proyecto	Valor
Seccion	9	Proyecto: Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas D	-	$ 40.247.745,65
Rubro	2.3.2.01.01.001.03.02.1	
Fuente Recurso	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00	2.2.8.2.00 - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL
Sector	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0	SEGUN NBI Y
Programa	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0	NO APLICA
SubPrograma	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0	No aplica
Producto	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0	NA
Cpc	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0-0	NA
Politica	2.3.2.01.01.001.03.02.1-2.2.8.2.00-0-0-0-0-0-0	NO APLICA
			Valor Total	$ 40.247.745,65
			Total Ajustes	$ 0,00
			Total CDP	$ 40.247.745,65

Objeto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA - BPIN 2023772330010 SECTOR TRANSPORTE

Hernan Alonso Ramirez
Gerente Administrativo y Financiero

Ana Maria Sanclemente Jaramillo
Alcaldesa

Elaboró: **Miguel Perdomo**

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

8672004

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHharamire	HERNAN ALONSO RAMIREZ HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-76233	MUNICIPIO DE DAGUA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-9:06 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	723	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-76233 MUNICIPIO DE DAGUA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	481.689.120,77	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	481.689.120,77	**Saldo x Comprometer:**	481.689.120,77

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	923	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**				**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-76233 MUNICIPIO DE DAGUA	00IL-2402-0600-2023-76233-0010 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA	Nación	IL76233	CSF	2023-09-05				
					Total:	481.689.120,77	0,00	481.689.120,77	481.689.120,77

Objeto:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA PROYECTO NO. 2023762330010

Firma Responsable

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

PREFACTURA DE VENTA

No. **CBK-108**

NIT. 900.686.385-9
Carrera 10 No.18-44 Oficina 1101
Bogota, D.C. (Cundinamarca)
Teléfono (1) 7041562 Fax (1) 7495933

FECHA: 21 de marzo de 2024
CIUDAD: Bogota, D.C.

RESOLUCION DE FACTURACION No. 18764032290471 Del 02-08-2025, NUMERACION AUTORIZADA DESDE No. 29 HASTA No. 200 prefijo CBK
Actividad Economica 7110 Desde el 12/26/2011 No Somos Grandes Contribuyentes

Entidad: MUNICIPIO DE DAGUA
NIT: 890000464
Direccion: CR 10 09 30
Teléfono: (602)760520

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTID	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	ACTA FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2023746 OBJETO "INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA" NOTA: Favor consignar en Bancolombia en la cuenta de ahorros No. 053-182395-01	1	$11.329.740,40	$9.520.790,25
			IVA 19%	$1.808.950,15
			TOTAL	$11.329.740,40

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CUATRO CENTAVOS

ORIGINAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. El cliente declara haber recibido los servicios arriba descritos y se compromete a pagar de acuerdo a las condiciones acordadas en este documento, o a pagar los intereses a la tasa máxima legal autorizada en caso de mora.

Firma Autorizada | Firma Cliente | FECHA

26/Dic/2023.

Inicio actividades. 07:00 am.

Clima. Nublado posibles lluvias

Personal: Residente de Interventoria.
Residente de obra.
1 oficial
1 Ayudante.

Se realizo
Sellado con solarin de material granular suelto, para no tener problemas de humedades en caso de lluvia.

Se realiza Visita por parte de la supervisión de la alcaldia el Señor Ingeniero: Milton Ospina.

Se realiza toma de densidades del material granular (Roca dura) Ingeomac.

Felipe Calderón
Interventoría

Residente obra

27/Dic/2023

Inicio Actividades. 07:00 am.

Clima: Soleado

Personal: Residente Interventoria
Residente de Obra.
1 Ayudante.

Se realizo.

sellado con Vibrocompactador XMR 303. XCMG

- Se realizo chequeo de niveles
- se realizo Serrado de material granular para llegar al nivel establecido en el diseño de la via.

Residente de Interventoria

Jonathan DG
Residente obra.

28/oic/2023.
Inicio actividades: 07:00
Clima Nublado posibles lluvias.
personal Residente de Interventoria.
Residente de obra
2 Ayudantes

Se realiza Compactacion Con Vibro Compactador XMR 303
Se realiza chequeo de niveles, y secado de material granular Roca Muerta para alcanzar los niveles establecidos en el diseño de la via. Se solicita tomar densidades.
Al dia de hoy la obra lleva un retraso de 78% se obtiene de lo cobrado $94'000.000 sobre el total de la obra $427000.000.
Se le indica al contratista elaborar un plan de contingencia, el cual ya inicio colocando en obra un cilindro vibro compactador XCMG el cual comienza a trabajar, para

darle una correcta compactación a la roca muerta y solicitar la toma de densidades nuevamente en un area mas representativa

Residente obra
Jonathon D C.

Felipe Calderón
Ing residente.

29/12/2023
La interventoría no autoriza ninguna actividad posterior hasta que no se tomen las muestras de densidades, y que cumplan con los requerimientos.

Se extiende Geotextil Tejido 2000 y se realiza la conformacion de la estructura de la via con material granular subbase se realiza compactacion con Vibro Compactador XP48303

Ing. residente
Felipe Calderón

Jonathon D
Residente obra

30/Oct/2023

- Inicio de actividades 08:00 am.

Clima: lluvioso

personal Residente de Interventoria
Residente de obra.
1 oficial
1 ayudante.

Se realiza trabajo en caja de alcantarillado domiciliaria para solucionar Falla en la via.
Ya que sale agua al momento de compactar la via con el Vibrocompactador.
Se debe ~~reparar~~ empernetar cajas domiciliarias de Red de alcantarillado para evitar posibles filtraciones.

Felipe Calderón
Ingeniero interventor

Jorge
Residente Obra

02/Enero/2024
Inicio de actividades 07:00 am
Clima: Soleado.
Personal. Residente Interventoria
Residente Obra.
Operario Vibrocompactador.
XMR 303
Operario Retrocargador
Turbo 416 B.

Se realiza toma de densidades en Via
2 dos de material granular Subbase.
Se realiza toma de densidades en Via
3 tres y cuarto 1/4 de material granular
Roca Muerta.
Personal de la Comunidad realiza Filtro frances
Artesanal para dar Solución a filtración de agua
que se mostro en la Via # 4 en el
momento de la compactación del material
granular roca muerta.
En la Via # 3 tres se deja bombeo del 2%
un solo sentido ya que la Via no cuenta

Con sumideros para la recolección y canalización de aguas lluvias.
Se recomienda por parte de la interventoria realizar obra de arte sobre el bordillo para evacuación de aguas lluvias.
Se recomienda por parte de la interventoria Colocar pendiente longitudinal del 2% sobre el tramo de la via 3 tes para evacuacion de aguas lluvias y conectar a sumideros existentes.

Jonathon
Residente de Obra

Felipe Calderon
Residente Inf.

03/Enero/2024

Inicio actividades 07:00 am.

Clima: Seco:

Personal: Residente Interventoria.
Residente Obra.
1 Oficial
1 Maestro.
1 Ayudante.

Se realiza reparación de estructura Vial en la Via Numero 24 norte donde se encontro fallo por filtración de agua de acometida domiciliaria
Se Compacto con Vibrocompactador XMR303
Se estendio Geotextil tejido 2100
Se estendio material granular Subbase y se Compacto con Vibrocompactador XMR303.
Según Solicitud enviada por Oficio a la parte de Interventoria, Solicitando el cambio de acero de 1/8 segun diseños y Remplazarlo por acero de 1/4 pero poder alcanzar en la Reparación y armado de los Canastillas que Sostienen los pasadores transmisores de Carga

19

que se instalan cada 30cm entre placas según diseños.


Ing. residente
Felipe Calderon
04/Enero/2024

Jonathan DC
Residente Obra

Inicio actividades 07:00am.
Clima: seco.
Personas: Residente Interventoria
Residente obra.
1 Oficial
1 maestro.
1 Ayudante.
1 operario Vibrocompactador

Se realiza cerrado y compactaron de material granular subbase en la vía #4
Se inicia excavacion en frente de

1.

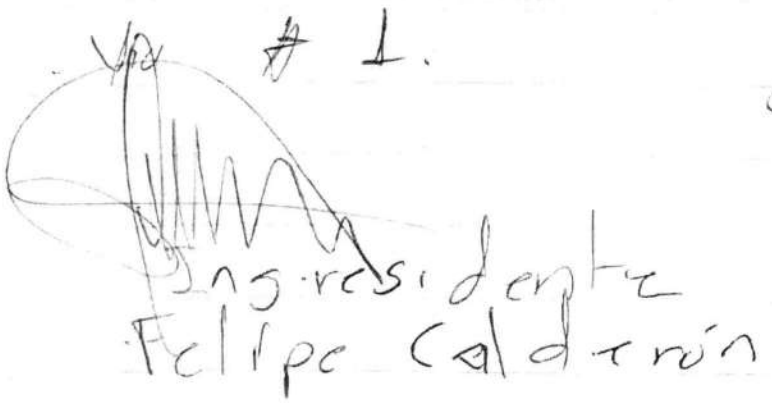

Ing. residente
Felipe Caldrón



05/Enero/2024
Clima Soleado
- Residente de interventoría
- Residente de obra
1 oficial
1 maestro
1 Ayudante
Operario de vibro compactadora
Operario de retroexcavadora.

Se presentó rotura de la tuberia de acueducto, la cual fue subsanada por el contratista, se sellaron las valvulas del suministro de agua

mientras se hacia la repa-
ración.
Se continua con la excavacion
en la viga N. 1.
Se presento daño en red de gas de
ambas redes las cuales prestan el servicio en
el municipio el cual se realizo la reparacion
por parte de cada una de las entidades
encargadas.
Asistencia de 1/4 471 unidades a 6 metros

Felipe calderón
Residente interventoria

padhon
Residente obra

06/ Enero /2024
Inicio actividades 07:00 am.
Clima: seco.
Personal Contratista Ing. Juan Carlos Sanchez
Residente Interventoria
Residente Obra.
Operario Retroexcavadora.
1 maestro
1 oficial
1 Ayudante.

Se realiza excavación con retroexcavadora en el tramo de la Via # 1 uno para realizar la conformación de la estructura Vial.
Se realiza retiro de material de excavación y material natural.
12:45 PM
Dia soleado se continua con la excavación

Residente Obra
Jonathan D.

09/Enero/2024.

Inicio Actividades 07:00 am

Clima Seco.

personal.

Residente Interventoria
Residente Obra.
Operario Retroexcavadora.
1 maestro
1 oficial.
3 ayudantes

Se realiza visita a la obra del ingeniero Daniel Arce por parte de la entidad Contratante.

Se realiza visita del operario de redes hidraulicas de la Empresa Acuavalle empresa encargada de prestar el servicio de agua potable Silvio Ramos Chito.

Se le pone en conocimiento la ubicación del tubo de agua potable.

y si le comunica y se le recomienda hacer el cambio de la tobera por el ondeo y dejarla por fuera de la

estructura de la vía.
Se comunicara de manera oficial a la entidad contratante el cual comunicara a la empresa encarga de hacer la reposición.
Se aplica Roca muerta para solucionar un posible fallo sobre la red de alcantarillado existente. Para mejoramiento de la subrasante.
Se realiza excavación con retro excavadora retroexcavadora para conformación de la estructura de la vía.
Se alista area para realizar el retiro de los remanos de alcantarillado.

Felipe Calderon
Ing. interventor

Pedro D.
Residente Obra.

10 - Enero - 2024

Residente Interventoria
Residente Obra

Operador Retroexcavadora.
1 maestro
1 maestro
1 oficial
3 Ayudantes

Continua con la excavación en la vía N. 1.
Llega las mezcladoras para fundir las losas de concreto
Se continua con la compactación en la vía N. 4
Se Compacta subrasante con Vibrocompactador XMR303.
Se realiza conformación de estructura Vial según planos .40cm de roca muerta según diseños
Se Compacta Roca Muerta 40cm con Vibrocompactador XMR303.
Se retiran los viajes de Material de excavación y Suelo natural.
Se Retira la Retroexcavadora.

Felipe Calderón
Ing. Residente int.

Jonathan D
Residente obra

10

11- Enero de 2024

Residente de Interventoría
Residente Obra
Operador Retro excavadora
1 maestro
1 oficial.
3 Ayudantes

Se continua con la excavación en la vía N. 1.
A las 12:30 pm la retro excavadora sufrio un daño, el cuál fue subsanado a la 3:30 y se continua con la excavación
Se continua con la compactación en la vía N. 4
Se comienza el armado de la formaleta para la fundición de las placas de concreto. 17 vigas de viga viga material de excavación y material 8 viajes retroexcavadora

Jonathan B.G.

Felipe Calderon
Ing resd. int.

12 Enero de 2024
Dia Soleado
Residente de obra, Inge. Int. Residente
Operador de retroexcavadora
Operador de cilindro vibro con pactador.
2 Maestros
1 Oficial
5 Ayudantes
Se continua con el sereo de rasa muerta en la via N.1 y compactación.
Se comienza a extender el concreto hidraulico en la via N.3, se ejercen control de la colocación, se exige la toma de cilindros para ensayos de resistencia.
Se le comunica al contratista la colocación de unas T en las entradas al barrio para tener un suministro diferente al

barrio si se efectua un arreglo. A petición de Residente de Interventoria se compran y se instalan dos tubos de 3" pulgadas en cada una de las intersecciones de la via para no dañar en pavimento en el momento de cambio de tuberia existente. Se suministran 3 Viajes roca muerta. 8 Viajes de retiro de material de excavación y material natural. Y 11 horas Retro excavadora

Residente Ing Felipe Calderón Jardim A.G.

Ing. Residente - Felipe Calderón Jardim A.G.
13 Enero de 2024
Dra soleado
Residente de obra
Operador de retroexcavadora
Operador de cilindro vibrocompactador
1 Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes
Residente de Interventoria
Se continuo con la excavación en la via N.1 para alcanzar los niveles de la estructura, se compacta la capa de roca muerta, se re-

paran fallos en la tubería de AN.
Se continua con la fundición del concreto en la via N.3 se fundieron 118.7M3 de concreto. MR 38

Ingres Int.
15 Enero de 2024
Dia soleado
Residente de Interventoria
Residente de obra
Operador de retroexcavadora
Operador de Vibrocompactador
1 maestro
2 Oficiales
5 Ayudantes
Se reconforma la via N.4 para la colocacion de subbase Tipo INVIAS

Se comienza la fundición de la placa de concreto en la vía N.2.
Se toman densidades de la roca muerta en la vía N.1.
Se instala geotextil tejido sobre la vía #1 y se instala material granular subbase según diseño de planos & viajes de material de subbase



Ingresidente Int
Felipe Calderón



Residente obra
Jonathan O G

16-Enero de 2024
Dia soleado
Residente de interventoría
Residente obra
Operador retroexcavadora
Operador vibrocompactador
1 maestro

1 oficial
8 Ayudantes.
Se continua la excavación en la vía N. 1, se compacta la subbase tipo invia en la via N. 1.
Se continua con la fundición de la placa de concreto en la via N. 2 y N. 3.
Como se había hablado con el personal de Interventoría personal de acuavalle y el representante de la entidad Calcalolal se instala taberio de presión en las intersecciones de la via para garantizar la red de agua potable en tiempo futuro. Se realizan reparaciones en tuberías de gas. Se instalan 5 Vigas de subbase en el tramo de la Via

Ing residente
interventoría

Residente obra

17 de Enero de 2024
Dia soleado
Residente de interventoría
Residente de obra

Operador de retroexcavadora
Operador vibrocompactador
1 maestro
1 oficial
8 Ayudantes

Se encuentra en la obra el topografo para rectificar los niveles de excavación y corroborarlos con los espesores de diseño de la estructra de pavimento.
Se continua con la perfilación de de la via N.1 y compactación
Se continua con la fundición de la placa de concreto para alcanzar a fundir 100 ml * 4.60 = 460 M² placa de concreto
MR

CONTRATO No 2023746

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT o C.C.:	900.686.385-9
OBJETO:	INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($40.247.745,65)
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($40.247.745,65)
DURACIÓN:	DOS (02) MESES CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACION 01:	TREINTA Y NUEVE (39) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	08 DE FEBRERO DE 2024

En el municipio de Dagua, el día 08 de febrero de 2024, se reunieron el ingeniero FRANCISCO CALVACHE como supervisor y la arquitecta ADRIANA CAROLINA SANABRIA como representante legal de la firma interventora CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S, con el fin de suscribir esta acta de recibo de obra entre las partes a satisfacción.

A esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos exigidos en el pliego de condiciones y en el contrato, para el recibo del mismo, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar por recibido al contrato de la referencia.

Para constancia, se firma la presente acta a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2024 por quienes en ella intervinieron:

FRANCISCO CAYACHE
Supervisor

ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Contratista Interventor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág.
		CÓDIGO:
	INFORME FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERSION
		TRD. 4.5.01.18

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DEL CONTRATO N° 2023746

Fecha de presentación (27-**mayo-2024**) Período del informe: Desde (11-01-2024) Hasta (09-02-2024)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS NIT: 900.686.385-9

NOMBRE SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ **CC: 6.248.473 de DAGUA (V)**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2023746

OBJETO:
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

PLAZO: HASTA EL 9 DE FEBRERO DE 2024 **VALOR CONTRATO; ($40.272.745,65) M/CTE**

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN**:09 **DE FEBRERO DEL 2024**

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL: 50006 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
RUBRO FINANCIACION: 2.1.3.2.01.01.001.03.02.1
FUENTE: 2.2.8.2.00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 50006 DEL 9/11/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo: X Fecha de la Prórroga: 31/12/2023.

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $
Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soporte detallado de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios	La interventoría desarrollo las siguientes actividades en el periodo de tiempo del presente informe. 1. Revisión de procesos constructivos. 2. Revisión y aprobación de acta final 3. Revisión y aprobación de acta entrega y recibo 4. Revisión de ensayos de calidad de la estructura del pavimento. 5. Revisión de planillas de seguridad social del contratista. 6. Entrega de informes semanales correspondientes al segundo mes. 7. Entrega de informe final.	Se anexan: • Acta final de interventoria. • Informes semanales • Informe mensual. • Acta de recibo

prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados
con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas,

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2023746 de 2023

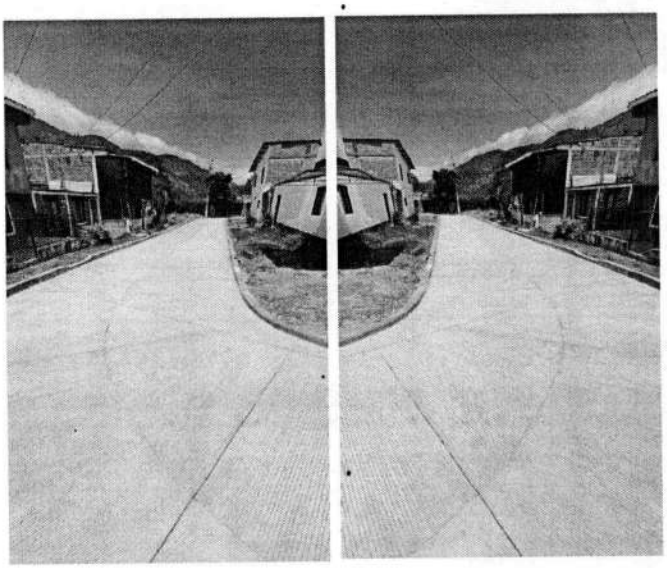

- Acta de liquidacion

sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.		

AUTORIZACION DE PAGO

Por su parte en el Municipio de Dagua, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2024, el Señor FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ identificado con **C.C. 6.248.473** DE DAGUA, como supervisor del contrato No 2023746 a nombre de, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **pago final**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE DAGUA	Pág.
		CÓDIGO:
	INFORME FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	VERSION
		TRD. 4.5.01.18

FORMA DE PAGO PACTADA

"El Municipio de Dagua pagará actas parciales por avance de obra, cada una que será cancelada al contratista previa presentación de un informe desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, comprobante de pago de los aportes relativos al Sistema General Integral de Seguridad Social de cada mes

Valor contrato	$ 40.247.745,65
Pagos realizados	$ 28. 918.005,25
Pago a realizar	$ 11.329.740,4
Saldo a pagar	$ 0,00

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El Gerente de Planeación y proyectos de inversión del Municipio de Dagua certifica que en contrato **2023746** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Resolución de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacén	NA
Cuenta de Cobro	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista, **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS** declara que: SI ___ /NO X__ es responsable de iva.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ **CC:6.248.473 de Dagua** **Supervisor contrato** **Secretario de Infraestructura**	**ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA** **Contratista** **Contrato 2023746** **Pago final**

Nestor David Arce
Paz civil apoyo a supervisio.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S	Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoobras@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	19/02/2024	75763173	$3.890.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	173.100	0		0		0	0	0	0	173.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	93.500	0		0		0	0	0	0	93.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	712.400	0	0	0	0	0	0		712.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.093.400	0	0	0	0	0	0		1.093.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	876.200				876.200	0	0	876.200			8.762	876.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	497.200	0	0	497.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	503.600	503.600
Pensión	3	2.013.800	2.013.800
Riesgos Laborales	1	876.200	876.200
CCF	1	497.200	497.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.890.800	3.890.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	cubikoltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DAGUA	DAGUA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	19/02/2024	75783173	$3.890.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDL	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003806956	CASTELLANOS SANTOS MARIA CAMILA	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF56	1.140.000	45.600	0	0	0	0	0
2	CC	1067876820	BUILES RODRIGUEZ DAVID ENRIQUE	1	0			S																230301	1.425.000	228.000	0	0	0	0	EPS041	1.425.000	57.000	14-23	1.425.000	5	99.200	CCF56	1.425.000	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1074417229	MEDINA PEÑA YICELA YASMIN	1	0			S																230301	3.027.500	484.400	0	0	0	0	EPS005	3.027.500	121.100	14-23	3.027.500	5	210.800	CCF56	3.027.500	121.100	0	0	0	0	0
4	CC	19472865	CALDERON HERRERA FELIPE ALFONSO	1	0			S																25-14	4.498.000	719.700	0	0	0	0	EPS002	4.498.000	180.000	14-23	4.498.000	5	313.100	CCF56	4.498.000	180.000	0	0	0	0	0
5	CC	79433953	CONTRERAS ROJAS MARCO ANTONIO	1	0			S																25-14	2.335.500	373.700	0	0	0	0	EPS008	2.335.500	93.500	14-23	2.335.500	5	162.600	CCF56	2.335.500	93.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
