

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
16		**TRAMO 3. LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AURORA BAJA A LA VEREDA MÁRQUEZ EN EL SECTOR LOS ALPES. CONV. No. ICCU 925-2022 -SUB TRAMOS 2 Y 1**	**62 días**	**mar 30/01/24**
17		ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO- TRAMO 3 SUBTRAMOS CONFORMACION BANCA- SUB -TRAMO 2 Y 1	5 días	mar 30/01/24
18		RECIBO SUB TRAMO 2 Y 1 VEREDA MARQUEZ	1 día	lun 5/02/24
19		REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOG	3 días	lun 5/02/24
20		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	14 días	jue 8/02/24
21		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	28 días	sáb 10/02/24
22		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	28 días	sáb 10/02/24
23		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	28 días	mar 20/02/24
24		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	28 días	mar 27/02/24
25		CURADO Y MADURACION CONC	28 días	lun 4/03/24

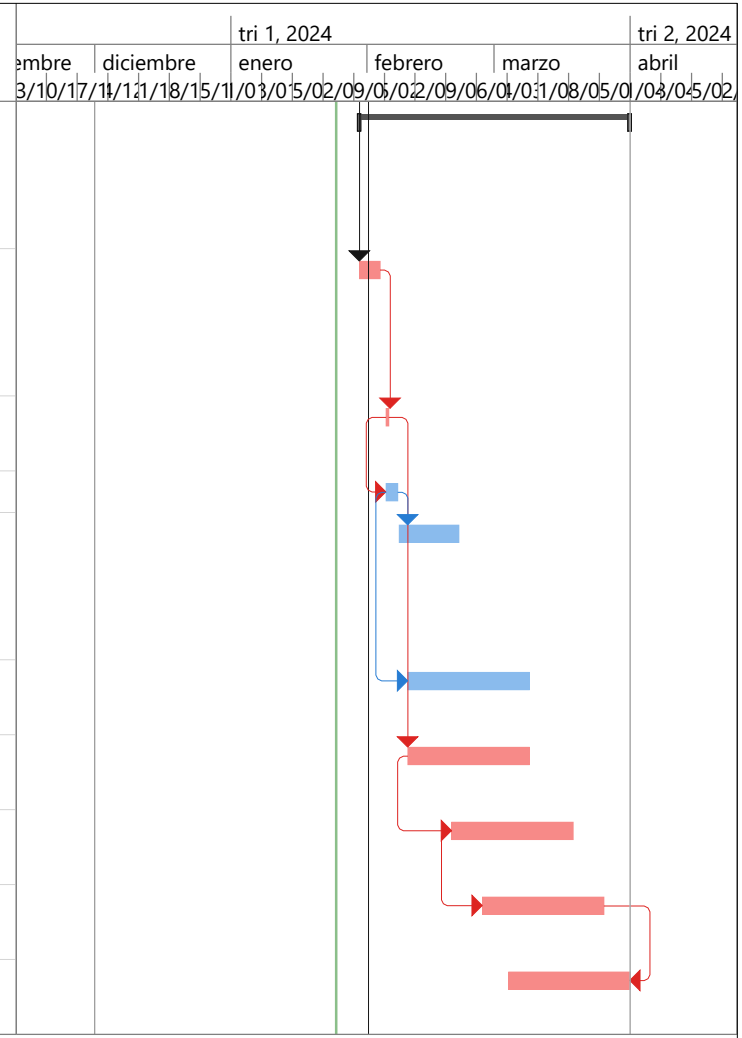

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: jue 25/01/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
26		**TRAMO 2. VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MÁRQUEZ A LA VEREDA AURORA BAJA SECTOR LOS AYALA. CONV. No. ICCU 920-2022**	**60 días**	**jue 1/02/24**
27		ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO- TRAMO 3 SUBTRAMOS CONFORMACION BANCA	5 días	jue 1/02/24
28		RECIBO TRAMO 2 VEREDA MARQUEZ	1 día	mié 7/02/24
29		REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOG	4 días	mié 7/02/24
30		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	28 días	sáb 10/02/24
31		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	40 días	mié 7/02/24
32		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	40 días	mié 7/02/24
33		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	40 días	mié 14/02/24
34		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	40 días	mié 14/02/24
35		CURADO Y MADURACION CONC	21 días	lun 11/03/24
36		**TRAMO 1. VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TRIUNFO AL CASCO URBANO SECTOR CALIXTO. CONV. No. ICCU 914-2022**	**52 días**	**vie 9/02/24**

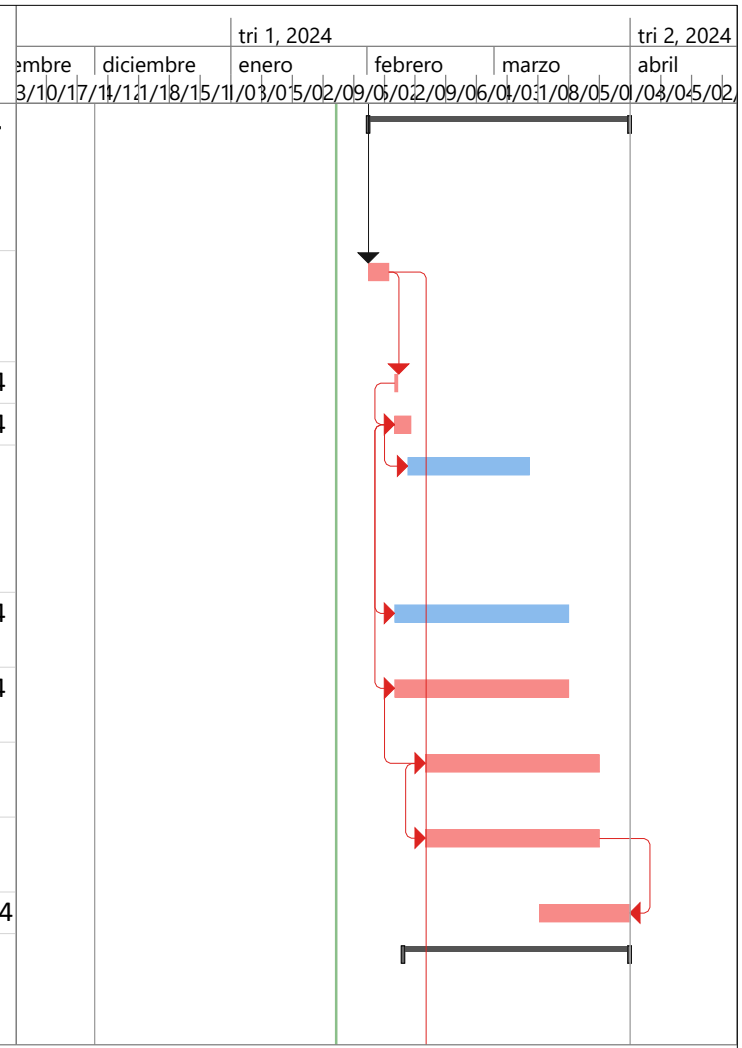

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: jue 25/01/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
37		SOCIALIZACION	1 día	vie 9/02/24
38		ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO- TRAMO 3 SUBTRAMOS CONFORMACION BANCA	5 días	vie 9/02/24
39		RECIBO TRAMO 1 VEREDA TRIUNFO	1 día	mié 14/02/24
40		REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOG	4 días	mié 14/02/24
41		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	28 días	dom 18/02/24
42		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	35 días	mié 21/02/24
43		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	35 días	sáb 24/02/24
44		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	35 días	dom 25/02/24
45		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	35 días	lun 26/02/24
46		CURADO Y MADURACION CONC	1 día	dom 31/03/2
47		**RECIBO FINAL**	0 días	dom 31/03/2

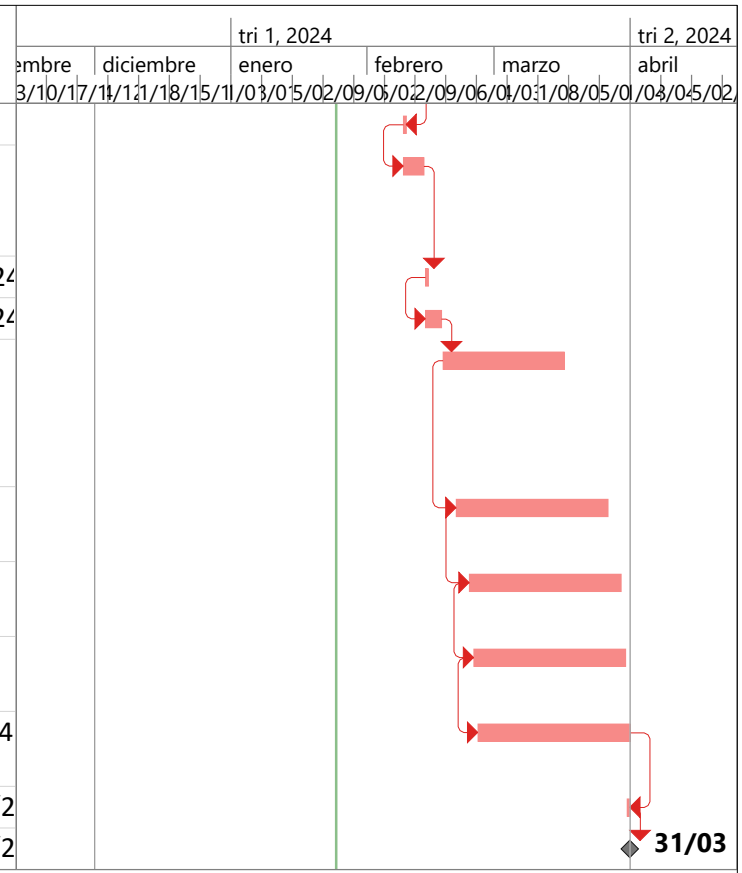

Proyecto: PROGRAMACION LA
Fecha: jue 25/01/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

CONSORCIO CANO

ANEXO 5.
ACTAS DE COMITÉ

La Calera, 20 de febrero de 2024

Siendo las 3:10 p.m se reunen en la via los vecinos de el sector denominado la fortaleza, el contratista de obra Andres Linares y el secretario de obras del municipio Diego Peralta Corredor, para llegar a acuerdos para el transito libre en los arreglos de la via que de la vereda la Aurora conduce a la vereda Márquez, llegando a los siguientes acuerdos:

① Conversar con el Sr. Laureano Arevalo para saber si autoriza el paso por su finca, cubriendo la comunidad el gasto

② Si hay una urgencia vital habra paso sin ningun inconveniente.

③ Redactar un comunicado para dar la orden de dejar pasar, el cual firmara el contratista y secretario de obras. la emergencia vital

④ Informar a el secretario de obras sobre la ejecucion de esta (cantidad de personas materiales, entre otras) vereda ciudadana

⑤ Se programa el cierre total de la via el dia lunes 26 de febrero cion de 1 mes calendario, prorrogable

dll. Pilar Arialdo 60309604

Camila Velosa A 1026574767

1098356088

35.665.660

1907925?

1074159483

ACTA No 003 **FECHA:** 23-Feb-24

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO, PLANES O PROGRAMAS

Nombre del Proyecto, Plan, o Programa **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Responsable: **DIEGO PERALTA CORREDOR**

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. **475 DE 2023** Supervisor: **SOP**

Objeto: **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023".**

1. OBJETIVO

Comite de obra - Verificación avance de obra solicitudes y/o recomendaciones.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Balance de mayores y menores → Se encuentra en revision y ajustes por parte del contratista

Actividades adicionales (Propuesta) → En proceso

4. TEMAS TRATADOS

- Incluir mas personal en obra, se evidencia que la ejecucion de 93 MI tramo aprox 1 mes; por lo que se estima que para la construccion de los tramos restantes se debe incluir el doble del personal que se maneja (10 Personas) con el fin de que se logren los tiempos establecidos.
- Se solicita especial atención en el diseño de la mezcla en obra y realizarlo de acuerdo al diseño de mezcla enviado por el laboratorio Tecnisuelos, ya que teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el mismo laboratorio el dia 22 de feb, la dosificacion pedo que este fuera de los parametros que se requieren para garantizar la resistencia del concreto. Se recomienda realizar la prueba de slump para medir el asentamiento del concreto.
Se solicita tener medidas para el continuo uso de los EPP's en obra

5. DECISIONES TOMADAS.

- Cierre total del tramo N.2. el dia lunes para implementacion de nuevas cuadrillas.
- El dia de hoy se va a realizar la instalacion de las vallas.
- Instalacion de senalizacion de cierre el dia de hoy.

6. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMROMISO
Inicio tramo No 2	Contratista	26/Feb/24	
Señalización	Contratista	23/Feb/24	
Uniformes para personal en obra	Contratista	27/Feb/24	
Balance de obra y propuesta	Contratista	23/Feb/24	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitres (23) del mes de Febrero del año 2024.

Programación próxima reunión: 01-03-24

7. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Angie Vanessa Cubillos
Cargo: R Interventoría

Firma: _____
Nombre: MA. ASTRID VARGAS
Cargo: ~~RTA~~ DIR. OBRA INGEARTCIVIL SAS

Firma: _____
Nombre: Carlos H Moreno
Cargo: R. Obra

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-01
ALCALDÍA DE LA CALERA	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS PÚBLICAS	Versión	4
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Fecha	10/01/2024
	ACTA DE REUNIONES	Página	1

ACTA No.	02.

PROCESO / PROYECTO	CTO 475-2023	TEMA	Socializacion Convenio 914

FECHA	01 marzo	HORA INICIO	11:12	HORA FIN	12:20.

I. OBJETIVO

Informar a la comunidad del cierre total de la via por ejecucion de obras

II. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
* Planilla asistencia		

III. ORDEN DEL DÍA

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reunieron la comunidad, secretario de obras, contratista e interventoria, se le indica a la comunidad que para el desarrollo de la obra se debe cerrar la via completamente. Se informa que una vez el municipio realice la debida confirmación el contratista procedera a iniciar actividades propias de la ejecución de la obra lo cual le tomara cerca de 75 dias.

Se reflejan opiniones divididas por parte de la comunidad donde indican que hay sitios mas importantes donde se pueda realizar el proyecto, otros refieren que se pueda cerrar la via parcialmente ejecutando la mitad de la Placa huella primero, sin obstaculizar el paso ni tener un cierre total, a lo cual se indica que constructivamente esto no es viable y si se hiciera así el trabajo perdera la garantia y el contratista no estaria dispuesto a responder por situaciones venideras en ley que si así se hiciera la obra presentaria fallas.

Siendo las 12:20 se da por terminada socialización

V. COMPROMISOS PACTADOS DE LA REUNIÓN

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Conformación vía	Municipio	11-15 marzo			
Ejecutar en 75 días	Ingeniería				tras la conformación

VI. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

	CRITERIOS A EVALUAR	SI	NO
1.	LA REUNIÓN COMENZO A LA HORA PROGRAMADA		X
2.	SE CUMPLIO CON EL ORDEN DEL DIA	X	
3.	SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS	–	–
4.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION	X	
5.	LA REUNIÓN TERMINO A LA HORA PROGRAMADA	X	

Elaboro:
Reviso:
Autorizo:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-03
		Versión	01
		Fecha	08/11/2018
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	OFICINA DE INTERVENTORÍA	S.G.C	
	Planilla Asistencia Externa		

Conferencista	Sec Obras - contratista obra e interventoria	Hora inicio	11:12	Hora fin		Fecha	09	08	24
Tema	Socializacion convenio 914 - 2022	Área							

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Teléfono	Edad	Genero	Rural / Urbano	Población (Discapacidad, Víctimas, LGBT, otro.)	Correo Electrónico	Firma
1	Victor Bautista	191=2723	3228536921		M	R			
2	Olga Sofia Rozo	52418457	3138853843	47	F	R.		OlvRozo	OlvRozo.
3	Guillermo Hernandez	11231868	3142040185	50	M.	R.			
4	Jesus Garzon	3134726370	321[illegible]32	52	M	R		gjuancarlos@hotmail.com	
5	Abso Espinosa	17 16f 964	3203726130/80		M.	R			Alejandro
6	Gabriel Herrera	11.231.186	3118375265	54	M	R		gabrielherrera@hotmail.com	Gabriel H.
7	Calixto Arrollo	2942[illegible]	3124255539	88	M	R			Calixto Arr
8	Mónica Ovalle	35.220.190	3006440007	42	F	R		monicaovalle@gmail.com	Mónica A Ovalle
9	Camilo Rincon Forero	1122330224	3132597178	43	M	R			Camilo Rincon Forero
10	Rodolfo Martinez	11232100	3134180943		M	R		rodolfo14752@gmail.com	
11	Carlos Alberto Monroy INGEARQ SAS	7931943[illegible]	3108544334	54	M	R.		ingenieros@gmail.com	
12	Rubén Venegas	10777[illegible]	3[illegible]	37	M	R			
13	Paola Romero H.	1010205320	3112392[illegible]	31	F	R		Paola.Romero@gmail.com	Paola Romero H.
14	Martha Escobar	20[illegible]	31[illegible]		F	R			

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-03
		Versión	01
		Fecha	08/11/2018
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	OFICINA DE INTERVENTORÍA	S.G.C	
	Planilla Asistencia Externa		

Conferencista		Hora inicio		Hora fin		Fecha	D	M	A
Tema		Área							

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Teléfono	Edad	Genero	Rural / Urbano	Población (Discapacidad, Víctimas, LGBT, otro.)	Correo Electrónico	Firma
	Ismael Venegas P.	11230689	3114583294	57	M.	R			
	Manuel Venegas	11231791	3112326651	52	M	R			Manuel Venegas
	Claudia Peña.	1071167736	3138723586	29	F	R			
	Federico Andrew	79144695	3142818094	64	M	R		fandrew2002@yahoo.es	
	Jaime Rojas	79232105	3216176	64	M	R		jaimerojas1964	
	Jair R	11 2 2 5 5		42					
	Edgar H Collantes	11230605	3213057						
	Angie Vanessa Ciballos	1071170595	31852415	26	F			vanessaciballos60@gmail.com	
	Carol Garzón León	1003838231	3214579661	22	F			karol.garzon@hotmail.com	Carol Garzón
0	Carlos A. Sierra M.	11'349088	3103400430	50	M			sierracarlos1978@gmail.com	
1									
2									
3									
4									

Powered by CamScanner

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-09
		Versión	01
		Fecha	08/11/2018
	INSFRASTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS	Página 1 de 3	
	OBRAS PUBLICAS	S.G.C	
	ACTA DE SEGUIMIENTO		

ACTA No 005 **FECHA:** 08 marzo 24

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO, PLANES O PROGRAMAS

Nombre del Proyecto, Plan, o Programa **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Responsable: **DIEGO PERALTA CORREDOR**

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. **475 DE 2023** Supervisor: **SOP**

Objeto: **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023".**

1. OBJETIVO

Comite de obra - Desarrollo del contrato

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se realizo la entrega de los balances de obra y asi mismo se remitieron a supervision

4. TEMAS TRATADOS

- Se realiza recorrido de obra en conjunto con la supervision del contrato se menciona el tema de las afectaciones causadas por las lluvias que arrastraron el material en los tramos 2, 1 del convenio 925
- El municipio va a evaluar la disponibilidad de maquinaria para reconformacion.
- La interventoria enviará un oficio al municipio con el concepto técnico emitido por el contratista soportando la colocacion de piedra para conformación de sobreespesores
- El contratista presentará la propuesta técnica para conformacion de los sobreanchos de los tramos teniendo en cuenta el saldo remanente de cada convenio, teniendo en cuenta la necesidad/urgencia en cada tramo.

5. DECISIONES TOMADAS.

El municipio solicita se realicen las adecuaciones que se requieren a la placa (dentellon) para encausar las aguas en la canaleta y se requiere se suministre el esquema de como se realizaria la adecuacion.

- Se solicita por el supervisor marcar los dilataciones

6. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMROMISO
Evaluar reconformacion por parte del municipio	SOP	08-marzo-24	
concepto tecnico	contratista/ interventoria	11-marzo-24	
Entrega balance saldos reevaluacion	contratista/ interventoria	13-marzo-24	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los ocho (8) del mes de marzo del año 2024.

Programación próxima reunión: _____

7. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: José M. Pinzón
Cargo: Supervisor SOP

Firma: _____
Nombre: Carlos Andres R.
Cargo: Director interventoria

Firma: _____
Nombre: Carlos A Pinzon G.
Cargo: R. Obra. Ingecat cv sas

Firma: Carol Garzón
Nombre: Carol Garzón
Cargo: R. Auxiliar Ingecat Cv SAS

Firma: _____
Nombre: Angie Vanessa Ceballos
Cargo: R. Interventoria

Firma: _____
Nombre: MA. ASCELID ARAGON
Cargo: D/L. OBRA.

ACTA No 06 **FECHA:** 15/03/24

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO, PLANES O PROGRAMAS

Nombre del Proyecto, Plan, o Programa Mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria del departamento de Cundinamarca

Responsable: **DIEGO PERALTA CORREDOR**

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 475-2023 Supervisor: **SOP**

Objeto: Contratar la construcción de placa huella en las veredas del tirunto, marquez y aurora baja del municipio de La Calera - Cundinamarca en el marco de los convenios del ICCU No 914, 920 y 925 de 2022 según plan de acción 2023.

1. OBJETIVO

Comité de obra - estado de avance del contrato.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

4. TEMAS TRATADOS

- Se comentan observaciones generadas por la comunidad a cerca del disipador que se incluira dentro de las obras para la correcta conducción de aguas en las cunetas de la placa huella.

- Se indica que la motoniveladora se acercara a la reconformación de los tramos 1 y 2 el martes 19 de marzo a realizar los trabajos necesarios

- Estado del acta de cobro de los contratistas; estado del contrato y convenio para la ejecución de actividades pendientes, balance del cto.

- Claridad del informe de concepto técnico necesario de acuerdo con las actividades que se realizaran donde se incluira material petreo dentro de las placas y se

→ Apertura de los tramos 3 y 4 programados para el 29 de marzo.

→ Remitir diseño del disipador para que se pueda

→ opciones de como balancear el contrato

5. DECISIONES TOMADAS.

6. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMROMISO
Reconformación tramo 142 anuelno 925.	SOP	19 de marzo.	19 de marzo
Estado cuenta de cobro contratista de obra	SOP	15 de marzo.	15 de marzo.
Oficio información cambio cuneta	Contratistas	22 de marzo	22 de marzo
Balance.	Contratistas.	22 de marzo.	22 de marzo.
Encamisar tuberia	contratista obra.	22 de marzo	22 de marzo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, al quince (15) del mes de marzo del año 2024.

Programación próxima reunión: _____

7. PARTICIPANTES

Firma: María Paula González
Nombre: María Paula González,
Cargo: Apoyo a la supervisión

Firma:
Nombre: José M. Pinzón A.
Cargo: Asesor SOP

Firma: Carol Gonzón
Nombre: Carol Gonzón
Cargo: R. Auxiliar.

Firma: Caico Arroyo
Nombre:
Cargo: Dirección Interventoría.

Firma:
Nombre: MA. ASTRID CARREÑO
Cargo: D/R. OBRA con U.T.S-2023

Firma: Chaza Capacho
Nombre: YULIANA CAPACHO
Cargo: SST.

Firma:
Nombre: Carlos A Monzón C.
Cargo: R. Obra Ingeocal CUSAS

Firma:
Nombre: Angie Vanessa Cubillos
Cargo: R Interventoría

CONSORCIO CANO

ANEXO 6.

COMUNICACIONES

CONSORCIO CANO

Bogotá, Febrero 22 de 2024

INGEART CV SAS
La ciudad

Ref: Contrato de obra pública Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: REPROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el pasado 19 de febrero se culminó la conformación y posterior entrega de los subtramos 1 y 2 del Tramo No. 3 – Convenio 925 y Tramo No. 2 – Convenio 920. Nos permitimos solicitar de manera atenta se realice entrega de la reprogramación del cronograma de obra teniendo en cuenta la fecha de entrega de los tramos mencionados y dentro de los términos contractuales; es de mencionar que de acuerdo con lo mencionado por la entidad contratante en el comité de obra se tiene como fecha prevista de conformación del tramo No.1 – Convenio 914 el próximo 29 de febrero de 2024.

Adicional a lo anteriormente expuesto, se reitera al contratista de obra el cumplimiento de la clausula **10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** en el numeral 69 *“…La persona que efectúe las labores deberá portar la vestimenta adecuada y cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demás que considere el interventor y/o supervisor importantes, que se rijan de acuerdo a las normas de seguridad industrial; es decir garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes…”*; lo anterior debido a se ha evidenciado que el personal carece de algún tipo de identificación que lo asocie a la intervención, además de no cumplir continuamente con el uso de EPP`s acordes a las actividades desarrolladas.

Civilesun@gmail.com
Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

Finalmente, se solicita nuevamente se realice la instalación de las vallas informativas (una para cada convenio) en un sitio visibles para toda la comunidad, acorde al compromiso adquirido en el comité de obra desarrollado el 19 de febrero de 2024.

Saludos,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24

Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 26 de febrero de 2024

PR-061-009-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Remisión reprogramación de obra y solicitud de prorroga contrato de obra No. 475 de 2023.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, me permito remitir la comunicación INGEART-011-2024 realizada por el contratista de obra; con referencia a la entrega del cronograma de obra actualizado, acorde a los tiempos de conformación y entrega de los tramos, manejados por la administración municipal. Adicionalmente, la empresa INGEART en calidad de contratista de obra se permite realizar la solicitud de prorroga al contrato de obra por un lapso de veinte (20) días calendario, tiempo que considera necesario para la culminación a satisfacción del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, remitimos la solicitud mencionada con el objetivo de que sea evaluada por la supervisión del contrato acorde a los tiempos manejados y los requerimientos del municipio.

Cordialmente,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

CONSORCIO CANO

La Calera, Febrero 27 de 2024

PR-061-010-2024

INGEART CV SAS
La ciudad

Ref: Contrato de obra pública Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: SOLICITUD DE PERSONAL EN OBRA Y REITERACIÓN INSTALACIÒN VALLAS.

Cordial saludo

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia me permito solicitar se incluya de manera pronta personal operativo en obra, ya que se evidenció por parte de la interventoría que la ejecución del subtramo S-3 y subtramo S-4 del tramo Nro. 3 tomó aproximadamente un mes; dicho esto y teniendo en cuenta el rendimiento manejado, se estima que para la construcción de los tramos restantes se debe incluir el doble de personal que maneja en este momento la obra (10 personas) con el fin de que se logren los tiempos establecidos.

Adicional a lo anteriormente expuesto, se reitera la solicitud realizada el pasado 22 de febrero de 2024 al contratista de obra acerca del cumplimiento de la clausula **10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** en el numeral 69 *“…La persona que efectúe las labores deberá portar la vestimenta adecuada y cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demás que considere el interventor y/o supervisor importantes, que se rijan de acuerdo a las normas de seguridad industrial; es decir garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes…”*; lo anterior debido a se ha evidenciado que el personal carece de algún tipo de identificación que lo asocie a la intervención, además de no cumplir continuamente con el uso de EPP`s acordes a las actividades desarrolladas.

Finalmente, se solicita nuevamente se realice la instalación de las vallas informativas (una para cada convenio) en un sitio visibles para toda la comunidad, acorde al compromiso

adquirido en el comité de obra desarrollado el 19 de febrero de 2024 y lo solicitado mediante oficio el día 22 de febrero de 2024.

Saludos,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, Febrero 29 de 2024

PR-061-012-2024

INGEART CV SAS
La ciudad

Ref: Contrato de obra pública Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: BALANCE DE OBRA CON MAYORES ESPESORES Y PRESUPUESTO RELLENOS LATERALES Y CONFORMACIÓN ACCESOS.

Cordial saludo

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia me permito solicitar se remita a esta interventoría los respectivos soportes técnicos a considerar que sustenten las cantidades relacionadas en las memorias del “Balance de obra con mayores espesores” y “Presupuesto rellenos laterales y conformación accesos” entregados a esta interventoría el pasado 26 de febrero y de los cuales no se ha podido realizar la verificación técnica a fondo con respecto al origen de las cantidades descritas.

Dicho esto, solicitamos se allegue la cartera y planos topográficos levantados en campo en donde se pueda evidenciar de manera clara y precisa los aspectos mencionados en el correo enviado; adicional en el caso del presupuesto de los rellenos laterales se requiere el plano que soporte la respectiva propuesta en donde se pueda evidenciar de manera clara las cantidades que se requieren para su ejecución.

Saludos,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 05 de marzo de 2024

PR-061-013-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Entrega balance general de obra.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, y de acuerdo con los compromisos adquiridos con la supervisión me permito remitir el balance de obra general entregado por la empresa INGEART en calidad de contratista de obra, acorde a las actividades contratadas.

Es de mencionar que el balance y memorias entregadas han sido revisadas y avaladas por esta interventoría, por lo que lo remitimos a la supervisión para su respectivo análisis y aprobación.

Cordialmente,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

CONSORCIO CANO

La Calera, 05 de marzo de 2024

PR-061-014-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra pública Nro.475 de 2023 "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023"

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de obra No. 475 de 2023.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, me permito remitir la solicitud de **PRORROGA** realizada por el contratista INGEART, por un plazo de **veintiocho (28) días** calendario, soportada en las demoras en los tiempos de entrega de los tramos por parte del municipio, adicional menciona las situaciones presentadas en los Tramos 1 y 2 del convenio 925 con respecto a las fuertes lluvias del pasado 03 de marzo que afectaron la conformación de los tramos realizada por el municipio.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y considerando que este tipo de circunstancias no dependen netamente del contratista y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y a las actividades estipuladas dentro del contrato de obra No. 475 de 2023 esta interventoría da la **APROBACIÓN** de los veintiocho (28) días calendario, en donde la nueva fecha de terminación del contrato correspondería al 28 de abril de 2024.

Cordialmente,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 05 de marzo de 2024

PR-061-015-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Solicitud de prorroga contrato de interventoría No. 476 de 2023.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, y teniendo en cuenta que es necesaria la prórroga al contrato de obra solicitada mediante la comunicación PR-061-014-2024, en donde se realiza la aprobación de prórroga por un plazo de veintiocho (28) días calendario al contrato de obra Nro. 475 de 2023 con base en las demoras en los tiempos de entrega de los tramos por parte del municipio y las afectaciones a causa de las lluvias en los Tramos 1 y 2 del convenio 925; solicitamos muy respetuosamente se realice la **PRORROGA al contrato de interventoría** No. 476 de 2024 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES : CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”, en el mismo plazo que el contrato de obra, es decir **veintiocho (28) días** y de esta forma realizar el seguimiento y control de las actividades que se encuentran por ejecutar y dar estricto cumplimiento al objeto contractual.

Cordialmente,



CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24

Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 06 de marzo de 2024

PR-061-016-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Remisión balance de obra, solicitud de adición y prórroga contrato de obra Nro. 475 de 2023.

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, me permito remitir la comunicación realizada por la empresa INGEART cv s.a.s. en su calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 475 de 2023 emitida mediante oficio INGEART-015-2024, con referencia a la “Solicitud de adición en valor y tiempo” para la ejecución de los rellenos laterales de las placas con el objetivo de confinar adecuadamente la cuneta natural existente y la cuneta de la placa huella construida a razón de proteger la calidad del proyecto en ejecución. Teniendo en cuenta esto, el contratista solicita una adición al contrato de obra por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($95.281.801) y una prórroga por un lapso de TREINTA (30) DÌAS calendario para la ejecución de las actividades propuestas.

Lo anterior, en base a la solicitud realizada por la supervisión en el comité de obra desarrollado el 19 de febrero de 2024, por lo que remitimos la solicitud mencionada con el objetivo de que sea evaluada por la supervisión del contrato acorde a los tiempos manejados y los requerimientos del municipio.

Cordialmente,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 12 de marzo de 2024

PR-061-017-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Solicitud de adecuación subtramos 2 y 1 del tramo No. 3 – Convenio 925 y conformación tramo No. 1 – Convenio 914.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, me permito remitir la comunicación INGEART-016-2024 realizada por el contratista de obra; con referencia al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diferentes comités de obra desarrollados, en donde la fecha establecida para conformación y entrega por parte del municipio del tramo No. 1 del convenio 914 correspondía al día 11 de marzo de 2024 y razón por la cual no ha sido posible iniciar las actividades a desarrollar en este sector.

Dicho esto, el contratista de obra solicita la reconformación de los tramos No. 1 y 2 del convenio 925 ya que como es de su conocimiento las fuertes lluvias presentadas en la zona causaron el desprendimiento y arrastre del material usado para la conformación de estos tramos, lo que afectó significativamente el normal desarrollo del contrato y generó atrasos a la programación de obra planteada. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y considerando que la conformación y entrega de los tramos pendientes a la fecha no depende netamente del contratista y por el contrario esta situación puede llegar a ocasionar alteraciones y/o retrasos al normal desarrollo de la obra; nos permitimos reiterar la solicitud de entrega de los tramos al contratista de obra, acorde a los compromisos adquiridos por parte de la administración municipal.

Finalmente, se solicita de manera amable la respuesta a las comunicaciones PR-061-014-2024 y PR-061-015-2024 enviadas a la Secretaría de Obras Públicas el pasado 06 de marzo de 2024, reiterando la necesidad del tiempo adicional propuesto para la culminación de las actividades propuesta y acorde al cumplimiento de los compromisos por parte del municipio.

Cordialmente,



CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24

Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 14 de marzo de 2024

PR-061-018-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Remisión concepto técnico.

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia, y de acuerdo a lo solicitado por la supervisión me permito remitir el informe y recomendaciones del especialista en pavimentos presentado por la empresa INGEART el día de hoy 14 de marzo de 2024; lo anterior, en base a la aclaración sobre el uso de piedra rajón para el lleno de los espacios en sitios puntuales de la vía durante la construcción del Tramo No. 2 del convenio 920.

Cordialmente,



CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

CONSORCIO CANO

La Calera, 15 de marzo de 2024

PR-061-019-2024

INGENIERO
DIEGO PERALTA COORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Correo: secretariadeobras@lacalera-cundinamarca.gov.co
La Calera, Cundinamarca

Ref: Contrato de obra publica Nro.475 de 2023 “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA – CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023”

Asunto: Estado de avance del proyecto.

Reciban un cordial saludo:

Por medio de la presente en mi calidad de interventor del contrato de obra pública Nro. 475 de 2023 cuyo objeto se menciona en la referencia y teniendo en cuenta lo solicitado por la supervisión del contrato, me permito informar que, de acuerdo a las actividades desarrolladas desde la fecha de la firma del acta de inicio al 29 de febrero de 2024, el proyecto se encuentra en un avance del **36%** de ejecución; lo anterior, teniendo en cuenta el seguimiento realizado desde la interventoría a cada una de las actividades ejecutadas y llevadas a acabo por el contratista de acuerdo a los ítems establecidos en el presupuesto del contrato.

Así mismo, nos permitimos informar que la fecha prevista de apertura de los tramos No. 4 y No.3 derivados del convenio 925 es el próximo 29 de marzo de 2024, teniendo en cuenta los tiempos de curado del concreto necesarios para garantizar su optimo funcionamiento.

Saludos,

CARLOS ARAGON
RL CONSORCIO CANO

Civilesun@gmail.com

Calle 106 No 54-24
Tel 3107534026

Bogotá, Febrero 22 de 2024 INGEART-0011-2024

Ingeniero
CARLOS ARAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CANO
Ciudad

ASUNTO: REPROGRAMACION DE OBRA - SOLICITUD PRORROGA
REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

Cordial saludo Ing. Carlos,

Según los compromisos del Comité de Obra del día 19 de enero de 2024, entregamos la reprogramación de obra, teniendo en cuenta los siguientes hitos, que se han ido modificando según las entregas de tramos hechos por el Municipio de la Calera.

1- Tramo 2 – Convenio 920.- Inicia el día 26 de febrero de 2024 según acuerdos entre la Secretaria de Obras Publicas Municipal y la comunidad
2- Tramos 1 y 2 – Convenio 925.- Inician el día 11 de marzo de 2024, 2024 según acuerdos entre la Secretaria de Obras Publicas Municipal y la comunidad
3- Tramo 1 – Convenio 914 las actividades previas al inicio de la construcción de la placa huella no se han ejecutado por parte del Municipio, se programa fecha tentativa el día 11 de marzo de 2024.

La fecha final de entrega de terminación de actividades es hasta el día 20 de abril de 2024, con un tiempo de ejecución de los tramos faltantes de 50 días.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita una prórroga al Contrato de la referencia por 20 días calendario, hasta el 20 de abril de 2024.

Se reitera, que las demoras en el inicio de la ejecución física de obra, no es imputable de INGEART CV SAS y revisando los tiempos de ejecución, de entregas reales de tramos por parte del Municipio, revisión, aprobación de alcances y de curado de las placas huellas, el

proyecto se hace totalmente crítico y por lo tanto se hace necesario el tiempo adicional para terminar las actividades establecidas en el Contrato.

Atentamente,



ING. MARIA ASTRID VARGAS
Directora de Obra
INGEART CV SAS
Adjuntos ( ) folios
C.C.

Bogotá, marzo 5 de 2024 INGEART-0013-2024

Ingeniero
CARLOS ARAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CANO
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO
REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

Cordial saludo Ing. Carlos,

Como es de su conocimiento, se debe reprogramar el cronograma de ejecución de los convenios del Contrato de la referencia, lo anterior debido a las siguientes circunstancias:

1- Tramo 2 – Convenio 920.- Inicio el día 26 de febrero de 2024 según acuerdos entre la Secretaria de Obras Publicas Municipal y la comunidad, para que estos últimos organizaran su ingreso y salida a sus predios, por la necesidad del cierre total del tramo a ejecutar.

2- Tramos 1 y 2 – Convenio 925.- Se programó su iniciación para el día 11 de marzo de 2024, pero debido a que el con los aguaceros del fin de semana (2 y 3) de marzo de 2024, se evidencio que la capa granular (afirmado) se lavó debido a que este material al tener contacto con el agua pierde su capacidad y lava los finos perdiéndose la estructura granular. Sobre este particular desde el inicio de la ejecución de los trabajos INGEART CV SAS, ha reiterado sobre las bajas calidades de este material y que la estabilidad final del proyecto se puede ver comprometida, por el uso de este material como capa granular de soporte estructural de la placa huella. A la fecha, se está enviando un informe sobre lo enunciado anteriormente, y la necesidad de realizar nuevamente la actividad de conformación por parte del Municipio, como compromiso establecido en el Convenio el ICCU 925.

3- Tramo 1 – Convenio 914 las actividades previas al inicio de la construcción de la placa huella no se han ejecutado por parte del Municipio, se programa fecha tentativa de inicio el día 11 de marzo de 2024.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se solicita una prórroga al Contrato de la referencia por 28 días calendario, hasta el 28 de abril de 2024.

Se reitera, que las demoras en el inicio de la ejecución física de obra, no son imputables a INGEART CV SAS y revisando los tiempos de ejecución, de entregas reales de tramos por parte del Municipio, revisión, aprobación de alcances y de curado de las placas huellas, el proyecto se hace totalmente crítico y por lo tanto se hace necesario el tiempo adicional para terminar las actividades establecidas en el Contrato.

Atentamente,



YANETH ALFONSO RODRIGUEZ
R.L
INGEART CV SAS
Adjuntos ( ) folios
C.C.

Ingeart cv s.a.s

Bogotá, marzo 5 de 2024 INGEART-0015-2024

Ingeniero
CARLOS ARAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CANO
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y TIEMPO
REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

Cordial saludo Ing. Carlos,

Exponemos nuevamente la necesidad de ejecutar los rellenos laterales para confinar adecuadamente entre la cuneta existente en el terreno natural y la cuneta nueva de la placa huella en construcción.

La necesidad de ejecutar estos rellenos laterales obedecen a que los anchos de la banca actual en los tramos de los convenios tienen un promedio de 6.50 metros y la placa huella de 5.00 metros incluidas las cunetas; generando algunos problemas que han sido expuestos ampliamente en los diferentes oficios enviados a la interventoría como son: 004 de 204, 006 de 2024, 007 de 2024, 0012 de 2024, 014 de 2024.

Además, los bordes de la vía no han sido debidamente compactados y con las lluvias se presentan socavaciones y arrastre de finos que desestabilizan la estructura de soporte

Dadas las circunstancias expuestas anteriormente, solicitamos una adición al Contrato del asunto en referencia, por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE. (**$ 95.281.801,00)**

Discriminados así, según los Convenios:

		VALOR ADICIONAL	TOTAL
		VALOR TOTAL CONVENIO	
TRAMO 1. VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TRIUNFO AL CASCO URBANO SECTOR CALIXTO. CCONV. No. ICCU 914-2022			
	SUBTOTAL OBRAS CONVENIO ICCU 914	$ 29.794.495,45	$ 254.897.369,42
TRAMO 2. VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MÁRQUEZ A LA VEREDA AURORA BAJA SECTOR LOS AYALA. CONV. No. ICCU			
	SUBTOTAL OBRAS CONVENIO ICCU 920	$ 14.561.289,40	$ 129.799.112,06
TRAMO 3. LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA AURORA BAJA A LA VEREDA MÁRQUEZ EN EL SECTOR LOS ALPES. CONV. No.			
Subtotal		$ 50.122.935,59	$ 248.196.680,49
	SUBTOTAL OBRAS CONVENIO ICCU 925	$ 50.926.016,61	$ 250.122.071,93
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA Y AIU)	$ 95.281.801,46	$ 634.818.553,41
	AJUSTE AL PESO	-$ 0,46	-0,41
	VALOR TOTAL	$ 95.281.801,00	$ 634.818.553,00

La ampliación requerida en tiempo estimado para la ejecución de las actividades es de 30 días calendario, a partir de la fecha de aprobación y perfeccionamiento de garantías.

Atentamente,

YANETH ALFONSO RODRIGUEZ
R.L.
INGEART CV SAS
Adjuntos ( ) folios
C.C.

Bogotá, marzo 5 de 2024 INGEART-0014-2024

Ingeniero
CARLOS ARAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CANO
Ciudad

ASUNTO: INFORME SITUACION ACTUAL DESPUES DE LAS LLUVIAS CONVENIO 925 ST- 1 Y ST- 2 CONVENIO 920
REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

Cordial saludo Ing. Carlos,

Nos permitimos informar, que los días 2 y 3 de marzo del año en curso, se presentaron lluvias fuertes en la zona de los trabajos, y que estos eventos naturales ocasionaron daños importantes en la capa granular de afirmado.

Las afectaciones se describen a continuación:

1- Tramo 2 – Convenio 920.-

- Se generaron cárcavas y perdida de finos y espesores en la capa de afirmado, ejecutado por el municipio, como estructura granular de la vía.

- Las cuentas laterales naturales aumentaron su profundidad.

- En las líneas de construcción de las placas huellas, se lavó y perdió parte de los finos, situación que ahora presenta profundidades de hasta 25 cm entre el nivel de la placa en concreto ciclópeo y el piso.

  ** Ver informe fotográfico

2- Tramos 1 y 2 – Convenio 925.- se evidencio que la capa granular (afirmado) se lavó debido a que este material al tener contacto con el agua pierde su capacidad y lava los finos perdiéndose la estructura granular.
3- Tramo 4 - convenio 925.- El agua lavo los finos de la capa granular. En el sector derecho subiendo el inicio del Subtramo 4. Esta situación es bastante preocupande debido a que ya se perdió la estructura de soporte en el punto mencionado.

Dadas las circunstancias anteriormente expuestas, se solicita a la Interventoría y al Municipio de la Calera para que nuevamente se ejecute la conformación de los subtramos 1 y 2 del Convenio 925.

Además, se autorice una solución para disminuir los sobre espesores en las placas huellas de 3.000 PSI en el tramo 2 Convenio 920. La propuesta consiste en colocar rajón de menor tamaño en la base de las huellas 7 cm aprox., y sobre este hacer los 15 cm de placa huella con las mismas condiciones establecidas para este ítem.

La otra alternativa consiste en aplicar recebo y compactar en 7 centímetros, para rellenar y no tener sobre espesores de concreto; situación que no sería la adecuada debido al espacio y porque no se garantizaría una compactación optima con una plancha vibratoria.

Lo sobrecostos en la ejecución de cualquiera de las opciones será presentada para su respectiva evaluación.

Atentamente,



ING. MARIA ASTRID VARGAS N
Directora de Obra
INGEART CV SAS
Adjuntos ( ) folios
C.C.

Bogotá, marzo 11 de 2024 INGEART-0016-2024

Ingeniero
CARLOS ARAGON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CANO
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CONFORMACION TRAMOS CONVENIO 914 Y CONVENIO 925 ST-2 Y ST-1.

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

Cordial saludo Ing. Carlos,

Según los compromisos establecidos por el Municipio, en la socialización para el Tramo 1 Convenio 914 de realizar la actividades de conformación de la estructura granular a partir del día de hoy 11 de marzo del año corriente, en la visita realizada por parte del jefe de maquinaria Municipal quien nos informa que este tramo NO está programado y que posiblemente la próxima semana, se hagan las labores programadas.


Además, reiteramos la necesidad de la ejecutar la reconformación para los sub - tramos 1 y 2 del Convenio 925, los cuales se han visto afectados por la ola invernal, evidenciada en los Oficios e informes allegados a la Interventoría la semanada anterior.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, solicitamos la ejecución de las actividades de conformación en los tramos mencionados, debido a que a partir del próximo 14 marzo de 2024, se terminan las actividades programadas en los demás tramos, viéndose afectado el cronograma de obra, y con el agravante de suspender las cuadrillas de mano de obra.

Reiteramos que INGEART CV SAS cumple a cabalidad con la ejecución de las actividades y que estos imprevistos, retrasos e inconvenientes de la no realización de estas tareas nos

generan en el normal desarrollo de las labores, situaciones que se nos están ocasionado pérdidas y desequilibrio financiero a nuestra firma.

Atentos a sus comentarios,



YANETH ALFONSO RODRIGUEZ
R.L.
INGEART CV SAS
Adjuntos ( ) folios
C.C.

CONSORCIO CANO

ANEXO 7.
ACTAS DE VECINDAD

Hoja	de	
FECHA		
13	MAR	24

MUNICIPIO DE LA CALERA

CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914


CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda: Arcadio Rozo

CASA No.: La Arboleda

Teléfono: 317 425 5432

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☐	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

☐	☐	Cuantos ☐ ☐ ☐ ☐
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

- Machones en ladrillo con desgaste natural, Portón metalico con desgaste de pintura.
- Cerca con postes en concreto bastante deteriorado, con desprendimiento de concreto, quedando varilla a la vista, ademas alambre en pua. con desgaste

FECHA :

13 días del mes de MARZO de 2024

(Día en números) (Mes en el que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) R. Aux. Carol Garzón

Residente Social - Contratista

REVISARON:

CARLOS MONZON

Firma: _____

Nombre: Carlos Monzón

Cargo: Residente de obra

APROBÓ:

(Firma)

(Nombre)

Interventoria

(Firma)

(Nombre)

Propietario

Dirección de consulta: Intranet / formatos / FORMATOS DE INTERVENTORIA / FORMATOS SEGUIMIENTO SOCIAL

4-MN-PCJS-04

Powered by CamScanner

Hoja de		
FECHA		
13	03	24

MUNICIPIO DE LA CALERA

CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914

CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA






2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda: Arevalo Rozo

CASA No.: La Arboleda

Teléfono: 312 425 5432

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☐	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

☐	☐	Cuantos ☐ ☐ ☐ ☐
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Mochones en ladrillo con desgaste natural, Portón metalico con desgaste de pintura, Cerca con postes en concreto bastante deterrorado, con desprendimiento de Concreto y acero de refuerzo a la vista, ademas, alambre de puas deterrorado

FECHA :

13 días del mes de Marzo de 2024

(Día en números) (Mes en el que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) R. Aux. Carol Garzón

Residente Social - Contratista

REVISARON:

CARLOS MONZON

Firma: _____

Nombre: Carlos Monzón

Cargo: Residente de obra

APROBÓ:

(Firma)

(Nombre) Angie Cobos

Interventoria

(Firma)

(Nombre)

Propietario

Dirección de consulta: Intranet / formatos / FORMATOS DE INTERVENTORIA / FORMATOS SEGUIMIENTO SOCIAL

Powered by CamScanner

Hoja de	MUNICIPIO DE LA CALERA
FECHA	CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914
05 03 24	CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda (Kikombo) Predio Emma Hernandez
CASA No.
Teléfono 3213907895

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☑	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

☐	☐	Cuantos	☐ ☐
☐	☐		☐ ☐
☐	☐		
☐	☐		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Fisuras en la placa de acceso, Portón metalico con desgaste Pintura, Portón electrico. Muchon en piedra con base Fracturada. Cerca con postes de madera. y alambre de pua con desgaste natural.
• Poste de energia inclinado hacia el predio.
(telefono). Tubería concreto en buen estado

FECHA :

13 días del mes de Marzo de 2024
(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social - Contratista
R. Aux. Carol Garzón

REVISARON:

CARLOS MONZON
Firma: _____
Nombre: Carlos Monzón
Cargo: Residente de obra

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Interventoria

(Firma)
(Nombre)
Propietario
Emma Hernandez Avilán

Dirección de consulta: Intranet / formatos / FORMATOS DE INTERVENTORIA / FORMATOS SEGUIMIENTO SOCIAL

4-MN-PC-IS-04

Powered by CamScanner

Hoja ___ de ___	MUNICIPIO DE LA CALERA
FECHA	CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914
DD MM AA	CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023
	ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda: Gabriel Hernandez
CASA No.: La Selva
Teléfono: 311 8375263

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☐	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

☐	☐	Cuantos ☐ ☐ ☐ ☐
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

- Cerca con desgaste natural
- Poste de telefono inclinado hacia el predio

FECHA :

13 días del mes de Marzo de 2024

(Día en numeros) (Mes en el que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) R.AUX. Carol Gaizán
Residente Social - Contratista

CARLOS MONZON
Firma: _____
Nombre: Carlos Monzón
Cargo: Residente de obra

REVISARON:


APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Interventoria

(Firma) Hernandez
(Nombre) Gabriel Hernandez
Propietario

Powered by CamScanner

Hoja de	MUNICIPIO DE LA CALERA
FECHA	CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914
DD MM AA	CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023
	ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

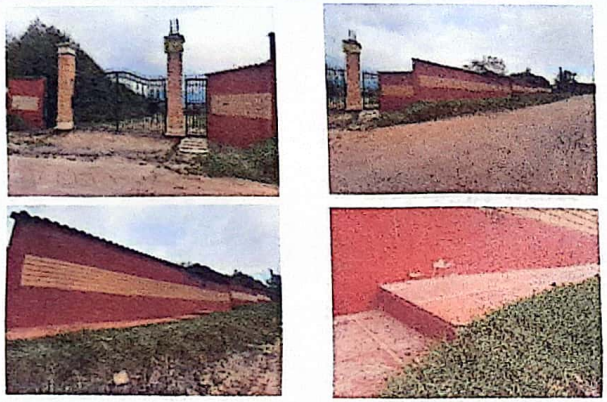

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda
CASA No. Vda San Joaquin, Vda San Jose La Concepción
Teléfono

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	X		
2. GRIETAS			
3. PINTURA			
4. DESGASTE			
5. CARPIN Y VIDRIOS			

Cuantos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Desgaste de pintura en muro de cerramiento, tres baldosas rotas, tejas de barro desgastadas, ademas se evidencian fisuras en el muro de cerramiento -se observan grietas en el techo de la parte central del muro.

FECHA :

_____ días del mes de _____ de _____

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social - Contratista

R. Aux Carol Garzón

CARLOS MONZON

Firma: _____
Nombre: Carlos Monzón
Cargo: Residente de obra

REVISARON:

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Interventoria

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Powered by CamScanner

Hoja de	MUNICIPIO DE LA CALERA
FECHA	CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914
15 03 24	CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda: Ruben Venegas

CASA No.

Teléfono: 311 8806164

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☐	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

☐	☐	Cuantos ☐ ☐ ☐ ☐
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Cerca con postes de madera y concreto, con desgaste natural y alambre de pua oxidado.
Machones en piedra con desgaste natural y una reja metalica en el costado norte, aparentemente sin uso

FECHA :

____ días del mes de ____ de ____

(Día en numeros) (Mes que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social - Contratista

R. AUX. Carol Garzón

CARLOS MONZON

Firma: _____
Nombre: Carlos Monzón
Cargo: Residente de obra

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)
Interventoria

REVISARON:
(Firma)
(Nombre) Rubén Venegas Propietario

Powered by CamScanner

Hoja ___ de ___		
FECHA		
DD	MM	AA

MUNICIPIO DE LA CALERA

CONVENIOS ICCU 920,925 Y 914

CONTRATO 475 DE 2023 -CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS DEL TRIUNFO, MARQUEZ Y AURORA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS ICCU No. 914, 920 Y 925 DE 2022 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2023

ACTA No: DE VENCINDAD

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA






2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del encargado de la vivienda: Flor María Venegas

CASA No.

Teléfono

ESTADO DE LA FACHADA

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. FISURAS	☐	☐	
2. GRIETAS	☐	☐	
3. PINTURA	☐	☐	
4. DESGASTE	☐	☐	
5. CARPIN Y VIDRIOS	☐	☐	

Cuantos ☐ ☐ ☐ ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

- Postes en madera inclinados y alambre de puas con desgaste natural

FECHA :

13 días del mes de Marzo de 2024.

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Residente Social - Contratista

R.AUX. Carol Garzón

CARLOS MONZON

Firma: _____

Nombre: Carlos Monzón

Cargo: Residente de obra

REVISARON:

APROBÓ:

(Firma)

(Nombre) Interventoria

(Firma)

(Nombre) Propietario

Powered by CamScanner

CONSORCIO CANO

ANEXO 8.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO CANO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CANO

TOPÓGRAFO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79788490	CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ	calle 44 d No 45-45 7201	6012220635	ofertascarlos4@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	20/03/2024	75361792	$403.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.300	403.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79788490	CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ		calle 44 d No 45-45 7201	6012220635	ofertascarlos4@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	20/03/2024	75361792	$403.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79788490	ARAGON RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79788490	CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ		calle 44 d No 45-45 7201	6012220635	ofertascarlos4@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	20/03/2024	75361832	$876.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	132.100				132.100	0	0	132.100			1.321	132.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	124.000	0	0	124.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	124.000	124.000
Pensión	2	496.000	496.000
Riesgos Laborales	1	132.100	132.100
CCF	1	124.000	124.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	876.100	876.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79788490	CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ		calle 44 d No 45-45 7201	6012220635	ofertascarlos4@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	20/03/2024	75361832	$876.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1071170595	CUBILLOS CIFUENTES ANGIE VANESSA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	46370853	BARRERA GONZALEZ FANNY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO CANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CANO

CADENERO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79965798	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	CALLE 106 #54-24 OFICINA 101	3204210524	ingandcar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	08/03/2024	75361957	$403.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.300	403.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79965798	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	CALLE 106 #54-24 OFICINA 101	3204210524	ingandcar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	08/03/2024	75361957	$403.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79965798	CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79965798	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	CALLE 106 #54-24 OFICINA 101	3204210524	ingandcar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	75364571	$2.014.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	38.200	0		0		0	0	0	0	38.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.600	0		0		0	0	0	0	73.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	667.400	0	0	0	0	0	0		667.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	294.100	0	0	0	0	0	0		294.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	363.500				363.500	0	0	363.500			3.635	363.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	344.600	0	0	344.600	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	344.600	344.600
Pensión	2	961.500	961.500
Riesgos Laborales	1	363.500	363.500
CCF	1	344.600	344.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.014.200	2.014.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79965798	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA		CALLE 106 #54-24 OFICINA 101	3204210524	ingandcar@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	75364571	$2.014.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000123158	ZULETA HERNANDEZ BRAYAN STEVEN	1	0			S																	25-14	1.838.000	294.100	0	0	0	0	EPS008	1.838.000	73.600	14-11	1.838.000	1	9.600	CCF24	1.838.000	73.600	0	0	0	0	0
2	CC	1006617492	ARPUSHANA GONZALEZ EMMANUEL MARIA	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
3	CC	1026579367	CABRERA GONZALEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	1093772581	MEZA LIZCANO YENEDITH	1	0			S	X																230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
5	CC	19060210	ARAGON OSPINA HUMBERTO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	79291250	CARDENAS RAUL EDUARDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	PT	12805075	PALENCIA CHAPARRO RAFAEL ANTONIO	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
8	PT	5677088	FERNANDEZ FERNANDEZ JUNIOR JESUS	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
9	CC	1092394338	ESTEBAN VIVAS JUAN DAVID	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
10	CC	13571119	MEZA LIZCANO JOHN ALEXANDER	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO CANO

INSPECTOR SST

CONSORCIO CANO

ANEXO 9. CERTIFICADOS DE CALIDAD

ILAB-No.061-2024

Bogotá D.C., marzo 11 del 2023

INGEART
Vereda Márquez Aurora Baja
Municipio de La Calera
Departamento de Cundinamarca

REFERENCIA: RESULTADO ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: CONTRATO 475-2023 - CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Cordial Saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de remitirles los resultados de los ensayos de RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO del informe ILAB-061-2024.

Procedimientos solicitados para el proyecto de la referencia.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud, cambio o modificación que surja en el análisis de este mismo.

Cordialmente,



Director Técnico

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
NIT.: 901.028.209-2

>CQR "Inteligencia, al Servicio de la Confianza" COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

CERTIFICADO No. SG-2020001919

HOJA DE CALCULO: RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.

Codigo :	TS-FT-017-03
Fecha de Edición :	2020-09-29
Versión :	3
Copia Controlada :	SI / NO

CLIENTE: INGEART

PROYECTO: CONTRATO 475-2023 - CONSTRUCCION PLACA HUELLA

LOCALIZACIÓN: VEREDA MÁRQUEZ AURORA BAJA

DESCRIPCIÓN: CONCRETO MEZCLADO EN OBRA

NORMA E ENSAYO: INVIAS E-410-2013

FECHA DE INGRESO 2024-02-22

RESISTENCIA DE DISEÑO: 2000-2500-3000

CODIGO DEL CLIENTE : 146

Codigo Procedimiento Ensayo: TS-PT-016-00

Numero de Orden de Servicios: OSC-928-2024 OSC-929-2024

Numero de Informe Resultados: ILAB-061-2024

Contrato /Elemento /No. Muestra	No. Cilindro /Codigo Muestra Cliente	Fecha de Toma	Días de curado	Fechas de rotura	Temperatura ambiente	Humedad Relativa	Diametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm²)	Volumen (cm³)	Masa (g)	Densidad (g/cm³)	Carga aplicada (kN)	Resistencia a la fecha		Resistencia estimada los 28 dias (P.S.I.)	% desarrollo	Tipo de falla	Tipo de Falla
														MPa	P.S.I.				
CONCRETO CICLOPEO	C-1	2024-02-09	14	2024-02-23	18.8°	54%	15,1	30,7	178,3	5473,5	12285	2,244	212,7	11,9	1730,3	2000	86,52	3	1
	C-2	2024-02-09	14	2024-02-23	18.8°	54%	15,2	30,8	182,3	5607,4	12460	2,222	241,3	13,2	1920,3	2000	96,01	3	
	C-3	2024-02-09	28	2024-03-08	20.2°	56%	15,3	30,7	183,1	5613,7	12175	2,169	253,1	13,8	2005,4	2000	100,27	2	
	C-4	2024-02-09	T													2000			
CINTA PLACA HUELLA	C-5	2024-02-12	10	2024-02-22	21.1°	53%	15,2	30,8	180,7	5564,4	12710	2,284	308,4	17,1	2475,9	3000	82,53	2	
	C-6	2024-02-12	14	2024-02-26	18.6°	56%	15,2	30,8	180,7	5558,4	12680	2,281	342,8	19,0	2752,0	3000	91,73	5	
	C-7	2024-02-12	28	2024-03-11	19.3°	58%	15,2	30,7	180,7	5546,4	12510	2,256	374,9	20,8	3009,7	3000	100,32	5	
	C-8	2024-02-12	T													3000			
CUNETAS	C-9	2024-02-16	7	2024-02-23	18.8°	54%	15,3	30,8	183,1	5638,1	12870	2,283	252,4	13,8	1999,8	2500	79,99	2	2
	C-10	2024-02-16	14	2024-03-01	19.0°	56%	15,2	30,5	181,5	5534,5	12790	2,311	286,5	15,8	2290,0	2500	91,60	5	
	C-11	2024-02-16	28	2024-03-15												2500			
	C-12	2024-02-16	T													2500			
CINTA PLACA HUELLA	C-13	2024-02-20	7	2024-02-27	19.4°	56%	15,2	30,8	181,5	5595,0	12710	2,272	308,0	17,0	2461,8	3000	82,06	5	
	C-14	2024-02-20	14	2024-03-05	20.4°	58%	15,2	30,8	181,5	5588,9	12590	2,253	352,3	19,4	2815,9	3000	93,86	2	
	C-15	2024-02-20	28	2024-03-19												3000			
	C-16	2024-02-20	T													3000			
CUNETAS	C-17	2024-02-21	7	2024-02-28	19.8°	55%	15,0	30,0	176,7	5307,3	12440	2,344	252,0	14,3	2068,3	2500	82,73	4	3
	C-18	2024-02-21	14	2024-03-06	20.4°	58%	15,2	30,8	180,7	5558,4	12340	2,220	287,3	15,9	2306,5	2500	92,26	3	
	C-19	2024-02-21	28	2024-03-20												2500			
	C-20	2024-02-21	T													2500			
																			4
																			5

ILAB-No.082-2024

Bogotá D.C., marzo 12 del 2023

INGEART
Vereda Márquez Aurora Baja
Municipio de La Calera
Departamento de Cundinamarca

REFERENCIA: RESULTADO ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: CONTRATO 475-2023 - CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Cordial Saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de remitirles los resultados de los ensayos de RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO del informe ILAB-082-2024.

Procedimientos solicitados para el proyecto de la referencia.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud, cambio o modificación que surja en el análisis de este mismo.

Cordialmente,



Director Técnico

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
NIT.: 901.028.209-2

>CQR "Inteligencia, al Servicio de la Confianza" COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

CERTIFICADO No. SG-2020001919

HOJA DE CALCULO: RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO.

Codigo :	TS-FT-017-03	
Fecha de Edición :	2020-09-29	
Versión :	3	
Copia Controlada :	SI	NO

CLIENTE: INGEART

PROYECTO: CONTRATO 475-2023 - CONSTRUCCION PLACA HUELLA

LOCALIZACIÓN: VEREDA MÁRQUEZ AURORA BAJA

DESCRIPCIÓN: CONCRETO MEZCLADO EN OBRA

NORMA E ENSAYO: INVIAS E-410-2013

FECHA DE INGRESO 2024-02-22

RESISTENCIA DE DISEÑO: 2000-2500-3000


CODIGO DEL CLIENTE : 146

Codigo Procedimiento Ensayo: TS-PT-016-00

Numero de Orden de Servicios: OSC-928-2024 OSC-929-2024

Numero de Informe Resultados: ILAB-061-2024

Contrato /Elemento /No. Muestra	No. Cilindro /Codigo Muestra Cliente	Fecha de Toma	Días de curado	Fechas de rotura	Temperatura ambiente	Humedad Relativa	Diametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm²)	Volumen (cm³)	Masa (g)	Densidad (g/cm³)	Carga aplicada (kN)	Resistencia a la fecha		Resistencia estimada los 28 dias (P.S.I.)	% desarrollo	Tipo de falla	Tipo de Falla
														MPa	P.S.I.				
CONCRETO CICLOPEO	C-21	2024-02-24	7	2024-03-02	18.8°	54%	15,2	30,4	181,5	5510,3	12680	2,301	209,1	11,5	1671,3	2000	83,57	5	
	C-22	2024-02-24	14	2024-03-09	18.8°	54%	15,4	30,7	185,5	5693,6	12745	2,238	239,8	12,9	1875,3	2000	93,77	2	
	C-23	2024-02-24	28	2024-03-23												2000			
	C-24	2024-02-24	T													2000			
CINTA PLACA HUELLA	C-25	2024-02-27	7	2024-03-05	20.3°	56%	15,3	30,5	184,7	5632,0	12860	2,283	270,5	14,6	2124,6	2500	84,99	4	
	C-26	2024-02-27	14	2024-03-12	20,1°	55%	15,4	30,7	186,3	5724,6	12800	2,236	303,5	16,3	2363,2	2500	94,53	2	
	C-27	2024-02-27	28	2024-03-26												2500			
	C-28	2024-02-27	T													2500			
CUNETAS	C-29	2024-02-28	7	2024-03-06	20.2°	58%	15,1	30,4	178,3	5414,1	12550	2,318	306,8	17,2	2495,8	3000	83,19	5	
	C-30	2024-02-28	14	2024-03-13												3000			
	C-31	2024-02-28	28	2024-03-27												3000			
	C-32	2024-02-28	T													3000			
CINTA PLACA HUELLA	C-33	2024-02-29	7	2024-03-07	20.3°	56%	15,3	30,4	183,9	5589,2	12730	2,278	207,4	11,3	1636,1	2000	81,81	2	
	C-34	2024-02-29	14	2024-03-14												2000			
	C-35	2024-02-29	28	2024-03-28												2000			
	C-36	2024-02-29	T													2000			
CUNETAS	C-37	2024-03-05	7	2024-03-12	20,1°	55%	15,4	31,0	186,3	5774,2	12705	2,200	307,2	16,5	2392,1	3000	79,74	5	
	C-38	2024-03-05	14	2024-03-19												3000			
	C-39	2024-03-05	28	2024-04-02												3000			
	C-40	2024-03-05	T													3000			



OBSERVACIONES :

Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

REVISADO Y APROBADO POR:

DIRECTOR TÉCNICO

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil Nit. 901.028.209-2

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por el laboratorio TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS
