columnas que describen el código, nombre del programa, tipo de medida, indicador, valor de referencia, frecuencia, duración y costos para cada uno de los programas del plan de manejo ambiental de la Planta de concretos de Ultracem S.A.S en Barranquilla

El plan de contingencia para el proyecto de la Planta de Concretos Barraquilla de Ultracem S.A.S. se desarrolla con el propósito de establecer lineamientos que ayuden a prevenir o a controlar las situaciones que se puedan presentar en el evento de una emergencia originada por diferentes fenómenos, ya sean de origen antrópico o natural, que lleguen a afectar al proyecto o al medio ambiente durante las etapas que este desarrolle. Estas afectaciones pueden interactuar del medio ambiente al proyecto o del proyecto al medio ambiente.

Durante el desarrollo de éste Plan de Contingencia se hará la identificación tanto cualitativa como cuantitativa de amenazas y riesgos que posteriormente servirán como lineamientos a seguir para los eventos presentados en el proyecto

OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer los lineamientos operativos de atención y comunicación a eventualidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades del proyecto en relación a las amenazas y riesgos a los que éste se encuentre expuesto.

ALCANCE

La elaboración del plan de contingencia cuenta con un alcance que cubre la etapa inicial del proyecto que se denomina de Construcción pasando por la de Operaciones hasta la Etapa de Cierre y Abandono del proyecto. En caso que se proyecte una ampliación o modificación del proyecto, éste deberá ser actualizado.

Análisis del riesgo

Metodología

Para el desarrollo del Plan de Contingencia de la Planta de Concreto Barranquilla Ultracem S.A.S. se tuvo en cuenta los efectos no controlados que el medio ambiente puede causar sobre el proyecto y los que el proyecto pueda causar sobre el medio ambiente. La metodología del plan de contingencia se basa en tres grandes pasos:

- Identificación de amenazas y la estimación de su probabilidad de ocurrencia
- El análisis de vulnerabilidad
- La evaluación del riesgo

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

La ejecución del plan de contingencia aporta las actividades a desarrollar para el control y prevención de las amenazas a las cuales sea vulnerable el proyecto y el medio ambiente. El desarrollo de éste plan se hace a través de estrategias específicas para el manejo de

las contingencias y para la corrección de los desastres que se presenten en caso de un eventual siniestro.

Plan estratégico

Las estrategias definidas en éste plan de acción serán propuestas a través de planes de manejo para los eventos que de acuerdo a la calificación del riesgo se ubicaron en los rangos Tolerables e Inaceptable.

PLAN DE CIERRE DE LA PLANTA Y ABANDONO

ACTIVIDADES DE CIERRE

Diagnóstico

El Plan de desmantelamiento y abandono deberá ajustarse a las condiciones de la instalación y normativas vigentes al momento del cierre. Inicialmente, debe realizarse la inspección, inventario y caracterización del estado de la infraestructura y equipos de la planta al momento del cierre.

Ajuste del plan de cierre

Se debe realizar una revisión del plan con el fin de ajustarlo al estado y condiciones existentes de la infraestructura y equipos, incluye modificación de los procesos y actividades formuladas. Finalmente, se adoptará el plan de cierre actualizado y ajustado.

Desmontaje de la instalación

El desmontaje o desmantelamiento de la instalación es el proceso de desmonte de equipos y desmantelamiento de estructuras. Dentro de las actividades del proceso de desmonte de equipos se encuentran el desarme, etiquetado, acopio, embalaje, cargue y transporte de sistemas, contenedores, maquinaria y equipos. Así mismo, el desmantelamiento de estructuras comprende demolición de estructuras hidráulicas, metálicas, subterráneas, edificaciones, incluyendo el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros resultantes del proceso. Durante la etapa de cierre se acogerán medidas preventivas en materia de seguridad industrial y así garantizar la integridad física del personal, junto a la respectiva instalación de señales preventivas. Para asegurar el éxito del plan se contará para la ejecución con un profesional en gestión ambiental, un profesional en salud ocupacional, que harán la supervisión de las actividades propuestas.

En la etapa final, Cierre de la planta y abandono, se podría generar afectaciones a los recursos naturales, salud humana y medio perceptual, por lo cual se deben implementar medidas de prevención y mitigación que garanticen el buen desarrollo de las labores de desmantelamiento formuladas en éste plan.

La Oficina de Control y Vigilancia, considera técnicamente procedente otorgar Licencia Ambiental a la Sociedad ULTRACEM S.A.S, identificada con NIT. 900.570.964 – 4. localizada en la margen izquierda de La Vía la Cordialidad que conduce de Barranquilla a Galapa, a la altura del Kilómetro 1,75, para el proyecto de montaje y operación de una planta de producción de concreto, por el término de vida útil del proyecto.

1. La Licencia Ambiental aquí otorgada ampara las siguientes etapas del proyecto.

Etapa 1. Construcción y montaje de la instalación,
Etapa 2. Operación de la planta, finalmente
Etapa 3. Cierre de la planta y abandono.

Las obras que ampara la licencia ambiental son:

- ✓ Centro de acopio de agregados
- ✓ Planta dosificadora de concretos
- ✓ Planta mezcladora de concretos
- ✓ Silos de cemento
- ✓ Planta de lavado de mixers
- ✓ Laboratorio de materiales y oficinas
- ✓ Edificio de casino y vestieres
- ✓ Edificio subestación eléctrica
- ✓ Edificio de talleres y almacén
- ✓ Portería y bascula
- ✓ Vías internas
- ✓ Parqueaderos
- ✓ Áreas de arborización y jardines

2. La Licencia Ambiental otorgada en éste acto, no ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora silvestre.

3. La Licencia Ambiental otorgada, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Plan de Contingencias presentados. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo o al Plan de Contingencia deberá ser informada inmediatamente al DAMAB para su evaluación y aprobación.

4. La Licencia Ambiental que se otorga por medio del Acto Administrativo que desarrolla el presente concepto, incluye los permisos y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la legislación ambiental vigente, los cuales son:

   - Permiso de Emisiones Atmosféricas
   - Permiso de Vertimientos Líquidos
   - Uso y Aprovechamiento de Materiales de Construcción
   - Autorización Ambiental para la Gestión Interna de Residuos Peligrosos

   Nota: En caso de realizar alguna obra dura en el punto de vertimiento sobre el arroyo caños, deberá tramitar y obtener el correspondiente permiso de ocupación de cauces cumplimentando los requisitos exigidos por la normativa ambiental vigente.

5. La Sociedad **ULTRACEM S.A.S.**, deberá dar estricto cumplimiento a las medidas contempladas en el Plan de manejo Ambiental y Plan de Monitoreo contenidos en el documento presentado.

6. La Sociedad **ULTRACEM S.A.S.**, antes de iniciar la explotación del pozo artesiano existente en el predio deberá obtener la correspondiente concesión de aguas subterráneas, previo cumplimientos de los requisitos establecidos para ello.

7. Deberá presentar la propuesta de inversión del 1% del valor del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 o aquella norma que lo sustituya o modifique.

Así mismo, la Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Via Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito,deberá dar cumplimiento a las obligaciones que aparecerán en la parte resolutiva de la presente decisión.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Que el Artículo 9 del Decreto 2820 de Agosto 05 de 2010 establece: "*Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales.* Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Artículo 36. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. De ésta situación deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia.

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las que no ha dado inicio a la obra, proyecto o actividad.

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar sobre las razones por las qué no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su evaluación por parte de la autoridad ambiental.

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito no se hará afectiva la pérdida de vigencia de la licencia".
La norma ibídem también establece textualmente en el inciso segundo del numeral 8, lo siguiente:

Artículo 39. "*Control y seguimiento.* Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:

(...)

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto;

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental".

Que de conformidad con la ley 768de 2002 en su Artículo 13 y lo establecido en el Decreto 0208 de 2004, en sus Artículos 2 y 4 el DAMA BARRANQUILLA DAMAB, es la máxima autoridad ambiental en el Distrito de Barranquilla.

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA
BARRANQUILLA – DAMAB

RESOLUCION No. 0 3 0 0
FECHA: 30 MAR. 2015

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar la Licencia Ambiental a la Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Vía Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito, para el Proyecto de Construcción y Operación de una Planta de Concreto, que se ubicara sobre la margen izquierda de la vía La Cordialidad que conduce de Barranquilla a Cartagena a la altura del kilómetro 1.75, por el término de vida útil del proyecto.

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental aquí otorgada ampara las siguientes etapas del proyecto:

Etapa 1. Construcción y montaje de la instalación,
Etapa 2. Operación de la planta, finalmente
Etapa 3. Cierre de la planta y abandono.

Las obras que ampara la licencia ambiental son:

- ✓ Centro de acopio de agregados
- ✓ Planta dosificadora de concretos
- ✓ Planta mezcladora de concretos
- ✓ Silos de cemento
- ✓ Planta de lavado de mixers
- ✓ Laboratorio de materiales y oficinas
- ✓ Edificio de casino y vestieres
- ✓ Edificio subestación eléctrica
- ✓ Edificio de talleres y almacén
- ✓ Portería y bascula
- ✓ Vías internas
- ✓ Parqueaderos
- ✓ Áreas de arborización y jardines
- ✓

ARTICULO TERCERO: La Licencia Ambiental otorgada en éste acto, no ampara la captura o extracción de especímenes de fauna o flora silvestre.

ARTICULO CUARTO: La Licencia Ambiental otorgada, ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Plan de Contingencias presentados. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental, al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo o al Plan de Contingencia deberá ser informada inmediatamente al DAMAB para su evaluación y aprobación.

ARTICULO QUINTO: La Licencia Ambiental que se otorga por medio del presente Acto Administrativo, incluye los permisos y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la legislación ambiental vigente, los cuales son:

- o Permiso de Emisiones Atmosféricas
- o Permiso de Vertimientos Líquidos

- Uso y Aprovechamiento de Materiales de Construcción
- Autorización Ambiental para la Gestión Interna de Residuos Peligrosos

En caso de realizar alguna obra dura en el punto de vertimiento sobre el arroyo caños, deberá tramitar y obtener el correspondiente permiso de ocupación de cauces cumplimentando los requisitos exigidos por la normativa ambiental vigente.

ARTICULO SEXTO: La Sociedad **ULTRACEM S.A.S.**, deberá dar estricto cumplimiento a las medidas contempladas en el Plan de manejo Ambiental y Plan de Monitoreo contenidos en el documento presentado.

ARTICULO SEP**TIMO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S**, antes de iniciar la explotación del pozo artesiano existente en el predio deberá obtener la correspondiente concesión de aguas subterráneas, previo cumplimientos de los requisitos establecidos para ello.

ARTICULO OCTAVO: La citada Sociedad, deberá presentar la propuesta de inversión del 1% del valor del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 o aquella norma que lo sustituya o modifique.

ARTICULO NOVENO: La Licencia Ambiental otorgada para el Proyecto de Construcción y Operación de una Planta de Concreto, que se ubicara sobre la margen izquierda de la vía La Cordialidad que conduce de Barranquilla a Cartagena a la altura del kilómetro 1.75. por el término de vida útil del proyecto, lleva implícitos todos los permisos autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento, y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

ARTICULO DECIMO: La Licencia Ambiental aquí otorgada sujeta al beneficiario de la misma, al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental -E.I.A.-, presentado en el para el Proyecto de Construcción y Operación de una Planta de Concreto, que se ubicará sobre la margen izquierda de la vía La Cordialidad que conduce de Barranquilla a Cartagena a la altura del kilómetro 1.75, por el término de vida útil del proyecto, al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento durante la etapa de operación del proyecto de las siguientes obligaciones:

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones durante la operación del proyecto:

a.Realizar anualmente un estudio de calidad de aire (PM 10) en el área de influencia directa del proyecto, para lo cual deberá realizar un muestreo por espacio de diez y ocho (18) días continuos con un mínimo de tres muestreadores, los cuales se instalaran en sitios convenidos con la Autoridad Ambiental y de acuerdo con las condiciones de operación.

b.Realizar anualmente un estudio de niveles de presión sonora y emisión de ruido, haciendo recorridos diurnos y nocturnos, de conformidad con lo establecido en el protocolo para medición de ruido adoptado por el IDEAM o aquella norma que lo modifique o sustituya.

c.Realizar anualmente una caracterización de los vertimientos originados en el establecimiento industrial, para lo cual deberá medir los parámetros establecidos por la norma de vertimientos vigente al momento de realizar el estudio de caracterización. Deberá tomar muestras compuestas de cinco alícuotas tomadas una cada hora, y muestrear durante cuatro días, antes y después del sistema de tratamiento instalado.

d.Disponer los residuos de construcción en escombreras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, guardando las certificaciones que le sean expedidas por dicha disposición para cuando la autoridad ambiental realice los correspondientes

seguimientos.

e.Los laboratorios contratados para realizar los diferentes estudios deberán estar debidamente acreditados por el IDEAM.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., deberá presentar ante el DAMAB, anualmente fotocopias de los certificados de revisión técnico mecánica y de gases de los vehículos utilizados para la actividad de Transporte de concreto en el Distrito de Barranquilla.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S.,, deberá presentar ante el DAMAB, semestralmente, un Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) con los avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental Establecido.

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., en caso de encontrar vestigios arqueológicos durante la ejecución del proyecto, deberá realizar la prospección arqueológica del sitio, el cual será llevado a cabo por personal especializado, concluida ésta etapa, la empresa deberá presentar el estudio respectivo al Instituto Colombiano de Antropología ICANH del Ministerio de Cultura y a ésta Autoridad Ambiental. El ICANH determinará la necesidad de realizar la etapa de excavación o rescate arqueológico.

ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de presentarse durante el tiempo de operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, La Sociedad ULTRACEM S.A.S., como beneficiaria de la Licencia Ambiental deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a la Autoridad Ambiental – DAMAB – para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será causal para aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., deberá suministrar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas en esta providencia, asi como aquellas definidas en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo presentados por la empresa y exigirá el estricto cumplimiento de las mismas. El cumplimiento a este requerimiento deberá estar soportado mediante las respectivas actas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La citada Sociedad deberá avisar al DAMAB, cualquier modificación o reparación que quiera realizar en su actividad o política ambiental.

ARTICULO DECIMO NOVENO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Vía Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito, será responsable civilmente ante la nación y/o terceros por la contaminación, y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

ARTICULO VIGESIMO: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla – DAMAB –, supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, en los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental presentados. Cualquier incumplimiento de los mismos, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes.

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA
BARRANQUILLA – DAMAB

RESOLUCION No. 0300
FECHA: 30 MAR. 2015

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente providencia a la Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Vía Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito, a través de su Representante Legal, o a su apoderado legalmente constituido de acuerdo con lo contemplado en el artículo 66, 67, 68 y 69 del Nuevo Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La presente resolución deberá ser publicada en la gaceta Ambiental del DAMAB, a costas del interesado, quien deberá consignar la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L., ($1'728.864,00), equivalentes al valor de tres y medio salarios mínimos legales diarios por cada folio del presente acto administrativo, en el Banco GNB SUDAMERIS, de ésta ciudad en la cuenta corriente No. 33436205, a nombre del DAMAB. en virtud de las tarifas establecidas, en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993.

PARAGRAFO: La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata éste articulo será causal suficiente para revocar y dejar sin efectos el presente acto administrativo.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra lo dispuesto en la presente providencia solo procede el Recurso de Reposición ante el Director General del DAMAB dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el numeral 2 inciso 2 del artículo 74 y 76 del Nuevo Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: La presente providencia rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Barranquilla, a los 30 MAR. 2015

JACKELINE REINA SENIOR
Directora General

PROYEECTO: ANTONIO M.
REVISO: RITA N.
Aprobó: S.B.R.M.
EXP: L.A. No. 9148/05/12/14.

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA
BARRANQUILLA – DAMAB

RESOLUCION No. 0300
FECHA: 30 MAR. 2015

DILIGENCIA DE NOTIFICACION

En Barranquilla D.E.I.P a los 07 días del mes Abril de 2.015, se notificó personalmente del contenido de la presente Resolución No. 0300 de fecha 30 Marzo 2.015 al señor (a) Juan Alfonso Villa Sierra identificado con cédula de ciudadania No 9.175.155 de San Jacinto a quien luego leerla, se le entregó copia integra, auténtica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informó que contra está procede legalmente el recurso de Reposición ante el Director General del DAMAB, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal, o por aviso, según el Articulo 66, 67,68, 69, 74 y 76 del Nuevo C.C.A.

EL NOTIFICADO

Jorge Del Castillo
EL NOTIFICADOR

	INGENIERIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	**Código:** IP-FM-02
		Versión: 01
	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	**Fecha:** 27 - 09- 2013
		Página: 1 de 4

No.		**FECHA**	24	10	2023

CONTRATO	OBRA		INTERVENTORIA		GERENCIA	X

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato	CD-05-2022-3691
Objeto	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

2. INFORMACION DE LA REUNION:

Lugar:	**EDUBAR S.A**
Objeto:	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

3. PARTICIPANTES INVITADOS:

PARTICIPANTE	**ENTIDAD**	**CARGO**
1. LIZZ FIGUEREDO	EDUBAR S.A.	APOYO A GERENCIA
2. EVERT SALGADO	EDUBAR S.A.	APOYO A GERENCIA
3. LUISA NUÑEZ	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
4. JAVIER CONRADO	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	COORDINADOR DE PROYECTO
5. ALBERTO CALDERON	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
6. EDGAR ARIAS	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	RESIDENTE DE OBRA
7. CARLOS MENDOZA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	COORDINADOR DE PROYECTO
8. DANIEL SANCHEZ	CONSORCIO IE DISTRITO	INTERVENTOR
9. RICARDO CABALLERO	CONSORCIO IE DISTRITO	INTERVENTOR
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

No.	**FECHA**	24	10	2023

4. ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del estado de los frentes de obra
2. Avances de los frentes de obra
3. Compromisos

No.	**FECHA**	24	10	2023

5. VERIFICACION DE COMPROMISOS:

DESCRIPCION DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO

6. DESARROLLO DE LA AGENDA:

•En la IED NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO a la fecha el contratista de obra se encuentra realizando actividades en el piso 3 del bloque 2 de intervención, se solicita por parte de la gerencia del contrato EDUBAR S.A. mejorar la gestión del contratista en área SST, debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores. Se programa la entrega de este frente para el 31 de octubre del 2023.

• En la IED CASTILLO DE LA ALBORAYA se encuentran realizando las actividades concernientes a la instalación de acrílicos en los calados de las aulas intervenidas. Asimismo, en la IED JESÚS DE NAZARETH el contratista de obra se encuentra realizando la instalación de flashing en cubierta y queda pendiente por ejecutar toma de detalles.

• Continuando con el avance de la ejecución de las obras se ha identificado que el avance de las obras en la IED CARRIZAL SEDE 1 se ha visto afectado considerablemente por las fuertes lluvias presentadas las últimas semanas en la ciudad de Barranquilla, mismas que se espera se extiendan hasta el mes de noviembre. Lo anterior, ha generado que se deban suspender las actividades durante horas por seguridad del personal, afectando principalmente las fundidas de elementos en concreto debido a las complejidades técnicas que supone realizar estas actividades durante eventos de lluvia. La gerencia del contrato EDUBAR S.A. le solicita al contratista de obra realizar las modificaciones a los horarios de jornada laboral y agregar los recursos necesarios para cumplir con la ejecución de las actividades dentro del plazo vigente del contrato.

• La IED REUVEN FEUERSTEIN el contratista de obra continua con la ejecución de las actividades, a la fecha se ha completado la instalación de estructura metálica de soporte y las láminas de cubierta en la zona administrativa y aulas de preescolar. Además, se ha finalizado la construcción del muro de cerramiento y continua con actividad de pañete, filos en vanos de puertas y ventanas.

• En la IED JOSÉ EUSEBIO CARO el contratista de obra menciona que se han presentado complejidades en los trabajos de reforzamiento de la estructura de la institución, lo cual ha generado que las mismas no avancen de la manera inicialmente planificada, ya que las mismas han afectado el ritmo de trabajo. Debido a lo anterior se programa una visita conjunta a la institución con la interventoría del proyecto el día 26 de octubre, para evaluar esta situación y tomar las medidas necesarias.

• En la IED MAYOR DE BARRANQUILLA el contratista de obra continúa realizando el reforzamiento estructural de columnas en los 3 bloques intervenidos. Asimismo, continúa con la instalación de vigas IP en el bloque 1, para cumplir con el diseño estructural propuesto para esta institución y finalizar el reforzamiento que requieren los edificios de esta institución es necesario contar con los anclajes, a la fecha el contratista se encuentra a la espera de la entrega de estos insumos, el contratista se compromete a una vez recibido los insumos finalizar la actividad la actividad con rapidez sin poner en riesgo la calidad de la obra.

•En la IED INOCENCIO CHINCA la gerencia del contrato continúa a la espera de la revisión por parte del contratista con el diseñador hidráulico la validación del tramo de cárcamos que atraviesan las zonas duras. Además, la gerencia del contrato manifiesta su preocupación con respecto al avance de las obras en las zonas blandas y el inicio de la intervención en la zona duras. Por lo tanto, solicita la reprogramación de este frente.

No.	**FECHA**	24	10	2023

7. COMPROMISOS PACTADOS:








COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Entrega IED Normal Superior del Distrito	Consorcio Educativo Distrital	31/10/2023
Toma de detalles IED Jesús de Nazareth	Consorcio Educativo Distrital / Consorcio IE Distrito	6/11/2023
Realizar visita conjunta a IED José Eusebio Caro	Consorcio Educativo Distrital / Consorcio IE Distrito / EDUBAR S.A.	26/10/2023

8. PROXIMA REUNION:

FECHA	14	11	2023	

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del dia, en Barranquilla a los 24 dias del mes de octubre de 2023.

9. FIRMAS:

NOMBRE	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
1. LIZZ FIGUEREDO	EDUBAR S.A.	
2. EVERT SALGADO	EDUBAR S.A.	
3. LUISA NUÑEZ	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
4. JAVIER CONRADO	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
5. ALBERTO CALDERON	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
6. EDGAR ARIAS	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
7. CARLOS MENDOZA	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
8. DANIEL SANCHEZ	CONSORCIO IE DISTRITO	
9. RICARDO CABALLERO	CONSORCIO IE DISTRITO	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INGENIERIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO**	**Código:** IP-FM-02
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha:** 27 - 09- 2013
		Página: 1 de 2

No.		**FECHA**	5	10	2023

CONTRATO	OBRA		INTERVENTORIA		GERENCIA	X

1. INFORMACION DEL CONTRATO:	
No. del Contrato	CD-05-2022-3691
Objeto	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

2. INFORMACION DE LA REUNION:	
Lugar:	IED JUAN JOSÉ RONDÓN
Objeto:	VISITA CONJUNTA PARA REVISIÓN AVANCES DE OBRA

3. PARTICIPANTES INVITADOS:

PARTICIPANTE	ENTIDAD	CARGO
1. EVERT SALGADO	EDUBAR S.A.	APOYO A GERENCIA
2. DIANA SANGUINO	EDUBAR S.A.	APOYO TÉCNICO
3. JAVIER CONRADO	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	COORDINADOR DE PROYECTO
4. ALBERTO CALDERON	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
5. DANIEL SANCHEZ	CONSORCIO IE DISTRITO	INTERVENTOR
6. RICARDO CABALLERO	CONSORCIO IE DISTRITO	INTERVENTOR
7. CLAUDIO CURVELO	CONSORCIO IE DISTRITO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

4. DESARROLLO DE LA AGENDA:

El 5 de octubre de 2023, se llevó a cabo una reunión conjunta entre el contratista de obra CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL, la interventoría del proyecto CONSORCIO IE DISTRITO y la gerencia del contrato EDUBAR S.A. a la IED JUAN JOSÉ RONDÓN, con el propósito de evaluar los avances y situaciones encontradas durante la ejecución de las actividades en este frente de obra.

Durante la reunión, se constató que el contratista de obra se encontraba en la fase de desmonte de las cubiertas existentes. En este proceso, el mismo identificó la necesidad de llevar a cabo la construcción de elementos adicionales en concreto, específicamente columnas y vigas de amarre.

El contratista de obra proporcionó detalles esenciales sobre las condiciones encontradas durante la visita. Después del desmonte de las cubiertas, se identificó que la estructura existente requería refuerzos adicionales para garantizar su estabilidad y resistencia. En consecuencia, se considera necesaria la construcción de columnas y vigas de amarre con el objetivo de redistribuir cargas y mejorar la capacidad de carga de la estructura.

Asimismo, se destacó que el desmonte de las cubiertas pudo haber alterado la distribución de cargas en la estructura. Por lo tanto, se sugiere que la construcción de elementos adicionales es necesaria para adaptarse a estas nuevas cargas y garantizar un sistema estructural equilibrado.





La interventoría evaluó la situación y confirmó la validez de la necesidad identificada, respaldando la decisión del contratista.

La gerencia del contrato expresó su comprensión de la situación y reconoció que la complejidad inherente a la obra puede generar imprevistos. En este contexto, se resaltó la importancia de abordar esta nueva fase de construcción con eficiencia y de cumplir rigurosamente con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Se acordó programar reuniones periódicas para evaluar el avance de la construcción de los elementos adicionales y abordar cualquier otro asunto relevante.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del dia, en Barranquilla a los 5 dias del mes de octubre de 2023.

5. FIRMAS:

NOMBRE	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
1. EVERT SALGADO	EDUBAR S.A.	
2. DIANA SANGUINO	EDUBAR S.A.	
3. JAVIER CONRADO	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
4. ALBERTO CALDERON	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	
5. DANIEL SANCHEZ	CONSORCIO IE DISTRITO	
6. RICARDO CABALLERO	CONSORCIO IE DISTRITO	
7. CLAUDIO CURVELO	CONSORCIO IE DISTRITO	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.13%	0.05%	0.05%	17	3.13%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.13%	0.46%	0.51%	18	3.13%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	3.13%	0.57%	1.08%	19	3.13%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	3.13%	6.82%	7.90%	20	3.13%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	3.13%	4.25%	12.15%	21	3.13%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.13%	0.92%	13.08%	22	3.13%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	3.13%	1.19%	14.27%	23	3.13%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.13%	0.81%	15.08%	24	3.13%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.13%	0.45%	15.53%	25	3.13%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.13%	1.15%	16.67%	26	3.13%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	3.13%	1.60%	18.27%	27	3.13%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	3.13%	1.23%	19.50%	28	3.13%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.13%	1.30%	20.80%	29	3.13%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.13%	0.35%	21.15%	30	3.13%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.13%	0.15%	21.30%	31	3.13%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.13%	1.21%	22.51%	32	3.13%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	3.13%	0.32%	22.83%	33	3.13%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.13%	0.14%	22.97%	34	3.13%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	3.13%	4.68%	27.65%	35	3.13%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.13%	0.80%	28.45%	36	3.13%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	3.13%	1.07%	29.52%	37	3.13%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.13%	1.22%	30.74%	38	3.13%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.13%	3.32%	34.06%	39	3.13%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	3.13%	0.88%	34.95%	40	3.13%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.13%	5.17%	40.12%	41	3.13%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	3.13%	1.81%	41.92%	42	3.13%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.13%	3.77%	45.70%	43	3.13%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.13%	0.44%	46.14%	44	3.13%	0.44%	$28,919,037	46.14%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-10-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-02	Levante de mampostería, muro de cerramiento. Excavación. Armado de viga de amarre para rampa y escalera. Excavación e Instalación de redes hidrosanitarias. Armado de columnas. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento. Corte y figuración de acero para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-10-03	Levante de mampostería. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento. Levante de muro de cerramiento. Excavación e Instalación de redes hidrosanitarias. Armado de viga de amarre para rampa.	N/A
		2023-10-04	Excavación para muro de cerramiento y demolición de este. Levante de mampostería. Instalación de redes hidrosanitarias. Levante de muro de cerramiento. Fundida de pedestal de rampa en concreto. Corte y figuración de acero. Armado de columnas y vigas. Excavaciones para redes hidrosanitarias.	N/A
		2023-10-05	Corte y figuración de acero para tanque de almacenamiento. Fundida de pedestal de rampa en concreto. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento. Demolición, Excavacion y levante para muro de cerramiento. Levante de mampostería. Instalación de redes hidráulicas. Armado de columnas y vigas.	N/A
		2023-10-06	Levante de mampostería. Instalación de redes hidráulicas. Excavación para redes hidrosanitarias. Armado de columnas. Corte y figuración de acero para vigas, columnas y tanque de almacenamiento. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento. Demolición de muro de cerramiento.	N/A
		2023-10-07	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para vigas, columnas y tanque de almacenamiento. Instalación de redes hidráulicas. Armado de columnas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35	0.00	$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00	0.00	$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00	0.00	$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	66.28		66.09	0.00	$252,961	-	66.09	0.19
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72	0.00	$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10	0.00	$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		68.48	4.56	$93,507	426,391.92	73.04	458.29
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03	0.00	$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24	0.00	$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		329.48	0.00	$54,171	-	329.48	133.73
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		68,165.09	1,412.87	$9,568	13,518,340.16	69,577.96	8,570.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		428.00	48.00	$40,436	1,940,928.00	476.00	469.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00	0.00	$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29	0.10	$1,742,818	174,281.80	59.39	21.78
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,305.40	128.00	$27,186	3,479,808.00	1,433.40	668.06
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87	0.00	$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1864		1,231.81	76.18	$100,669	7,668,964.42	1,307.99	556.01
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00	15.16	$38,862	589,147.92	111.16	13.99
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02	0.00	$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67	0.00	$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38	0.00	$20,865	-	222.38	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09	0.00	$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00	0.00	$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00	0.00	$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00	0.00	$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00	0.00	$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$16,601	-	4.00	-
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	3		3.00		$64,019	-	3.00	-
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00	0.00	$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	88.17		47.29	0.00	$35,397	-	47.29	40.88
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		-	14.15	$29,367	415,543.05	14.15	31.01
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00	0.00	$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00	0.00	$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12	0.00	$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		-	26.12	$27,015	705,631.80	26.12	102.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	107.18		62.41	0.00	$58,180	-	62.41	44.77
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00	0.00	$173,513	-	11.00	37.72
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-

NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		145.87		$760,000	$0.00	145.87	5.13
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	43.57		43.57		$806,383	$0.00	43.57	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,411	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,162.52		$439,795	$0.00	1,162.52	88.48
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	189		159.08		$1,913,255	$0.00	159.08	29.92
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835	$0.00	706.75	0.00
							VALOR DE OBRA	$28,919,037.07		
							INCIDENCIA	0.44%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 — Excavación para redes hidrosanitarias



FOTO 2 — Levante de muros.



FOTO 3 — Levante de muros.



FOTO 4 — Instalación de redes hidrosanitarias



FOTO 5 — Instalación de redes hidrosanitarias



FOTO 6 — Corte y figurado de acero

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 45**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	8	AL	14

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.13%	0.05%	0.05%	17	3.13%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.13%	0.46%	0.51%	18	3.13%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	3.13%	0.57%	1.08%	19	3.13%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	3.13%	6.82%	7.90%	20	3.13%	6.82%	$449,147,148	7.90%

21	23/4/2023	29/4/2023	3.13%	4.25%	12.15%	21	3.13%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.13%	0.92%	13.08%	22	3.13%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	3.13%	1.19%	14.27%	23	3.13%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.13%	0.81%	15.08%	24	3.13%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.13%	0.45%	15.53%	25	3.13%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.13%	1.15%	16.67%	26	3.13%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	3.13%	1.60%	18.27%	27	3.13%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	3.13%	1.23%	19.50%	28	3.13%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.13%	1.30%	20.80%	29	3.13%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.13%	0.35%	21.15%	30	3.13%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.13%	0.15%	21.30%	31	3.13%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.13%	1.21%	22.51%	32	3.13%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	3.13%	0.32%	22.83%	33	3.13%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.13%	0.14%	22.97%	34	3.13%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	3.13%	4.68%	27.65%	35	3.13%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.13%	0.80%	28.45%	36	3.13%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	3.13%	1.07%	29.52%	37	3.13%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.13%	1.22%	30.74%	38	3.13%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.13%	3.32%	34.06%	39	3.13%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	3.13%	0.88%	34.95%	40	3.13%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.13%	5.17%	40.12%	41	3.13%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	3.13%	1.81%	41.92%	42	3.13%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.13%	3.77%	45.70%	43	3.13%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.13%	0.44%	46.14%	44	3.13%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.13%	0.76%	46.90%	45	3.13%	0.76%	$50,018,999	46.90%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

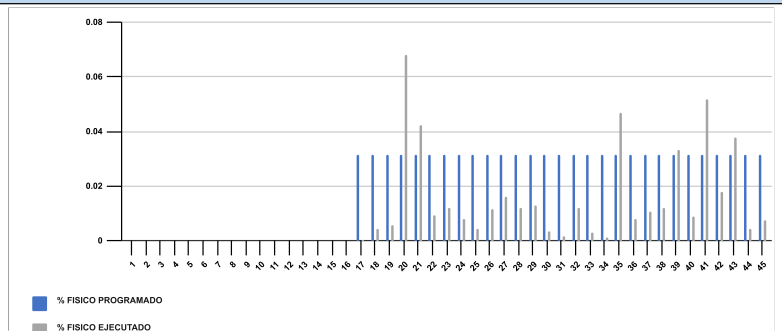

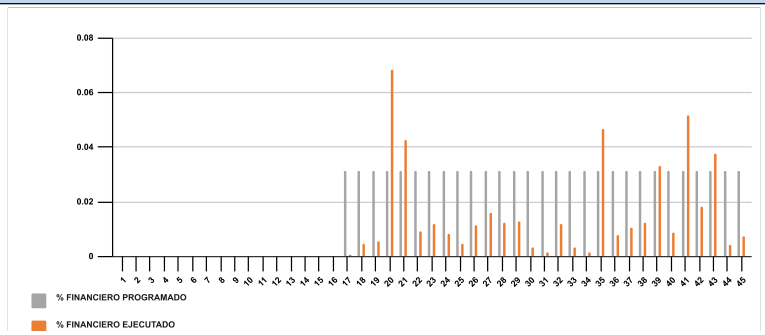

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-10-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-09	Armado de columnas y vigas. Corte y figuración de acero para vigas de amarre. Levante de mampostería. Instalación de redes hidráulicas. Excavación para redes hidrosanitarias. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-10-10	Armado de columnas. Excavación para muro de cerramiento. Excavación para redes hidrosanitarias. Levante de mampostería. Instalación de redes hidráulicas. Corte y figuración de acero para vigas de amarre. Instalación de redes hidrosanitarias.	N/A

CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-10-11	Instalación de redes hidráulicas. Levante de mampostería. Excavación para muro de cerramiento. Excavación para redes eléctricas. Perfilación de excavación para tanque de almacenamiento. Excavación para redes hidrosanitarias. Relleno y compactación para placa contrapiso. Armado de viga dintel. Corte y figuración de acero para vigas.	N/A
		2023-10-12	Nivelación, relleno y compactación para placa contrapiso. Excavación para redes eléctricas e hidrosanitarias. Fundida de placa contrapiso. Levante de mampostería. Armado de columnas y vigas.	N/A
		2023-10-13	Especificaciones de diseño escritas en bitácora.	N/A
		2023-10-14	Fundida de columnas, armado de vigas. Solado para tanque de almacenamiento. Levante de mampostería. Pañete para muros de baños. Excavación para red eléctrica y muro de cerramiento. Corte y figuración de acero para viga dintel.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35	0.00	$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00	0.00	$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00	0.00	$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	66.28		66.09	0.00	$252,961	-	66.09	0.19
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72	0.00	$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10	0.00	$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		73.04	1.20	$93,507	112,208.40	74.24	457.09
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03	0.00	$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24	0.00	$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		329.48	0.00	$54,171	-	329.48	133.73
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		69,577.96	2,738.00	$9,568	26,197,184.00	72,315.96	5,832.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		476.00	77.00	$40,436	3,113,572.00	553.00	392.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00	0.00	$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.39	0.10	$1,742,818	174,281.80	59.49	21.68
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,433.40	145.00	$27,186	3,941,970.00	1,578.40	523.06
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87	0.00	$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1864		1,307.99	127.16	$100,669	12,801,070.04	1,435.15	428.85
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	600.81		-	87.15	$23,961	2,088,201.15	87.15	513.66
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		111.16	0.00	$38,862	-	111.16	13.99

5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02	0.00	$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67	0.00	$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38	0.00	$20,865	-	222.38	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09	0.00	$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00	0.00	$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00	0.00	$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00	0.00	$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00	0.00	$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00	0.00	$16,601	-	4.00	-
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	3		3.00		$64,019	-	3.00	-
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00	0.00	$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	88.17		47.29	0.00	$35,397	-	47.29	40.88
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		14.15	16.18	$29,367	475,158.06	30.33	14.83
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00	0.00	$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00	0.00	$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12	0.00	$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		26.12	15.12	$27,015	408,466.80	41.24	86.88
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	107.18		62.41	12.15	$58,180	706,887.00	74.56	32.62
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00	0.00	$173,513	-	11.00	37.72
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		145.87		$760,000	$0.00	145.87	5.13
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	43.57		43.57		$806,383	$0.00	43.57	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,411	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,162.52		$439,795	$0.00	1,162.52	88.48
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	189		159.08		$1,913,255	$0.00	159.08	29.92

NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835	$0.00	706.75	0.00

VALOR DE OBRA	$50,018,999.25
INCIDENCIA	0.76%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1qQVt6h1qHuUALhbsNcXUPoQqmRt_fx3d

FOTO 1	Levante de muros.



https://drive.google.com/open?id=1FdKeND49GSpf0IOEsk5YeJ3Qs52ejjT

FOTO 2	Levante de muros.



https://drive.google.com/open?id=1UiqEdTbx1YqrDAUY8iYz_WRtHGilWoL1

FOTO 3	Excavación



https://drive.google.com/open?id=1h4_Y60bX1quuKxRbGE_Q7bWlFneeWlz

FOTO 4	Armado y fundida de columnas.

 https://drive.google.com/open?id=1SEKITu9qU65a4kbz2fusE7X4I7iHbFIK		 https://drive.google.com/open?id=1qOoEQj6awPiWKEle4-mRsQnhloQ1bWbRK	
FOTO 5	Fundida de placa	**FOTO 6**	Fundida de placa
 https://drive.google.com/open?id=1wY56FzaU6Y5iTugKSva5_AugXPV68xZ1		 https://drive.google.com/open?id=1-gaNLIfXGVSTsv3RBna0b_cypI-3Kb6D	
FOTO 7	Perfilación de excavación para tanque	**FOTO 8**	Solado para tanque

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 46**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	15	AL	21

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.13%	0.05%	0.05%	17	3.13%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.13%	0.46%	0.51%	18	3.13%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	3.13%	0.57%	1.08%	19	3.13%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	3.13%	6.82%	7.90%	20	3.13%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	3.13%	4.25%	12.15%	21	3.13%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.13%	0.92%	13.08%	22	3.13%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	3.13%	1.19%	14.27%	23	3.13%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.13%	0.81%	15.08%	24	3.13%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.13%	0.45%	15.53%	25	3.13%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.13%	1.15%	16.67%	26	3.13%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	3.13%	1.60%	18.27%	27	3.13%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	3.13%	1.23%	19.50%	28	3.13%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.13%	1.30%	20.80%	29	3.13%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.13%	0.35%	21.15%	30	3.13%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.13%	0.15%	21.30%	31	3.13%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.13%	1.21%	22.51%	32	3.13%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	3.13%	0.32%	22.83%	33	3.13%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.13%	0.14%	22.97%	34	3.13%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	3.13%	4.68%	27.65%	35	3.13%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.13%	0.80%	28.45%	36	3.13%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	3.13%	1.07%	29.52%	37	3.13%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.13%	1.22%	30.74%	38	3.13%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.13%	3.32%	34.06%	39	3.13%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	3.13%	0.88%	34.95%	40	3.13%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.13%	5.17%	40.12%	41	3.13%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	3.13%	1.81%	41.92%	42	3.13%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.13%	3.77%	45.70%	43	3.13%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.13%	0.44%	46.14%	44	3.13%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.13%	0.76%	46.90%	45	3.13%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.13%	1.32%	48.22%	46	3.13%	1.32%	$87,113,652	48.22%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

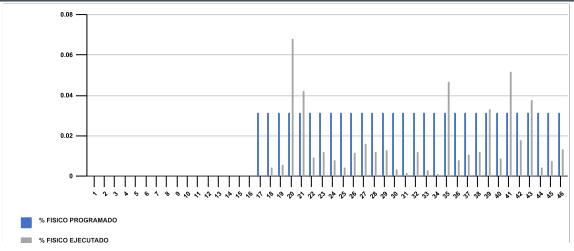

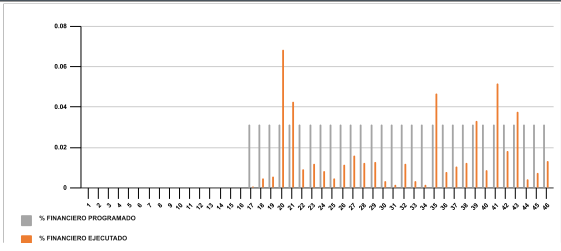

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	**DIRECCIONES**	**FECHA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**OBSERVACIONES**
CARRIZAL	**CL 50 D# 3- 15**	2023-10-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-17	Fundida de pedestal en concreto para muro de cerramiento. Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para vigas y dintel. Excavación para red eléctrica. Solado para tanque de almacenamiento. Pañete para muros de baños. Desencofrado de columnas.	N/A
		2023-10-18	Fundida en concreto para cimentación de subestación. Armado de columnas. solado para tanque de almacenamiento. Levante de mampostería. Fundida en concreto para viga dintel. Corte y figuración de acero para vigas . Armado de vigas. excavación para red eléctrica. Se realizó extracción de Núcleos en la losa de entrepiso para redes hidrosanitarias. Punto de desagüe para aguas lluvias.	N/A
		2023-10-19	Se suspenden actividades por falta de elementos de protección para trabajo seguro en alturas.	N/A
		2023-10-20	Cimentación para la subestación eléctrica. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Excavación para red eléctrica. Levante de mampostería. Armado de viga. Armado de acero para viga dintel. Fundida de viga dintel. Instalación hidráulica. Armado de losa entrepiso.	N/A
		2023-10-21	Armado de viga. Levante de mampostería. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Nivelacion, compactacion y fundida de placa entrepiso. Armado de acero para viga dintel. Demolición de muro de cerramiento. Armado de redes hidrosanitarias.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL TOTAL**	**CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**3487.3505**		**3,487.35**	**0.00**	**$4,221**	**-**	**3,487.35**	**0.00**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**45**		**45.00**	**0.00**	**$454,545**	**-**	**45.00**	**-**
1.06	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS**	ML	**32**		**32.00**	**0.00**	**$116,390**	**-**	**32.00**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**66.28**		**66.09**	**0.00**	**$252,961**	**-**	**66.09**	**0.19**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**1136**		**1,034.72**	**0.00**	**$20,699**	**-**	**1,034.72**	**101.28**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**70.1**		**70.10**	**0.00**	**$266,275**	**-**	**70.10**	**-**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**531.33**		**74.24**	**0.00**	**$93,507**	**-**	**74.24**	**457.09**
2.10	**EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	M3	**12450**		**6,937.03**	**0.00**	**$90,362**	**-**	**6,937.03**	**5,512.97**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**7547**		**6,581.24**	**0.00**	**$34,062**	**-**	**6,581.24**	**965.76**
2.14	**SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS**	MT2	**463.21**		**329.48**	**0.00**	**$54,171**	**-**	**329.48**	**133.73**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**78148.67**		**72,315.96**	**1,116.14**	**$9,568**	**10,679,227.52**	**73,432.10**	**4,716.57**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**945**		**553.00**	**36.00**	**$40,436**	**1,455,696.00**	**589.00**	**356.00**
2.17	**VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**50.21**		**0.00**	**0.00**	**$894,392**	**-**	**0.00**	**50.21**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**81.17**		**59.49**	**0.10**	**$1,742,818**	**174,281.80**	**59.59**	**21.58**
2.19	**VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**8.72**		**-**	**0.30**	**$1,894,074**	**568,222.20**	**0.30**	**8.42**
2.24	**DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.**	ML	**2101.46**		**1,578.40**	**122.00**	**$27,186**	**3,316,692.00**	**1,700.40**	**401.06**
2.39	**ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**191.12**		**0.00**	**0.00**	**$813,350**	**-**	**0.00**	**191.12**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**467**		**466.87**	**0.00**	**$32,154**	**-**	**466.87**	**0.13**
3.06	**LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,**	MT2	**1864**		**1,435.15**	**74.52**	**$100,669**	**7,501,853.88**	**1,509.67**	**354.33**
3.08	**PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4**	MT2	**600.81**		**87.15**	**41.40**	**$23,961**	**991,985.40**	**128.55**	**472.26**
3.16	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .**	MT2	**125.15**		**111.16**	**12.18**	**$38,862**	**473,339.16**	**123.34**	**1.81**
5.14	**DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.**	MT2	**286.12**		**286.02**	**0.00**	**$34,014**	**-**	**286.02**	**0.10**
6.01	**DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m**	MT2	**259.67**		**259.67**	**0.00**	**$16,524**	**-**	**259.67**	**-**
6.04	**DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**222.38**		**222.38**	**0.00**	**$20,865**	**-**	**222.38**	**-**
6.23	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD**	MT2	**3.09**		**3.09**	**0.00**	**$77,644**	**-**	**3.09**	**-**
7.01	**DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**16**		**16.00**	**0.00**	**$38,451**	**-**	**16.00**	**-**
7.02	**DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**34**		**34.00**	**0.00**	**$57,053**	**-**	**34.00**	**-**
7.03	**DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL**	UND	**18**		**18.00**	**0.00**	**$32,669**	**-**	**18.00**	**-**
8.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL**	M2	**2**		**2.00**	**0.00**	**$204,956**	**-**	**2.00**	**-**
9.02	**DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO**	UND	**4**		**4.00**	**0.00**	**$16,601**	**-**	**4.00**	**-**
10.04	**PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"**	UND	**3**		**3.00**		**$64,019**	**-**	**3.00**	**-**
10.05	**PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"**	UND	**29**		**29.00**	**0.00**	**$96,952**	**-**	**29.00**	**-**
10.06	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"**	ML	**88.17**		**47.29**	**0.00**	**$35,397**	**-**	**47.29**	**40.88**
10.07	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"**	ML	**45.16**		**30.33**	**0.00**	**$29,367**	**-**	**30.33**	**14.83**
10.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA**	UND	**2**		**2.00**	**0.00**	**$859,102**	**-**	**2.00**	**-**
10.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA**	UND	**1**		**1.00**	**0.00**	**$212,285**	**-**	**1.00**	**-**
10.13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2**	ML	**67.17**		**19.12**	**0.00**	**$45,401**	**-**	**19.12**	**48.05**
10.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"**	ML	**128.12**		**41.24**	**48.15**	**$27,015**	**1,300,772.25**	**89.39**	**38.73**

10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	107.18		74.56	0.00	$58,180	-	74.56	32.62
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00	0.00	$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	40			10	$65,771	$657,714.00	10.00	30.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		145.87	1.08	$760,000	$820,800.00	146.95	4.05
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	43.57		43.57		$806,383	$0.00	43.57	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,411	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,162.52	77.34	$439,795	$34,013,771.60	1,239.86	11.14
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	189		159.08	13.15	$1,913,255	$25,159,296.68	172.23	16.77
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835	$0.00	706.75	0.00
							VALOR DE OBRA	$87,113,652.48		
							INCIDENCIA	1.32%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Excavaciones.



FOTO 2	Pañete para muros



FOTO 3	Levante de muros.



FOTO 4	Armado de viga dintel



FOTO 5	Armado de columnas



FOTO 6	Excavación para redes eléctricas.

 https://drive.google.com/open?id=1b3Mp331_7Jv5N-exzdV_HKIlm9DpIV8S		 https://drive.google.com/open?id=1tVI2403nOn2k9uCdXIUdslFrAlm0nOGO	
FOTO 7	Pañete para muros	**FOTO 8**	Instalación de redes hidráulicas.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 47**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	22	AL	28

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.13%	0.05%	0.05%	17	3.13%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.13%	0.46%	0.51%	18	3.13%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	3.13%	0.57%	1.08%	19	3.13%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	3.13%	6.82%	7.90%	20	3.13%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	3.13%	4.25%	12.15%	21	3.13%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.13%	0.92%	13.08%	22	3.13%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	3.13%	1.19%	14.27%	23	3.13%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.13%	0.81%	15.08%	24	3.13%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	3.13%	0.45%	15.53%	25	3.13%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	3.13%	1.15%	16.67%	26	3.13%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	3.13%	1.60%	18.27%	27	3.13%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	3.13%	1.23%	19.50%	28	3.13%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.13%	1.30%	20.80%	29	3.13%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.13%	0.35%	21.15%	30	3.13%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.13%	0.15%	21.30%	31	3.13%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.13%	1.21%	22.51%	32	3.13%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	3.13%	0.32%	22.83%	33	3.13%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.13%	0.14%	22.97%	34	3.13%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	3.13%	4.68%	27.65%	35	3.13%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.13%	0.80%	28.45%	36	3.13%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	3.13%	1.07%	29.52%	37	3.13%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.13%	1.22%	30.74%	38	3.13%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.13%	3.32%	34.06%	39	3.13%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	3.13%	0.88%	34.95%	40	3.13%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.13%	5.17%	40.12%	41	3.13%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	3.13%	1.81%	41.92%	42	3.13%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.13%	3.77%	45.70%	43	3.13%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.13%	0.44%	46.14%	44	3.13%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.13%	0.76%	46.90%	45	3.13%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.13%	1.32%	48.22%	46	3.13%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.13%	0.56%	48.79%	47	3.13%	0.56%	$37,131,499	48.79%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

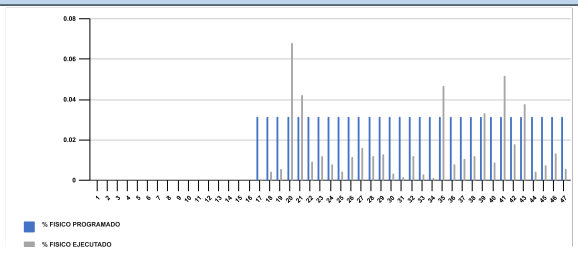

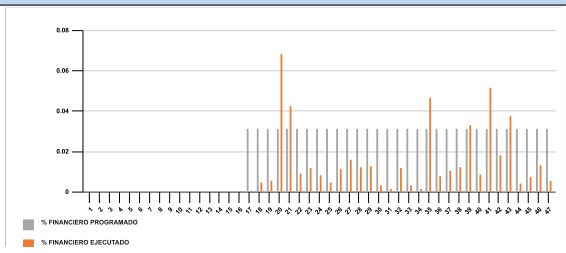

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-10-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-23	Armado de acero para viga dintel y fundida en concreto. Armado de parrilla para subestación eléctrica. Corte y figuración de acero. Puntos de núcleos para redes hidrosanitarias. Levante de mampostería. Acabado de losa entrepiso. Armado de vigas de cubierta.	N/A
		2023-10-24	Fundida en concreto de cimentación para muro de cerramiento. Levante de mampostería. Armado de viga y losa entrepiso. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Levante de mampostería en pasamanos. Fundida de placa entrepiso. Acabados de losa entrepiso y columnas.	N/A
		2023-10-25	Nivelacion y compactacion para placa contrapiso. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Levante de mampostería en pasamanos. Fundida en concreto de cimentación para muro de cerramiento. Plantilla para piso pulido en aulas. Armado de acero para viga dintel y fundida en concreto. Armado de viga de cubierta. Instalación de red hidrosanitaria.	N/A
		2023-10-26	Nivelacion y compactacion y fundida en concreto para placa contrapiso. Levante de mampostería. Levante de muro para subestación eléctrica. Plantilla para piso pulido. Armado de acero para viga dintel y fundida en concreto. Armado de viga y losa de entrepiso.	N/A
		2023-10-27	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para viga dintel. Armado y fundida en concreto para viga dintel. Fundida en concreto para placa de contrapiso. Instalación de redes hidrosanitarias. Pañete impermeabilizado en baños. Filos para vanos. Armado de viga y columneta para muro pasamanos en segundo piso. Armado de viga de cubierta.	N/A
		2023-10-28	Levante de mampostería. Instalación de redes hidrosanitarias e hidráulicas. Corte y figuración de acero para vigas, alfajías y cuchillas. Fundida en concreto de vigas y alfajías. Filos para vanos. Pañete impermeabilizado en baños.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	66.28		66.09		$252,961	-	66.09	0.19
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		74.24		$93,507	-	74.24	457.09
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		329.48		$54,171	-	329.48	133.73
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,432.10		$9,568	-	73,432.10	4,716.57
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		589.00	54.00	$40,436	2,183,544.00	643.00	302.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.59		$1,742,818	-	59.59	21.58
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.72		0.30		$1,894,074	-	0.30	8.42
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,700.40	176.00	$27,186	4,784,736.00	1,876.40	225.06
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1864		1,509.67	127.18	$100,669	12,803,083.42	1,636.85	227.15
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	600.81		128.55	67.14	$23,961	1,608,741.54	195.69	405.12
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	365		-	17.16	$15,618	268,004.88	17.16	347.84
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		123.34		$38,862	-	123.34	1.81
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	3		3.00		$64,019	-	3.00	-
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	88.17		47.29		$35,397	-	47.29	40.88
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		30.33		$29,367	-	30.33	14.83
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-

10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		89.39	24.12	$27,015	651,601.80	113.51	14.61
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	107.18		74.56		$58,180	-	74.56	32.62
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	40		10.00	10	$65,771	$657,714.00	20.00	20.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		146.95	2.07	$760,000	$1,573,200.00	149.02	1.98
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	43.57		43.57		$806,383	$0.00	43.57	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,411	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,239.86		$439,795	$0.00	1,239.86	11.14
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	189		172.23	4.14	$1,913,255	$7,920,873.63	176.37	12.63
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835	$0.00	706.75	0.00
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	15.16			3.12	$1,500,000	$4,680,000.00	3.12	12.04
								VALOR DE OBRA	$37,131,499.27	
								INCIDENCIA	0.56%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Anderson Saavedra	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 — Pañete para muros



FOTO 2 — Armado de viga dintel



FOTO 3 — Núcleos para redes hidrosanitarias.



FOTO 4 — Levante de muros.



FOTO 5 — Excavación manual.



FOTO 6 — instalación de tuberías de desagüe.

 https://drive.google.com/open?id=1dp6lq7RToa3c3ylSBnXVdT79dL_LyOBz		 https://drive.google.com/open?id=1QMxdbuez_dx3sUYLq8m5sCpWXYrxeKha	
FOTO 7	Levante de muros.	**FOTO 8**	Pulida de piso en salones.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE ALBORAYA** **No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0,00%	0.00%	0.00%	17	0,00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	8.33%	2.68%	2.68%	18	8.33%	2.68%	$10,979,290	2.68%
19	9/4/2023	15/4/2023	8.33%	9.62%	12.30%	19	8.33%	9.62%	$39,485,749	12.30%
20	16/4/2023	22/4/2023	8.33%	10.11%	22.41%	20	8.33%	10.11%	$41,477,111	22.41%
21	23/4/2023	29/4/2023	8.33%	6.52%	28.93%	21	8.33%	6.52%	$26,756,077	28.93%
22	30/4/2023	6/5/2023	8.33%	11.84%	40.77%	22	8.33%	11.84%	$48,560,404	40.77%
23	7/5/2023	13/5/2023	8.33%	14.23%	55.00%	23	8.33%	14.23%	$58,376,340	55.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	8.33%	15.03%	70.03%	24	8.33%	15.03%	$61,677,306	70.03%
25	21/5/2023	27/5/2023	8.33%	7.67%	77.70%	25	8.33%	7.67%	$31,473,177	77.70%
26	28/5/2023	3/6/2023	8.33%	9.72%	87.42%	26	8.33%	9.72%	$39,888,245	87.42%
27	4/6/2023	10/6/2023	8.33%	2.29%	89.72%	27	8.33%	2.29%	$9,407,068	89.72%
28	11/6/2023	17/6/2023	8.33%	2.21%	91.93%	28	8.33%	2.21%	$9,059,646	91.93%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.94%	2.85%	94.77%	29	2.94%	2.85%	$11,689,349	94.77%
30	25/6/2023	1/7/2023	0.00%	0.00%	94.77%	30	0.00%	0.00%	$0	94.77%
31	2/7/2023	8/7/2023	0.00%	0.00%	94.77%	31	0.00%	0.00%	$0	94.77%
32	9/7/2023	15/7/2023	0.00%	0.00%	94.77%	32	0.00%	0.00%	$0	94.77%
33	16/7/2023	22/7/2023	0.00%	0.00%	94.77%	33	0.00%	0.00%	$0	94.77%
34	23/7/2023	29/7/2023	0.00%	0.00%	94.77%	34	0.00%	0.00%	$0	94.77%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	94.77%	35	0.00%	0.00%	$0	94.77%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	94.77%	36	0.00%	0.00%	$0	94.77%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	94.77%	37	0.00%	0.00%	$0	94.77%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	94.77%	38	0.00%	0.00%	$0	94.77%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	94.77%	39	0.00%	0.00%	$0	94.77%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	94.77%	40	0.00%	0.00%	$0	94.77%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	94.77%	41	0.00%	0.00%	$0	94.77%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	94.77%	42	0.00%	0.00%	$0	94.77%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.00%	0.00%	94.77%	43	0.00%	0.00%	$0	94.77%
44	1/10/2023	7/10/2023	5.43%	5.23%	100.00%	44	5.43%	5.23%	$21,439,530	100.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

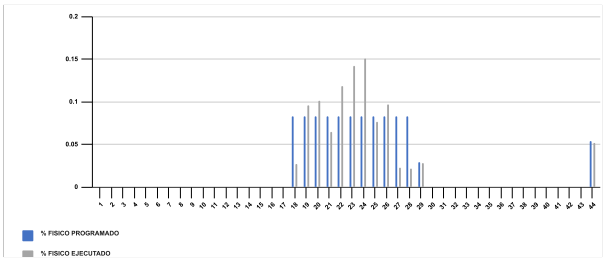

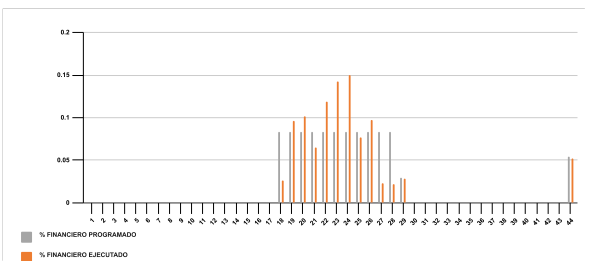

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

ALBORAYA	CL 41 #8A - 62	2023-10-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-02	Nota: desde la entrega del proyecto no se ejecutaron actividades hasta el 31 de Octubre de 2023. Actividades: Instalacion de laminas acrilicas en aula 1, aula 2, aula 3, aula4 y aula 5. Orden y aseo en el area de trabajo.	N/A
		2023-10-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	426.35		426.35	0.00	$4,221	$0	426.35	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	413.57		413.57		$9,648	$0	413.57	-
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	36.7		36.70	0.00	$32,124	$0	36.70	-
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	15.9		15.90	0.00	$274,649	-	15.90	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	48.67		48.67	0.00	$14,939	$0	48.67	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	16.04		16.04	0.00	$100,669	$0	16.04	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	123.35		123.35	0.00	$60,337	$0	123.35	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	108.73		108.73	0.00	$23,961	$0	108.73	-
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	753.51		753.51	0.00	$17,610	$0	753.51	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	155.26		155.26	0.00	$20,000	$0	155.26	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	7814.53		7,814.53	0.00	$24,307	$0	7,814.53	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	470.41		470.41	0.00	$33,985	$0	470.41	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	470.41		470.41	0.00	$138,761	$0	470.41	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	75.566		75.57	0.00	$59,248	$0	75.57	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	380.412		380.41	0.00	$20,865	$0	380.41	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	353.42		353.42	0.00	$17,948	-	353.42	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	215.21		215.21	0.00	$17,384	-	215.21	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	138.22		138.22		$20,720	-	138.22	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	44.86		44.86	0.00	$32,600	$0	44.86	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	10		10.00	0.00	$32,669	-	10.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	35		35.00	0.00	$19,629	$0	35.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	60		60.00	0.00	$16,601	$0	60.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	20		20.00	0.00	$19,709	$0	20.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	50		50.00	0.00	$190,218	-	50.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	108.37		108.37	0.00	$40,541	-	108.37	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	129.95		129.95	0.00	$27,090	-	129.95	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	50		50.00	0.00	$190,755	-	50.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		5.00	0.00	$282,244	-	5.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	25		25.00	0.00	$235,052	-	25.00	-
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, NO INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		1.00	0.00	$615,867	-	1.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		5.00	0.00	$212,527	-	5.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	61.28		61.28	0.00	$18,863	-	61.28	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	17		17.00	0.00	$24,609	-	17.00	-

NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA FIJA EN ACRÍLICO PARA VENTANA. INCLUYE SELLADO, MARCOS Y SOPORTES INTERMEDIOS EN ALUMINIO.	M2	12			62.53	$342,868	21,439,529.79	62.53	-	50.53

VALOR DE OBRA	$21,439,530
INCIDENCIA	5.23%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALBORAYA	Carlos Mendoza	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de laminas acrilicas ALBORAYA



FOTO 2	Instalación de laminas acrilicas ALBORAYA



FOTO 3	Instalación de laminas acrilicas ALBORAYA



FOTO 4	Instalación de laminas acrilicas ALBORAYA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25.672.996.396,61	VALOR INICIAL	$1.349.952.660,00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	**$0**	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	**$0**	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	3	0,00%	0,00%	**$0**	0,00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	**$0**	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	**$0**	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	3,45%	3,38%	3,38%	6	3,45%	3,38%	**$56.485.530,00**	3,38%
7	15/1/2023	21/1/2023	3,45%	10,16%	13,54%	7	3,45%	10,16%	**$169.938.000,00**	13,54%
8	22/1/2023	28/1/2023	3,45%	4,97%	18,50%	8	3,45%	4,97%	**$83.123.592,00**	18,50%
9	29/1/2023	4/2/2023	3,45%	5,30%	23,80%	9	3,45%	5,30%	**$88.579.581,00**	23,80%
10	5/2/2023	11/2/2023	3,45%	2,03%	25,83%	10	3,45%	2,03%	**$34.019.694,00**	25,83%
11	12/2/2023	18/2/2023	3,45%	4,15%	29,99%	11	3,45%	4,15%	**$69.483.620,00**	29,99%
12	19/2/2023	25/2/2023	3,45%	11,43%	41,42%	12	3,45%	11,43%	**$191.280.544,00**	41,42%

13	26/2/2023	4/3/2023	3,45%	0,35%	41,78%	13	3,45%	0,35%	$5.937.399,00	41,78%
14	5/3/2023	11/3/2023	3,45%	0,02%	41,79%	14	3,45%	0,02%	$320.941,00	41,79%
15	12/3/2023	18/3/2023	3,45%	0,01%	41,80%	15	3,45%	0,01%	$160.470,00	41,80%
16	19/3/2023	25/3/2023	5,45%	0,11%	41,91%	16	5,45%	0,11%	$1.765.173,00	41,91%
17	26/3/2023	1/4/2023	3,45%	20,09%	62,00%	17	3,45%	20,09%	$336.024.714,00	62,00%
18	2/4/2023	8/4/2023	5,45%	7,40%	69,40%	18	5,45%	7,40%	$123.775.872,00	69,40%
19	9/4/2023	15/4/2023	3,45%	3,56%	72,96%	19	3,45%	3,56%	$59.598.539,70	72,96%
20	16/4/2023	22/4/2023	3,45%	3,99%	76,95%	20	3,45%	3,99%	$66.750.452,45	76,95%
21	23/4/2023	29/4/2023	5,45%	2,25%	79,19%	21	5,45%	2,25%	$37.570.928,36	79,19%
22	30/4/2023	6/5/2023	3,45%	0,61%	79,81%	22	3,45%	0,61%	$10.211.802,94	79,81%
23	7/5/2023	13/5/2023	3,45%	1,72%	81,53%	23	3,45%	1,72%	$28.804.890,28	81,53%
24	14/5/2023	20/5/2023	5,45%	2,91%	84,44%	24	5,45%	2,91%	$48.669.997,80	84,44%
25	21/5/2023	27/5/2023	3,45%	2,88%	87,32%	25	3,45%	2,88%	$48.211.062,37	87,32%
26	28/5/2023	3/6/2023	3,45%	0,16%	87,48%	26	3,45%	0,16%	$2.727.393,79	87,48%
27	4/6/2023	10/6/2023	5,45%	0,12%	87,60%	27	5,45%	0,12%	$2.007.427,22	87,60%
28	11/6/2023	17/6/2023	3,45%	0,11%	87,71%	28	3,45%	0,11%	$1.840.141,62	87,71%
29	18/6/2023	24/6/2023	2,73%	0,39%	88,10%	29	2,73%	0,39%	$6.452.851,84	88,10%
30	25/6/2023	1/7/2023	1,45%	1,19%	89,29%	30	1,45%	1,19%	$19.908.898,62	89,29%
31	2/7/2023	8/7/2023	1,39%	1,01%	90,30%	31	1,39%	1,01%	$16.932.189,94	90,30%
32	9/7/2023	15/7/2023	1,34%	1,68%	91,98%	32	1,34%	1,68%	$28.183.106,00	91,98%
33	16/7/2023	22/7/2023	0,76%	1,39%	93,37%	33	0,76%	1,39%	$23.233.602,00	93,37%
34	23/7/2023	29/7/2023	0,84%	1,53%	94,90%	34	0,84%	1,53%	$25.550.345,00	94,90%
35	30/7/2023	5/8/2023	0,28%	2,57%	97,47%	35	0,28%	2,57%	$43.027.947,79	97,47%
36	6/8/2023	12/8/2023	0,21%	0,64%	98,11%	36	0,21%	0,64%	$10.700.636,28	98,11%
37	13/8/2023	19/8/2023	0,35%	0,17%	98,29%	37	0,35%	0,17%	$2.893.352,00	98,29%
38	20/8/2023	26/8/2023	0,00%	0,00%	98,29%	38	0,00%	0,00%	$0,00	98,29%
39	27/8/2023	2/9/2023	0,00%	0,00%	98,29%	39	0,00%	0,00%	$0,00	98,29%
40	3/9/2023	9/9/2023	0,00%	0,00%	98,29%	40	0,00%	0,00%	$0,00	98,29%
41	10/9/2023	16/9/2023	0,30%	0,33%	98,61%	41	0,30%	0,33%	$5.458.036,32	98,61%
42	17/9/2023	23/9/2023	0,42%	0,29%	98,90%	42	0,42%	0,29%	$4.865.136,70	98,90%
43	24/9/2023	30/9/2023	0,25%	0,77%	99,67%	43	0,25%	0,77%	$12.893.404,48	99,67%
44	1/10/2023	7/10/2023	0,33%	0,33%	100,00%	44	0,33%	0,33%	$5.543.683,56	100,00%

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

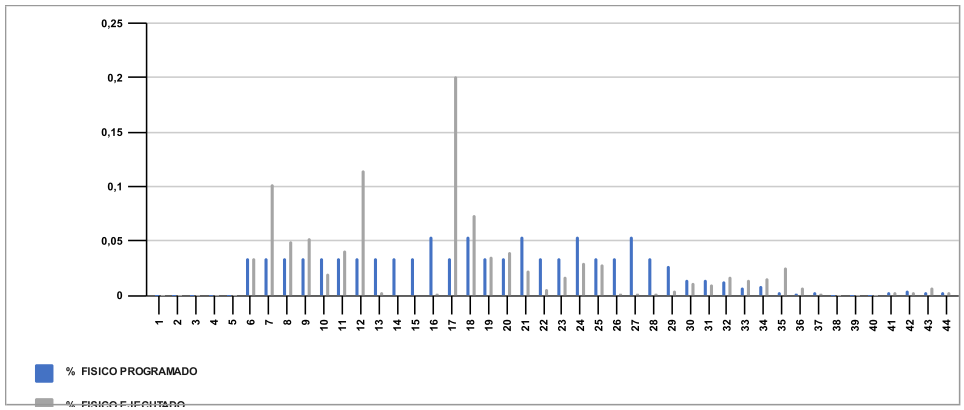

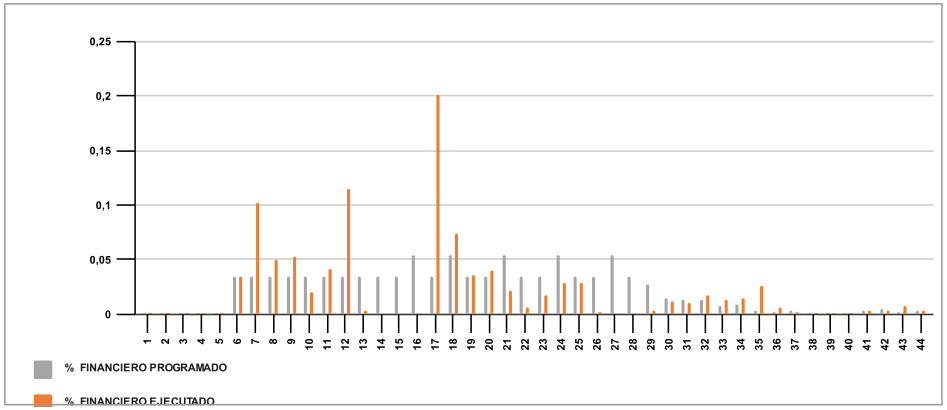

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JESUS DE NAZARETH	KR 6 #54 A - 149	2023-10-01	No se ejecutaron Actividades constructivas.	N/A
		2023-10-02	Se realizó instalación de Flashing en lamina galvanizada sobre cubierta termoacustica.	N/A
		2023-10-03	Se realizó instalación de Flashing en lamina galvanizada sobre cubierta termoacustica.	N/A
		2023-10-04	Se realizó instalación de Flashing en lamina galvanizada sobre cubierta termoacustica. se culminaron las actividades estipuladas a ejecutar en el marco del presente contrato de Obra.	N/A
		2023-10-05	se culminaron las actividades estipuladas a ejecutar en el marco del presente contrato de Obra	N/A
		2023-10-06	se culminaron las actividades estipuladas a ejecutar en el marco del presente contrato de Obra	N/A
		2023-10-07	se culminaron las actividades estipuladas a ejecutar en el marco del presente contrato de Obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**1005,47**		**1.005,47**		**$4.221**	**-**	**1.005,47**	**-**
1.02	**COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL**	DIA	**15**		**15,00**		**$454.545**	**-**	**15,00**	**-**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 44								Código:	IP-FM-31
									VERSION:	01
									FECHA:	6/9/2021
									Paginas:	1 de 1

1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	1005,47		1.005,47		$9.648	-	1.005,47	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	85,14		85,14		$116.390	-	85,14	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	45,42		45,42		$252.961	-	45,42	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1087,96		1.087,96		$20.699	-	1.087,96	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	26		26,00		$20.794	-	26,00	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	396,8		396,80		$93.507	-	396,80	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	113,215		113,21		$90.362	-	113,21	0,00
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	638,47		638,47		$49.030	-	638,47	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	589,6		589,60		$192.928	-	589,60	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	128,36		128,36		$54.171	-	128,36	0,00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	13689,05		13.689,05		$9.568	-	13.689,05	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	26,51		26,51		$894.392	-	26,51	0,00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19,05		19,05		$1.742.818	-	19,05	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	3,6		3,60		$1.894.074	-	3,60	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1015,405		1.015,40		$99.065	-	1.015,40	0,00

2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	5,14		5,14		$149.548	-	5,14	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	22,45		22,45		$513.566	-	22,45	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	823,65		823,65		$27.186	-	823,65	-
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	48,6		48,60		$48.408	-	48,60	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	549,93		549,93		$18.074	-	549,93	-
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,28		3,28		$1.933.197	-	3,28	-
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	33,44		33,44		$1.254.738	-	33,44	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	21,35		21,35		$813.350	-	21,35	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	628,92		628,92		$32.154	-	628,92	-

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 44									Código:	IP-FM-31
										VERSION:	01
										FECHA:	6/9/2021
										Paginas:	1 de 1

3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	12		12,00		$16.526	-	12,00	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	14,98		14,98		$13.644	-	14,98	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1012,14		1.012,14		$100.669	-	1.012,14	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	489,02		489,02		$39.705	-	489,02	-
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	82,2405		82,24		$15.618	-	82,24	0,00
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	13575,84		13.575,84		$24.307	-	13.575,84	-
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	399,56		399,56		$33.985	-	399,56	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	625,76		625,76		$138.761	-	625,76	-
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30 x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	13,87		13,87		$151.298	-	13,87	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	845,11		845,11		$16.524	-	845,11	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	382,75		382,75		$20.865	-	382,75	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	408,08		408,08		$32.600	-	408,08	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	308,42		308,42		$73.815	-	308,42	0,00

6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2	80,305		80,30		$77.136	-	80,30	0,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	2,34		2,34		$12.513	-	2,34	-
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	76,16		76,16		$93.422	-	76,16	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	20		20,00		$77.644	-	20,00	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	20		20,00		$67.320	-	20,00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$38.451	-	12,00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12,00		$57.053	-	12,00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	14		14,00		$32.669	-	14,00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	87,13		87,13		$323.953	-	87,13	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	43,62		43,62		$891.836	-	43,62	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	325		325,00		$57.278	-	325,00	-

9.05	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300**	UND	**97**		**97,00**		**$190.218**	**-**	**97,00**	**-**
9.10	**SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**94**		**94,00**		**$190.755**	**-**	**94,00**	**-**
9.11	**SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**9**		**9,00**		**$282.244**	**-**	**9,00**	**-**
9.13	**SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**34**		**34,00**		**$235.052**	**-**	**34,00**	**-**
9.14	**SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**5**		**5,00**		**$191.338**	**-**	**5,00**	**-**
9.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS**	ML	**75**		**75,00**		**$16.480**	**-**	**75,00**	**-**
9.20	**TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)**	ML	**48**		**48,00**		**$53.959**	**-**	**48,00**	**-**
9.21	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120**	UND	**4**		**4,00**		**$100.299**	**-**	**4,00**	**-**
9.24	**SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**9**		**9,00**		**$212.527**	**-**	**9,00**	**-**

9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	450		450,00		$18.863	-	450,00	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1,00		$550.917	-	1,00	-
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1,00		$765.112	-	1,00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	30		30,00		$24.609	-	30,00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	12		12,00		$93.368	-	12,00	-
9.34	CABLE #8 AWG LIBRE DE HALOGENO ML	ML	20		20,00		$15.260	-	20,00	-
9.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 150w Luz Blanca 12700lm no incluye salida ni alimentador.	UND	5		5,00		$455.958	-	5,00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	37		37,00		$121.310	-	37,00	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	9		9,00		$283.058	-	9,00	-
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	1		1,00		$814.922	-	1,00	-

9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	2		2,00		$282.196	-	2,00	-
9.49	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	7		7,00		$161.147	-	7,00	-
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION JABALINA VERTICAL. INCLUYE: 1 JABALINA DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-CU 9ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 25KG.	UND	1		1,00		$1.195.602	-	1,00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	340		340,00		$55.395	-	340,00	-
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS	UND	1		1,00		$175.757	-	1,00	-
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	150		150,00		$39.900	-	150,00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	120		120,00		$29.990	-	120,00	-

10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"	UND	12		12,00		$50.230	-	12,00	-
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	3		3,00		$1.488.291	-	3,00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	3		3,00		$35.397	-	3,00	-
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	80		80,00		$27.015	-	80,00	-
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASIENTO SANITARIO CONFORTO CORONA BLANCO	UND	1		1,00		$156.389	-	1,00	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	65		65,00		$58.180	-	65,00	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	4		4,00		$173.513	-	4,00	-
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH O SIMILAR	UND	4		4,00		$451.081	-	4,00	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	1		1,00		$43.887	-	1,00	-
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	3		3,00		$674.797	-	3,00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	16,32		16,32		$136.534	-	16,32	-

11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	52,74		52,74		$67.760	-	52,74	-
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	1		1,00		$1.556.196	-	1,00	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	2		2,00		$1.088.110	-	2,00	-
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	354,31		354,31		$39.320	-	354,31	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	355,73		355,73		$134.924	-	355,73	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	218,8		218,80		$39.518	-	218,80	-
NP 23	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN DRYWALL A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA INTERIOR A 3 MANOS	M2	108,51		108,51		$110.546,2	-	108,51	0,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES (45X45) HASTA (60X60) O SIMILAR	M2	16,81		16,81		$108.791,00	-	16,81	-
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA EN ALUMINIO	M2	6,73		6,73		$257.316,67	-	6,73	-
NP 86	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PARA CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	69			69	$80.343,24	5.543.683,56	69,00	-

VALOR DE OBRA	5.543.683,56
INCIDENCIA	0,33%

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JESUS DE NAZARETH No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
JESUS DE NAZARETH	**Alberto Diaz**	**Ricardo Caballero**	**Herramientas menores, Andamios**	**NO APLICA**
		Inspector Luis Mendoza		**NO APLICA**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

			
https://drive.google.com/open?id=1Gq9epeIG9f4Drcg9NU55vwTjhz		https://drive.google.com/open?id=1dIiFU9yXXY56d_9lqXij-1p1lTN-oZqs	
FOTO 1	Instalación de Flashing en lamina galvanizada	**FOTO 2**	Instalación de Flashing en lamina galvanizada

7. OBSERVACIONES

Se culminaron las actividades estipuladas a ejecutar dentro del marco del presente contrato.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero.		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUMAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.44%	0.00%	0.00%	8	2.44%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.44%	0.34%	0.34%	9	2.44%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.44%	0.93%	1.27%	10	2.44%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.44%	1.27%	2.54%	11	2.44%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.44%	0.49%	3.03%	12	2.44%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	13	2.44%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	14	2.44%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	15	2.44%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	16	2.44%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	17	2.44%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	18	2.44%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	19	2.44%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.44%	1.42%	4.45%	20	2.44%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.44%	1.16%	5.61%	21	2.44%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.44%	0.41%	6.02%	22	2.44%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.44%	0.06%	6.08%	23	2.44%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.44%	0.03%	6.11%	24	2.44%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.44%	0.08%	6.19%	25	2.44%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.44%	0.01%	6.19%	26	2.44%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.44%	0.05%	6.24%	27	2.44%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.44%	0.34%	6.57%	28	2.44%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.44%	0.40%	6.98%	29	2.44%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.44%	2.98%	9.96%	30	2.44%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.44%	3.12%	13.08%	31	2.44%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.44%	2.97%	16.05%	32	2.44%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.44%	7.40%	23.46%	33	2.44%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	5.57%	29.02%	34	2.44%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.44%	4.55%	33.57%	35	2.44%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.44%	1.50%	35.08%	36	2.44%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.44%	1.74%	36.81%	37	2.44%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.44%	1.63%	38.44%	38	2.44%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.44%	1.03%	39.47%	39	2.44%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.44%	1.62%	41.09%	40	2.44%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.44%	1.88%	42.97%	41	2.44%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.44%	1.97%	44.94%	42	2.44%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.44%	2.73%	47.67%	43	2.44%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.44%	0.76%	48.43%	44	2.44%	0.76%	$9,186,334	48.43%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

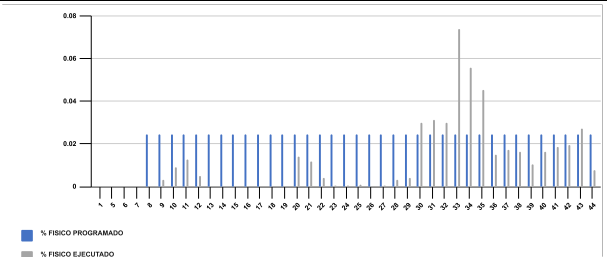

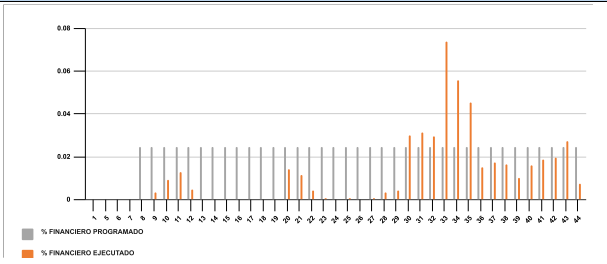

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-10-01	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-02	Fundida de viga aérea tramo 3 bloque 1. Acarreo de piedra y arena.	N/A
		2023-10-03	Fundida de viga aérea tramo 3 bloque 1. Limpieza.	N/A
		2023-10-04	Desencofrado de viga aérea tramo 3 bloque 1. Relleno de material seleccionado zapata bloque 3. Fundida de viga aérea bloque 1.	N/A
		2023-10-05	Armado de acero para viga aerea. Corte y figuración de acero para viga aerea.	N/A
		2023-10-06	Corte y figuración de acero para viga aerea. Armado de mesa para losa en concreto piso 3.	N/A
		2023-10-07	Fundida de viga aérea en bloque 1. Desencofrado de viga aérea. Orden y aseo.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.30	0.11	$192,928	21,222.08	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,235.31	194.15	$9,568	1,857,627.20	9,429.46	5,257.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		4.61	3.78	$1,933,197	7,307,484.66	8.39	14.15
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58

6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-

VALOR DE OBRA	9,186,333.94
INCIDENCIA	0.76%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=18AoHvlbU7XCF-gOYiFm72JNDzVN_miU8



https://drive.google.com/open?id=1JcFFF8vyKIZ97Wku24IFypefV4B12vlN

FOTO 1	Armado de acero para viga aérea JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Armado de mesa para losa JOSE EUSEBIO CARO

 https://drive.google.com/open?id=1Bu12lfh_FfRolI_rZTDe1v2naF8LDWSs		 https://drive.google.com/open?id=1ug_a95cOP6qzL7KlXVlWBsMVTZuEqwss	
FOTO 3	Fundida viga aérea JOSE EUSEBIO CARO	**FOTO 4**	Fundida viga aérea JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 45**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	8	AL	14

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.44%	0.00%	0.00%	8	2.44%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.44%	0.34%	0.34%	9	2.44%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.44%	0.93%	1.27%	10	2.44%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.44%	1.27%	2.54%	11	2.44%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.44%	0.49%	3.03%	12	2.44%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	13	2.44%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	14	2.44%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	15	2.44%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	16	2.44%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	17	2.44%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	18	2.44%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	19	2.44%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.44%	1.42%	4.45%	20	2.44%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.44%	1.16%	5.61%	21	2.44%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.44%	0.41%	6.02%	22	2.44%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.44%	0.06%	6.08%	23	2.44%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.44%	0.03%	6.11%	24	2.44%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.44%	0.08%	6.19%	25	2.44%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.44%	0.01%	6.19%	26	2.44%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.44%	0.05%	6.24%	27	2.44%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.44%	0.34%	6.57%	28	2.44%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.44%	0.40%	6.98%	29	2.44%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.44%	2.98%	9.96%	30	2.44%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.44%	3.12%	13.08%	31	2.44%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.44%	2.97%	16.05%	32	2.44%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.44%	7.40%	23.46%	33	2.44%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	5.57%	29.02%	34	2.44%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.44%	4.55%	33.57%	35	2.44%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.44%	1.50%	35.08%	36	2.44%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.44%	1.74%	36.81%	37	2.44%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.44%	1.63%	38.44%	38	2.44%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.44%	1.03%	39.47%	39	2.44%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.44%	1.62%	41.09%	40	2.44%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.44%	1.88%	42.97%	41	2.44%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.44%	1.97%	44.94%	42	2.44%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.44%	2.73%	47.67%	43	2.44%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.44%	0.76%	48.43%	44	2.44%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.74%	49.17%	45	2.44%	0.74%	$9,003,858	49.17%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

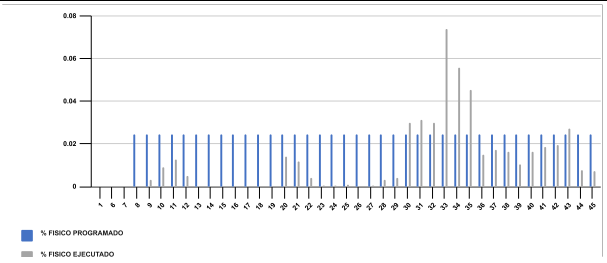

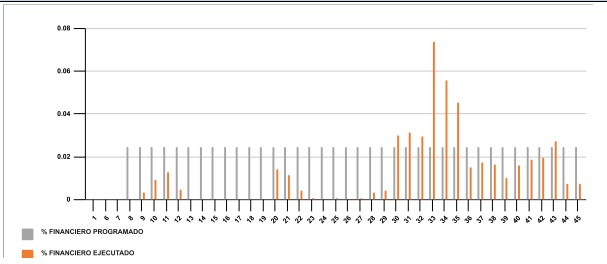

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-10-08	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-09	Corte y figuración de acero para viga aerea. Desencofrado de viga aérea. Orden y aseo.	N/A
		2023-10-10	Limpieza general. Acopio de escombros.	N/A
		2023-10-11	Limpieza general. Acopio de escombros. Desencofrado de viga aérea piso 2 bloque 1.	N/A
		2023-10-12	Limpieza general.	N/A
		2023-10-13	Desencofrado de viga aérea piso 2 bloque 1. Limpieza general.	N/A
		2023-10-14	Limpieza general. se realiza instalacion de estera metalica Acopio de formaletas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,429.46	111.61	$9,568	1,067,884.48	9,541.07	5,146.10
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		8.39	2.15	$1,933,197	4,156,373.55	10.54	12.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58

6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4			4.40	$859,000	3,779,600.00	4.40	-
							VALOR DE OBRA	9,003,858.03		
							INCIDENCIA	0.74%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1_MDyGhBFkqGv3-YSVhH-9lSLvJ3I2-1X



https://drive.google.com/open?id=1Q2MiVN_4lRFEOdCkZCVkzWs2IT5FNqVv

FOTO 1	Fundida de viga aérea JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Desencofrado de viga aérea JOSE EUSEBIO CARO

			
FOTO 3	Acopio de material RCD JOSE EUSEBIO CARO	**FOTO 4**	Orden y aseo. JOSE EUSEBIO CARO
			
FOTO 5	Instalación de cortina metalica enrollable JOSE EUSEBIO CARO	**FOTO 6**	Instalación de cortina metalica enrollable JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 46**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	15	AL	21

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.44%	0.00%	0.00%	8	2.44%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.44%	0.34%	0.34%	9	2.44%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.44%	0.93%	1.27%	10	2.44%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.44%	1.27%	2.54%	11	2.44%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.44%	0.49%	3.03%	12	2.44%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	13	2.44%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	14	2.44%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	15	2.44%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	16	2.44%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	17	2.44%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	18	2.44%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	19	2.44%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.44%	1.42%	4.45%	20	2.44%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.44%	1.16%	5.61%	21	2.44%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.44%	0.41%	6.02%	22	2.44%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.44%	0.06%	6.08%	23	2.44%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.44%	0.03%	6.11%	24	2.44%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.44%	0.08%	6.19%	25	2.44%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.44%	0.01%	6.19%	26	2.44%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.44%	0.05%	6.24%	27	2.44%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.44%	0.34%	6.57%	28	2.44%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.44%	0.40%	6.98%	29	2.44%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.44%	2.98%	9.96%	30	2.44%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.44%	3.12%	13.08%	31	2.44%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.44%	2.97%	16.05%	32	2.44%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.44%	7.40%	23.46%	33	2.44%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	5.57%	29.02%	34	2.44%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.44%	4.55%	33.57%	35	2.44%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.44%	1.50%	35.08%	36	2.44%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.44%	1.74%	36.81%	37	2.44%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.44%	1.63%	38.44%	38	2.44%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.44%	1.03%	39.47%	39	2.44%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.44%	1.62%	41.09%	40	2.44%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.44%	1.88%	42.97%	41	2.44%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.44%	1.97%	44.94%	42	2.44%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.44%	2.73%	47.67%	43	2.44%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.44%	0.76%	48.43%	44	2.44%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.74%	49.17%	45	2.44%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.44%	0.00%	49.17%	46	2.44%	0.00%	$0	49.17%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

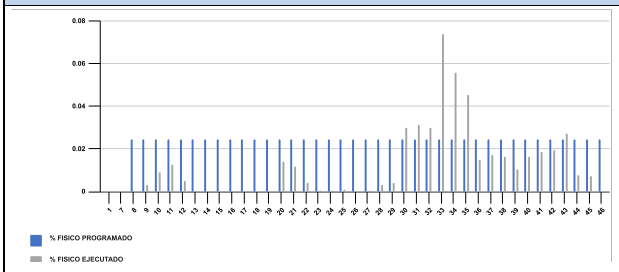

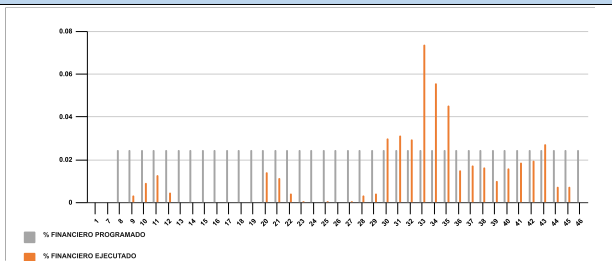

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-10-15	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-16	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-17	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-18	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-19	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-20	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-21	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,541.07		$9,568	-	9,541.07	5,146.10
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58

6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 47**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	22	AL	28

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.44%	0.00%	0.00%	8	2.44%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.44%	0.34%	0.34%	9	2.44%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	2.44%	0.93%	1.27%	10	2.44%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.44%	1.27%	2.54%	11	2.44%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.44%	0.49%	3.03%	12	2.44%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	13	2.44%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	14	2.44%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	15	2.44%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.44%	0.00%	3.03%	16	2.44%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	17	2.44%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	18	2.44%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.44%	0.00%	3.03%	19	2.44%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.44%	1.42%	4.45%	20	2.44%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.44%	1.16%	5.61%	21	2.44%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.44%	0.41%	6.02%	22	2.44%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.44%	0.06%	6.08%	23	2.44%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.44%	0.03%	6.11%	24	2.44%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.44%	0.08%	6.19%	25	2.44%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.44%	0.01%	6.19%	26	2.44%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.44%	0.05%	6.24%	27	2.44%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.44%	0.34%	6.57%	28	2.44%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.44%	0.40%	6.98%	29	2.44%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.44%	2.98%	9.96%	30	2.44%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.44%	3.12%	13.08%	31	2.44%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.44%	2.97%	16.05%	32	2.44%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.44%	7.40%	23.46%	33	2.44%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	5.57%	29.02%	34	2.44%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.44%	4.55%	33.57%	35	2.44%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.44%	1.50%	35.08%	36	2.44%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.44%	1.74%	36.81%	37	2.44%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.44%	1.63%	38.44%	38	2.44%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.44%	1.03%	39.47%	39	2.44%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.44%	1.62%	41.09%	40	2.44%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.44%	1.88%	42.97%	41	2.44%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.44%	1.97%	44.94%	42	2.44%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.44%	2.73%	47.67%	43	2.44%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.44%	0.76%	48.43%	44	2.44%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.74%	49.17%	45	2.44%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.44%	0.00%	49.17%	46	2.44%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.44%	0.00%	49.17%	47	2.44%	0.00%	$0	49.17%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

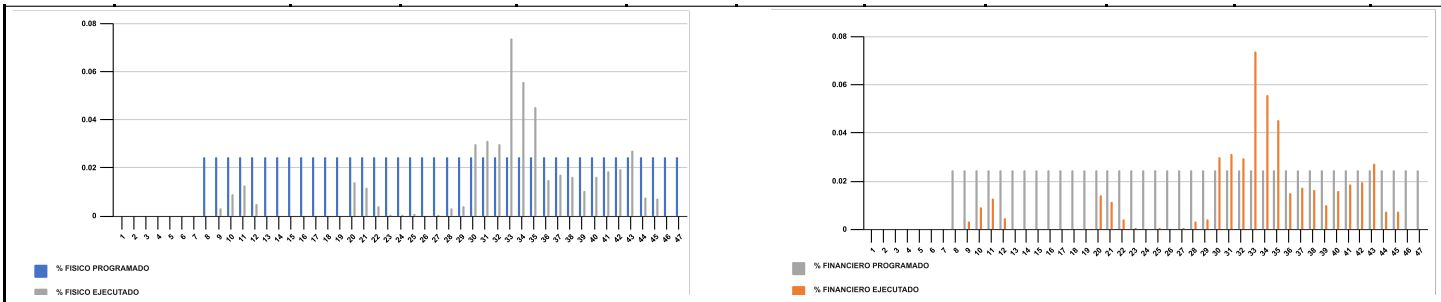

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-10-22	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-23	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-24	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-25	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-26	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-27	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-28	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,541.07		$9,568	-	9,541.07	5,146.10
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-

NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-

VALOR DE OBRA	-
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	4.12%	2.83%	2.83%	41	4.12%	2.83%	$10,624,185	2.83%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.12%	6.10%	8.93%	42	8.12%	6.10%	$22,863,434	8.93%
43	24/9/2023	30/9/2023	6.12%	5.68%	14.62%	43	6.12%	5.68%	$21,311,110	14.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	16.54%	0.00%	14.62%	44	16.54%	0.00%	$0	14.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

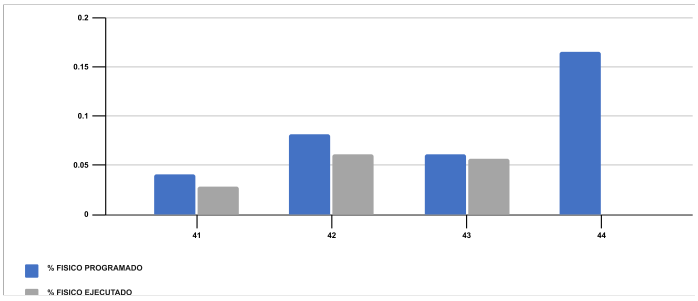

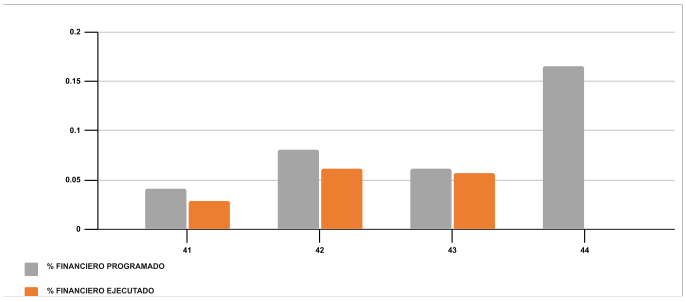

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-10-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$4,221**	**-**	**307.05**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$9,648**	**-**	**307.05**	**-**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**40**		**40.00**		**$23,673**	**-**	**40.00**	**-**

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	140		138.63		$32,154	-	138.63	1.37
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 45**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	8	AL	14

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	4.12%	2.83%	2.83%	41	4.12%	2.83%	$10,624,185	2.83%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.12%	6.10%	8.93%	42	8.12%	6.10%	$22,863,434	8.93%
43	24/9/2023	30/9/2023	6.12%	5.68%	14.62%	43	6.12%	5.68%	$21,311,110	14.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	16.54%	0.00%	14.62%	44	16.54%	0.00%	$0	14.62%
45	8/10/2023	14/10/2023	25.62%	0.00%	14.62%	45	25.62%	0.00%	$0	14.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

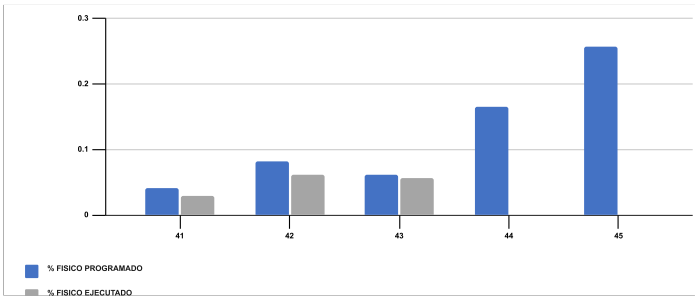

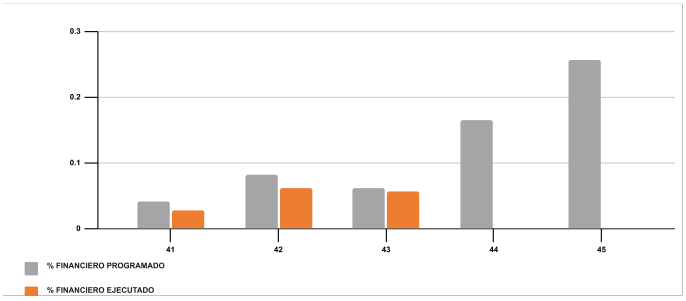

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-10-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	140		138.63		$32,154	-	138.63	1.37
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 46**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	15	AL	21

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	4.12%	2.83%	2.83%	41	4.12%	2.83%	$10,624,185	2.83%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.12%	6.10%	8.93%	42	8.12%	6.10%	$22,863,434	8.93%
43	24/9/2023	30/9/2023	6.12%	5.68%	14.62%	43	6.12%	5.68%	$21,311,110	14.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	16.54%	0.00%	14.62%	44	16.54%	0.00%	$0	14.62%
45	8/10/2023	14/10/2023	25.62%	0.00%	14.62%	45	25.62%	0.00%	$0	14.62%
46	15/10/2023	21/10/2023	24.76%	0.00%	14.62%	46	24.76%	0.00%	$0	14.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

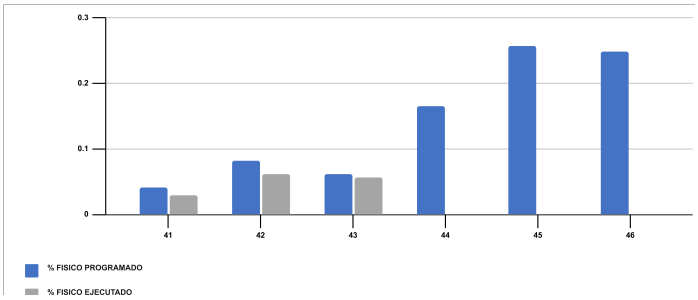

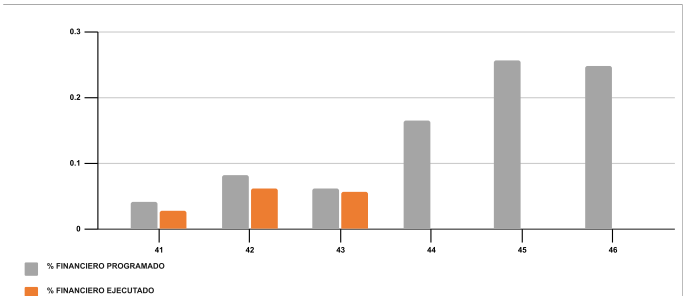

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-10-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$4,221**	**-**	**307.05**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$9,648**	**-**	**307.05**	**-**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**40**		**40.00**		**$23,673**	**-**	**40.00**	**-**

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	140		138.63		$32,154	-	138.63	1.37
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 47**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	22	AL	28

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	4.12%	2.83%	2.83%	41	4.12%	2.83%	$10,624,185	2.83%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.12%	6.10%	8.93%	42	8.12%	6.10%	$22,863,434	8.93%
43	24/9/2023	30/9/2023	6.12%	5.68%	14.62%	43	6.12%	5.68%	$21,311,110	14.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	16.54%	0.00%	14.62%	44	16.54%	0.00%	$0	14.62%
45	8/10/2023	14/10/2023	25.62%	0.00%	14.62%	45	25.62%	0.00%	$0	14.62%
46	15/10/2023	21/10/2023	24.76%	0.00%	14.62%	46	24.76%	0.00%	$0	14.62%
47	22/10/2023	28/10/2023	14.15%	0.00%	14.62%	47	14.15%	0.00%	$0	14.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

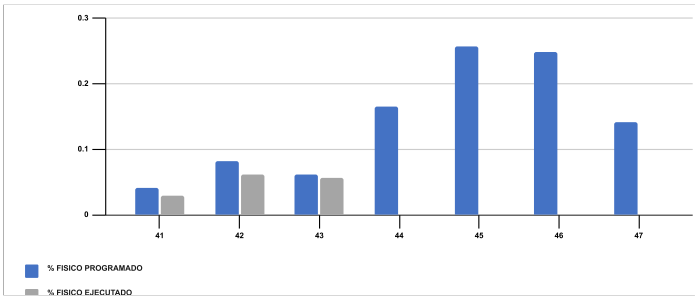

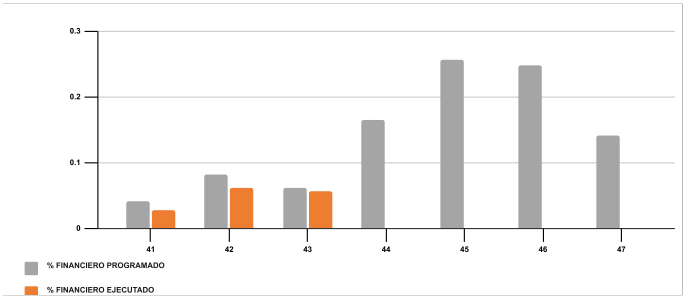

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-10-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$4,221**	**-**	**307.05**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$9,648**	**-**	**307.05**	**-**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**40**		**40.00**		**$23,673**	**-**	**40.00**	**-**

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	140		138.63		$32,154	-	138.63	1.37
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	0.12%	0.12%	11	2.63%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.79%	0.90%	12	2.63%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.82%	1.72%	13	2.63%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.78%	2.50%	14	2.63%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.78%	3.27%	15	2.63%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.39%	3.66%	16	2.63%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.39%	4.05%	17	2.63%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	4.05%	18	2.63%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.61%	4.66%	19	2.63%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	0.81%	5.47%	20	2.63%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	0.38%	5.85%	21	2.63%	0.38%	$13,861,882	5.85%

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 44								Código:	IP-FM-31
									VERSION:	01
									FECHA:	6/9/2021
									Paginas:	1 de 1

22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.83%	6.68%	22	2.63%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.31%	6.99%	23	2.63%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.75%	7.74%	24	2.63%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.20%	8.94%	25	2.63%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.79%	9.73%	26	2.63%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.80%	10.53%	27	2.63%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.45%	10.98%	28	2.63%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.53%	11.52%	29	2.63%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.63%	0.17%	11.69%	30	2.63%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.63%	2.25%	13.94%	31	2.63%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.63%	1.41%	15.35%	32	2.63%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.63%	1.22%	16.57%	33	2.63%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.63%	2.65%	19.22%	34	2.63%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.63%	1.88%	21.11%	35	2.63%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.63%	0.39%	21.50%	36	2.63%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.63%	0.29%	21.79%	37	2.63%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.63%	0.35%	22.14%	38	2.63%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.63%	0.73%	22.87%	39	2.63%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.63%	0.62%	23.49%	40	2.63%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.63%	1.29%	24.78%	41	2.63%	1.29%	$46,864,864	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.63%	1.45%	26.22%	42	2.63%	1.45%	$52,703,160	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.63%	0.82%	27.04%	43	2.63%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.63%	0.31%	27.35%	44	3.63%	0.31%	$11,136,252	27.35%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

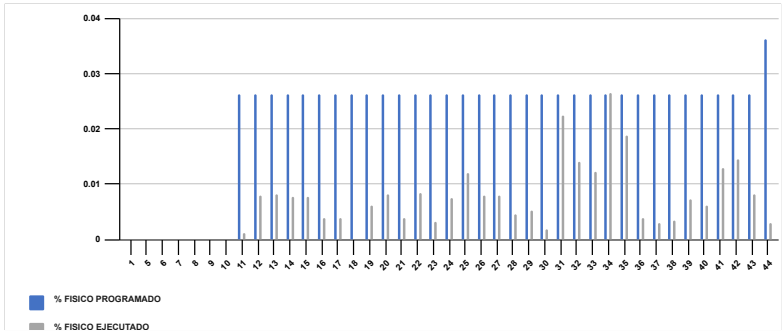

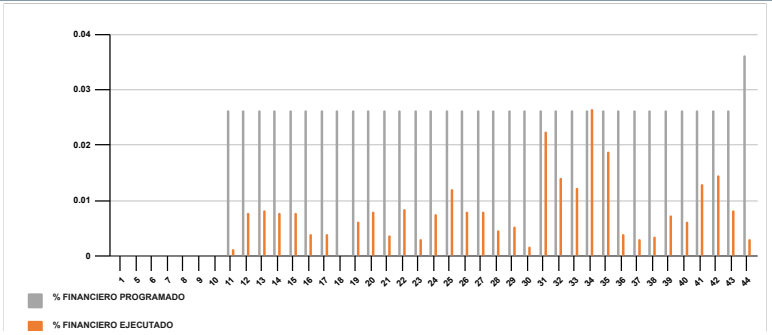

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 44	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-10-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-02	Bloque 1: Pintura de perfiles IPE en piso 2.	N/A
		2023-10-03	Bloque 1: Pintura de perfiles IPE. Retiro de material RCD en piso 3.	N/A
		2023-10-04	Visitas de edubar, interventoria, secretaria de educacion y contratistas.	N/A
		2023-10-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2717.92**		**2,717.92**		**$4,221**	**-**	**2,717.92**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**3.15**		**0.84**		**$252,961**	**$0**	**0.84**	**2.31**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**586**		**351.46**		**$20,699**	**$0**	**351.46**	**234.54**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**22.5354**		**5.92**		**$266,275**	**$0**	**5.92**	**16.62**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**1449.1**		**629.46**		**$32,124**	**$0**	**629.46**	**819.64**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**225.18**		**231.50**		**$93,507**	**$0**	**231.50**	**- 6.32**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**192.81**		**181.52**		**$34,062**	**$0**	**181.52**	**11.29**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**45405.50004**		**29,466.62**		**$9,568**	**$0**	**29,466.62**	**15,938.88**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**2690**		**2,710.80**		**$40,436**	**$0**	**2,710.80**	**- 20.80**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**139.69**		**123.91**		**$1,742,818**	**$0**	**123.91**	**15.78**
2.20	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS**	MT2	**658.168**		**200.45**		**$99,065**	**$0**	**200.45**	**457.72**
2.28	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO**	ML	**639**		**654.00**		**$18,074**	**$0**	**654.00**	**- 15.00**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**1736**		**1,074.80**		**$14,939**	**$0**	**1,074.80**	**661.20**
3.02	**DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL**	MT2	**898**		**849.12**		**$32,154**	**$0**	**849.12**	**48.88**

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		4,211.15	458.15	$24,307	11,136,252.05	4,669.30	9,690.10
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	379.33
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 44**								**Código:**	**IP-FM-31**	
									VERSION:	**01**	
									FECHA:	**6/9/2021**	
									Paginas:	**1 de 1**	
NP 19	**MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.**	ML	**259.21**		**259.21**		**$160,366**	**-**	**259.21**	**-**	**0.00**

VALOR DE OBRA	**11,136,252.05**
INCIDENCIA	**0.31%**

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA**	**INTERVENTORIA**
MAYOR DE BARRANQUILLA	**Rene Montenegro.**	**Angelo Sanchez**	**Herramientas menores, Andamios**	**NO APLICA**
			Taladro Percutor	**NO APLICA**

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=11XXB2O_PDW7FoeuAOH-coeBNKfqBz93H

FOTO 1	Pintura de perfiles MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1qKdVNdPqi39x3lHCChfA56yx-HFd-8o6

FOTO 2	Pintura de perfiles MAYOR DE BARRANQUILLA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 44**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

 https://drive.google.com/open?id=1JvLmgORm9_C0tx95U2u3OPG9JQzmnMvM		 https://drive.google.com/open?id=1u_rwL7W9OH54cVtZB6uS96w-q6jHdx8x	
FOTO 3	Retiro de material RCD MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Retiro de material RCD MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 45**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	8	AL	14

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	0.12%	0.12%	11	2.63%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.79%	0.90%	12	2.63%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.82%	1.72%	13	2.63%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.78%	2.50%	14	2.63%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.78%	3.27%	15	2.63%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.39%	3.66%	16	2.63%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.39%	4.05%	17	2.63%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	4.05%	18	2.63%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.61%	4.66%	19	2.63%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	0.81%	5.47%	20	2.63%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	0.38%	5.85%	21	2.63%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.83%	6.68%	22	2.63%	0.83%	$30,363,456	6.68%

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 45	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.31%	6.99%	23	2.63%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.75%	7.74%	24	2.63%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.20%	8.94%	25	2.63%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.79%	9.73%	26	2.63%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.80%	10.53%	27	2.63%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.45%	10.98%	28	2.63%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.53%	11.52%	29	2.63%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.63%	0.17%	11.69%	30	2.63%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.63%	2.25%	13.94%	31	2.63%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.63%	1.41%	15.35%	32	2.63%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.63%	1.22%	16.57%	33	2.63%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.63%	2.65%	19.22%	34	2.63%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.63%	1.88%	21.11%	35	2.63%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.63%	0.39%	21.50%	36	2.63%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.63%	0.29%	21.79%	37	2.63%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.63%	0.35%	22.14%	38	2.63%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.63%	0.73%	22.87%	39	2.63%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.63%	0.62%	23.49%	40	2.63%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.63%	1.29%	24.78%	41	2.63%	1.29%	$46,864,864	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.63%	1.45%	26.22%	42	2.63%	1.45%	$52,703,160	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.63%	0.82%	27.04%	43	2.63%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.63%	0.31%	27.35%	44	3.63%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.63%	0.23%	27.58%	45	2.63%	0.23%	$8,315,874	27.58%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

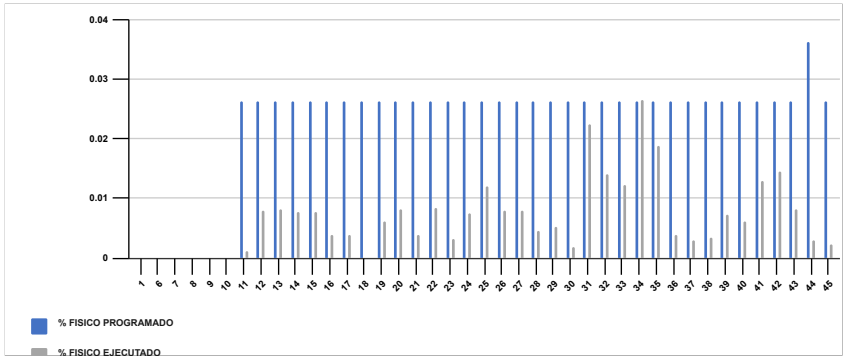

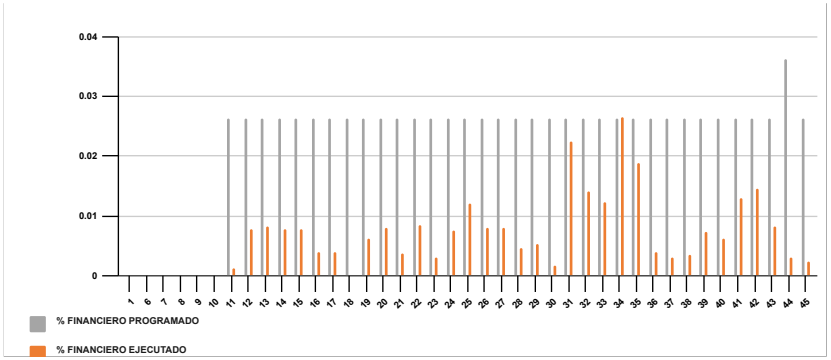

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 45	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-10-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-11	Visitas de edubar, interventoria, secretaria de educacion y contratistas.	N/A
		2023-10-12	Bloque 1: Soldadura y Pintura de perfiles IPE. Demolicion de muro.	N/A
		2023-10-13	Bloque 1: Soldadura y Pintura de perfiles IPE. Retiro de material RCD	N/A
		2023-10-14	Bloque 1: Soldadura y Pintura de perfiles IPE.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		351.46		$20,699	$0	351.46	234.54
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.92		$266,275	$0	5.92	16.62
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		629.46		$32,124	$0	629.46	819.64
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		231.50		$93,507	$0	231.50	- 6.32
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,466.62		$9,568	$0	29,466.62	15,938.88
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2690		2,710.80		$40,436	$0	2,710.80	- 20.80
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.91		$1,742,818	$0	123.91	15.78
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		654.00		$18,074	$0	654.00	- 15.00
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,074.80		$14,939	$0	1,074.80	661.20

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 45	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		849.12	3.00	$32,154	$96,462	852.12	45.88
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		4,669.30	338.15	$24,307	8,219,412.05	5,007.45	9,351.95
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	379.33
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-

NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	- 0.00

VALOR DE OBRA	8,315,874.05
INCIDENCIA	0.23%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Rene Montenegro.	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
			Taladro Percutor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1jd62h_8TJkEpCe0LmjqXyeqYO-tN1yn

FOTO 1	Pintura de perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=16xC576NwUTZoYqhqFgHELqFJWC3uWn3

FOTO 2	Soldadura de perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 45**	**Código:** **IP-FM-31** **VERSION:** **01** **FECHA:** **6/9/2021** **Paginas:** **1 de 1**



https://drive.google.com/open?id=1OVbrmYs87aagMKjQkAnWQE7ol7Vg91Iz

FOTO 3	Demolición de muro MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1IPFfniT_x7K16uwib3lKhS1k-PVAo86z

FOTO 4	Soldaduras en perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE **Angelo Sanchez**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 46**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	15	AL	21

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	**$0**	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	0.12%	0.12%	11	2.63%	0.12%	**$4,316,804**	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.79%	0.90%	12	2.63%	0.79%	**$28,578,248**	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.82%	1.72%	13	2.63%	0.82%	**$29,783,114**	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.78%	2.50%	14	2.63%	0.78%	**$28,228,801**	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.78%	3.27%	15	2.63%	0.78%	**$28,228,801**	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.39%	3.66%	16	2.63%	0.39%	**$14,112,580**	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.39%	4.05%	17	2.63%	0.39%	**$14,112,580**	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	4.05%	18	2.63%	0.00%	**$0**	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.61%	4.66%	19	2.63%	0.61%	**$22,216,692**	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	0.81%	5.47%	20	2.63%	0.81%	**$29,404,355**	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	0.38%	5.85%	21	2.63%	0.38%	**$13,861,882**	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.83%	6.68%	22	2.63%	0.83%	**$30,363,456**	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.31%	6.99%	23	2.63%	0.31%	**$11,294,914**	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.75%	7.74%	24	2.63%	0.75%	**$27,168,253**	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.20%	8.94%	25	2.63%	1.20%	**$43,713,028**	8.94%

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 46	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.79%	9.73%	26	2.63%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.80%	10.53%	27	2.63%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.45%	10.98%	28	2.63%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.53%	11.52%	29	2.63%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.63%	0.17%	11.69%	30	2.63%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.63%	2.25%	13.94%	31	2.63%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.63%	1.41%	15.35%	32	2.63%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.63%	1.22%	16.57%	33	2.63%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.63%	2.65%	19.22%	34	2.63%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.63%	1.88%	21.11%	35	2.63%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.63%	0.39%	21.50%	36	2.63%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.63%	0.29%	21.79%	37	2.63%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.63%	0.35%	22.14%	38	2.63%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.63%	0.73%	22.87%	39	2.63%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.63%	0.62%	23.49%	40	2.63%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.63%	1.29%	24.78%	41	2.63%	1.29%	$46,864,864	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.63%	1.45%	26.22%	42	2.63%	1.45%	$52,703,160	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.63%	0.82%	27.04%	43	2.63%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.63%	0.31%	27.35%	44	3.63%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.63%	0.23%	27.58%	45	2.63%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.63%	0.16%	27.73%	46	2.63%	0.16%	$5,682,734	27.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

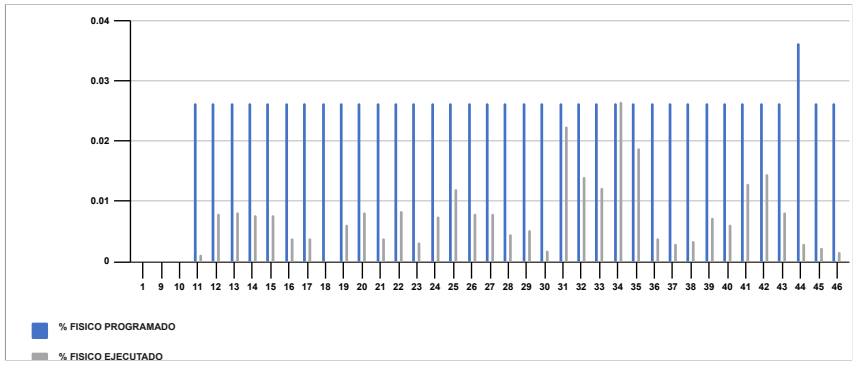

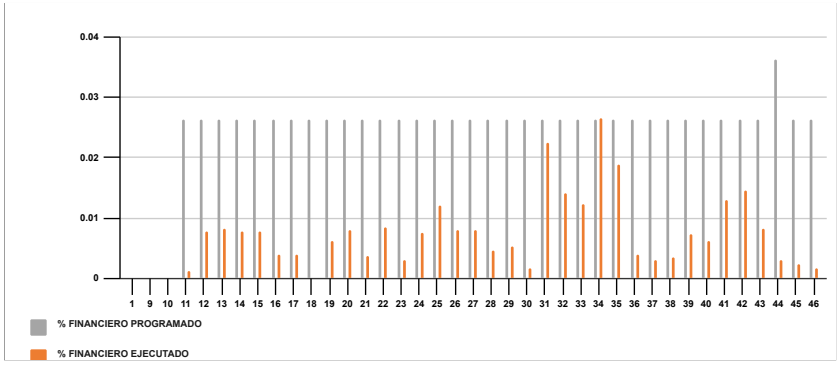

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
		2023-10-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 46**			**Código:**	**IP-FM-31**
				VERSION:	**01**
				FECHA:	**6/9/2021**
				Paginas:	**1 de 1**
MAYOR DE BARRANQUILLA	**Calle 47 -# 44-97**	2023-10-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A	
		2023-10-17	Bloque 1:Instalacion de flanches. Soldadura y Pintura de perfiles IPE.	N/A	
		2023-10-18	Visitas de edubar, interventoria, secretaria de educacion y contratistas.	N/A	
		2023-10-19	Bloque 1:Instalacion de flanches. Soldadura y Pintura de perfiles IPE.	N/A	
		2023-10-20	Bloque 1:Soldadura y Pintura de perfiles IPE.	N/A	
		2023-10-21	Bloque 1:Soldadura y Pintura de perfiles IPE.	N/A	

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2717.92**		**2,717.92**		**$4,221**	**-**	**2,717.92**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**3.15**		**0.84**		**$252,961**	**$0**	**0.84**	**2.31**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**586**		**351.46**		**$20,699**	**$0**	**351.46**	**234.54**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**22.5354**		**5.92**		**$266,275**	**$0**	**5.92**	**16.62**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**1449.1**		**629.46**		**$32,124**	**$0**	**629.46**	**819.64**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**225.18**		**231.50**		**$93,507**	**$0**	**231.50**	**- 6.32**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**192.81**		**181.52**		**$34,062**	**$0**	**181.52**	**11.29**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**45405.50004**		**29,466.62**		**$9,568**	**$0**	**29,466.62**	**15,938.88**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**2690**		**2,710.80**		**$40,436**	**$0**	**2,710.80**	**- 20.80**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**139.69**		**123.91**		**$1,742,818**	**$0**	**123.91**	**15.78**
2.20	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS**	MT2	**658.168**		**200.45**		**$99,065**	**$0**	**200.45**	**457.72**
2.28	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO**	ML	**639**		**654.00**		**$18,074**	**$0**	**654.00**	**- 15.00**
3.01	**CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	ML	**1736**		**1,074.80**		**$14,939**	**$0**	**1,074.80**	**661.20**

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		852.12		$32,154	$0	852.12	45.88
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		5,007.45	233.79	$24,307	5,682,733.53	5,241.24	9,118.16
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	379.33
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00

10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	- 0.00

VALOR DE OBRA	5,682,733.53
INCIDENCIA	0.16%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Rene Montenegro.	Angelo Sanchez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
			Taladro Percutor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1nGJnMi6vNJUbHOHKpHvZ02WSqZVXCkX



https://drive.google.com/open?id=1_69xFim0w55ySCYCW3EnAZdOGfuCjqf7

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA No. 46**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FOTO 1	Instalación de flanches MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 2**	Soldadura de perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA
	 https://drive.google.com/open?id=1Tl9sLSXbzk8LEykQ9T6ULeA-2KFj5goJ		 https://drive.google.com/open?id=124LT31Y7N5HOTPaDBZxhSP4nUkmK1tly
FOTO 3	Pintura de perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Pintura de perfiles IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 47**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**10**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	22	AL	28

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO


SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.63%	0.12%	0.12%	11	2.63%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.63%	0.79%	0.90%	12	2.63%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.63%	0.82%	1.72%	13	2.63%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.63%	0.78%	2.50%	14	2.63%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.63%	0.78%	3.27%	15	2.63%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.63%	0.39%	3.66%	16	2.63%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.63%	0.39%	4.05%	17	2.63%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.63%	0.00%	4.05%	18	2.63%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.63%	0.61%	4.66%	19	2.63%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.63%	0.81%	5.47%	20	2.63%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.63%	0.38%	5.85%	21	2.63%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.63%	0.83%	6.68%	22	2.63%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.63%	0.31%	6.99%	23	2.63%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.63%	0.75%	7.74%	24	2.63%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.20%	8.94%	25	2.63%	1.20%	$43,713,028	8.94%

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 47	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

26	28/5/2023	3/6/2023	2.63%	0.79%	9.73%	26	2.63%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.63%	0.80%	10.53%	27	2.63%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.63%	0.45%	10.98%	28	2.63%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.63%	0.53%	11.52%	29	2.63%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.63%	0.17%	11.69%	30	2.63%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.63%	2.25%	13.94%	31	2.63%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.63%	1.41%	15.35%	32	2.63%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.63%	1.22%	16.57%	33	2.63%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.63%	2.65%	19.22%	34	2.63%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.63%	1.88%	21.11%	35	2.63%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.63%	0.39%	21.50%	36	2.63%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.63%	0.29%	21.79%	37	2.63%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.63%	0.35%	22.14%	38	2.63%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.63%	0.73%	22.87%	39	2.63%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.63%	0.62%	23.49%	40	2.63%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.63%	1.29%	24.78%	41	2.63%	1.29%	$46,864,864	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.63%	1.45%	26.22%	42	2.63%	1.45%	$52,703,160	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.63%	0.82%	27.04%	43	2.63%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.63%	0.31%	27.35%	44	3.63%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.63%	0.23%	27.58%	45	2.63%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.63%	0.16%	27.73%	46	2.63%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.69%	0.00%	27.73%	47	2.69%	0.00%	$0	27.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

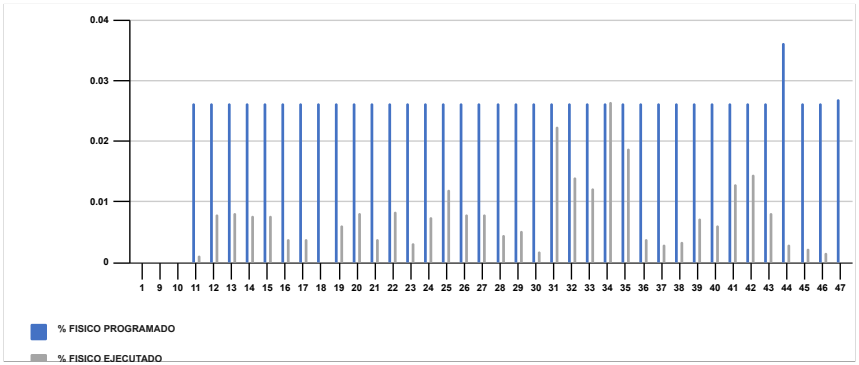

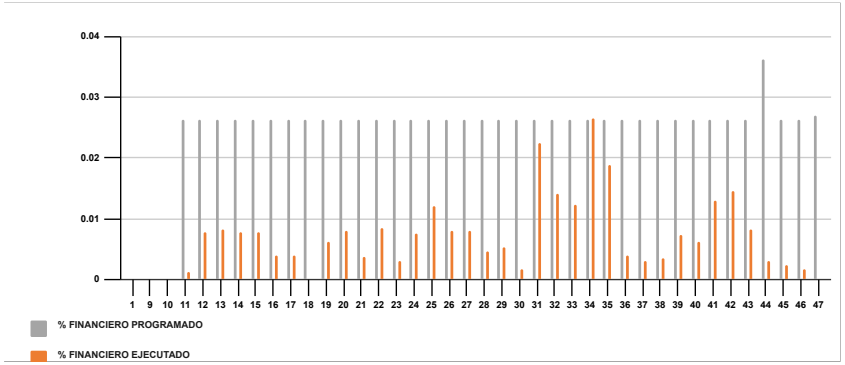

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 47	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

MAYOR DE BARRANQUILLA	Calle 47 -# 44-97	2023-10-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**2717.92**		**2,717.92**		**$4,221**	**-**	**2,717.92**	**-**
2.01	**DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.**	M3	**3.15**		**0.84**		**$252,961**	**$0**	**0.84**	**2.31**
2.02	**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m**	MT2	**586**		**351.46**		**$20,699**	**$0**	**351.46**	**234.54**
2.05	**DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL**	M3	**22.5354**		**5.92**		**$266,275**	**$0**	**5.92**	**16.62**
2.06	**ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M**	M2	**1449.1**		**629.46**		**$32,124**	**$0**	**629.46**	**819.64**
2.09	**EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA**	MT3	**225.18**		**231.50**		**$93,507**	**$0**	**231.50**	**- 6.32**
2.12	**RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO**	MT3	**192.81**		**181.52**		**$34,062**	**$0**	**181.52**	**11.29**
2.15	**ACERO DE REFUERZO FIGURADO**	KGS	**45405.50004**		**29,466.62**		**$9,568**	**$0**	**29,466.62**	**15,938.88**
2.16	**ANCLAJE EPOXICO**	UND	**2690**		**2,710.80**		**$40,436**	**$0**	**2,710.80**	**- 20.80**
2.18	**COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	MT3	**139.69**		**123.91**		**$1,742,818**	**$0**	**123.91**	**15.78**
2.20	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS**	MT2	**658.168**		**200.45**		**$99,065**	**$0**	**200.45**	**457.72**
2.28	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO**	ML	**639**		**654.00**		**$18,074**	**$0**	**654.00**	**- 15.00**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA	No. 47	Código:	IP-FM-31
			VERSION:	01
			FECHA:	6/9/2021
			Paginas:	1 de 1

3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,074.80		$14,939	$0	1,074.80	661.20
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		849.12		$32,154	$0	849.12	48.88
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		4,211.15		$24,307	-	4,211.15	10,148.25
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		730.91		$33,985	$0	730.91	523.69
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		495.11		$39,196	$0	495.11	75.49
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,150.67		$20,865	$0	1,150.67	379.33
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00

10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	- 0.00

VALOR DE OBRA	-
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Rene Montenegro.	Angelo Sanchez	N/A	NO APLICA

7. OBSERVACIONES

El contratista de Obra no dispuso de personal en campo para ejecucion de actividades contempladas dentro del marco del presente contrato.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 44	Código:	IP-FM-31
	VERSION:	01
	FECHA:	6/9/2021
	Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	10	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	1	AL	7

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.54%	6.67%	30	6.85%	6.54%	$61,521,756	6.67%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.95%	33.63%	31	9.18%	26.95%	$253,433,782	33.63%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	25.32%	58.95%	32	15.13%	25.32%	$238,102,232	58.95%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.71%	66.66%	33	14.13%	7.71%	$72,449,480	66.66%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	4.10%	70.75%	34	27.02%	4.10%	$38,520,668	70.75%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.67%	74.42%	35	2.17%	3.67%	$34,509,150	74.42%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.10%	77.52%	36	3.32%	3.10%	$29,133,887	77.52%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.74%	80.26%	37	4.14%	2.74%	$25,746,376	80.26%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.22%	3.50%	83.76%	38	4.22%	3.50%	$32,928,405	83.76%
39	27/8/2023	2/9/2023	4.27%	3.51%	87.27%	39	4.27%	3.51%	$33,009,530	87.27%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	3.01%	90.28%	40	2.04%	3.01%	$28,267,485	90.28%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.10%	92.38%	41	1.59%	2.10%	$19,760,126	92.38%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.66%	2.38%	94.76%	42	1.66%	2.38%	$22,353,123	94.76%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.12%	2.86%	97.62%	43	2.12%	2.86%	$26,924,978	97.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.38%	98.00%	44	0.74%	0.38%	$3,583,897	98.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

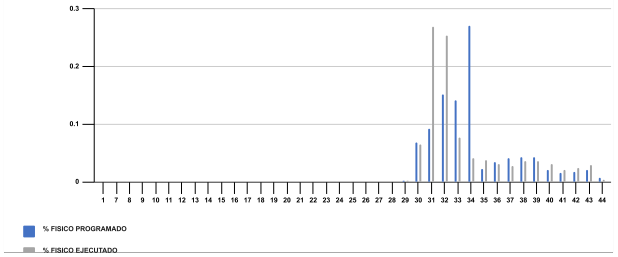

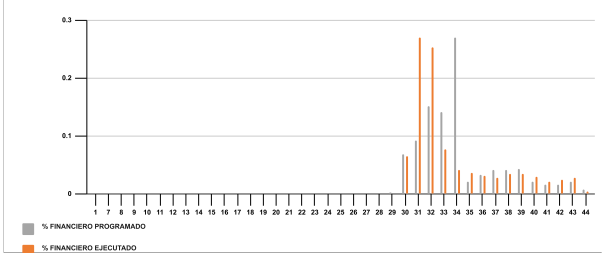

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-10-01	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-10-02	Pintura en aulas del piso 3. Instalación de luminaria, tomacorrientes, interruptores del piso #3. Demolición de plantilla en concreto y retiro de material (viga canal)	N/A
		2023-10-03	Demolición de plantilla en concreto y retiro de material (viga canal). Levante de muro en bloque vibrado.	N/A
		2023-10-04	Acopio y retiro de residuos. Levante de muro en bloque (viga canal). Suministro e instalación de tablón vitrificado para exterior en entrada de auditorio piso 1.	N/A
		2023-10-05	Suministro e instalación de tablón vitrificado para exterior en entrada de auditorio piso 1. Pañete exterior allanado con material impermeabilizado (viga canal)	N/A
		2023-10-06	Pañete exterior allanado con mortero, impermeabilizado (viga canal). Instalación de canal tipo amazonas pvc en piso 2. Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Acopio de residuos.	N/A
		2023-10-07	Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Acopio de residuos. Pañete exterior allanado con mortero, impermeabilizado (viga canal). Acopio de residuos.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	926.47		926.47		$9,648	-	926.47	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	18.74		-	18.74	$20,699	387,899.26	18.74	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,458.19		$9,568	-	1,458.19	-
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	124.8		124.80		$100,669	-	124.80	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	14.82		-	14.82	$60,337	894,194.34	14.82	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	14.82		-	14.82	$27,794	411,907.08	14.82	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	796.53		796.53		$138,761	-	796.53	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML	14.93		-	9.12	$90,800	828,096.00	9.12	5.81
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.53		796.53		$34,014	-	796.53	-


6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		1,121.88		$17,948	-	1,121.88	223.12
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,075.20	38.15	$17,384	663,199.60	1,113.35	100.85
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		46.68		$20,720	-	46.68	14.08
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	5.4		-	5.40	$73,815	398,601.00	5.40	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	48.11		48.11		$77,644	-	48.11	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	903.47		903.47		$67,320	-	903.47	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	20.07		20.07		$323,953	-	20.07	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	160		160.00		$190,218	-	160.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	90		90.00		$40,541	-	90.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	147		147.00		$27,090	-	147.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	79		79.00		$235,052	-	79.00	-
9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		6.00		$191,338	-	6.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	240.5		240.50		$16,480	-	240.50	-
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		2.00		$872,036	-	2.00	-

9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	5		5.00		$100,299	-	5.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	16		16.00		$212,527	-	16.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	562.6		562.60		$18,863	-	562.60	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	27		27.00		$24,609	-	27.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND	2		2.00		$447,467	-	2.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	117.5		117.50		$121,310	-	117.50	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	176		176.00		$283,058	-	176.00	-
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	1		1.00		$814,922	-	1.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	547.6		547.60		$55,395	-	547.60	-
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS	UND	2		2.00		$175,757	-	2.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	174		174.00		$29,990	-	174.00	-
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	200		200.00		$39,320	-	200.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1075.2		1,075.20		$6,641	-	1,075.20	-

VALOR DE OBRA	3,583,897.28
INCIDENCIA	0.38%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

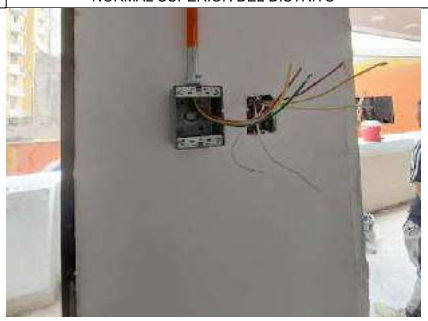 https://drive.google.com/open?id=1fapgw0enWOvxeGu-P_6hEmMFlAv		 https://drive.google.com/open?id=1xqaNRt29AOM8wD1VuZsMOxkHoPHOBqI	
FOTO 1	Pintura en vinilo para muro interior NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	**FOTO 2**	Pañete exterior impermeabilizado NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO
 https://drive.google.com/open?id=1c0pTUTiePVW8E2lv2YIARFswH3oI		 https://drive.google.com/open?id=1l41VnS7A_aJM6hH0pLVw7tz-DPZFHOnL	
FOTO 3	Instalación de luminaria, tomacorrientes e interruptores NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	**FOTO 4**	Instalación de canal PVC NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 45	Código:	IP-FM-31
	VERSION:	01
	FECHA:	6/9/2021
	Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	10	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	8	AL	14

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.54%	6.67%	30	6.85%	6.54%	$61,521,756	6.67%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.95%	33.63%	31	9.18%	26.95%	$253,433,782	33.63%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	25.32%	58.95%	32	15.13%	25.32%	$238,102,232	58.95%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.71%	66.66%	33	14.13%	7.71%	$72,449,480	66.66%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	4.10%	70.75%	34	27.02%	4.10%	$38,520,668	70.75%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.67%	74.42%	35	2.17%	3.67%	$34,509,150	74.42%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.10%	77.52%	36	3.32%	3.10%	$29,133,887	77.52%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.74%	80.26%	37	4.14%	2.74%	$25,746,376	80.26%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.22%	3.50%	83.76%	38	4.22%	3.50%	$32,928,405	83.76%
39	27/8/2023	2/9/2023	4.27%	3.51%	87.27%	39	4.27%	3.51%	$33,009,530	87.27%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	3.01%	90.28%	40	2.04%	3.01%	$28,267,485	90.28%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.10%	92.38%	41	1.59%	2.10%	$19,760,126	92.38%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.66%	2.38%	94.76%	42	1.66%	2.38%	$22,353,123	94.76%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.12%	2.86%	97.62%	43	2.12%	2.86%	$26,924,978	97.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.38%	98.00%	44	0.74%	0.38%	$3,583,897	98.00%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.26%	0.31%	98.31%	45	0.26%	0.31%	$2,927,776	98.31%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

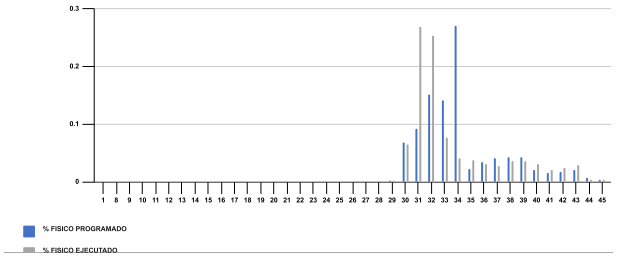

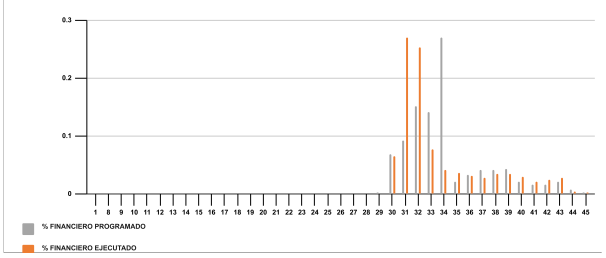

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-10-08	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-10-09	Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Pañete exterior allanado , impermeabilizado (viga canal). Pintura exterior en vinilo tipo coraza, sobre muro (pintura de zócalos en piso 3)	N/A
		2023-10-10	Pintura exterior en vinilo tipo coraza, sobre muro (pintura de zócalos en piso 3). Pañete exterior allanado , impermeabilizado (viga canal). Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Plantilla de piso en mortero impermeabilizado (viga canal)	N/A
		2023-10-11	Plantilla de piso en mortero impermeabilizado (viga canal). Pintura en vinilo para muro interior piso 3.	N/A
		2023-10-12	Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Pintura exterior en vinilo tipo coraza (pintura de zócalos en piso 3). Impermeabilizacion con manto edil o similar de 3 mm acabado en pintura bituminosa viga canal.	N/A
		2023-10-13	Impermeabilizacion con manto edil o similar de 3 mm acabado en pintura bituminosa viga canal. pintura de zócalos en piso 3. Acopio de residuos.	N/A
		2023-10-14	Limpieza general de obra. Acopio de residuos y retiro de material.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	926.47		926.47		$9,648	-	926.47	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	18.74		18.74		$20,699	-	18.74	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,458.19		$9,568	-	1,458.19	-
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	124.8		124.80		$100,669	-	124.80	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	14.82		14.82		$60,337	-	14.82	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	14.82		14.82		$27,794	-	14.82	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	796.53		796.53		$138,761	-	796.53	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML	14.93		9.12		$90,800	-	9.12	5.81
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		-	25.00	$59,248	1,481,200.00	25.00	-

5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.53		796.53		$34,014	-	796.53	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		1,121.88		$17,948	-	1,121.88	223.12
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,113.35	51.14	$17,384	889,017.76	1,164.49	49.71
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		46.68	3.12	$20,720	64,646.40	49.80	10.96
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	25		-	15.12	$32,600	492,912.00	15.12	9.88
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	5.4		5.40		$73,815	-	5.40	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	48.11		48.11		$77,644	-	48.11	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	903.47		903.47		$67,320	-	903.47	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	20.07		20.07		$323,953	-	20.07	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	160		160.00		$190,218	-	160.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	90		90.00		$40,541	-	90.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	147		147.00		$27,090	-	147.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	79		79.00		$235,052	-	79.00	-
9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		6.00		$191,338	-	6.00	-

9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	240.5		240.50		$16,480	-	240.50	-
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		2.00		$872,036	-	2.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	5		5.00		$100,299	-	5.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	16		16.00		$212,527	-	16.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	562.6		562.60		$18,863	-	562.60	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	27		27.00		$24,609	-	27.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND	2		2.00		$447,467	-	2.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	117.5		117.50		$121,310	-	117.50	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	176		176.00		$283,058	-	176.00	-
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	1		1.00		$814,922	-	1.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	547.6		547.60		$55,395	-	547.60	-
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS	UND	2		2.00		$175,757	-	2.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	174		174.00		$29,990	-	174.00	-
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	200		200.00		$39,320	-	200.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1075.2		1,075.20		$6,641	-	1,075.20	-

VALOR DE OBRA	2,927,776.16
INCIDENCIA	0.31%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Tronzadora, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1fuCyDNt4dsI1Pa0lhAyVAo5_kbSI-pl

FOTO 1	Pintura en vinilo para muro interior NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1RkvaxY23pZ0_IsBFBXI41bOI7Kv3blym

FOTO 2	Pañete exterior impermeabilizado NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1le1oDvJPDPXNRIOGEFdIQTOPDRM

FOTO 3	Pintura exterior tipo coraza NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1aPVRGOBNHDLHQHUDpSBhqWDqNkd1u

FOTO 4	Plantilla de piso impermeabilizado NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 46	Código:	IP-FM-31
	VERSION:	01
	FECHA:	6/9/2021
	Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	10	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	15	AL	21

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.54%	6.67%	30	6.85%	6.54%	$61,521,756	6.67%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.95%	33.63%	31	9.18%	26.95%	$253,433,782	33.63%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	25.32%	58.95%	32	15.13%	25.32%	$238,102,232	58.95%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.71%	66.66%	33	14.13%	7.71%	$72,449,480	66.66%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	4.10%	70.75%	34	27.02%	4.10%	$38,520,668	70.75%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.67%	74.42%	35	2.17%	3.67%	$34,509,150	74.42%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.10%	77.52%	36	3.32%	3.10%	$29,133,887	77.52%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.74%	80.26%	37	4.14%	2.74%	$25,746,376	80.26%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.22%	3.50%	83.76%	38	4.22%	3.50%	$32,928,405	83.76%
39	27/8/2023	2/9/2023	4.27%	3.51%	87.27%	39	4.27%	3.51%	$33,009,530	87.27%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	3.01%	90.28%	40	2.04%	3.01%	$28,267,485	90.28%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.10%	92.38%	41	1.59%	2.10%	$19,760,126	92.38%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.66%	2.38%	94.76%	42	1.66%	2.38%	$22,353,123	94.76%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.12%	2.86%	97.62%	43	2.12%	2.86%	$26,924,978	97.62%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.38%	98.00%	44	0.74%	0.38%	$3,583,897	98.00%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.26%	0.31%	98.31%	45	0.26%	0.31%	$2,927,776	98.31%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.76%	1.57%	99.88%	46	0.76%	1.57%	$14,752,752	99.88%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

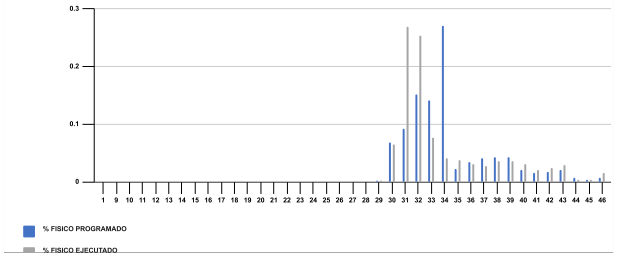

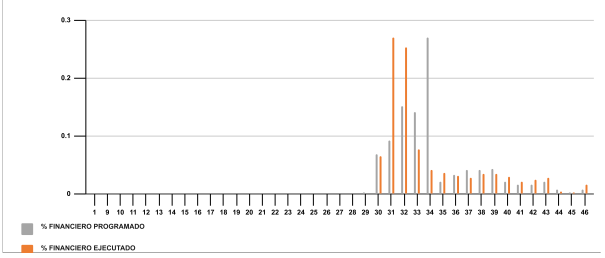

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-10-15	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-10-16	Pintura de zócalos en piso 3. Plantilla de piso en mortero impermeabilizado (viga canal). Instalación de flashing en lámina galvanizada para cubierta termoacustica.	N/A
		2023-10-17	Pintura de zócalos en piso 3. Instalación de flashing en lámina galvanizada para cubierta termoacustica. Acopio de residuos. Pintura en vinilo para muro interior piso 3.	N/A
		2023-10-18	Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Pintura de zócalos en piso 3. Instalación de flashing en lámina galvanizada para cubierta termoacustica.	N/A
		2023-10-19	Instalación de canal tipo amazonas pvc en piso 2. Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Pintura de zócalos en piso 3. limpieza y acopio de residuos.	N/A
		2023-10-20	Pintura en vinilo para muro interior piso 3. Pintura de zócalos en piso 3. Mantenimiento de ventanas en piso 2.	N/A
		2023-10-21	Pintura de zócalos en piso 3. Mantenimiento de ventanas en piso 2.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	926.47		926.47		$4,221	-	926.47	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	926.47		926.47		$9,648	-	926.47	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	18.74		18.74		$20,699	-	18.74	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,458.19		$9,568	-	1,458.19	-
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	124.8		124.80		$100,669	-	124.80	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	14.82		14.82		$60,337	-	14.82	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	14.82		14.82		$27,794	-	14.82	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	796.53		796.53		$138,761	-	796.53	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML	14.93		9.12	5.81	$90,800	527,548.00	14.93	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		25.00		$59,248	-	25.00	-

5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.53		796.53		$34,014	-	796.53	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1345		1,121.88		$17,948	-	1,121.88	223.12
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,164.49	49.71	$17,384	864,158.64	1,214.20	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		49.80	4.12	$20,720	85,366.40	53.92	6.84
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	25		15.12	9.88	$32,600	322,088.00	25.00	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	5.4		5.40		$73,815	-	5.40	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	48.11		48.11		$77,644	-	48.11	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	903.47		903.47		$67,320	-	903.47	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	20.07		20.07		$323,953	-	20.07	-
7.07	MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA	M2	55.68		-	10.15	$37,426	379,873.90	10.15	45.53
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	160		160.00		$190,218	-	160.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	90		90.00		$40,541	-	90.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	147		147.00		$27,090	-	147.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	79		79.00		$235,052	-	79.00	-

9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		6.00		$191,338	-	6.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	240.5		240.50		$16,480	-	240.50	-
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		2.00		$872,036	-	2.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	5		5.00		$100,299	-	5.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	16		16.00		$212,527	-	16.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	562.6		562.60		$18,863	-	562.60	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	27		27.00		$24,609	-	27.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND	2		2.00		$447,467	-	2.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	117.5		117.50		$121,310	-	117.50	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	176		176.00		$283,058	-	176.00	-
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	1		1.00		$814,922	-	1.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	547.6		547.60		$55,395	-	547.60	-
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS	UND	2		2.00		$175,757	-	2.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	174		174.00		$29,990	-	174.00	-
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	200		200.00		$39,320	-	200.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1075.2		1,075.20		$6,641	-	1,075.20	-
