Barranquilla, 31 de octubre de 2023 **CIED-2023-156**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Corrección de informe mensual 7

Estimados Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos remitir las correcciones del informe mensual N°7

Permanecemos atentos a sus comentarios y/o inquietudes.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo: Informe Mensual N°7

Barranquilla, 7 de noviembre de 2023 **CIED-2023-157**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Corrección de informe tecnico 9

Estimados Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos remitir los comentarios con respecto al INFORME TECNICO 9 allegado a esta interventoría, solicitamos remitir los anexos faltantes para poder llevar a cabo la revisión de las actividades ejecutadas en el periodo.

Permanecemos atentos a sus comentarios y/o inquietudes.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo: Informe Tecnico 9

Barranquilla, 14 de noviembre de 2023 **CIED-2023-159**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME TECNICO 9

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, una vez revisada la información allegada a esta interventoría, nos permitimos remitir las correcciones encontradas en el INFORME TECNICO 9.

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe técnico 9

Barranquilla, 14 de noviembre de 2023 **CIED-2023-160**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud Documentación IED José Eusebio Caro

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones de seguimiento como interventores al Contrato de Obra EDU-345-2022, nos permitimos solicitar de manera perentoria el diseño de la cubierta contemplada a intervenir en la IED José Eusebio Caro.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en cumplimiento a las condiciones contractuales y a las obligaciones adquiridas por parte del Contratista de Obra, se le solicita que se remita la información requerida en un plazo no mayor a 3 días hábiles, una vez recibido el presente comunicado.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 15 de noviembre de 2023 **CIED-2023-161**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
Cristian Jiménez Yejas

Ref. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Medidas a tomar colegio Mayor de Barranquilla

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones como interventoría al contrato en referencia, nos permitimos comedidamente solicitar reporte de medidas tomadas en relación a los hurtos reportados en la IED Mayor de Barranquilla.

Como es de su conocimiento, han sido reportados hurtos dentro de la institución educativa en ocasión a la suspensión de actividades de obra, sobre la cual, aun ante reiterados llamados, no han sido reportadas las medidas o plan de choque frente a la situación del frente. Esta situación no solo afecta directamente el progreso de la obra, sino que también representa un riesgo para la integridad de nuestro equipo y personal.

Es menester destacar que la responsabilidad sobre la seguridad y la integridad de las obra fue dada al Contratista de Obra, que ha tenido disposición total de los espacios de la institución educativa, siendo este último poseedor actual de las llaves que permiten ingreso a la institución y a los espacios dentro de esta, por lo cual velar por la integridad de la misma y mantener sus equipos y personal en función permanentemente resulta una obligación dentro de la gestión de la construcción en este frente. Es por esta razón que, solicitamos tomar las medidas para subsanar lo anterior y prevenir futuros incidentes de vandalismo.

Le solicitamos amablemente que considere las siguientes acciones para mejorar la seguridad en la zona de construcción:

1. Reforzar las medidas de vigilancia y control dentro del área de la obra, especialmente durante las horas no laborales.
2. Establecer un sistema de acceso controlado que impida el ingreso no autorizado.
3. Establecer una comunicación estrecha y colaborativa con las autoridades locales para coordinar acciones conjuntas de seguridad.

De manera similar, considerando los plazos hábiles de ejecución de obra, así como los bajos rendimientos de obra en el frente de trabajo, les solicitamos remitir plan de contingencia para dicho frente, con el fin de establecer una ruta de avance para las actividades restantes en el frente.

Agradecemos de antemano su atención y cooperación en este asunto tan importante. Esperamos poder contar con su apoyo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la obra de construcción en el Colegio Mayor de Barranquilla.

Atentamente,



Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 15 de noviembre de 2023 **CIED-2023-162**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
Cristian Jiménez Yejas

Ref. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud de plan de contingencia sobre el avance de obra en IED Jose Eusebio Caro e IED Reuven Feuerstein

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones como interventoría al contrato en referencia, nos permitimos comedidamente solicitar reporte de medidas tomadas en relación a los avances de obra en actividades pendientes en IED Reuven F e IED Jose Eusebio Caro.

Como es de su conocimiento, ambas instituciones se encuentran actualmente en proceso de ejecución de obras de infraestructura, las cuales tienen como objetivo mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios educativos, sin embargo, dadas las circunstancias y los posibles contratiempos que pueden surgir durante el proceso de construcción, consideramos fundamental contar con un plan de contingencia que nos permita anticipar y manejar eficientemente cualquier eventualidad o retraso que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Por lo tanto, mediante la presente, solicitamos respetuosamente que se nos proporcione un plan de contingencia detallado, el cual contempla las siguientes consideraciones:

- Identificación de posibles riesgos y contratiempos que podrían surgir durante la ejecución de las obras.
- Acciones y medidas preventivas para minimizar los impactos negativos en el avance de las actividades académicas y en la seguridad de los estudiantes y personal docente.
- Procedimientos claros y protocolos de comunicación para notificar y manejar eficientemente cualquier incidente o retraso que se presente.
- Asignación de responsabilidades específicas a los actores involucrados en la ejecución de las obras y en el seguimiento del plan de contingencia.
- Cronograma actualizado que refleje los plazos estimados de finalización de las obras, considerando los posibles retrasos y las acciones correctivas planificadas.

La finalidad de este plan de contingencia es asegurar que la comunidad educativa de las IED Jose Eusebio Caro e IED Reuven Feuerstein pueda realizar sus actividades académicas de manera segura y sin mayores inconvenientes durante el periodo de ejecución de las obras, especialmente considerado los rendimientos obtenidos a la fecha, y los plazos hábiles de ejecución de obra.

Solicitamos tomar precauciones, sobre humedades evidenciadas en losa de entrepiso en IED Jose Eusebio Caro como parte de las medidas





Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y su pronta respuesta. Confiamos en su gestión para garantizar un adecuado plan de contingencia.

Atentamente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 15 de noviembre de 2023 **CIED-2023-163**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME TECNICO 10

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, una vez revisada la información allegada a esta interventoría, nos permitimos remitir las correcciones encontradas en el INFORME TECNICO 10.

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe técnico 10

Barranquilla, 21 de noviembre de 2023 **CIED-2023-164**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: CORRECCIONES INFORME TECNICO 10

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, una vez revisada la información allegada a esta interventoría, nos permitimos remitir las correcciones encontradas en el INFORME TECNICO 10.

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe técnico 10

Barranquilla, 23 de noviembre de 2023 **CIED-2023-165**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Revisión Análisis de Precios Unitarios - IED Mayor de Barranquilla.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones de seguimiento como interventores al Contrato de Obra EDU-345-2022, nos permitimos contestar al comunicado CED-162-2023*: Solicitud revisión, análisis y aprobación del análisis unitario no previstos en el contrato* del 22 de noviembre de 2023. En tal sentido se solicita remitir cotizaciones acordes a los materiales planteados a implementar, debido a que la documentación adjuntada al comunicado anteriormente mencionado resulta insuficiente para el análisis de lo solicitado.

Recordamos que es preciso presentar respaldo del estudio de mercado realizado relacionando mínimo tres (3) cotizaciones del producto. Igualmente, en ocasión de no encontrar la referencia requerida, es preciso contemplar referencias de anclajes con especificaciones similares en el mercado local, el cual deberá ir soportado mediante un estudio de mercado con mínimo tres (3) cotizaciones por insumo.

Lo anterior en virtud de la incidencia presupuestal que supone el ajustar el valor por anclaje. Recordamos que modificar el recurso contemplado para el frente de trabajo, significa un impacto presupuestal en otros frentes objeto del contrato, por lo cual debe procurarse mantener el valor del recurso presupuestado a este frente. De no lograr abordar la actividad dentro del recurso presupuestado, deberá presentarse balance de las cantidades y recursos de este frente, donde se debe mantener el valor presupuestado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en cumplimiento a las condiciones contractuales y a las obligaciones adquiridas por parte del Contratista de Obra, se le solicita que se remita la información requerida en un plazo no mayor a 1 día hábil, una vez recibido el presente comunicado.

Sin otro particular, les solicitamos actuar con celeridad sobre lo encomendado, así como levantar de forma inmediata el abandono sobre el frente de trabajo, según ha sido solicitado en reiteradas ocasiones.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 27 de noviembre de 2023 **CIED-2023-166**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°9

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras funciones como interventoría, nos permitimos remitir el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°9 con sus respectivos anexos.

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 9

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-167**

SEÑORES
EDUBAR S.A.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Pólizas Actualizadas

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos remitir copia de las pólizas actualizadas según Prorroga #3 al contrato en referencia.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. atentos a cualquier inquietud al respecto.

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-168**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Respuesta Concepto Hidráulico

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos comedidamente solicitar se remita informe hidráulico en el cual se ofrezca mayor claridad sobre las alternativas y soluciones propuestas para diseño hidráulico para IED Inocencio Chinca. Lo anterior en virtud del comunicado CED-161-2023, recibido relacionando la respuesta del diseñador encargado sobre las observaciones realizadas en el frente en cuestión.

Es menester destacar que lo relacionado en el informe remitido, sugiere de manera reiterada, la falta de información para los ajustes del mismos diseño, no obstante, es preciso recordar que el ajuste de los mismo fue adelantado por la firma contratista, CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL, por lo cual, en calidad de supervisores a la ejecución de la obra contratada, les solicitamos adelantar los levantamientos y diseños a los que haya lugar, con el fin de subsanar y proveer soluciones a este diseño.

Sin otro particular, les solicitamos remitir, en plazo no superior a cinco (5) días hábiles, plan de choque sobre este frente, considerando para este la programación y jornadas de inspección, plazos de ajuste de diseños, y fechas de entrega de los anexos con el fin de verificar y validar la ejecución de los mismos.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. atentos a cualquier inquietud al respecto.

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-169**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración Diseño de Cubierta José E. Caro

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos reiterar requerimiento sobre diseño de cubierta para IED Jose Eusebio Caro.

Recordamos que los diseños requeridos son indispensables para el correcto desarrollo de la construcción, por lo cual solicitamos remitir lo indicado en plazo máximo de tres (3) días calendario a partir del recibo del mismo.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. atentos a cualquier inquietud al respecto.

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-170**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Reiteración Envío de Programación

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos reiterar requerimiento remitido en solicitud de entrega de programación proyectada para la toma de detalles en IED Carrizal.

Recordamos que esta es necesaria para verificar el avance y corrección sobre los detalles evidenciados, por lo cual solicitamos remitir la misma con las evidencias de cumplimiento de este compromiso en plazo no superior a dos (2) días calendario.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-171**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Traslado Comunicado Jose E. Caro

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos hacer traslado del comunicado recibido con asunto: Demoras en las Obras de intervención de la IED JOSE EUSEBIO CARO.

Solicitamos se de respuesta al mismo de manera inmediata con plan de contingencia sobre el frente en referencia.

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023 **CIED-2023-172**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud de Informe de estado Estructural Mayor de Barranquilla

Estimado Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos comedidamente hacer solicitud de remisión de informe sobre las condiciones estructurales de cada elemento fundido en IED Mayor de Barranquilla.

Lo anterior en ocasión a los bajos ritmos de trabajo alcanzados en los periodos recientes, donde se ha evidenciado una disminución importante en los rendimientos esperados, pendientes aún por subsanar, así como hurto de equipos de apuntalamiento los cuales no han sido repuestos a la fecha.

Así las cosas, considerando que para garantizar la estabilidad y calidad de la obra era requerido el estricto cumplimiento del cronograma establecido, donde el avance estructural debia cumlirse en ritmo uniforme, asegurando la correcta transmisión de cargas y comportamiento estructural, solicitamos se haga inspección de los elementos estructurales en cumplimiento de las obligaciones que les asisten como garantes de la calidad y estabilidad de la obra, realizando evaluación del estado actual de la Institución educativa y verificando la calidad de los elementos fundidos.

Se solicita remitir la programación de esta actividad, así como cronograma de trabajo sobre este frente de manera inmediata

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 7 de noviembre de 2023

CED-159-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO IP-01040

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado IP-01040 se envía la documentación solicitada, y se adjuntan la siguiente documentación:

1. Investigación de Incidente y acciones correctivas.
2. Check List para montaje estructural.
3. Acta para dar de baja EPCC.
4. Acciones correctivas de trabajo en alturas.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

Barranquilla, 7 de noviembre de 2023

CED-160-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO IP-01033

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y en respuesta al comunicado IP-01033 acerca del estado de pendientes en los frentes entregados, a continuación, se relaciona el estado actual de las actividades en cada frente de obra.

- IED CARLOS MEISEL

Se anexa registro fotográfico donde se observa la validación de los detalles corregidos que se relacionan en su oficio IP-01033 Barranquilla, fechado el 18 de octubre de 2023, relacionado con la toma de pendientes en frentes entregados:
Las anotaciones en su oficio tal como se evidencia en el registro fotográfico fueron tomados

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
COMEDOR-COCINA	Pintura en encoroce, marco de puerta y externo azul	Actividad Realizada
COMEDOR-COCINA	Cambio de talco de luminaria	Actividad Realizada
COMEDOR-COCINA	Nivelación de luminarias	Actividad Realizada
COMEDOR-COCINA	Cielo raso incompletos	Actividad Realizada

Imagen 1 Pintura en encoroce, marco de puerta y externo azul.




Imagen 2 Cambio de talco de luminaria



Imagen 3 Nivelación de luminarias.



Imagen 4 Cielo raso incompletos (masilla y pintura).

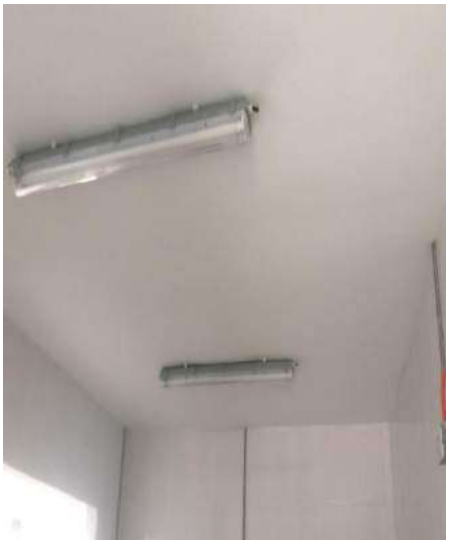

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

- IED DENIS HERRERA

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
AULAS 5A, 5B Y 5C	Impermeabilización de pisa techo	Actividad Realizada
2 AULAS BLOQUE 2	Aplicación de silicona en juntas de ventana de escalera	No se intervinieron las ventanas
PASILLOS	Acabados de pintura en área superior de escaleras	Esta actividad no se contemplo dentro del alcance inicial y no ha sido aprobada.

Imagen 5 Impermeabilización pisa techos.



- CEB 161

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
AULAS 26, 27 Y 28	Suministro e instalación de puertas faltantes	Actividad Realizada
AULAS 26, 27 Y 28	Corregir humedad en muro de salón 27	Actividad Realizada
AULAS 26, 27 Y 28	Limpieza en pisos, puertas y ventanas	Actividad Realizada
AULAS 26, 27 Y 28	Cambiar tapas de cajas eléctricas en aulas 26, 27 y 28	Actividad Realizada
AULAS 26, 27 Y 28	Detalles de pintura y limpieza de rejillas de cárcamos	Actividad Realizada
AULAS 24, 25, 29, 30 Y 31	Identificación y marcación del tablero eléctrico	Actividad Programada

AULAS 24, 25, 29, 30 Y 31	Limpieza en pisos, puertas y ventanas	Actividad Realizada
AULAS 24, 25, 29, 30 Y 31	Pintura en fachada y guarda escobas	Actividad Programada
AULAS 24, 25, 29, 30 Y 31	Verificar humedad en salón 22	Actividad Revisada
AULAS 24, 25, 29, 30 Y 31	Se solicitó revisar el tema de fisuras en muros de salones anteriormente entregados y posibilidad de instalar ventanas en vanos faltantes	Actividad Realizada

Imagen 6 Instalación de puerta faltante.



Imagen 7 Limpieza de pisos fachadas y cárcamos.



Imagen 8 Cambio de tapas.



Imagen 9 Limpieza de pisos y puertas, actividad realizada.



Imagen 10 Humedad aula 22.

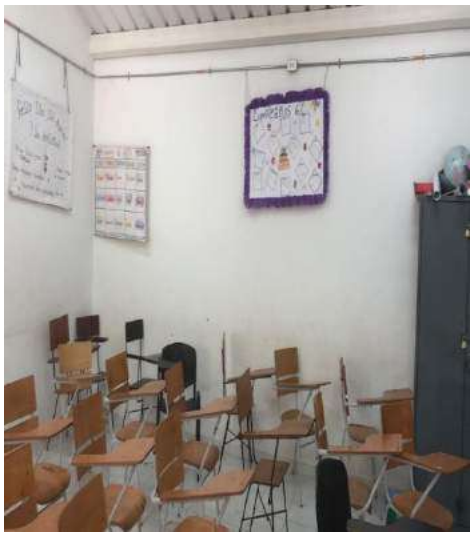


Imagen 11 Fachada aula 22.



Se realizo inspección en el aula 22 y se evidencia humedad en muro del aula como se puede observar en el registro fotográfico, adicionalmente se observa que el muro del aula que presenta humedad se encuentra adosado al muro de cerramiento del colegio por lo que se presume que el agua filtra entre la unión de los dos muros.

Imagen 12 Reparación de fisuras en aulas.



- IED CASTILLO DE LA ALBORAYA

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
AULAS 1,2,3,4,5	Detalles de pintura y resanes	Actividad Realizada
AULAS 1,2,3,4,5	Limpieza de muros, puertas y ventanas	Actividad Realizada

- IED JESUS DE NAZARETH

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Rejillas de desagüe	Programada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Instalación de cubierta en cafetería	Programada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Instalación de concertina	Programada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Bajantes de agua lluvia	Programada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Limpieza de mampostería interior	Actividad Realizada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Aseo y limpieza general	Actividad Realizada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Emboquillado de piso de almacenamiento	Actividad Realizada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Instalación de 2 tomas en aulas	Actividad Realizada
AULAS Y AREAS EXTERNAS	Detalles de pintura en perfilería metálica	Actividad Realizada

Imagen 13 Actividad de cárcamos.



Imagen 14 Instalación de rejillas en cárcamos.



- IED JUAN ACOSTA SOLERA

ESPACIOS	PENDIENTES	ESTADO
6 AULAS	Cambiar vela de lámpara que no enciende en aula 1	Actividad Realizada
6 AULAS	Revisar instalación de ventanas en aula 2	Programada
6 AULAS	Enmasillar y lijar en aula 4	Actividad Realizada
6 AULAS	Mantenimiento de la cerradura de las 6 puertas de las aulas	Actividad Realizada
6 AULAS	Limpieza de mampostería interior	Actividad Realizada
6 AULAS	Resane en marco de aula 3	Actividad Realizada
6 AULAS	Mejorar el anclaje de puerta en aula 2	Actividad Realizada
6 AULAS	Limpieza de protectores de rejas externas (hacia calle)	Actividad Realizada

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 20 de noviembre de 2023

CED-161-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: DIANOSTICO VISITA TECNICA IED INOCENCIO CHINCA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se envía diagnostico presentado por el diseñador hidráulico de la IED Inocencio chinca, a partir de la visita realizada a la institución educativa el día 8 de noviembre de 2023, en el cual, se presentan las respuestas a las solicitudes realizadas por contratista, interventoría y entidad contratante.
Adjunto se envía documento mencionado anteriormente.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 22 de noviembre de 2023

CED-162-2023

Señores

EDUBAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: Solicitud revisión, análisis y aprobación del análisis unitario no previstos en el contrato.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos la revisión y aprobación del análisis unitario no previsto en el contrato presentado por el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL identificado con Nit. 901.638.239- 0, con el fin que se incluyan contractualmente en la lista de cantidades y precios, debido a que en el mercado nacional no encontramos más de una cotización del ANCLAJE VIGA IPE A COLUMNA REFORZADA que exige el plano estructural del Colegio Mayor (planos IPCC-56 estructura existente & reforzada (05-04-2023)), teniendo en cuenta que este plano fue posterior a la firma del contrato y el APU de la estructura metálica no incluye ningún tipo de anclaje. para lo cual estamos adjuntando el formato que evidencie el Análisis de Precios Unitarios - APU's.

ITEM	DESCRIPCIÓN (Descripción del Ítem)	UNIDAD DE MEDIDA (Unidad requerida del Ítem)	VALOR UNITARIO (Costo directo)
NP 89	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	Unidad	$ 91.053,07

Sin otro particular agradecemos su pronta aprobación**.**

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	**Alberto Calderón**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Cristian Jiménez Yejas**	**Representante legal**

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántic
o.

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL No. 48**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORÍA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	Se culminó la demolición de la vigas existentes, se realizó Fundida en concreto para placa de entrepiso y vigas de entrepiso. Armado de vigas. Acabados de losa de entrepiso. Levante de mampostería. Pañete impermeabilizado en baños. Instalación de redes hidrosanitarias e hidráulicos. Corte y figuración de acero para vigas, alfajias, cuchillas. Fundida de concreto de alfajia.	N/A
		2023-10-31	Fundida de concreto en viga planta 3. Levante de mampostería. Acabado de losa de entrepiso, viga y columneta. Instalación de redes hidrosanitarias. Corte y figuración de acero para vigas, alfajias, cuchillas. Pañete impermeabilizado en baños. Fundida de concreto en viga y columneta de pasamanos.	N/A
		2023-11-01	Levante de mampostería. Pañete impermeabilizado en baños y cocina. Filos de vano y ventanas. Fundida de concreto de alfajias, viga pasamano. Armado de viga. Instalación de redes hidrosanitarias. Corte y figuración de acero para alfajia, acabado de losa entrepiso.	N/A
		2023-11-02	Corte y figuración de acero para vigas, alfajias, cuchillas. Viga pasamano. Levante de mampostería. Fundida de concreto en viga, alfajías. Pañete impermeabilizado en baños y cocina. Armado de viga. Instalación de redes hidrosanitarias e hidráulicas. Acabado de losa de entrepiso, columnas.	N/A
		2023-11-03	Levante de mamposteria. Fundida de concreto de registro eléctrico. Armado y fundida en concreto de alfajía. Instalación de redes hidrosanitarias. Acabado de losa de entrepiso. Filos de puerta y ventana. Pañete impermeabilizado en baños y cocina.	N/A
		2023-11-04	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para vigas, alfajias, cuchillas. Pañete impermeabilizado en cocina. Acabado de losa de entrepiso. Instalación de red eléctrica. Filos de puerta y ventana. Excavación para registro sanitario.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0,40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		66.09	3.51	$252,961	887,893.11	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		74.24		$93,507	-	74.24	457.09
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		329.48	6.22	$54,171	336,943.62	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,432.10	112.14	$9,568	1,072,955.52	73,544.24	4,604.43
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		643.00		$40,436	-	643.00	302.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.59	-0.30	$1,742,818	- 522,845.40	59.29	21.88
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.72		0.30	-0.30	$1,894,074	- 568,222.20	-	8.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,876.40		$27,186	-	1,876.40	225.06
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,636.85	52.18	$100,669	5,252,908.42	1,689.03	420.97
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		-	46.18	$17,610	813,229.80	46.18	413.82
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		-	125.17	$39,705	4,969,874.85	125.17	556.83
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		-	12.15	$27,794	337,697.10	12.15	65.99
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		123.34	-27.34	$38,862	- 1,062,487.08	96.00	29.15
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-

10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		-	3.00	$1,488,291	4,464,873.00	3.00	15.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		3.00	14.00	$64,019	896,266.00	17.00	82.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		47.29		$35,397	-	47.29	96.71
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		30.33	-30.33	$29,367	- 890,701.11	-	45.16
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		113.51	-27.29	$27,015	- 737,239.35	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		74.56	36.00	$58,180	2,094,480.00	110.56	478.44
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		20.00		$65,771.40	$0.00	20.00	38.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.02	0.12	$760,000.00	$91,200.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		43.57		$806,382.59	$0.00	43.57	21.43
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,239.86	-4.71	$439,795.34	-$2,071,436.05	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0,30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		176.37	34.62	$1,913,254.50	$66,236,870.79	210.99	39.01
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0,10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	15.16		3.12		$1,500,000.00	$0.00	3.12	12.04
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	230.405			31.68	$112,944.70	$3,578,088.10	31.68	198.73
							VALOR DE OBRA	$80,223,416.14		
							INCIDENCIA	1,22%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Pañete allanado sobre muro





FOTO 2	Levante de muro



FOTO 3	Armado y figurado de acero para alfajía	**FOTO 4**	Instalación de tubería sanitaria
			
FOTO 5	Encofrado de viga aérea	**FOTO 6**	Preparación para fundida de losa.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORÍA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-07	Pañete impermeabilizado en cocina. Plantilla de piso en baños. Corte y fundida en concreto de alfajías, viga dintel. Levante de mampostería. Armado de viga. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Levante de mesones para laboratorios. Instalación de redes hidrosanitarias. Nivelación y compactación de terreno para garita. Instalación de redes eléctricas.	N/A
		2023-11-08	Levante de mampostería. Acabado de losa de entrepiso. Armado de vigas. Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas. Armado de alfajías. Corte y figuración de acero para vigas, alfajías. Filos para vanos de puerta y ventana. Armado de acero para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-11-09	Instalación de redes hidrosanitarias. Levante de mampostería. Armado y fundida de vigas y alfajías. Armado de vigas. Corte y figuración de acero. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Armado de acero para placa de contrapiso de garita. Instalación de redes eléctricas.	N/A
		2023-11-10	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para vigas dintel, alfajía, tanque de almacenamiento. Fundida en concreto de piso pulido. Armado de acero y perfilación para tanque de almacenamiento. Armado de vigas. Acabado de losa de entrepiso. Instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias.	N/A
		2023-11-11	Fundida en concreto de vigas. Levante de mampostería. Acabado de losa de entrepiso. Corte y figuración de acero para alfajías y viga dintel. Instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias. Perfilación de tanque de almacenamiento. Armado de acero para tanque de almacenamiento.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		74.24		$93,507	-	74.24	457.09
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,544.24	135.44	$9,568	1,295,889.92	73,679.68	4,468.99
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		643.00		$40,436	-	643.00	302.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,876.40		$27,186	-	1,876.40	225.06
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,689.03	49.15	$100,669	4,947,881.35	1,738.18	371.82
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		46.18	52.15	$17,610	918,361.50	98.33	361.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		125.17	144.67	$39,705	5,744,122.35	269.84	412.16
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		12.15	18.66	$27,794	518,636.04	30.81	47.33
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		-	58.22	$32,600	1,897,972.00	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-

9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		-	1.00	$190,755	190,755.00	1.00	65.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		-	1.00	$235,052	235,052.00	1.00	36.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		3.00		$1,488,291	-	3.00	15.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		17.00	5.00	$64,019	320,095.00	22.00	77.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		47.29		$35,397	-	47.29	96.71
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		110.56	27.37	$58,180	1,592,386.60	137.93	451.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		20.00		$65,771.40	$0.00	20.00	38.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		43.57		$806,382.59	$0.00	43.57	21.43
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		210.99	31.46	$1,913,254.50	$60,190,986.57	242.45	7.55
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	15.16		3.12		$1,500,000.00	$0.00	3.12	12.04
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	230.405		31.68	37.16	$112,944.70	$4,197,025.05	68.84	161.57
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		-	24	$51,273.41	$1,230,561.84	24.00	137.41
								VALOR DE OBRA	$83,279,725.22	
								INCIDENCIA	1,27%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1 — Instalación de tubería EMT



FOTO 2 — Armado y figurado de acero de viga

			
FOTO 3	Armado y figurado de acero de tanque	**FOTO 4**	Fundida de alfajía en vanos
			
FOTO 5	Levante de muro	**FOTO 6**	Fundida de plantilla
			
FOTO 7	Armado y figurado de acero de zapata	**FOTO 8**	Replanteo para plantilla.

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

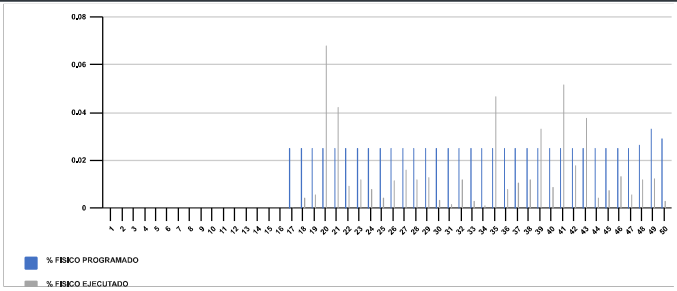

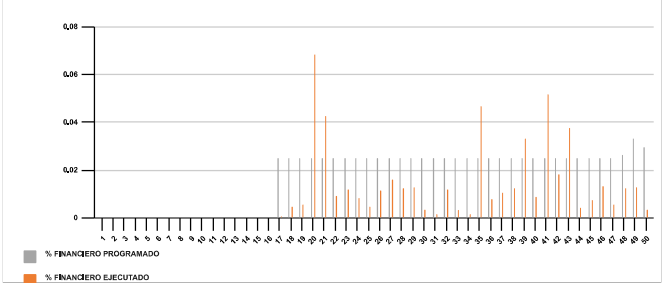

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-14	Levante de mampostería. Corte y figuración de acero para vigas dintel, alfajia, tanque de almacenamiento. Fundida en concreto para alfajías. Acabados de losa de entrepiso. Perfilación de tanque de almacenamiento. Instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias.	N/A
		2023-11-15	Levante de mampostería. Armado de acero para mesones de laboratorio. Armado y Fundida en concreto de alfajías. Acabados de losa de entrepiso. Instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias. Armado de acero para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-11-16	Perforación y Armado de acero para tanque de almacenamiento. Levante de mampostería. Armado de acero para mesones de cocina. Acabados de losa de entrepiso. Fundida en concreto para alfajías. Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Instalación de redes eléctricas.	N/A
		2023-11-17	Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Instalación de redes eléctricas. Levante de mampostería. Perforación de losa y Armado de acero para tanque de almacenamiento. Acabados de losa de entrepiso. Armado y fundida en concreto de alfajías.	N/A
		2023-11-18	Levante de mampostería. Perforación de losa y Armado de acero para tanque de almacenamiento. Acabado de losa de entrepiso. Corte y figuración de acero para alfajías y columnetas para garita de seguridad.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		74.24	46.14	$93,507	4,314,412.98	120.38	410.95
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,679.68	78.49	$9,568	750,992.32	73,758.17	4,390.50
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		643.00		$40,436	-	643.00	302.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,876.40	28.15	$27,186	765,285.90	1,904.55	196.91
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,738.18	48.18	$100,669	4,850,232.42	1,786.36	323.64
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		98.33		$17,610	-	98.33	361.67

3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		269.84		$39,705	-	269.84	412.16
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		30.81		$27,794	-	30.81	47.33
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		1.00	1.00	$190,755	190,755.00	2.00	64.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		-	1.00	$282,244	282,244.00	1.00	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		1.00		$235,052	-	1.00	36.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		-	1.00	$282,196	282,196.00	1.00	8.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		3.00		$1,488,291	-	3.00	15.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		22.00	12.00	$64,019	768,228.00	34.00	65.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		47.29	14.00	$35,397	495,558.00	61.29	82.71
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		137.93	44.00	$58,180	2,559,920.00	181.93	407.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		20.00	9	$65,771.40	$591,942.60	29.00	29.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86

NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		43.57		$806,382.59	$0.00	43.57	21.43
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410,72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		242.45		$1,913,254.50	$0.00	242.45	7.55
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	15.16		3.12		$1,500,000.00	$0.00	3.12	12.04
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	230.405		68.84	33.12	$112,944.70	$3,740,728.46	101.96	128.45
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		24.00	37	$51,273.41	$1,897,116.17	61.00	100.41
							VALOR DE OBRA	$21,489,611.85		
							INCIDENCIA	0.33%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=14HR8qwlKbOOLwSKXYabERl47wJrBT4uad

FOTO 1	Fundida de alfajía



https://drive.google.com/open?id=11X2VAoiDDNWHMHNutZSE_DMhorHIPaEV

FOTO 2	Trabajos en tanque de almacenamiento



FOTO 3	Instalación de tubería sanitaria



FOTO 4	Instalaciones de tubería EMT

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-20	Levante de mampostería. Se fundió en concreto columneta, viga de garita de seguridad. Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Acabado de losa de entrepiso. Perforación de losa y Armado de acero para tanque de almacenamiento. Instalación de redes eléctricas. Corte y figuración de acero para alfajías.	N/A
		2023-11-21	Levante de mampostería. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Acabado de losa de entrepiso. Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Redes eléctricas. Corte y figuración de acero para alfajías.	N/A
		2023-11-22	Levante de mamposteria. Armado de acero para viga de rampa. Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Instalación de redes eléctricas. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Armado y soldadura de perfiles de cubierta. Levante de cuchilla para cubierta. Acabado de losa de entrepiso. Perfiles de cubiertas. Flanches e instalación de láminas para cubierta.	N/A
		2023-11-23	Fundida en concreto de placa base del tanque de almacenamiento. Levante de mampostería. Excavaciones para redes hidrosanitarias y registros. Levante de cuchilla para cubierta. Acabado de losa de entrepiso. Instalación de redes eléctricas. Armado de acero para viga de rampa. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Instalación de perfiles de cubierta. Flanches. Lámina de cubierta.	N/A
		2023-11-24	Levante de mampostería. Levante de cuchilla para cubierta. Fabricación de de perfiles de cubierta. Instalación redes hidrosanitarias. Instalación de redes eléctricas. Acabado de losa de entrepiso. Armado de acero para viga de rampa. Armado de viga para cuchilla. Armado de acero para tanque de almacenamiento, perfiles de cubierta, flanches. Instalacion de laminas de cubierta.	N/A
		2023-11-25	Instalación de perfiles de cubierta. Levante de mampostería. Fundida de viga para cuchilla. Armado de acero para viga de rampa. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Instalación de redes eléctricas. Excavacion y suministro de redes hidrosanitarias. Acabado de losa de entrepiso. Fundida en concreto de alfajía. Pañete impermeabilizado en cocina.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		120.38	47.98	$93,507	4,486,465.86	168.36	362.97
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,758.17	94.15	$9,568	900,827.20	73,852.32	4,296.35
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		643.00	1.00	$40,436	40,436.00	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,904.55	25.62	$27,186	696,505.32	1,930.17	171.29
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,786.36	47.20	$100,669	4,751,576.80	1,833.56	276.44
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		98.33		$17,610	-	98.33	361.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		269.84		$39,705	-	269.84	412.16
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		30.81		$27,794	-	30.81	47.33
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-

9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		2.00	2.00	$190,755	381,510.00	4.00	62.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		1.00		$282,244	-	1.00	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		1.00	1.00	$235,052	235,052.00	2.00	35.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		1.00		$282,196	-	1.00	8.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0,15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		3.00		$1,488,291	-	3.00	15.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		34.00	8.00	$64,019	512,152.00	42.00	57.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		61.29	17.00	$35,397	601,749.00	78.29	65.71
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		181.93	48.00	$58,180	2,792,640.00	229.93	359.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		29.00	9	$65,771.40	$591,942.60	38.00	20.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		43.57		$806,382.59	$0.00	43.57	21.43
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		242.45		$1,913,254.50	$0.00	242.45	7.55
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	15.16		3.12		$1,500,000.00	$0.00	3.12	12.04
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	230.405		101.96	38.19	$112,944.70	$4,313,358.09	140.15	90.26
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		61.00	37	$51,273.41	$1,897,116.17	98.00	63.41
							VALOR DE OBRA	$22,201,331.04		
							INCIDENCIA	0.34%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=182TkyUsZoRcIRPughaDn82Z5TXdVZh



https://drive.google.com/open?id=1zKk806Y4v3OUCnlFTicOxvdap1IHED

FOTO 1	Instalación de tubería EMT	FOTO 2	Instalación de tubería de desagüe
			
FOTO 3	Levante para cuchilla de cubierta	FOTO 4	Levante para cuchilla de cubierta
			
FOTO 5	Armado y figurado de acero de rampa	FOTO 6	Fundida de placa de tanque

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 48**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,407,255	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$62,321,467	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$41,854,889	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$23,492,290	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.18%	16.13%	23	2.70%	1.18%	$10,787,932	16.13%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.52%	16.65%	24	3.04%	0.52%	$4,760,176	16.65%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.25%	17.90%	25	2.68%	1.25%	$11,392,850	17.90%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.71%	19.61%	26	2.14%	1.71%	$15,539,638	19.61%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.15%	22.76%	27	4.12%	3.15%	$28,721,045	22.76%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.24%	26.01%	28	1.78%	3.24%	$29,524,638	26.01%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	2.94%	28.94%	29	2.24%	2.94%	$26,740,797	28.94%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.23%	32.18%	30	3.68%	3.23%	$29,444,723	32.18%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.43%	41.60%	31	4.62%	9.43%	$85,857,097	41.60%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.49%	50.09%	32	3.22%	8.49%	$77,283,801	50.09%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.46%	53.55%	33	5.62%	3.46%	$31,520,369	53.55%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.24%	54.79%	34	3.68%	1.24%	$11,286,493	54.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	1.92%	56.71%	35	4.44%	1.92%	$17,458,690	56.71%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.70%	60.41%	36	3.07%	3.70%	$33,708,177	60.41%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.43%	64.84%	37	2.04%	4.43%	$40,307,650	64.84%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.33%	70.17%	38	2.94%	5.33%	$48,570,220	70.17%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.64%	74.81%	39	3.84%	4.64%	$42,273,194	74.81%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.27%	78.08%	40	2.94%	3.27%	$29,745,969	78.08%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.21%	82.29%	41	3.77%	4.21%	$38,365,450	82.29%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.24%	86.53%	42	2.68%	4.24%	$38,569,083	86.53%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	6.88%	93.41%	43	3.94%	6.88%	$62,619,047	93.41%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	44	0.00%	0.00%	$0	93.41%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	45	0.00%	0.00%	$0	93.41%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	46	0.00%	0.00%	$0	93.41%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	47	0.00%	0.00%	$0	93.41%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	48	0.00%	0.00%	$0	93.41%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2415		711.87		$4,221	$0	711.87	1,703.13
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	2415		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	1,041.47
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	885.99		803.29		$25,396	$0	803.29	82.70
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	132.18		48.57		$252,961	$0	48.57	83.61
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	482.44		454.03		$20,699	-	454.03	28.41
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.98		894.35		$93,507	$0	894.35	0.63
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.9		162.86		$34,062	-	162.86	1.04
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	368.59		24.71		$192,928	$0	24.71	343.88
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	624.76		459.89		$54,171	$0	459.89	164.87
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	26229.87		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	3,361.61
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	142		128.00		$40,436	-	128.00	14.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.61		69.14		$894,392	$0	69.14	0.47
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	156.79		140.97		$100,669	$0	140.97	15.82
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	165.54		136.78		$534,334	-	136.78	28.76
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.94		80.00		$67,760	$0	80.00	3.94
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	447.45		358.93		$70,000	$0	358.93	88.52
							VALOR DE OBRA	$0		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

INOCENCIO CHINCA	**Alberto Diaz**	**SAHAIR ORDOÑEZ**		**NO APLICA**
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,407,255	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$62,321,467	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$41,854,889	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$23,492,290	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.18%	16.13%	23	2.70%	1.18%	$10,787,932	16.13%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.52%	16.65%	24	3.04%	0.52%	$4,760,176	16.65%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.25%	17.90%	25	2.68%	1.25%	$11,392,850	17.90%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.71%	19.61%	26	2.14%	1.71%	$15,539,638	19.61%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.15%	22.76%	27	4.12%	3.15%	$28,721,045	22.76%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.24%	26.01%	28	1.78%	3.24%	$29,524,638	26.01%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	2.94%	28.94%	29	2.24%	2.94%	$26,740,797	28.94%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.23%	32.18%	30	3.68%	3.23%	$29,444,723	32.18%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.43%	41.60%	31	4.62%	9.43%	$85,857,097	41.60%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.49%	50.09%	32	3.22%	8.49%	$77,283,801	50.09%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.46%	53.55%	33	5.62%	3.46%	$31,520,369	53.55%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.24%	54.79%	34	3.68%	1.24%	$11,286,493	54.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	1.92%	56.71%	35	4.44%	1.92%	$17,458,690	56.71%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.70%	60.41%	36	3.07%	3.70%	$33,708,177	60.41%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.43%	64.84%	37	2.04%	4.43%	$40,307,650	64.84%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.33%	70.17%	38	2.94%	5.33%	$48,570,220	70.17%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.64%	74.81%	39	3.84%	4.64%	$42,273,194	74.81%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.27%	78.08%	40	2.94%	3.27%	$29,745,969	78.08%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.21%	82.29%	41	3.77%	4.21%	$38,365,450	82.29%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.24%	86.53%	42	2.68%	4.24%	$38,569,083	86.53%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	6.88%	93.41%	43	3.94%	6.88%	$62,619,047	93.41%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	44	0.00%	0.00%	$0	93.41%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	45	0.00%	0.00%	$0	93.41%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	46	0.00%	0.00%	$0	93.41%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	47	0.00%	0.00%	$0	93.41%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	48	0.00%	0.00%	$0	93.41%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	49	0.00%	0.00%	$0	93.41%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2415		711.87		$4,221	$0	711.87	1,703.13
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	2415		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	1,041.47
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	885.99		803.29		$25,396	$0	803.29	82.70
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	132.18		48.57		$252,961	$0	48.57	83.61
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	482.44		454.03		$20,699	-	454.03	28.41
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.98		894.35		$93,507	$0	894.35	0.63
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.9		162.86		$34,062	-	162.86	1.04
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	368.59		24.71		$192,928	$0	24.71	343.88
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	624.76		459.89		$54,171	$0	459.89	164.87
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	26229.87		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	3,361.61
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	142		128.00		$40,436	-	128.00	14.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.61		69.14		$894,392	$0	69.14	0.47
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	156.79		140.97		$100,669	$0	140.97	15.82
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	165.54		136.78		$534,334	-	136.78	28.76
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.94		80.00		$67,760	$0	80.00	3.94
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	447.45		358.93		$70,000	$0	358.93	88.52
							VALOR DE OBRA	$0		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ		NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,407,255	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$62,321,467	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$41,854,889	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$23,492,290	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.18%	16.13%	23	2.70%	1.18%	$10,787,932	16.13%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.52%	16.65%	24	3.04%	0.52%	$4,760,176	16.65%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.25%	17.90%	25	2.68%	1.25%	$11,392,850	17.90%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.71%	19.61%	26	2.14%	1.71%	$15,539,638	19.61%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.15%	22.76%	27	4.12%	3.15%	$28,721,045	22.76%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.24%	26.01%	28	1.78%	3.24%	$29,524,638	26.01%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	2.94%	28.94%	29	2.24%	2.94%	$26,740,797	28.94%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.23%	32.18%	30	3.68%	3.23%	$29,444,723	32.18%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.43%	41.60%	31	4.62%	9.43%	$85,857,097	41.60%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.49%	50.09%	32	3.22%	8.49%	$77,283,801	50.09%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.46%	53.55%	33	5.62%	3.46%	$31,520,369	53.55%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.24%	54.79%	34	3.68%	1.24%	$11,286,493	54.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	1.92%	56.71%	35	4.44%	1.92%	$17,458,690	56.71%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.70%	60.41%	36	3.07%	3.70%	$33,708,177	60.41%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.43%	64.84%	37	2.04%	4.43%	$40,307,650	64.84%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.33%	70.17%	38	2.94%	5.33%	$48,570,220	70.17%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.64%	74.81%	39	3.84%	4.64%	$42,273,194	74.81%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.27%	78.08%	40	2.94%	3.27%	$29,745,969	78.08%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.21%	82.29%	41	3.77%	4.21%	$38,365,450	82.29%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.24%	86.53%	42	2.68%	4.24%	$38,569,083	86.53%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	6.88%	93.41%	43	3.94%	6.88%	$62,619,047	93.41%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	44	0.00%	0.00%	$0	93.41%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	45	0.00%	0.00%	$0	93.41%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	46	0.00%	0.00%	$0	93.41%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	47	0.00%	0.00%	$0	93.41%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	48	0.00%	0.00%	$0	93.41%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	49	0.00%	0.00%	$0	93.41%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	50	0.00%	0.00%	$0	93.41%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2415		711.87		$4,221	$0	711.87	1,703.13
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	2415		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	1,041.47
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	885.99		803.29		$25,396	$0	803.29	82.70
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	132.18		48.57		$252,961	$0	48.57	83.61
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	482.44		454.03		$20,699	-	454.03	28.41
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.98		894.35		$93,507	$0	894.35	0.63
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.9		162.86		$34,062	-	162.86	1.04
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	368.59		24.71		$192,928	$0	24.71	343.88
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	624.76		459.89		$54,171	$0	459.89	164.87
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	26229.87		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	3,361.61
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	142		128.00		$40,436	-	128.00	14.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.61		69.14		$894,392	$0	69.14	0.47
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	156.79		140.97		$100,669	$0	140.97	15.82
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	165.54		136.78		$534,334	-	136.78	28.76
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.94		80.00		$67,760	$0	80.00	3.94
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	447.45		358.93		$70,000	$0	358.93	88.52
							VALOR DE OBRA	$0		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ		NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,407,255	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$62,321,467	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$41,854,889	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$23,492,290	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.18%	16.13%	23	2.70%	1.18%	$10,787,932	16.13%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.52%	16.65%	24	3.04%	0.52%	$4,760,176	16.65%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.25%	17.90%	25	2.68%	1.25%	$11,392,850	17.90%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.71%	19.61%	26	2.14%	1.71%	$15,539,638	19.61%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.15%	22.76%	27	4.12%	3.15%	$28,721,045	22.76%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.24%	26.01%	28	1.78%	3.24%	$29,524,638	26.01%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	2.94%	28.94%	29	2.24%	2.94%	$26,740,797	28.94%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.23%	32.18%	30	3.68%	3.23%	$29,444,723	32.18%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.43%	41.60%	31	4.62%	9.43%	$85,857,097	41.60%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.49%	50.09%	32	3.22%	8.49%	$77,283,801	50.09%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.46%	53.55%	33	5.62%	3.46%	$31,520,369	53.55%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.24%	54.79%	34	3.68%	1.24%	$11,286,493	54.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	1.92%	56.71%	35	4.44%	1.92%	$17,458,690	56.71%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.70%	60.41%	36	3.07%	3.70%	$33,708,177	60.41%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.43%	64.84%	37	2.04%	4.43%	$40,307,650	64.84%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.33%	70.17%	38	2.94%	5.33%	$48,570,220	70.17%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.64%	74.81%	39	3.84%	4.64%	$42,273,194	74.81%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.27%	78.08%	40	2.94%	3.27%	$29,745,969	78.08%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.21%	82.29%	41	3.77%	4.21%	$38,365,450	82.29%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.24%	86.53%	42	2.68%	4.24%	$38,569,083	86.53%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	6.88%	93.41%	43	3.94%	6.88%	$62,619,047	93.41%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	44	0.00%	0.00%	$0	93.41%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	45	0.00%	0.00%	$0	93.41%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	46	0.00%	0.00%	$0	93.41%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	93.41%	47	0.00%	0.00%	$0	93.41%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	48	0.00%	0.00%	$0	93.41%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	49	0.00%	0.00%	$0	93.41%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	50	0.00%	0.00%	$0	93.41%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	93.41%	51	0.00%	0.00%	$0	93.41%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2415		711.87		$4,221	$0	711.87	1,703.13
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	2415		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	1,041.47
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	885.99		803.29		$25,396	$0	803.29	82.70
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	132.18		48.57		$252,961	$0	48.57	83.61
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	482.44		454.03		$20,699	-	454.03	28.41
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.98		894.35		$93,507	$0	894.35	0.63
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.9		162.86		$34,062	-	162.86	1.04
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	368.59		24.71		$192,928	$0	24.71	343.88
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	624.76		459.89		$54,171	$0	459.89	164.87
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	26229.87		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	3,361.61
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	142		128.00		$40,436	-	128.00	14.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.61		69.14		$894,392	$0	69.14	0.47
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	156.79		140.97		$100,669	$0	140.97	15.82
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	165.54		136.78		$534,334	-	136.78	28.76
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.94		80.00		$67,760	$0	80.00	3.94
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	447.45		358.93		$70,000	$0	358.93	88.52
							VALOR DE OBRA	$0		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ		NO APLICA
				NO APLICA

				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 48**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

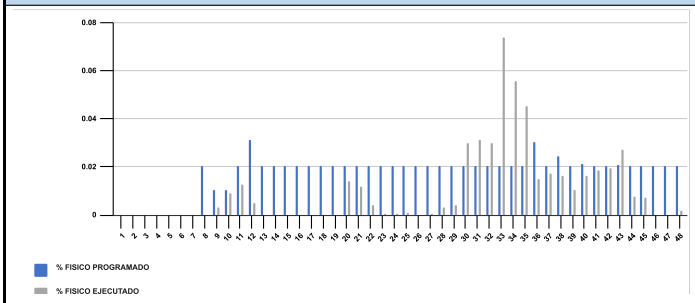

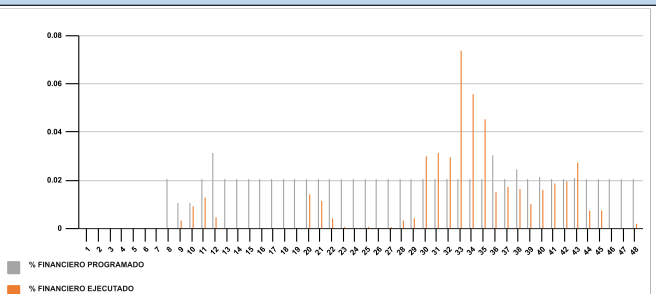

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-10-29	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-02	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-03	Se realizó figuración de acero para vigas.	N/A
		2023-11-04	Se realizó figuración de acero y armado de vigas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,541.07	258.16	$9,568	2,470,074.88	9,799.23	4,887.94
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-

NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-

VALOR DE OBRA	2,470,074.88
INCIDENCIA	0.20%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1GXuL6Ko1qDW6wtxOGZMBhjNhbajlUA84g



https://drive.google.com/open?id=1drzeJChhJdRv3JG4XHT2t81ryb11LEun

FOTO 1	Figuración de acero JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

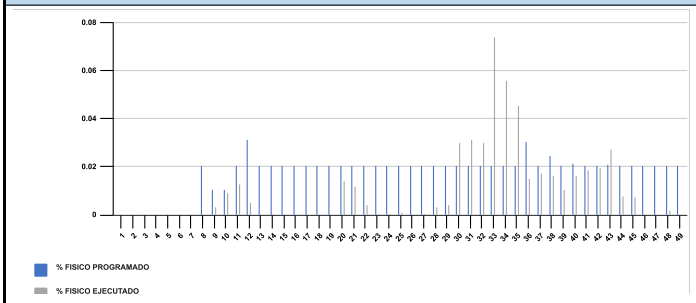

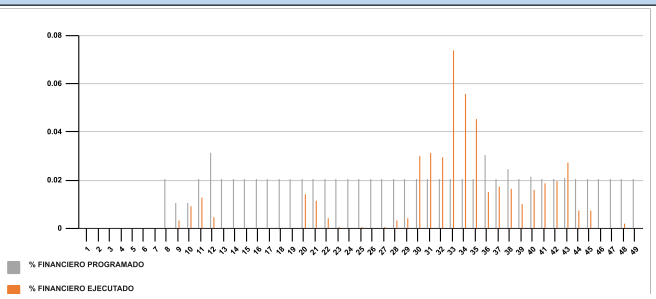

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-11-05	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	0		875.15		$454,545	-	875.15	- 875.15
1.04	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	MES	0		942.32		$578,772	-	942.32	- 942.32
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	80		41.12		$116,390	-	41.12	38.88
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		93.66		$25,396	-	93.66	- 93.66
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	0		127.12		$20,853	-	127.12	- 127.12
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		9.23		$32,124	-	9.23	80.77
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		90.00		$25,547	$0	90.00	95.50
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		85.50		$16,513	$0	85.50	566.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		30.19		$93,507	$0	30.19	125.61
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	0		45.97		$90,362	-	45.97	- 45.97
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		0.50		$192,928	-	0.50	88.68
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0		43.41		$54,171	-	43.41	- 43.41
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		9,799.23		$40,436	-	9,799.23	- 4,299.23
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		5,349.00		$894,392	-	5,349.00	- 5,346.28
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		2.72		$1,742,818	-	2.72	45.43
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	12.8		6.86		$1,894,074	-	6.86	5.94
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	0		116.19		$260,694	-	116.19	- 116.19
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		10.54		$190,540	-	10.54	- 10.54
3	MAMPOSTERIA				23.71			-	23.71	- 23.71

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		140.00		$32,154	-	140.00	-	37.85
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML			96.00		$16,526	-	96.00	-	96.00
5.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	0		7.00		$21,532	-	7.00	-	7.00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		545.17		$133,816	$0	545.17	-	537.96
6	ACABADOS				7.21			-	7.21	-	7.21
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		530.72		$17,948	$0	530.72		85.88
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	616.6		47.02		$17,384	-	47.02		569.58
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		32.02		$18,887	-	32.02		104.44
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		42.00		$20,457	-	42.00	-	42.00
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT2	0		42.00		$89,140	-	42.00	-	42.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		1.00		$57,053	$0	1.00		3.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		4.00		$32,669	$0	4.00		1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		5.00		$323,953	-	5.00	-	1.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	MT2	0		4.00		$819,193	-	4.00	-	4.00
7.13	PUERTA PRINCIPAL DE 2 HOJAS ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM DIMENSION: 2.10X0,90 m. INCLUYE ACCESORIOS, CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE REF B-362 O SIMILAR, CERRADURA CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE MANILLAS Y ACCESORIOS ACERO INOX	UND	0		2.00		$5,071,625	-	2.00	-	2.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		68.00		$16,601	$0	68.00	-	46.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		22.00		$19,709	$0	22.00	-	18.00
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		4.00		$57,278	-	4.00	-	4.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND	0		6.00		$320,817	-	6.00	-	6.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		6.00		$282,244	-	6.00		4.00
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	1		10.00		$194,230	-	10.00	-	9.00
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND	0		2.00		$298,801	-	2.00	-	2.00
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND	0		16.00		$51,641	-	16.00	-	16.00
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		4.00		$1,732,447	-	4.00		23.13

NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		15.98		$120,025	-	15.98	81.88
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		97.86		$195,000	-	97.86	- 95.86
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		2.00		$859,000	-	2.00	2.40
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	$0	49.37%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

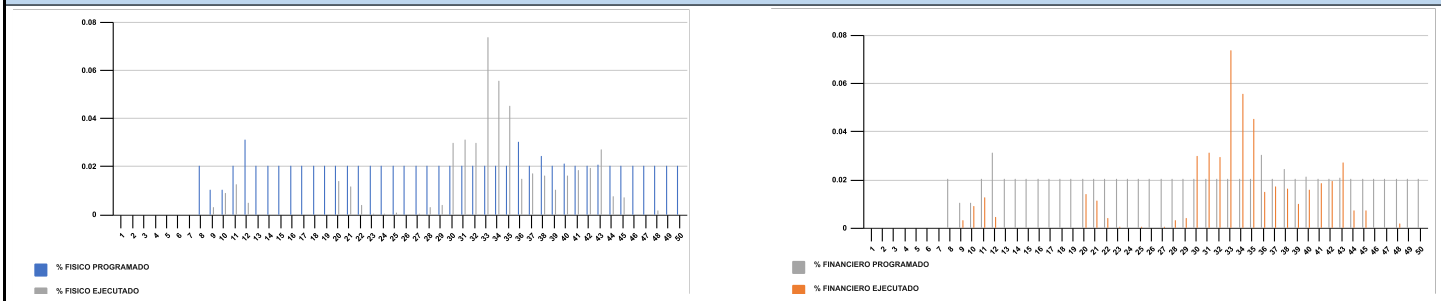

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-11-12	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-14	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		875.15		$9,648	-	875.15	67.17
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		942.32		$23,673	-	942.32	- 901.20
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		41.12		$140,481	$0	41.12	52.54
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		93.66		$27,679	-	93.66	- 93.66
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	0		127.12		$20,794	-	127.12	- 127.12
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		9.23		$25,547	$0	9.23	176.27
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		90.00		$16,513	$0	90.00	561.50
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		85.50		$93,507	$0	85.50	70.30
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	0		30.19		$90,362	-	30.19	- 30.19
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	0		45.97		$49,030	-	45.97	- 45.97
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0		0.50		$54,171	-	0.50	- 0.50
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		43.41		$9,568	-	43.41	14,643.76
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		9,799.23		$894,392	-	9,799.23	- 9,796.51
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		5,349.00		$1,742,818	-	5,349.00	- 5,300.85
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	12.8		2.72		$1,894,074	-	2.72	10.08
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		6.86		$99,065	-	6.86	118.14
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		116.19		$149,548	-	116.19	- 116.19

2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		10.54		$351,058	-	10.54	-	10.54
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		23.71		$14,939	$0	23.71		256.29
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML			140.00		$16,526	-	140.00	-	140.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2			96.00		$13,644	-	96.00	-	96.00
5.06	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INCLUYE RETIRO	ML	29.12		7.00		$9,892	-	7.00		22.12
6	ACABADOS				545.17			-	545.17	-	545.17
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	0		7.21		$16,524	-	7.21	-	7.21
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	616.6		530.72		$17,384	-	530.72		85.88
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		47.02		$20,720	$0	47.02		85.00
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		32.02		$20,457	-	32.02	-	32.02
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	0		42.00		$5,765	-	42.00	-	42.00
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML	0		42.00		$21,660	-	42.00	-	42.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		1.00		$32,669	$0	1.00		4.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00		-
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	MT2	0		5.00		$819,193	-	5.00	-	5.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2	3		4.00		$493,556	-	4.00	-	1.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA FORRADA EN PVC, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" POR PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE PINTURA DEL CERRAMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR.	MT2	0		2.00		$135,924	-	2.00	-	2.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		68.00		$19,709	$0	68.00	-	64.00
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		22.00		$57,278	-	22.00	-	22.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		4.00		$190,218	-	4.00		2.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	0		6.00		$439,996	-	6.00	-	6.00
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	1		6.00		$194,230	-	6.00	-	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	54		10.00		$235,052	-	10.00		44.00
9.45	Breaker Industrial ABB Formula 125A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066708R1 o similar	UND	0		2.00		$709,717	-	2.00	-	2.00

10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	0		16.00		$29,268	-	16.00	-	16.00
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		4.00		$120,025	-	4.00		93.86
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		15.98		$195,000	-	15.98	-	13.98
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		97.86		$859,000	-	97.86	-	93.46

VALOR DE OBRA	-
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

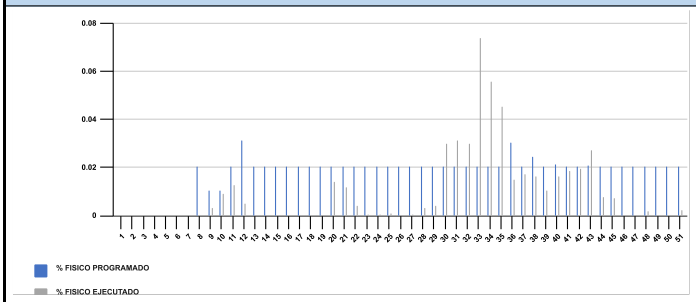

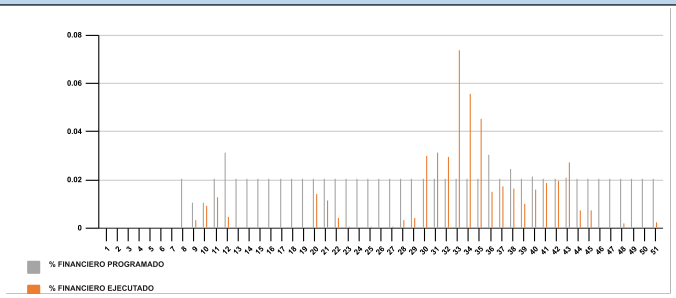

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-11-19	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-21	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-11-22	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-11-23	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-11-24	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		9,799.23	312.17	$9,568	2,986,842.56	10,111.40	4,575.77
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-

NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-

VALOR DE OBRA	2,986,842.56
INCIDENCIA	0.25%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1UYqdeRFBPDjZBGh4DKZGhjlbSSxj5MWd

FOTO 1	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1TA2lI14EbcbIchbvEJU1TdVVZ4Mtlel

FOTO 2	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 48	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

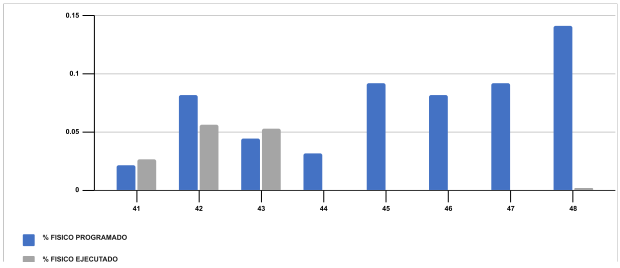

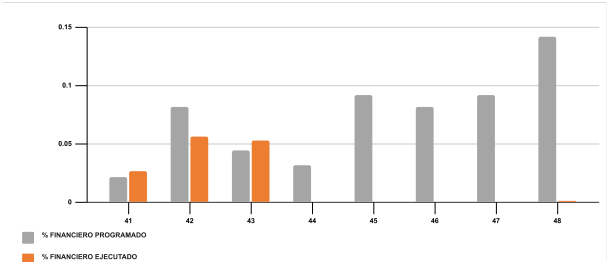

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	Limpieza en el área de trabajo. Acopio de residuos.	N/A
		2023-11-03	Pañete allanado sobre muro en aulas. Acopio de residuos y retiro de material.	N/A
		2023-11-04	Pañete de muro en aulas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11

2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	212		-	25.12	$23,961	601,900.32	25.12	186.88
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Limpieza en el área de trabajo. Acopio de residuos. JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 49	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-10	Pañete allanado sobre muro en aulas. Acopio de residuos. Limpieza de área de trabajo	N/A
		2023-11-11	Pañete allanado sobre muro en aulas. Se tomaron filos de puertas y ventanas en aula 1.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10

2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	212		25.12	24.68	$23,961	591,357.48	49.80	162.20
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		-	15.00	$15,618	234,270.00	15.00	99.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 50	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-14	Se tomaron filos de puertas y ventanas en aula 1 y 2. Pañete allanado sobre muro en aulas.	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11

2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	212		49.80	30.68	$23,961	735,123.48	80.48	131.52
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		15.00	20.00	$15,618	312,360.00	35.00	79.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=19C1t8W8rvWe04t1-IvdYooTo



https://drive.google.com/open?id=1WUc0-pLXsD9exnH6C2Y_d8RYoYqL

FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	Pañete allanado sobre muro en aulas. Acopio de residuos. Limpieza de área de trabajo	N/A
		2023-11-21	Pañete allanado sobre muro en aulas. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-11-22	Pañete allanado sobre muro en aulas. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-11-23	Pañete allanado sobre muro en aulas. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-11-24	Pañete allanado sobre muro en aulas. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-11-25	Pañete allanado sobre muro en aulas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11

2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	212		80.48	30.68	$23,961	735,123.48	111.16	100.84
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		35.00	24.00	$15,618	374,832.00	59.00	55.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=10xvIbJK9zyT4PIsVFBoGXvIRi



https://drive.google.com/open?id=1nXTFDqvrhJOkO8OmUvvNE1lK1B4kt

FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 48**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	1.29%	24.78%	41	3.01%	1.29%	$46,864,879	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	1.45%	26.22%	42	1.22%	1.45%	$52,703,171	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	0.82%	27.04%	43	1.38%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.31%	27.35%	44	2.74%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

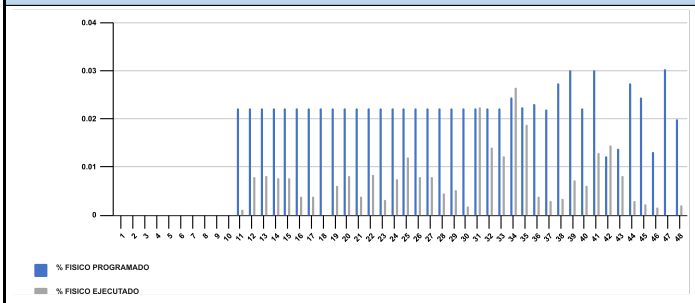

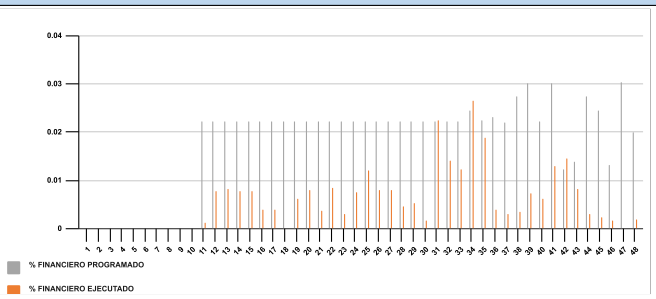

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	Se realiza soldadura y pintura de las vigas IPE. Se realiza instalación de vigas IPE.	N/A
		2023-11-03	Se realiza instalación de vigas IPE. Continua pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-11-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2690		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		852.12		$32,154	$0	852.12	45.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		-	6,211.00	$21,652	134,480,572.00	6,211.00	26,130.31
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		5,241.24	-5,241.24	$24,307	- 127,398,820.68	- 0.00	14,359.40
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-

9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1f0c_hV_rdb2TEAEHqUWcnD2sEPdk_ZQu



https://drive.google.com/open?id=1_bnsw1E82l2cNCJG4fpJBkAIBzVunTRe

FOTO 1	Soldadura de vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Pintura de las vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Se realizó ajuste en las cantidades reportadas en los periodos anteriores en el ITEM 4.03 cuyas cantidades seran reportadas en el ITEM 4.02

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 49**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	1.29%	24.78%	41	3.01%	1.29%	$46,864,879	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	1.45%	26.22%	42	1.22%	1.45%	$52,703,171	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	0.82%	27.04%	43	1.38%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.31%	27.35%	44	2.74%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

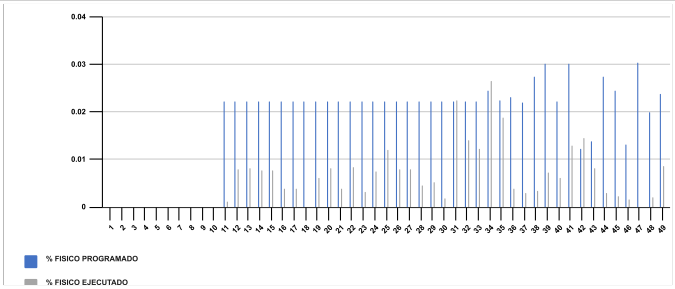

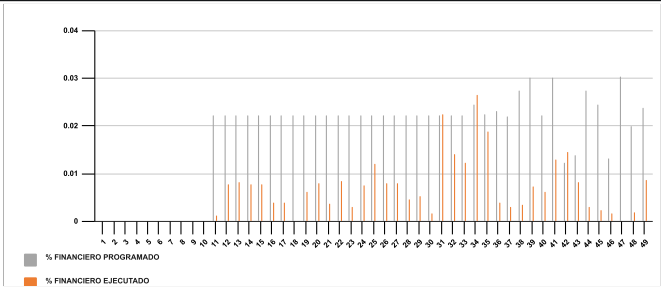

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-07	Se realiza instalación de vigas IPE. Continua pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-11-08	Se realiza soldadura y cortes de vigas IPE. Se realiza pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-11-09	Continua pintura e instalación de vigas IPE.	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2690		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		852.12		$32,154	$0	852.12	45.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		6,211.00	1,458.00	$21,652	31,568,616.00	7,669.00	24,672.31
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00

9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO-POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1k1fEQSV20YfOZTVcvNr1tY26BlwPDXsE

FOTO 1	Soldadura de vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=16RsHpNtqpDVDBwvyl6SxYSTe9x4ipKfE

FOTO 2	Pintura de las vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1OIUgHbn2SBAJ2pSqBPbHWHDCghJJI_Cw

FOTO 3	Instalación de vigas IPE. MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1n86kqk3IFCKOIX4dC7JcyqOnF7rqmnBI

FOTO 4	Instalación de vigas IPE. MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	1.29%	24.78%	41	3.01%	1.29%	$46,864,879	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	1.45%	26.22%	42	1.22%	1.45%	$52,703,171	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	0.82%	27.04%	43	1.38%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.31%	27.35%	44	2.74%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	$38,064,216	29.84%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

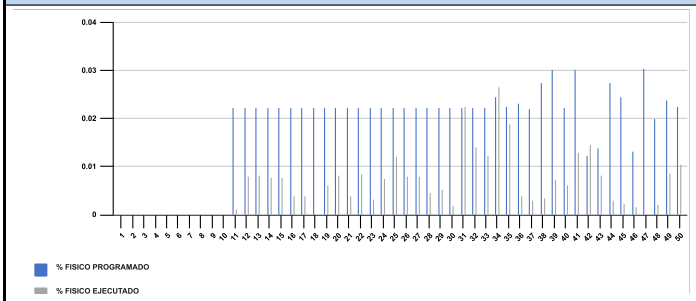

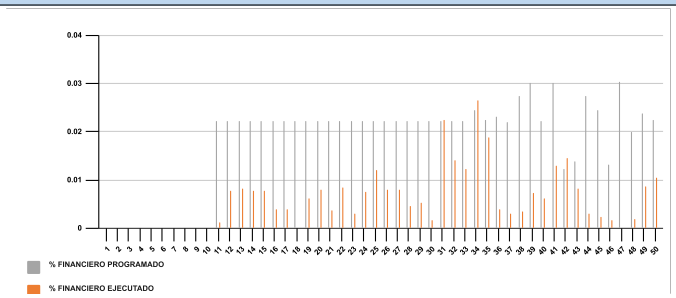

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	Se realiza pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-11-18	Se realiza pintura de vigas IPE. e instalación de IPE.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2690		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		852.12		$32,154	$0	852.12	45.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		7,669.00	1,758.00	$21,652	38,064,216.00	9,427.00	22,914.31
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	14,359.40
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87

6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

VALOR DE OBRA	38,064,216.00
INCIDENCIA	1.05%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1dVqCmvKolkLsFe_v-AZIAQ814xcd2s



https://drive.google.com/open?id=1SEIdZFQq7qGWA-N_scNgw3_cHXdU4Vki

FOTO 1	Pintura de las vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Instalación de vigas IPE. MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	1.29%	24.78%	41	3.01%	1.29%	$46,864,879	24.78%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	1.45%	26.22%	42	1.22%	1.45%	$52,703,171	26.22%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	0.82%	27.04%	43	1.38%	0.82%	$29,822,361	27.04%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.31%	27.35%	44	2.74%	0.31%	$11,136,252	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	**$38,064,216**	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	**$29,511,676**	30.65%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

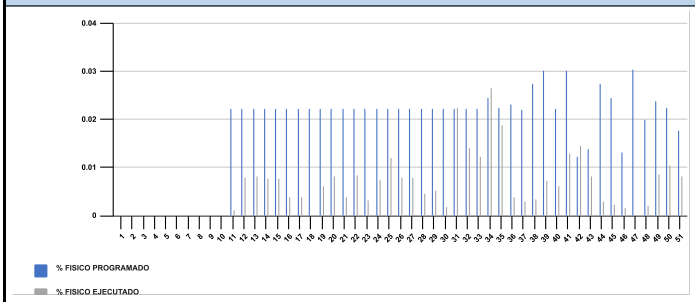

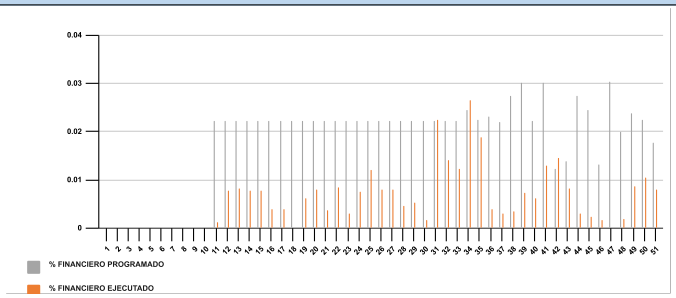

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-22	Se realiza pintura y soldaduras de vigas IPE.	N/A
		2023-11-23	Se realiza pintura y soldaduras de vigas IPE.	N/A
		2023-11-24	Se realiza pintura y soldaduras de vigas IPE.	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2717.92		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	2690		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	898		852.12		$32,154	$0	852.12	45.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		9,427.00	1,363.00	$21,652	29,511,676.00	10,790.00	21,551.31
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	14359.3968		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	14,359.40
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
