5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

VALOR DE OBRA	29,511,676.00
INCIDENCIA	0.81%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1M2cOdRvwl5cPnFldWgv_8266SHJQA8fq

FOTO 1 Soldadura de vigas IPE
MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1UQEAocHK01tNa8xeWI7ISHWVnGqRPQ

FOTO 2 Pintura de las vigas IPE
MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 48**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	21	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	23	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	24	4.50%	0.00%	$0	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	25	2.43%	0.00%	$0	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	26	1.57%	0.00%	$0	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2,05%	1.90%	99,36%	42	2,05%	1.90%	$84,187,270	99,36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	44	0.00%	0.00%	$0	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	45	0.00%	0.00%	$0	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	46	0.00%	0.00%	$0	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	47	0.00%	0.00%	$0	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	48	0.00%	0.00%	$0	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

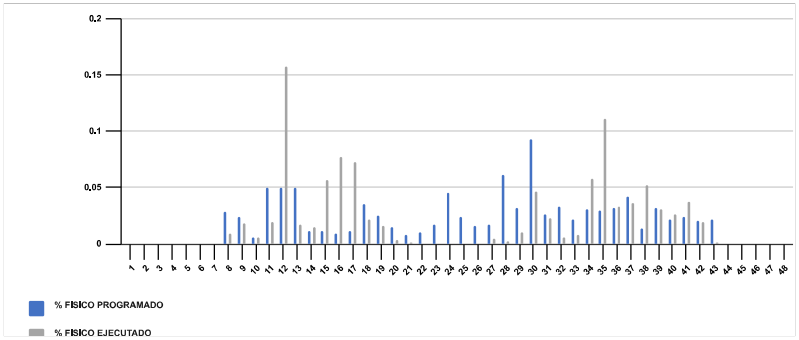

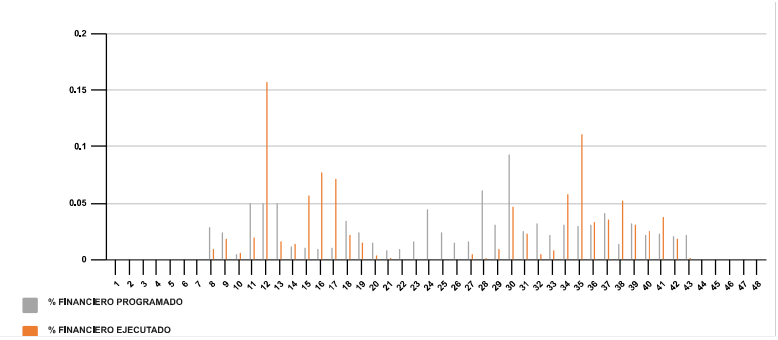

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00

2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-

5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-

	9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
	9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
	9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
	9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
	10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
	11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
	11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
	11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
	13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
	NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	21	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	23	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	24	4.50%	0.00%	$0	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	25	2.43%	0.00%	$0	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	26	1.57%	0.00%	$0	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	42	2.05%	1.90%	$84,187,270	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	44	0.00%	0.00%	$0	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	45	0.00%	0.00%	$0	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	46	0.00%	0.00%	$0	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	47	0.00%	0.00%	$0	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	48	0.00%	0.00%	$0	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	49	0.00%	0.00%	$0	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

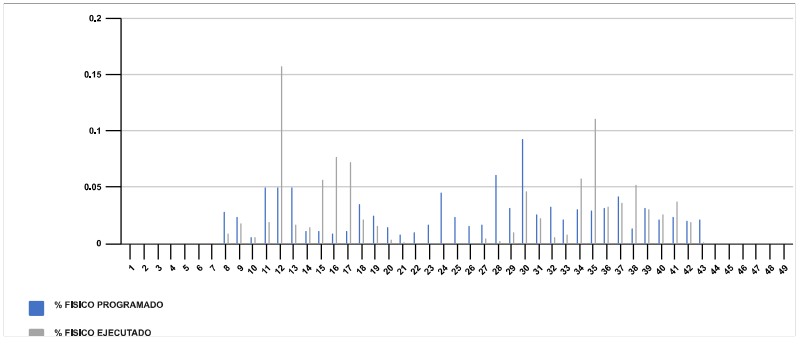

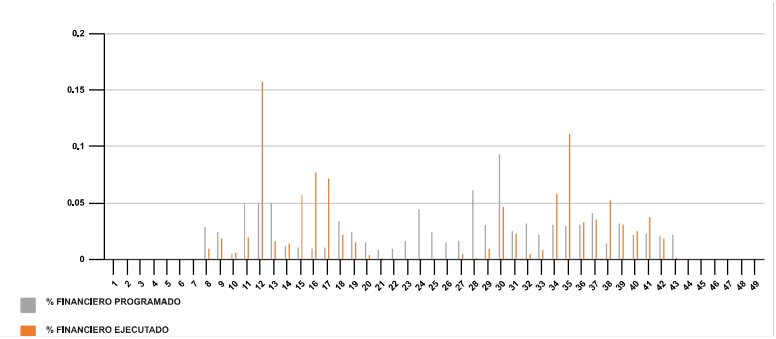

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2,23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00

2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-

5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-

	9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
	9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
	9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
	9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
	10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
	11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
	11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
	11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
	13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
	NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	**$6,589,763**	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	**$2,268,191**	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	**$0**	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	**$0**	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	**$0**	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

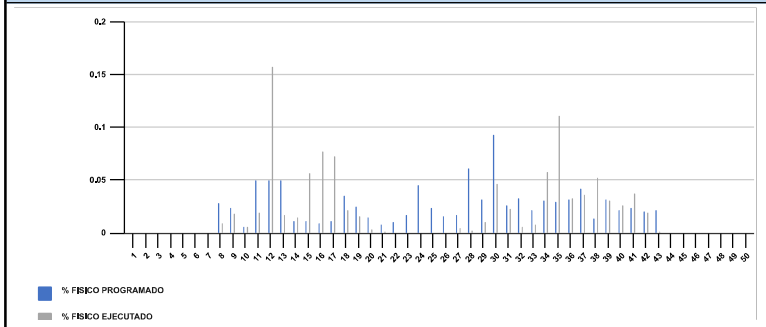

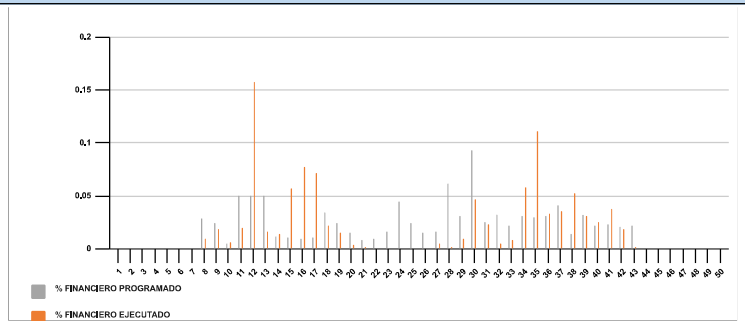

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53

2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00

2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-

9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-

	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71

NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	**$6,589,763**	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	**$2,268,191**	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	**$0**	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	**$0**	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	**$0**	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**51**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

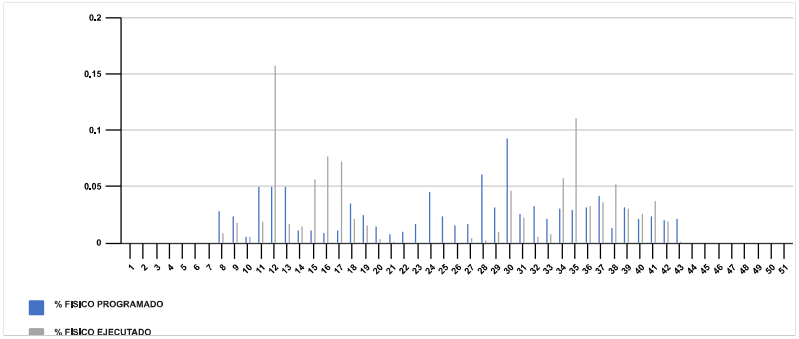

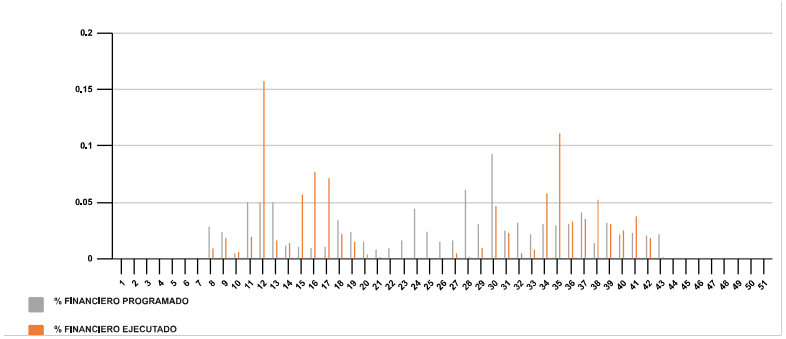

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53

2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00

2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-

9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-

*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
	NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
	NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 48	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	Pañete sobre muro en area interna de bloque nuevo	N/A
		2023-11-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45

2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		657.86	62.17	$23,961	1,489,655.37	720.03	403.97
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		79.00	0.00	$17,610	-	79.00	289.00
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00

6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-

VALOR DE OBRA	1,489,655.37
INCIDENCIA	0.12%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

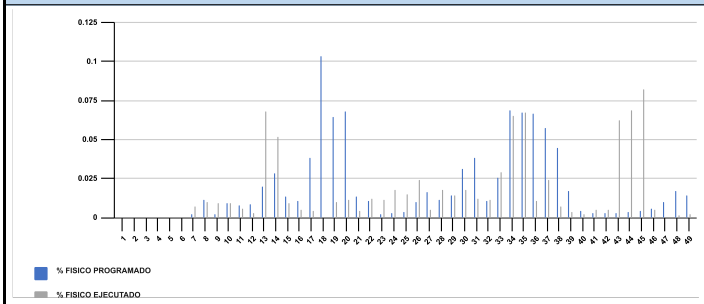

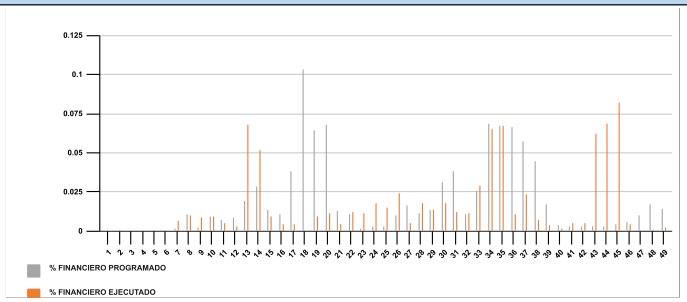

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	Se realiza pañete interno de bloque nuevo.	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.04	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	MES			-	0.00	$578,772	-	-	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	67		-	0.00	$23,673	-	-	67.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	23		-	0.00	$140,481	-	-	23.00
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2	ESTRUCTURA				0%			-	-	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML			-	0.00	$20,794	-	-	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2			-	0.00	$32,124	-	-	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36

2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	100.73		-	0.00	$90,362	-	-	100.73
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2			-	0.00	$260,694	-	-	-
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			-	0.00	$48,408	-	-	-
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML			-	0.00	$274,649	-	-	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	145		-	0.00	$559,014	-	-	145.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML			-	0.00	$18,074	-	-	-
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML			-	0.00	$229,078	-	-	-
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2			-	0.00	$154,549	-	-	-

2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2			-	0.00	$154,549	-	-	-
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	11.56		-	0.00	$113,318	-	-	11.56
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	23.03		-	0.00	$351,058	-	-	23.03
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	6.73		-	0.00	$1,254,738	-	-	6.73
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML			-	0.00	$28,100	-	-	-
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2			-	0.00	$354,181	-	-	-
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3	MAMPOSTERIA				-			-	-	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	668.57		-	0.00	$14,939	-	-	668.57
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.03	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML			-	0.00	$16,526	-	-	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		-	0.00	$92,552	-	-	820.36
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	555.16		-	0.00	$60,337	-	-	555.16
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		720.03	78.37	$23,961	1,877,823.57	798.40	325.60
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		79.00	57.18	$17,610	1,006,939.80	136.18	231.82

3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	350		-	0.00	$27,794	-	-	350.00
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML			-	0.00	$15,618	-	-	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML			-	0.00	$20,000	-	-	-
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2			-	0.00	$18,861	-	-	-
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT2			-	0.00	$107,045	-	-	-
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2			-	0.00	$38,862	-	-	-
4	ESTRUCTURA METALICA				-			-	-	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5	CUBIERTAS				-			-	-	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	427		-	0.00	$96,354	-	-	427.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2			-	0.00	$22,404	-	-	-
5.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	M2			-	0.00	$21,532	-	-	-
5.06	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INCLUYE RETIRO	ML			-	0.00	$9,892	-	-	-
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML	514.94		-	0.00	$8,357	-	-	514.94
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML			-	0.00	$151,298	-	-	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML			-	0.00	$90,800	-	-	-

5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TIPO AMAZONAS	ML			-	0.00	$51,908	-	-	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2			-	0.00	$59,248	-	-	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2			-	0.00	$133,816	-	-	-
6	ACABADOS				-			-	-	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	148.57		-	0.00	$24,487	-	-	148.57
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		-	0.00	$17,948	-	-	555.16
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	320		-	0.00	$17,384	-	-	320.00
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2			-	0.00	$20,720	-	-	-
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2			-	0.00	$18,887	-	-	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2			-	0.00	$20,457	-	-	-
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	445.39		-	0.00	$5,765	-	-	445.39
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	445.39		-	0.00	$32,600	-	-	445.39
6.12	PISO EN BALDOSA DURO PISO	MT2	222.7		-	0.00	$96,982	-	-	222.70
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML			-	0.00	$19,156	-	-	-
6.14	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO INCLUYE RELLENO DE JUNTAS	MT2			-	0.00	$115,802	-	-	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2			-	0.00	$73,815	-	-	-
6.16	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS. INCLUYE BOQUILLA	MT2			-	0.00	$77,136	-	-	-
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML			-	0.00	$12,513	-	-	-
6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.50 H=0.90. INCLUYE VANOS PARA LAVAMANOS Y SOPORTE PARA MESON.	ML			-	0.00	$616,876	-	-	-
6.19	ENCHAPE EN BALDOSA DE CEMENTO ≥ 0.20 X 0.20	M2			-	0.00	$78,933	-	-	-
6.20	ZÓCALO EN BALDOSA DE CEMENTO DE E ≥ 0.08 M	ML			-	0.00	$27,022	-	-	-
6.21	ZÓCALO EN ENCHAPE CERÁMICO h= 0,1 M	ML			-	0.00	$21,507	-	-	-
6.22	CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2			-	0.00	$93,422	-	-	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2			-	0.00	$77,644	-	-	-

6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2			-	0.00	$67,320	-	-	-
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT2			-	0.00	$89,140	-	-	-
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML			-	0.00	$21,660	-	-	-
7	CARPINTERIA METALICA				-			-	-	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2			-	0.00	$323,953	-	-	-
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	MT2	25.12		-	0.00	$819,193	-	-	25.12
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2			-	0.00	$493,556	-	-	-
7.07	MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA	M2			-	0.00	$37,426	-	-	-
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA FORTINET, DOBLE HILO, CLÁSICA O SIMILAR. INCLUYE FIJACIONES, POSTES VERTICALES Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO-POLIURETANO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	25.12		-	0.00	$162,600	-	-	25.12
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2			-	0.00	$334,742	-	-	-
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML			-	0.00	$306,616	-	-	-
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO CON SISTEMA EPOXICO. INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES	M2			-	0.00	$387,804	-	-	-

7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2			-	0.00	$891,836	-	-	-
7.13	PUERTA PRINCIPAL DE 2 HOJAS ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM DIMENSION: 2.10X0,90 m. INCLUYE ACCESORIOS, CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA SCHLAGE REF B-362 O SIMILAR, CERRADURA CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE MANILLAS Y ACCESORIOS ACERO INOX	UND			-	0.00	$5,071,625	-	-	-
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA FORRADA EN PVC, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" POR PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE PINTURA DEL CERRAMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR.	MT2			-	0.00	$135,924	-	-	-
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO MEDIDAS 1 X 2,10m	UND	25.12		-	0.00	$2,939,968	-	-	25.12
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA EN REJA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.10 METROS ENTRE BARROTES VERTICALES Y 0,20 METROS ENTRE BARROTES HORIZONTALES, MARCO EN VARILLA DE 1/2", INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	MT2			-	0.00	$192,251	-	-	-
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PUERTA, TABIQUE LISO, PARAL Y C EXTREMA.	MT2			-	0.00	$1,381,283	-	-	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND			-	0.00	$5,040,480	-	-	-
8	CARPINTERIA DE MADERA				-			-	-	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND			-	0.00	$32,643	-	-	-
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA DE CEDRO O ROBLE, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, VIDRIOS Y PINTURA EN TINTILLA	MT2			-	0.00	$592,927	-	-	-
8.03	PINTURA DE PUERTAS EN ESMALTE TIPO PINTUCO O SIMILAR	MT2			-	0.00	$32,151	-	-	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2			-	0.00	$204,956	-	-	-
8.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE CERRADURA TIPO POMO Y BISAGRAS.	M2			-	0.00	$58,613	-	-	-
9	ELECTRICO				-			-	-	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	56		-	0.00	$19,629	-	-	56.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-

9.03	**DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO**	UND	**411.2**		**1.00**	**0.00**	**$19,709**	**-**	**1.00**	**410.20**
9.04	**ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	ML	**60**		-	**0.00**	**$57,278**	**-**	-	60.00
9.05	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300**	UND	**6**		-	**0.00**	**$190,218**	**-**	-	6.00
9.06	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.**	UND	**1**		-	**0.00**	**$320,817**	**-**	-	1.00
9.07	**SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P**	UND	**78**		-	**0.00**	**$439,996**	**-**	-	78.00
9.08	**TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)**	ML	**150**		-	**0.00**	**$40,541**	**-**	-	150.00
9.09	**TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)**	ML	**60**		-	**0.00**	**$27,090**	**-**	-	60.00
9.10	**SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**24**		-	**0.00**	**$190,755**	**-**	-	24.00
9.11	**SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**10**		-	**0.00**	**$282,244**	**-**	-	10.00
9.12	**SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**12**		-	**0.00**	**$194,230**	**-**	-	12.00
9.13	**SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**16**		-	**0.00**	**$235,052**	**-**	-	16.00
9.14	**SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND	**25**		-	**0.00**	**$191,338**	**-**	-	25.00
9.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS**	ML			-	**0.00**	**$16,480**	**-**	-	-
9.16	**ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	ML	**2**		-	**0.00**	**$60,015**	**-**	-	2.00
9.17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.**	UND			-	**0.00**	**$441,714**	**-**	-	-
9.18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES**	UND			-	**0.00**	**$872,036**	**-**	-	-
9.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES**	UND			-	**0.00**	**$693,591**	**-**	-	-
9.20	**TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)**	ML			-	**0.00**	**$53,959**	**-**	-	-
9.21	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120**	UND			-	**0.00**	**$100,299**	**-**	-	-
9.22	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, NO INCLUYE PROTECCIONES**	UND			-	**0.00**	**$615,867**	**-**	-	-
9.23	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION**	UND			-	**0.00**	**$4,003,454**	**-**	-	-

9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND			-	0.00	$212,527	-	-	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML			-	0.00	$18,863	-	-	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND			-	0.00	$550,917	-	-	-
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND			-	0.00	$765,112	-	-	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND			-	0.00	$794,611	-	-	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND			-	0.00	$24,609	-	-	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND			-	0.00	$27,466	-	-	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND			-	0.00	$93,368	-	-	-
9.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO MAYOR DE 50A	UND			-	0.00	$119,225	-	-	-
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO MAYOR DE 40A	UND			-	0.00	$99,435	-	-	-
9.34	CABLE #8 AWG LIBRE DE HALOGENO ML	ML			-	0.00	$15,260	-	-	-
9.35	CABLE #6 AWG LIBRE DE HALOGENO ML	ML			-	0.00	$21,034	-	-	-
9.36	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML			-	0.00	$68,275	-	-	-
9.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 150w Luz Blanca 12700lm no incluye salida ni alimentador.	UND			-	0.00	$455,958	-	-	-
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND			-	0.00	$447,467	-	-	-
9.39	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML			-	0.00	$106,707	-	-	-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML			-	0.00	$117,110	-	-	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML			-	0.00	$121,310	-	-	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML			-	0.00	$283,058	-	-	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND			-	0.00	$298,701	-	-	-
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND			-	0.00	$298,801	-	-	-

9.45	**Breaker Industrial ABB Formula 125A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066708R1 o similar**	UND	**20**		-	**0.00**	**$709,717**	**-**	-	20.00
9.46	**Breaker Industrial ABB Formula 150A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar**	UND			-	**0.00**	**$761,041**	**-**	-	-
9.47	**Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar**	UND			-	**0.00**	**$814,922**	**-**	-	-
9.48	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND			-	**0.00**	**$282,196**	**-**	-	-
9.49	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND			-	**0.00**	**$161,147**	**-**	-	-
9.50	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISP. TRIANGULO B=3M. INCLUYE: 3 JABALINAS DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU- 20ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 75KG.**	UND			-	**0.00**	**$3,158,957**	**-**	-	-
9.51	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION JABALINA VERTICAL. INCLUYE: 1 JABALINA DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-CU 9ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 25KG.**	UND			-	**0.00**	**$1,195,602**	**-**	-	-
9.52	**ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4'', CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS**	ML			-	**0.00**	**$55,395**	**-**	-	-
9.53	**SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS**	UND			-	**0.00**	**$175,757**	**-**	-	-
9.54	**S.E.I. SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYE, Transformador Monofasico en Aceite de 75 KVA - 13.2Kv - 120 - 240v 2 CORTACIRCUITOS DE 27 KV, 100A, 2 PARARRAYOS DE 15 KV, KIT SPT, ARMADO Y ELEMENTOS Y TRAMITES NO DESCRITOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E.**	UND			-	**0.00**	**$19,388,197**	**-**	-	-
9.55	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO EN POSTE DE HORMIGON 12m X 1050 INCLUYE TRANSPORTE, HOYADO, APLOMADO Y CIMENTADO.**	UND			-	**0.00**	**$3,300,808**	**-**	-	-
9.56	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN 2#1/0F+1#1/0N DESDE TRANSFORMADOR HASTA TGD**	ML			-	**0.00**	**$301,739**	**-**	-	-
9.57	**S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.**	UND			-	**0.00**	**$7,695,992**	**-**	-	-
9.58	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA WALLPACK LED, TIPO BUQUE O SIMILAR. IP-65 , INCLUYE PRENSOESTOPA Y ELEMENTOS DE FIJACION.**	UND			-	**0.00**	**$145,709**	**-**	-	-

9.59	**Suministro e instalacion de reflector Led Highbay 200w Luz Blanca Gc015 24000 Lúmenes 100-240v o similar para canchas multiples**	UND			-	**0.00**	**$1,156,414**	**-**	-	-
9.60	**S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 400A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 125A 1un, 80A 2 un, 60A 2 un 40A 3 un, barrajes FFFNT, 2 reservas, p/planos, f. muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.**	UND			-	**0.00**	**$9,564,962**	**-**	-	-
9.61	**S.E.I. Panel LED RECTANGULAR 30x120 Cm 40w Luz Blanca incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.**	UND			-	**0.00**	**$190,218**	**-**	-	-
9.62	**S.E.I. PANEL LED CUADRADO 60x60 40w Luz Blanca 100-277v incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.**	UND			-	**0.00**	**$190,218**	**-**	-	-
9.63	**S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.**	UND			-	**0.00**	**$117,374**	**-**	-	-
9.64	**S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR**	ML			-	**0.00**	**$39,900**	**-**	-	-
9.65	**S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES**	UND			-	**0.00**	**$29,990**	**-**	-	-
10	**HIDRAULICO, AGUAS LLUVIAS Y AGUA POTABLE**				-			**-**	-	-
10.01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA**	UND	**2**		-	**0.00**	**$831,933**	**-**	-	2.00
10.02	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4"**	UND	**4**		-	**0.00**	**$50,230**	**-**	-	4.00
10.03	**REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION**	UND	**14**		7.00	**0.00**	**$1,488,291**	**-**	7.00	7.00
10.04	**PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"**	UND	**34**		17.00	**0.00**	**$64,019**	**-**	17.00	17.00
10.05	**PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"**	UND	**40**		13.00	**0.00**	**$96,952**	**-**	13.00	27.00
10.06	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"**	ML	**120**		-	**0.00**	**$35,397**	**-**	-	120.00
10.07	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"**	ML			-	**0.00**	**$29,367**	**-**	-	-
10.08	**LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.**	UND			-	**0.00**	**$51,641**	**-**	-	-
10.09	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21**	ML			-	**0.00**	**$29,268**	**-**	-	-
10.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA**	UND			-	**0.00**	**$859,102**	**-**	-	-
10.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA**	UND			-	**0.00**	**$212,285**	**-**	-	-
10.12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL**	UND			-	**0.00**	**$756,617**	**-**	-	-
10.13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2**	ML	**24**		12.00	**0.00**	**$45,401**	**-**	12.00	12.00
10.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"**	ML	**184**		92.00	**0.00**	**$27,015**	**-**	92.00	92.00

10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASIENTO SANITARIO CONFORTO CORONA BLANCO	UND			-	0.00	$156,389	-	-	-
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	UND			-	0.00	$67,036	-	-	-
10.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ATLAS PLUS PARA TANQUE SANITARIO	UND			-	0.00	$75,701	-	-	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML			-	0.00	$534,334	-	-	-
10.20	FILTRO FRANCES 0,60 X 0,40 MTS, TUBO RANURADO DE 4". INCLUYE GEOTEXTIL NT2000	ML			-	0.00	$104,031	-	-	-
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.22	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO RUBATEX 3/4" PARA DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS.	ML			-	0.00	$17,877	-	-	-
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH O SIMILAR	UND			-	0.00	$451,081	-	-	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND			-	0.00	$43,887	-	-	-
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND			-	0.00	$38,020	-	-	-
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657, LÍNEA CORONA O SIMILAR	UND			-	0.00	$1,587,962	-	-	-
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND			-	0.00	$674,797	-	-	-
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA.	UND			-	0.00	$849,125	-	-	-
10.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND			-	0.00	$719,231	-	-	-
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
10.31	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND			-	0.00	$51,125	-	-	-
11	URBANISMO				-			-	-	0%
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2			-	0.00	$136,534	-	-	-
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3			-	0.00	$146,312	-	-	-
11.03	JARDINERAS EN LADRILLO COMUN H=0.40 MTS	ML	67		-	0.00	$107,839	-	-	67.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML			-	0.00	$67,760	-	-	-

11.05	ANDÉN EN ADOQUÍN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.	MT2			-	0.00	$162,652	-	-	-
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2			-	0.00	$160,737	-	-	-
12	AMBIENTAL				-			-	-	-
12.01	TALA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND			-	0.00	$1,556,196	-	-	-
12.02	PODA DE ARBOLES MEDIANOS INC RETIRO	UND	445.39		-	0.00	$1,088,110	-	-	445.39
12.03	CONTROL DE PLAGAS (CUCARACHAS, ROEDORES, PLAGAS DE LA MADERA, PLAGAS DE CHINCHES, HORMIGAS, RASTREROS, AVES Y MURCIÉLAGOS, PULGA, GARRAPATAS, ÁCAROS, MOSCAS Y VECTORES). INCLUYE PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	MT2			-	0.00	$3,387	-	-	-
12.04	PODA DE ARBOLES GRANDES INC RETIRO Y TRAMITES	UND			-	0.00	$1,397,697	-	-	-
13	NO PREVISTOS				-			-	-	-
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1e-BN99pc_jTYPF5MI3aKIb4tYNH9y



https://drive.google.com/open?id=1fk7muRBqHxqlAqbxRlqrZwlwKBn378sK

FOTO 1	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

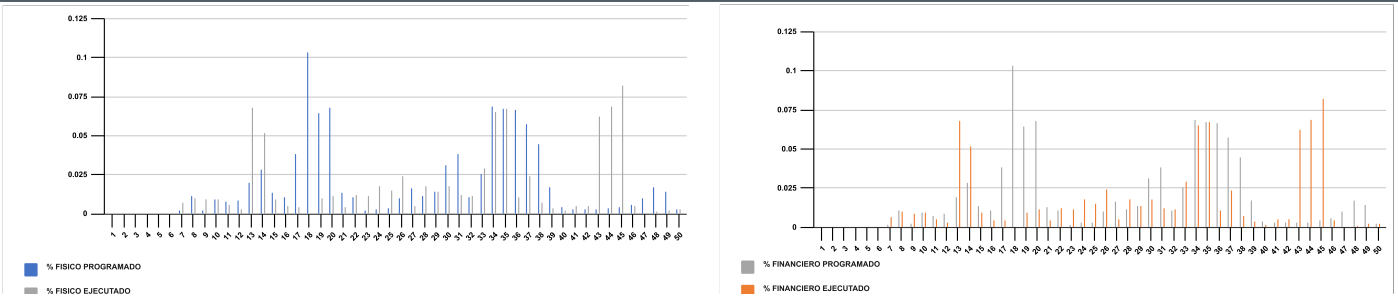

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	Pañete interior en fachada de bloque nuevo.	N/A
		2023-11-14	Pañete interior en bloque nuevo.	N/A
		2023-11-15	Filos de ventanas y puertas.	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38

2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		798.40	59.67	$23,961	1,429,752.87	858.07	265.93
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		136.18	88.97	$17,610	1,566,761.70	225.15	142.85
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-

VALOR DE OBRA	2,996,514.57
INCIDENCIA	0.25%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1GIPPnaiuSlqNwpl9GtGq2Ef201D9h



https://drive.google.com/open?id=1taiCkCplczBQEGu5SexQezyAQze4ZR6c

FOTO 1	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

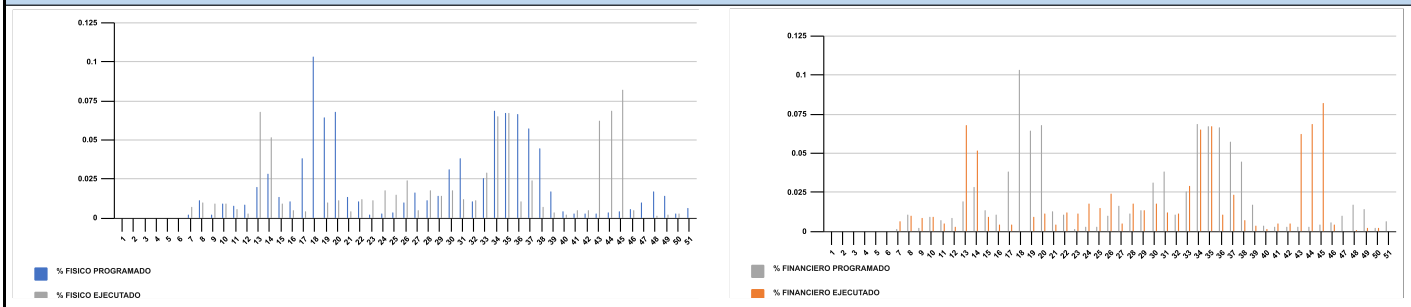

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78

2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		858.07	0.00	$23,961	-	858.07	265.93
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		225.15	0.00	$17,610	-	225.15	142.85
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 48**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	29	AL	4

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.67%	8.24%	13	9.15%	7.67%	$101,343,659	8.24%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.03%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.71%	25.74%	15	3.94%	10.71%	$141,411,474	25.74%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.57%	43.31%	16	2.95%	17.57%	$232,033,475	43.31%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.11%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.11%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.92%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.92%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.92%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.92%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.78%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.78%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.41%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.41%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.28%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.28%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.62%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.62%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.35%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.35%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.68%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.68%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.91%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.91%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.20%	58.12%	27	1.18%	5.20%	$68,723,990	58.12%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.87%	63.99%	28	2.18%	5.87%	$77,524,636	63.99%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.40%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.40%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.09%	70.50%	30	2.28%	3.09%	$40,864,298	70.50%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.74%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.74%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.90%	75.64%	32	3.38%	2.90%	$38,358,568	75.64%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.60%	3.88%	79.52%	33	1.60%	3.88%	$51,212,446	79.52%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.35%	16.11%	95.63%	34	1.35%	16.11%	$212,808,495	95.63%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	35	0.00%	0.00%	$0	95.63%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	36	0.00%	0.00%	$0	95.63%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	37	0.00%	0.00%	$0	95.63%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	38	0.00%	0.00%	$0	95.63%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	39	0.00%	0.00%	$0	95.63%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	40	0.00%	0.00%	$0	95.63%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	41	0.00%	0.00%	$0	95.63%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	42	0.00%	0.00%	$0	95.63%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.39%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.39%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	44	0.00%	0.00%	$0	96.39%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	45	0.00%	0.00%	$0	96.39%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	46	0.00%	0.00%	$0	96.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	47	0.00%	0.00%	$0	96.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	48	0.00%	0.00%	$0	96.39%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

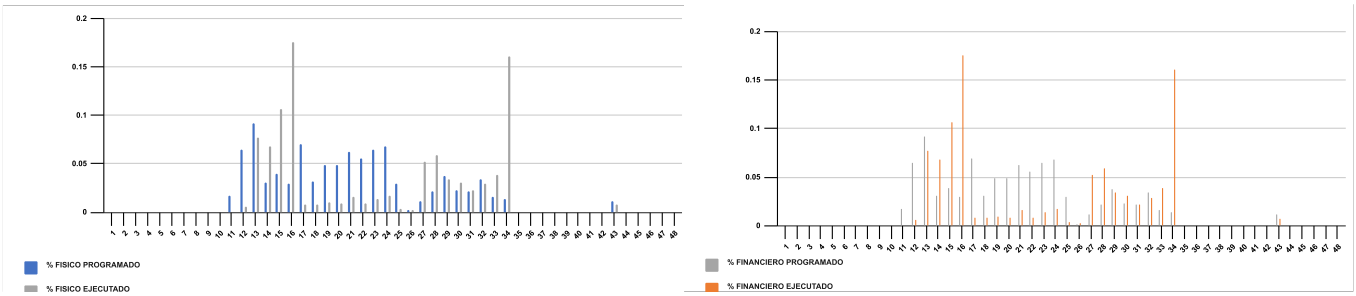

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-10-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-10-31	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	961.5		961.50		$93,507	-	961.50	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	204.02		204.02		$34,062	-	204.02	0.00
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00

2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	NO APLICA	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 49**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	5	AL	11

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.67%	8.24%	13	9.15%	7.67%	$101,343,659	8.24%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.03%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.71%	25.74%	15	3.94%	10.71%	$141,411,474	25.74%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.57%	43.31%	16	2.95%	17.57%	$232,033,475	43.31%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.11%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.11%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.92%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.92%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.92%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.92%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.78%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.78%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.41%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.41%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.28%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.28%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.62%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.62%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.35%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.35%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.68%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.68%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.91%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.91%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.20%	58.12%	27	1.18%	5.20%	$68,723,990	58.12%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.87%	63.99%	28	2.18%	5.87%	$77,524,636	63.99%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.40%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.40%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.09%	70.50%	30	2.28%	3.09%	$40,864,298	70.50%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.74%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.74%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.90%	75.64%	32	3.38%	2.90%	$38,358,568	75.64%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.60%	3.88%	79.52%	33	1.60%	3.88%	$51,212,446	79.52%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.35%	16.11%	95.63%	34	1.35%	16.11%	$212,808,495	95.63%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	35	0.00%	0.00%	$0	95.63%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	36	0.00%	0.00%	$0	95.63%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	37	0.00%	0.00%	$0	95.63%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	38	0.00%	0.00%	$0	95.63%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	39	0.00%	0.00%	$0	95.63%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	40	0.00%	0.00%	$0	95.63%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	41	0.00%	0.00%	$0	95.63%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	42	0.00%	0.00%	$0	95.63%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.39%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.39%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	44	0.00%	0.00%	$0	96.39%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	45	0.00%	0.00%	$0	96.39%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	46	0.00%	0.00%	$0	96.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	47	0.00%	0.00%	$0	96.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	48	0.00%	0.00%	$0	96.39%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	49	0.00%	0.00%	$0	96.39%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

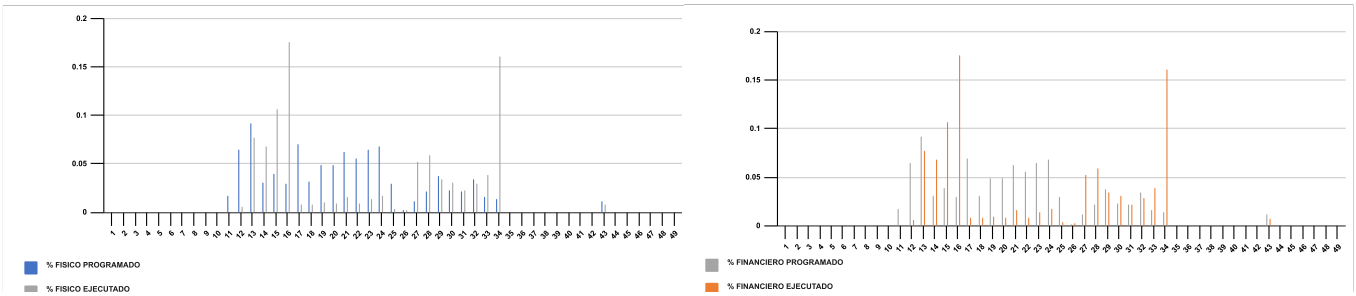

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-11-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	961.5		961.50		$93,507	-	961.50	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	204.02		204.02		$34,062	-	204.02	0.00
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	NO APLICA	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 50**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	12	AL	18

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.67%	8.24%	13	9.15%	7.67%	$101,343,659	8.24%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.03%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.71%	25.74%	15	3.94%	10.71%	$141,411,474	25.74%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.57%	43.31%	16	2.95%	17.57%	$232,033,475	43.31%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.11%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.11%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.92%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.92%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.92%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.92%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.78%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.78%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.41%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.41%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.28%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.28%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.62%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.62%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.35%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.35%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.68%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.68%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.91%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.91%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.20%	58.12%	27	1.18%	5.20%	$68,723,990	58.12%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.87%	63.99%	28	2.18%	5.87%	$77,524,636	63.99%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.40%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.40%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.09%	70.50%	30	2.28%	3.09%	$40,864,298	70.50%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.74%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.74%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.90%	75.64%	32	3.38%	2.90%	$38,358,568	75.64%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.60%	3.88%	79.52%	33	1.60%	3.88%	$51,212,446	79.52%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.35%	16.11%	95.63%	34	1.35%	16.11%	$212,808,495	95.63%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	35	0.00%	0.00%	$0	95.63%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	36	0.00%	0.00%	$0	95.63%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	37	0.00%	0.00%	$0	95.63%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	38	0.00%	0.00%	$0	95.63%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	39	0.00%	0.00%	$0	95.63%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	40	0.00%	0.00%	$0	95.63%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	41	0.00%	0.00%	$0	95.63%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	42	0.00%	0.00%	$0	95.63%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.39%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.39%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	44	0.00%	0.00%	$0	96.39%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	45	0.00%	0.00%	$0	96.39%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	46	0.00%	0.00%	$0	96.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	47	0.00%	0.00%	$0	96.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	48	0.00%	0.00%	$0	96.39%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	49	0.00%	0.00%	$0	96.39%

50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	50	0.00%	0.00%	$0	96.39%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

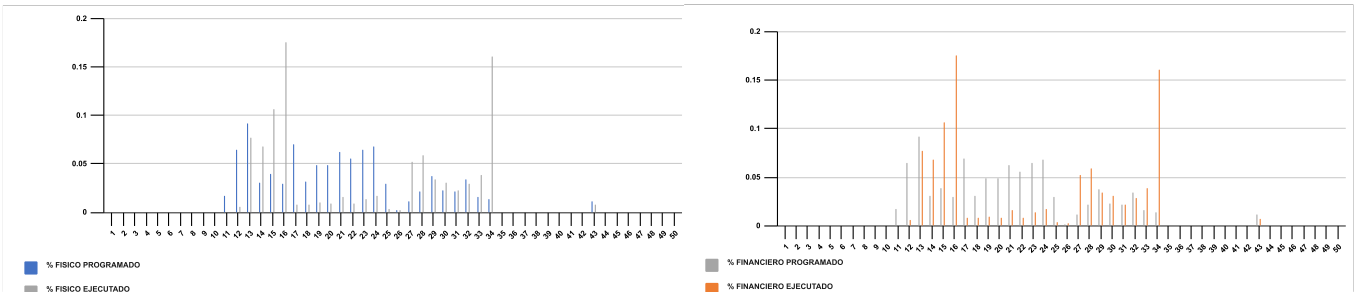

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-11-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	961.5		961.50		$93,507	-	961.50	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	204.02		204.02		$34,062	-	204.02	0.00
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	NO APLICA	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 51**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**11**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	19	AL	25

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.67%	8.24%	13	9.15%	7.67%	$101,343,659	8.24%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.03%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.71%	25.74%	15	3.94%	10.71%	$141,411,474	25.74%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.57%	43.31%	16	2.95%	17.57%	$232,033,475	43.31%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.11%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.11%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.92%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.92%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.92%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.92%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.78%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.78%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.41%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.41%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.28%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.28%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.62%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.62%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.35%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.35%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.68%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.68%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.91%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.91%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.20%	58.12%	27	1.18%	5.20%	$68,723,990	58.12%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.87%	63.99%	28	2.18%	5.87%	$77,524,636	63.99%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.40%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.40%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.09%	70.50%	30	2.28%	3.09%	$40,864,298	70.50%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.74%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.74%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.90%	75.64%	32	3.38%	2.90%	$38,358,568	75.64%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.60%	3.88%	79.52%	33	1.60%	3.88%	$51,212,446	79.52%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.35%	16.11%	95.63%	34	1.35%	16.11%	$212,808,495	95.63%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	35	0.00%	0.00%	$0	95.63%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	36	0.00%	0.00%	$0	95.63%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	37	0.00%	0.00%	$0	95.63%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.63%	38	0.00%	0.00%	$0	95.63%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	39	0.00%	0.00%	$0	95.63%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	40	0.00%	0.00%	$0	95.63%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	41	0.00%	0.00%	$0	95.63%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.63%	42	0.00%	0.00%	$0	95.63%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.39%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.39%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	44	0.00%	0.00%	$0	96.39%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	45	0.00%	0.00%	$0	96.39%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	46	0.00%	0.00%	$0	96.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.39%	47	0.00%	0.00%	$0	96.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	48	0.00%	0.00%	$0	96.39%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	49	0.00%	0.00%	$0	96.39%

50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	50	0.00%	0.00%	$0	96.39%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.39%	51	0.00%	0.00%	$0	96.39%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

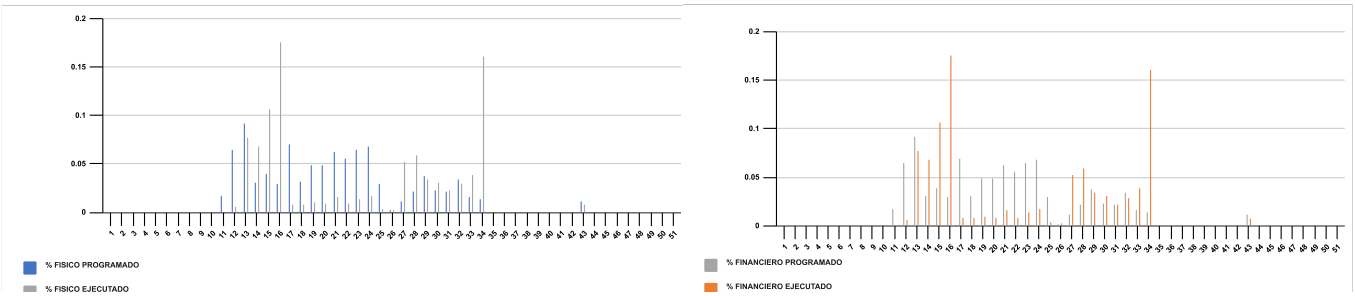

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-11-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	961.5		961.50		$93,507	-	961.50	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	204.02		204.02		$34,062	-	204.02	0.00
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
								VALOR DE OBRA	-	
								INCIDENCIA	0.00%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	NO APLICA	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
