



26 - 12 - 2023 (Martes)
Dia Soleado
Equipo en obra: Trompo y Andamios
Actividades: no se realizaron actividades en obra







27 - 12 - 2023 (Miercoles)
Dia Soleado
Equipo en obra: Trompo y Andamios
Actividades: no se realizaron actividades en obra







28 - 12 - 2023 (jueves)
Dia Soleado
Equipo en obra: Trompo y Andamios
Actividades: no se realizaron actividades en obra





29 - 12 - 2023 (Viernes)
Estado del dia: Soleado
Equipos en obra: Trompo y Andamios
Actividades: no se realizaron actividades en obra






30 - 12 - 2023 (Sabado)
Estado del clima : Soleado
Equipos en obra : Andamios y torpe
Actividades: no se realizaron actividades en obra



Contratista



Interventoria.

PRÓRROGA Nº 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°SA-EDU-0001-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO IE DISTRITO

IDENTIFICACIÓN: 901.646.712-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.,** con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.123.731.019, en Representación del CONSORCIO IE DISTRITO, identificado con NIT: 901.646.712-7 estructura plural integrada por: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S., identificada con NIT: 901.013.669-1, con un porcentaje de participación del 40%, HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S., identificada con NIT: 900.497.862-1, con un porcentaje de participación del 30% y HM INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT: 800.187.291-1, con un porcentaje de participación del 30%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prórroga Nº 4 al contrato de Interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, suscrito el día veintiocho (28) de noviembre de 2022, que se regulará por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2022, se suscribió contrato de interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA". 2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del contrato se estableció en la suma de **MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.349.952.660)** incluido IVA, así como todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el día seis (06) de diciembre de 2022 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día seis (06) de diciembre de 2022 se suscribió Acta de inicio al contrato de Interventoría Nº SA-EDU-0001-2022. **6.-** Que el día veintinueve (29) de diciembre del 2022, se suscribió prórroga Nº 1 al contrato de interventoría No. SA-EDU-0001-2022, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio del 2023. **7.-** Que el día veintiocho (28) de julio de 2023, se suscribió prórroga Nº 2 al contrato de interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre del 2023. **8.-** Que el día treinta y uno (31) de octubre de 2023 se suscribió Prórroga Nº 3 al contrato de interventoría No. SA-EDU-0001-2022, ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023. **9.-** Que mediante oficio CIED-2023-180 de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2023, el interventor del contrato de obra N° EDU-345-2022, solicita a EDUBAR S.A., prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría Nº SA-EDU-0001-2022, por el término de tres (03) meses, es decir hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024. **10.-** Que mediante oficio de fecha veinte (20) de diciembre del 2023, la Ingeniera LIZZ FIGUEREDO ARCE, contratista en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría **N° SA-EDU-0001-2022,** recomienda a la Gerencia General, prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de tres (03) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024, contados a partir de la fecha de terminación estipulada en el contrato principal y la prórroga Nº 3 en los siguientes términos: (…). *"me permito recomendar la prórroga del contrato de interventoría No. SA-EDU-0001-2022 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024, con el fin de seguir garantizando el control y seguimiento de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra Nº EDU-345-2022, de acuerdo con los mismos argumentos expuestos por el contratista. Lo anterior, en concordancia con el oficio de Interventoría No. CIED-2023-180 del diecinueve (19) de diciembre de 2023".* **11.-** Que teniendo en cuenta lo anterior, y que el contrato se encuentra vigente, la Gerencia General procedió a realizar la verificación previa del expediente contractual,

y estima que resulta conveniente llevar a cabo la Prorroga N° 4 al contrato de interventoría SA-EDU-0001-2022. **12.-** Que en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA:- OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría SA-EDU-0001-2022, suscrito entre las partes el día veintiocho (28) de noviembre de 2022. **CLÁUSULA SEGUNDA: - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal y la prórroga N° 3. **CLÁUSULA TERCERA:- EQUILIBRIO ECONÓMICO:-** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA CUARTA:- GARANTIAS: EL CONTRATISTA** se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prórroga N° 4 aquí estipulada. **CLÁUSULA QUINTA:- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA:- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:-** La presente Prórroga N° 4, se considera perfeccionada con la firma de la misma por las partes, y continua su ejecución al vencimiento del plazo establecido en la prórroga N° 3.

Proyectó. Guillermo Coba
Revisó: Albeiro García

Barranquilla, 19 de diciembre de 2023 **CIED-2023-181**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud de Programación para correctivos en IED Carrizal.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones contractuales, nos permitimos reiterar el requerimiento solicitado mediante oficio No. CIED-2023-148 del 19 de octubre de 2023 y CIED-2023-170 del 29 de noviembre, de los cuales a la fecha no hemos obtenida respuesta de la programación proyectada para la toma de detalles en IED Carrizal.

Recordamos que esta información es indispensable para verificar el avance y corrección sobre los detalles constructivos evidenciados durante los diversos recorridos a obra, por lo cual solicitamos de manera perentoria remitir la misma con las evidencias de cumplimiento de este compromiso en plazo no superior a un (1) día calendario.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 19 de diciembre de 2023 **CIED-2023-180**

SEÑORES
EDUBAR

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Solicitud de Prorroga a Contrato de Obra y Contrato de Interventoría

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en ocasión al recibo del comunicado bajo radicado N° CED-165-2023 del Consorcio Educativo, Distrital, en solicitud de Prórroga N°4, nos permitimos extender recomendación en favor de proceder con la mismas ante la entidad, toda vez que el caso expuesto ha sido estudiado con rigurosidad y validado, verificando la existencia de eventos los cuales no resultan imputables al Contratista de Obra.

Como es de su conocimiento, en el desarrollo del proceso en referencia, se ha hecho previamente mención sobre las motivaciones que indica el Contratista de Obra, siendo los casos ampliamente debatidos y revisados, en busca de las mejores alternativas de intervención. Esto es, buscando las alternativas a sobreponerse a condiciones de las frentes únicamente evidenciadas posterior al inicio de las obras, ajustes en diseños, abastecimiento con proveedores y permanente imprevistos que suponen ajustes presupuestales y replanteo de alternativas en los frentes de trabajo. A la fecha, se han superado numerosos eventos de esta naturaleza, sin embargo, como se expone en el presente comunicado, se generan retrasos que incrementan los tiempos para ejecución, por lo que asiste razón al contratista en solicitar extensión del plazo, con el fin de culminar a satisfacción las obras propuestas, una vez definidas las rutas de trabajo.

Así las cosas, entiendo las condiciones presentes, se recomienda comedidamente a la entidad, se sirva someter a estudio la alternativa de extender los plazos de ejecución del contratista de obra e interventoría por (3) tres meses a partir de la finalización del plazo vigente, dando plazo oportuno de finalizar a cabalidad las obras.

Sin otro particular.

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito

Barranquilla, 15 de diciembre de 2023 **CIED-2023-179**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: RADICADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°4

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir Acta Parcial de Interventoría N°4. Para diligencia de cobro. Adjunto a la misma, se encuentran los anexos solicitados para el trámite correspondiente.

1. Acta Parcial de Interventoría N° 4
2. Factura
3. Resolución de la DIAN
4. Certificación Bancaria
5. RUT
6. Contrato de Interventoría
7. Prorroga N°1
8. Prorroga N°2
9. Prorroga N°3
10. Pólizas
11. Seguridad Social
12. Informe de Gestión
13. Acta de Recibo Parcial a Satisfacción
14. Documento consorcial

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo:

Barranquilla, 15 de diciembre de 2023 **CIED-2023-178**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°11

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir el informe mensual N° 11 de la interventoría CONSORCIO IE DISTRITO con sus respectivos anexos.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo: INFORME MENSUAL 11

Barranquilla, 11 de diciembre de 2023 **CIED-2023-177**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: RADICADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°3

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir Acta Parcial de Interventoría N°3. Para diligencia de cobro. Adjunto a la misma, se encuentran los anexos solicitados para el trámite correspondiente.

1. Acta Parcial de Interventoría N° 3
2. Factura
3. Resolución de la DIAN
4. Certificación Bancaria
5. RUT
6. Contrato de Interventoría
7. Prorroga N°1
8. Prorroga N°2
9. Prorroga N°3
10. Pólizas
11. Seguridad Social
12. Informe de Gestión
13. Acta de Recibo Parcial a Satisfacción
14. Documento consorcial
15. Informe Mensual 9
16. Informe Mensual 10

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo:

Barranquilla, 7 de diciembre de 2023 **CIED-2023-176**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Corrección de informe mensual 9

Estimados Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos remitir el informe mensual de interventoria N9 con las correcciones realizadas.

Permanecemos atentos a sus comentarios y/o inquietudes.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo: Informe mensual 9

Barranquilla, 4 de diciembre de 2023 **CIED-2023-175**

SEÑORES
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: Corrección de informe técnico 11

Estimados Ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos remitir los comentarios con respecto al INFORME TECNICO 11 allegado a esta interventoría.

Permanecemos atentos a sus comentarios y/o inquietudes.

Sin otro particular,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexo: Informe Tecnico 11

Barranquilla, 01 de diciembre de 2023 **CIED-2023-174**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: RADICADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°3

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir Acta Parcial de Interventoría N°3. Para diligencia de cobro. Adjunto a la misma, se encuentran los anexos solicitados para el trámite correspondiente.

1. Acta Parcial de Interventoría N° 3
2. Factura
3. Resolución de la DIAN
4. Certificación Bancaria
5. RUT
6. Contrato de Interventoría
7. Prorroga N°1
8. Prorroga N°2
9. Prorroga N°3
10. Pólizas
11. Seguridad Social
12. Informe de Gestión
13. Acta de Recibo Parcial a Satisfacción
14. Documento consorcial

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos:

Barranquilla, 01 de diciembre de 2023 **CIED-2023-173**

SEÑORES
EDUBAR S.A

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Asunto: INFORME MENSUAL N°10

Estimados ingenieros,

Por medio de la presente, en cumplimiento de nuestras funciones como interventoría, nos permitimos remitir el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°10 con sus respectivos anexos.

Permanecemos atentos a cualquier comentario y/o inquietud.

Cordialmente,

Marcela Patricia Baquero Aponte.
Representante Legal – Consorcio I.E. Distrito
Anexos: Informe mensual 10

IP-01211

Barranquilla, 27 de dic. de 23

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
ATN. MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

REF: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD-05-2022-3691, QUE TIENE POR OBJETO "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cordial saludo,

En atención al contrato en referencia y reiterando el **Oficio IP – 01016**, se realiza la siguiente solicitud, con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia del **SG-SST,** se realice la entrega de los siguientes requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que deben ser desarrollados e implementados durante la ejecución del contrato.

- Remitir el plan de gestión integral del riesgo realizado por el contratista y aprobado por interventoría.
- Remitir el certificado o documento de recibido del plan integral de gestión del riesgo realizado para el proyecto.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración

Cordialmente,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Gerente – Representante Legal.
EDUBAR S.A.
Proyecto: Jhonathan Beltrán
Reviso: Lizz Figueredo

IP-01180

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

Barranquilla, 21 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO IE DISTRITO
MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
ATN. CRISTIAN DAVID JIMENEZ YEJAS
Representante legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SA-EDU-0001-2022, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

REF: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO D ELA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

ASUNTO: ENTERGA DE INFORMES MENSUALES ÁREA TÉCNICA Y SST-A

Cordial saludo

Mediante la presente, EDUBAR S.A. en calidad de contratante de los contratos de la referencia, y en concordancia con las obligaciones establecidas en la CLÁUSULA NOVENA – "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA" del contrato de obra EDU-345-2022 y la CLÁUSULA SÉPTIMA – "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" del contrato de interventoría SA-EDU-0001-2022, las cuales reza:

"(...) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de bitácora y esquemas de ubicación, además de otros informes que solicite EDUBAR S.A."

Se les solicita comedidamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales respecto a la entrega de informes mensuales, remitiendo la información que a continuación se detalla:

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

Tabla 1 Estado de informes componente técnico

INFORME	PERIODO	ESTADO OBRA	ESTADO INTERVENTORÍA
No. 12	1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023	No se ha presentado	No se ha presentado

Tabla 2 Estado de informes componente ambiental y seguridad y salud en el trabajo

INFORME	PERIODO	ESTADO OBRA	ESTADO INTERVENTORÍA
No. 12	1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023	No se ha presentado	No se ha presentado

La anterior información debe ser remitida a más tardar el martes 26 de diciembre de 2023. Sin perjuicio de ejercer las acciones contractuales a que haya lugar.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Supervisor
EDUBAR S.A.
Proyectó: Valentina Barrios Andrade VB
Aprobó: Evert Salgado Saballeth

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 19 de diciembre de 2023

CED-165-2023

Señores

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Representante legal
Consorcio IE Distrito

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: Solicitud de prórroga No. 4 al contrato de obra No. EDU-345-2022

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio nos permitimos realizar la solicitud correspondiente a la prórroga No. 4 del contrato de obra No. EDU–345–2022.

Actualmente, el plazo de ejecución para la intervención de los alcances aprobados es hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, a la fecha, este consorcio, considera que es necesario la ampliación de este, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Tras la elaboración, revisión y aprobación de los diseños para el reforzamiento estructural de la **IED JOSÉ EUSEBIO CARO**, implementamos las labores correspondientes con el objetivo de garantizar la estabilidad de la estructura de la institución, particularmente en la zona de intervención afectada por los problemas evidenciados en el sistema estructural de pórticos de concreto.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

No obstante, nos hemos enfrentado a complicaciones significativas en la ejecución de los trabajos de reforzamiento. A pesar de los ajustes realizados en los diseños originales, la complejidad inherente de las tareas ha demostrado ser más compleja de lo inicialmente anticipado, impactando negativamente en el ritmo de avance de las actividades programadas, generando retrasos significativos en la finalización del proyecto.

Asimismo, la naturaleza especifica de los reforzamientos estructurales ha requerido una reevaluación de nuestros planes de trabajo. La supervisión y seguimiento meticuloso se han convertido en elementos ineludibles para asegurar la seguridad y calidad de las estructuras resultantes. Este proceso adicional, aunque esencial, ha contribuido a los retrasos observados en la ejecución de los trabajos. (Ver anexo 1) (Ver anexo 4) (Ver anexo 5).

- Durante la ejecución de las actividades en la **IED CARRIZAL SEDE 1** en las últimas semanas, nos hemos enfrentado a eventos climáticos, como fuertes lluvias y condiciones atmosféricas desfavorables. Estos factores generaron complicaciones técnicas que impidieron la realización de las fundidas de elementos en concreto inicialmente planificados, afectando específicamente la cimentación de la rampa y muro de cerramiento, la construcción del tanque subterráneo, así como la edificación de columnas y vigas aéreas del nivel 3 del bloque en construcción. Ante estas circunstancias, hemos considerado prudente interrumpir temporalmente las actividades de construcción durante las horas de la jornada laboral en que se presentan los eventos mencionados, priorizando la seguridad y calidad de la obra.

  La incidencia de estas condiciones climáticas adversas ha generado una significativa ralentización en el progreso del proyecto. Para contrarrestar estos inconvenientes, hemos implementado medidas adicionales, tales como ajustes en los horarios de trabajo y la movilización de recursos extras. No obstante, a pesar de nuestros esfuerzos, la magnitud de las dificultades climáticas ha superado nuestras previsiones iniciales. (Ver anexo 2) (Ver anexo 4).

- Adicional a lo anterior, tras el inicio de las obras en la **IED JUAN JOSÉ RONDÓN** las cuales inicialmente correspondían según el alcance aprobado al cambio de cubierta del bloque 1, luego de realizar el desmonte de las cubiertas existentes se

identificó la necesidad de llevar a cabo la construcción de elementos adicionales en concreto, particularmente columnas y vigas de amarre, esta necesidad no estaba contemplada en la planificación inicial y no fue posible anticiparla en la fase inicial debido a la complejidad inherente a la naturaleza de la obra.

La construcción de estas columnas y vigas de amarre se ha vuelto imperativa para garantizar la estabilidad y seguridad estructural óptima en el área de intervención. Esta modificación es esencial para cumplir con los estándares de calidad y seguridad requeridos, asegurando al mismo tiempo la integridad a largo plazo de la estructura en cuestión. (Ver anexo 1) (Ver anexo 4).

Mencionadas las motivaciones y causales anteriores nos permitimos de la manera más cordial, solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo del 2024.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud y/o comentario.

Atentamente,



CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Anexos
Anexo 1 - Acta de comité de seguimiento.
Anexo 2 – Boletín climatológico IDEAM.
Anexo 3 - Acta de reunión IED Juan José Rondón.
Anexo 4 - Programaciones de obra.
Anexo 5 – Concepto estructural IED José Eusebio Caro

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 52	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.68%	8.25%	13	9.15%	7.68%	$101,343,659	8.25%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.05%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.05%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.72%	25.76%	15	3.94%	10.72%	$141,411,474	25.76%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.59%	43.35%	16	2.95%	17.59%	$232,033,475	43.35%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.16%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.16%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.96%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.97%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.97%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.82%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.82%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.45%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.45%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.32%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.32%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.67%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.67%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.40%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.40%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.74%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.74%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.97%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.97%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.21%	58.18%	27	1.18%	5.21%	$68,723,990	58.18%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.88%	64.05%	28	2.18%	5.88%	$77,524,636	64.05%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.47%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.10%	70.57%	30	2.28%	3.10%	$40,864,298	70.57%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.81%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.81%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.91%	75.72%	32	3.38%	2.91%	$38,358,568	75.72%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.60%	3.88%	79.60%	33	2.60%	3.88%	$51,212,446	79.60%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.35%	16.13%	95.73%	34	2.35%	16.13%	$212,808,495	95.73%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	35	0.00%	0.00%	$0	95.73%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	36	0.00%	0.00%	$0	95.73%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	37	0.00%	0.00%	$0	95.73%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	38	0.00%	0.00%	$0	95.73%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	39	0.00%	0.00%	$0	95.73%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	40	0.00%	0.00%	$0	95.73%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	41	0.00%	0.00%	$0	95.73%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	42	0.00%	0.00%	$0	95.73%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.49%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.49%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	44	0.00%	0.00%	$0	96.49%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	45	0.00%	0.00%	$0	96.49%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	46	0.00%	0.00%	$0	96.49%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	47	0.00%	0.00%	$0	96.49%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	48	0.00%	0.00%	$0	96.49%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	49	0.00%	0.00%	$0	96.49%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	50	0.00%	0.00%	$0	96.49%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	51	0.00%	0.00%	$0	96.49%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.64%	0.02%	96.51%	52	0.64%	0.02%	$287,066	96.51%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

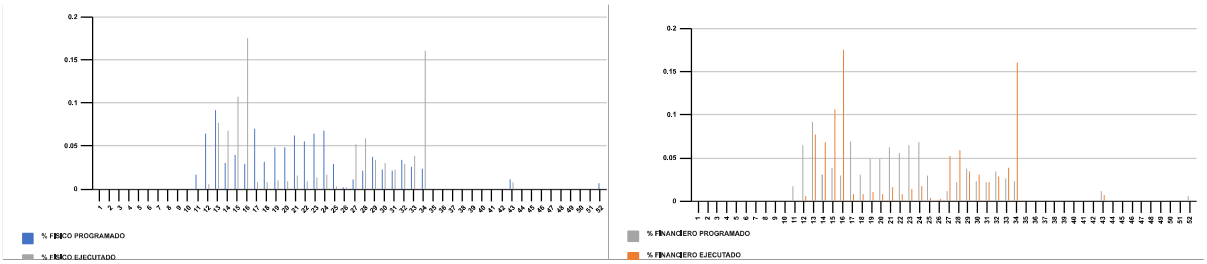

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-02	En este dia de trabajo se comenzaron a realizar excavaciones para instalar tubería para repartirla en las aulas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	966.84		961.50	3.07	$93,507	287,066.49	964.57	2.27
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	209.14		204.02		$34,062	-	204.02	5.12
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-

3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	287,066.49		
							INCIDENCIA	0.02%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Excavacion Manual COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	FOTO 2	Excavacion Manual COMUNITARIA SIETE DE ABRIL



7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.68%	8.25%	13	9.15%	7.68%	$101,343,659	8.25%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.05%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.05%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.72%	25.76%	15	3.94%	10.72%	$141,411,474	25.76%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.59%	43.35%	16	2.95%	17.59%	$232,033,475	43.35%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.16%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.16%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.96%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.97%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.97%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.82%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.82%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.45%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.45%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.32%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.32%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.67%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.67%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.40%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.40%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.74%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.74%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.97%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.97%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.21%	58.18%	27	1.18%	5.21%	$68,723,990	58.18%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.88%	64.05%	28	2.18%	5.88%	$77,524,636	64.05%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.47%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.10%	70.57%	30	2.28%	3.10%	$40,864,298	70.57%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.81%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.81%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.91%	75.72%	32	3.38%	2.91%	$38,358,568	75.72%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.60%	3.88%	79.60%	33	2.60%	3.88%	$51,212,446	79.60%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.35%	16.13%	95.73%	34	2.35%	16.13%	$212,808,495	95.73%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	35	0.00%	0.00%	$0	95.73%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	36	0.00%	0.00%	$0	95.73%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	37	0.00%	0.00%	$0	95.73%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	38	0.00%	0.00%	$0	95.73%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	39	0.00%	0.00%	$0	95.73%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	40	0.00%	0.00%	$0	95.73%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	41	0.00%	0.00%	$0	95.73%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	42	0.00%	0.00%	$0	95.73%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.49%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.49%

44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	44	0.00%	0.00%	$0	96.49%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	45	0.00%	0.00%	$0	96.49%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	46	0.00%	0.00%	$0	96.49%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	47	0.00%	0.00%	$0	96.49%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	48	0.00%	0.00%	$0	96.49%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	49	0.00%	0.00%	$0	96.49%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	50	0.00%	0.00%	$0	96.49%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	51	0.00%	0.00%	$0	96.49%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.64%	0.02%	96.51%	52	0.64%	0.02%	$287,066	96.51%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.04%	0.96%	97.47%	53	1.04%	0.96%	$12,657,025	97.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

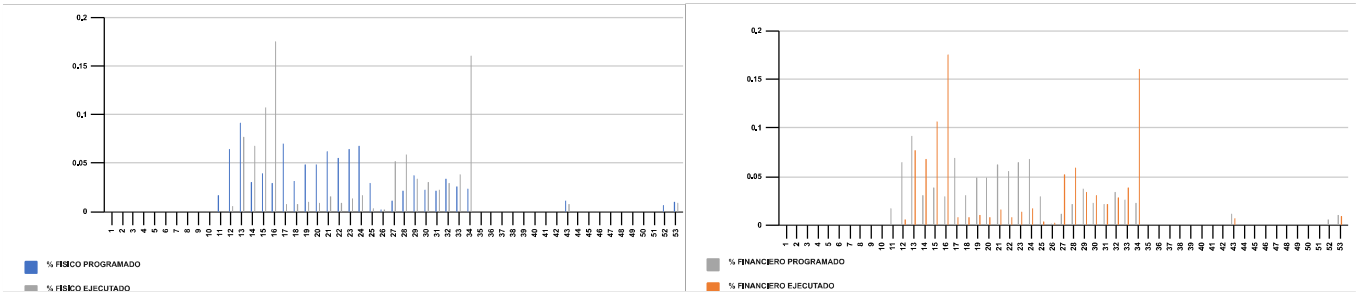

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-04	En este día laboral se continúa realizando las excavaciones para las tuberias electricas.	N/A
		2023-12-05	Se comenzo a instalar el tablero de distribucion general, ademas la tuberia IMC para reflectores.	N/A
		2023-12-06	Se terminó de instalar tablero de distribución general y se instaló tubería IMC . Instalación de 3 reflectores	N/A
		2023-12-07	Instalacion de tuberia EMT más cables en el aula 1.	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	Instalacion de tuberia EMT . Cableado de 1 luminaria para aula # 4.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	966.84		964.57	2.27	$93,507	212,260.89	966.84	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	209.14		204.02	5.12	$34,062	174,397.44	209.14	-

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0,10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0,10 X 0,20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	4		-	4.00	$439,996	1,759,984.00	4.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$40,541	-	-	-
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-	-
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		-	1.00	$693,591	693,591.00	1.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	0		-		$18,863	-	-	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	92		-	23.22	$121,310	2,816,818.20	23.22	68.78
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-

VALOR DE OBRA	12,657,024.53
INCIDENCIA	0.96%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS	
PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	EQUIPOS EN OBRA

FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1BBGv1nqdsRsBBPODxtCNBAbS7JckD2I

FOTO 1	Salida de ventiladores tomacorriente doble 120VAC COMUNITARIA SIETE DE ABRIL



https://drive.google.com/open?id=1Wu0U3Z7qNXXl9PX2tY5eRcZ3lRem-

FOTO 2	Instalación del tablero de distribución COMUNITARIA SIETE DE ABRIL



https://drive.google.com/open?id=1nl2Fm8IYpdJYONRjnjU6Pa-yOqtjhyC

FOTO 3	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL



https://drive.google.com/open?id=1r7prGcRoCBirg0nM2bfHEr_SXf6-0

FOTO 4	Relleno con material de sitio COMUNITARIA SIETE DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 54	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO IE DISTRITO

VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.68%	8.25%	13	9.15%	7.68%	$101,343,659	8.25%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.05%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.05%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.72%	25.76%	15	3.94%	10.72%	$141,411,474	25.76%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.59%	43.35%	16	2.95%	17.59%	$232,033,475	43.35%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.16%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.16%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.96%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.97%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.97%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.82%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.82%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.45%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.45%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.32%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.32%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.67%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.67%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.40%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.40%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.74%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.74%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.97%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.97%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.21%	58.18%	27	1.18%	5.21%	$68,723,990	58.18%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.88%	64.05%	28	2.18%	5.88%	$77,524,636	64.05%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.47%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.10%	70.57%	30	2.28%	3.10%	$40,864,298	70.57%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.81%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.81%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.91%	75.72%	32	3.38%	2.91%	$38,358,568	75.72%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.60%	3.88%	79.60%	33	2.60%	3.88%	$51,212,446	79.60%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.35%	16.13%	95.73%	34	2.35%	16.13%	$212,808,495	95.73%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	35	0.00%	0.00%	$0	95.73%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	36	0.00%	0.00%	$0	95.73%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	37	0.00%	0.00%	$0	95.73%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	38	0.00%	0.00%	$0	95.73%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	39	0.00%	0.00%	$0	95.73%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	40	0.00%	0.00%	$0	95.73%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	41	0.00%	0.00%	$0	95.73%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	42	0.00%	0.00%	$0	95.73%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.49%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.49%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	44	0.00%	0.00%	$0	96.49%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	45	0.00%	0.00%	$0	96.49%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	46	0.00%	0.00%	$0	96.49%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	47	0.00%	0.00%	$0	96.49%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	48	0.00%	0.00%	$0	96.49%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	49	0.00%	0.00%	$0	96.49%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	50	0.00%	0.00%	$0	96.49%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	51	0.00%	0.00%	$0	96.49%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.64%	0.02%	96.51%	52	0.64%	0.02%	$287,066	96.51%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.04%	0.96%	97.47%	53	1.04%	0.96%	$12,657,025	97.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.68%	1.32%	98.79%	54	0.68%	1.32%	$17,360,623	98.79%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

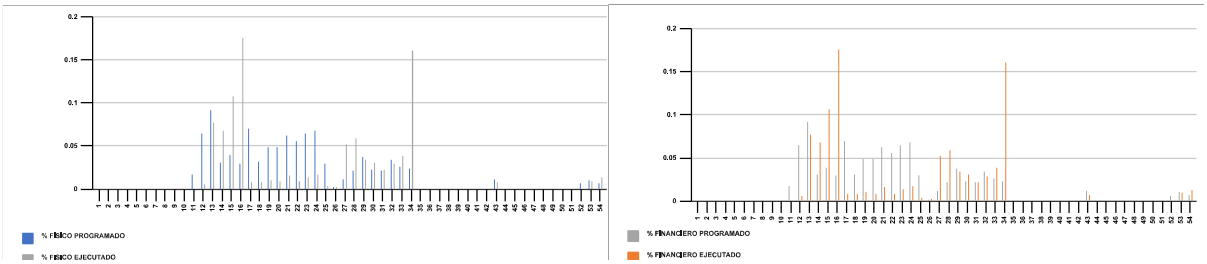

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-12-10	Instalación de punto de 220v mas puntos de ventiladores, más luminarias, más interruptor de aula # 1.	N/A
		2023-12-11	En este día se finaliza el aula # 1 con la instalación de luminarias ,punto eléctricos y puntos de ventiladores.	N/A
		2023-12-12	Instalación de cableado y tubería EMT en aula # 2	N/A
		2023-12-13	Se continúa a instalar cableado, tuberia EMT, punto 220 voltios, punto de ventilación , luminaria , interruptores en el aula # 2.	N/A
		2023-12-14	Se termina de instalar cableado, tubería EMT, luminarias , puntos eléctricos e interruptores en el aula # 2.	N/A
		2023-12-15	Se comienza a intervenir el aula # 3 instalando cableado, tubería EMT , puntos eléctricos y luminarias.	N/A
		2023-12-16	Se instala se instala en aula # 3 cableado , tubería EMT , puntos eléctricos , iluminación e interruptor	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	966.84		966.84		$93,507	-	966.84	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	209.14		209.14		$34,062	-	209.14	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	32		-	18.00	$190,218	3,423,924.00	18.00	14.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	4		4.00		$439,996	-	4.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$40,541	-	-	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35		-	18.00	$190,755	3,433,590.00	18.00	17.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		-	4.00	$282,244	1,128,976.00	4.00	-
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	15.45		-	15.45	$194,230	3,000,853.50	15.45	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	20		-	15.00	$16,480	247,200.00	15.00	5.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-	-
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		1.00		$693,591	-	1.00	-
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$53,959	-	-	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		-	3.00	$212,527	637,581.00	3.00	1.00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	0		-		$18,863	-	-	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	92		23.22	37.15	$121,310	4,506,666.50	60.37	31.63
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	13		-	6.00	$29,990	179,940.00	6.00	7.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6,50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	17,360,623.00		
							INCIDENCIA	1.32%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

			
FOTO 1	Instalación de punto de 220v COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	**FOTO 2**	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL
			
FOTO 3	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	**FOTO 4**	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 55	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.68%	8.25%	13	9.15%	7.68%	$101,343,659	8.25%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.05%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.05%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.72%	25.76%	15	3.94%	10.72%	$141,411,474	25.76%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.59%	43.35%	16	2.95%	17.59%	$232,033,475	43.35%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.16%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.16%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.96%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.97%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.97%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.82%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.82%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.45%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.45%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.32%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.32%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.67%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.67%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.40%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.40%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.74%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.74%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.97%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.97%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.21%	58.18%	27	1.18%	5.21%	$68,723,990	58.18%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.88%	64.05%	28	2.18%	5.88%	$77,524,636	64.05%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.47%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.10%	70.57%	30	2.28%	3.10%	$40,864,298	70.57%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.81%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.81%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.91%	75.72%	32	3.38%	2.91%	$38,358,568	75.72%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.60%	3.88%	79.60%	33	2.60%	3.88%	$51,212,446	79.60%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.35%	16.13%	95.73%	34	2.35%	16.13%	$212,808,495	95.73%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	35	0.00%	0.00%	$0	95.73%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	36	0.00%	0.00%	$0	95.73%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	37	0.00%	0.00%	$0	95.73%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	38	0.00%	0.00%	$0	95.73%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	39	0.00%	0.00%	$0	95.73%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	40	0.00%	0.00%	$0	95.73%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	41	0.00%	0.00%	$0	95.73%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	42	0.00%	0.00%	$0	95.73%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.49%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.49%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	44	0.00%	0.00%	$0	96.49%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	45	0.00%	0.00%	$0	96.49%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	46	0.00%	0.00%	$0	96.49%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	47	0.00%	0.00%	$0	96.49%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	48	0.00%	0.00%	$0	96.49%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	49	0.00%	0.00%	$0	96.49%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	50	0.00%	0.00%	$0	96.49%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	51	0.00%	0.00%	$0	96.49%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.64%	0.02%	96.51%	52	0.64%	0.02%	$287,066	96.51%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.04%	0.96%	97.47%	53	1.04%	0.96%	$12,657,025	97.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.68%	1.32%	98.79%	54	0.68%	1.32%	$17,360,623	98.79%

55	17/12/2023	23/12/2023	0.94%	1.09%	99.88%	55	0.94%	1.09%	$14,392,242	99.88%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

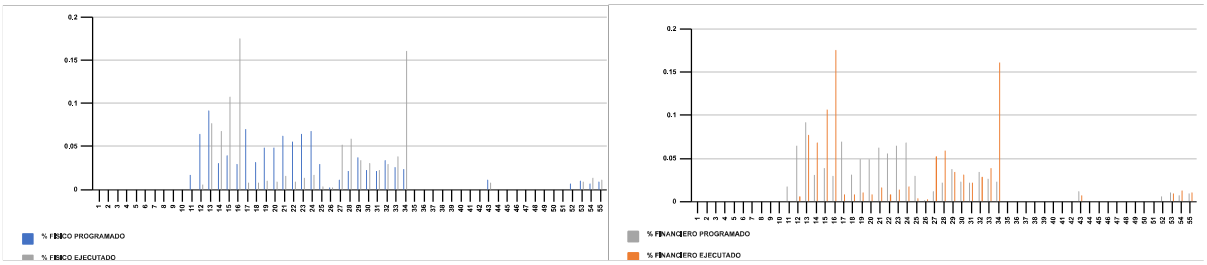

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-12-17	Instalación de tubería EMT, Cableado , puntos eléctricos, interruptores en el aula # 3.	N/A
		2023-12-18	Se inicia trabajo en el aula # 4 instalando tubería EMT , cableado, puntos eléctricos, interruptores, luminarias.	N/A
		2023-12-19	Se continua ejecutando el aula # cuatro, Instalando tubería EMT , cableado, luminarias , punto eléctricos , interruptores	N/A
		2023-12-20	Se continua ejecutando el aula # cuatro, Instalando tubería EMT , cableado, luminarias , punto eléctricos , interruptores	N/A
		2023-12-21	Se termina el aula # cuatro, Instalando tubería EMT , cableado, luminarias , punto eléctricos , interruptores. Se comenzó a instalar puesta a tierra en el área del tablero de distribución	N/A
		2023-12-22	Se termina de instalar puesta a tierra en el área del tablero de distribución	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	966.84		966.84		$93,507	-	966.84	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	209.14		209.14		$34,062	-	209.14	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-

2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	32		18.00	14.00	$190,218	2,663,052.00	32.00	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	4		4.00		$439,996	-	4.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$40,541	-	-	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35		18.00	17.00	$190,755	3,242,835.00	35.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		4.00		$282,244	-	4.00	-
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	15.45		15.45		$194,230	-	15.45	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		-	4.00	$235,052	940,208.00	4.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	20		15.00	5.00	$16,480	82,400.00	20.00	-
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-	-
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		1.00		$693,591	-	1.00	-
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$53,959	-	-	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		3.00	1.00	$212,527	212,527.00	4.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	0		-		$18,863	-	-	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	92		60.37	31.63	$121,310	3,837,035.30	92.00	-
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION JABALINA VERTICAL. INCLUYE: 1 JABALINA DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-CU 9ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 25KG.	UND	1		-	1.00	$1,195,602	1,195,602.00	1.00	-

9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS	UND	1		-	1.00	$175,757	175,757.00	1.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	13		6.00	7.00	$29,990	209,930.00	13.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-
							VALOR DE OBRA	14,392,242.30		
							INCIDENCIA	1.09%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	FOTO 2	Instalación de cableado, tubería EMT, luminarias, puntos eléctricos e interruptores COMUNITARIA SIETE DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE COMUNITARIA SIETE DE ABRIL No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.69%	0.00%	0.00%	11	1.69%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	6.48%	0.57%	0.57%	12	6.48%	0.57%	$7,552,218	0.57%
13	26/2/2023	4/3/2023	9.15%	7.68%	8.25%	13	9.15%	7.68%	$101,343,659	8.25%
14	5/3/2023	11/3/2023	3.06%	6.79%	15.05%	14	3.06%	6.79%	$89,650,870	15.05%
15	12/3/2023	18/3/2023	3.94%	10.72%	25.76%	15	3.94%	10.72%	$141,411,474	25.76%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.95%	17.59%	43.35%	16	2.95%	17.59%	$232,033,475	43.35%
17	26/3/2023	1/4/2023	6.98%	0.81%	44.16%	17	6.98%	0.81%	$10,639,769	44.16%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.15%	0.80%	44.96%	18	3.15%	0.80%	$10,610,935	44.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	4.92%	1.01%	45.97%	19	4.92%	1.01%	$13,287,942	45.97%
20	16/4/2023	22/4/2023	4.92%	0.86%	46.82%	20	4.92%	0.86%	$11,300,918	46.82%
21	23/4/2023	29/4/2023	6.22%	1.63%	48.45%	21	6.22%	1.63%	$21,511,443	48.45%
22	30/4/2023	6/5/2023	5.58%	0.87%	49.32%	22	5.58%	0.87%	$11,485,666	49.32%
23	7/5/2023	13/5/2023	6.48%	1.35%	50.67%	23	6.48%	1.35%	$17,819,182	50.67%
24	14/5/2023	20/5/2023	6.84%	1.73%	52.40%	24	6.84%	1.73%	$22,784,224	52.40%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.93%	0.33%	52.74%	25	2.93%	0.33%	$4,414,744	52.74%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.18%	0.23%	52.97%	26	0.18%	0.23%	$3,044,911	52.97%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.18%	5.21%	58.18%	27	1.18%	5.21%	$68,723,990	58.18%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.18%	5.88%	64.05%	28	2.18%	5.88%	$77,524,636	64.05%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.78%	3.42%	67.47%	29	3.78%	3.42%	$45,118,387	67.47%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.28%	3.10%	70.57%	30	2.28%	3.10%	$40,864,298	70.57%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.18%	2.24%	72.81%	31	2.18%	2.24%	$29,579,783	72.81%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.38%	2.91%	75.72%	32	3.38%	2.91%	$38,358,568	75.72%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.60%	3.88%	79.60%	33	2.60%	3.88%	$51,212,446	79.60%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.35%	16.13%	95.73%	34	2.35%	16.13%	$212,808,495	95.73%
35	30/7/2023	5/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	35	0.00%	0.00%	$0	95.73%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	36	0.00%	0.00%	$0	95.73%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	37	0.00%	0.00%	$0	95.73%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.00%	0.00%	95.73%	38	0.00%	0.00%	$0	95.73%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	39	0.00%	0.00%	$0	95.73%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	40	0.00%	0.00%	$0	95.73%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	41	0.00%	0.00%	$0	95.73%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.00%	0.00%	95.73%	42	0.00%	0.00%	$0	95.73%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.13%	0.76%	96.49%	43	1.13%	0.76%	$10,080,960	96.49%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	44	0.00%	0.00%	$0	96.49%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	45	0.00%	0.00%	$0	96.49%

46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	46	0.00%	0.00%	$0	96.49%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.49%	47	0.00%	0.00%	$0	96.49%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	48	0.00%	0.00%	$0	96.49%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	49	0.00%	0.00%	$0	96.49%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	50	0.00%	0.00%	$0	96.49%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.49%	51	0.00%	0.00%	$0	96.49%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.64%	0.02%	96.51%	52	0.64%	0.02%	$287,066	96.51%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.04%	0.96%	97.47%	53	1.04%	0.96%	$12,657,025	97.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.68%	1.32%	98.79%	54	0.68%	1.32%	$17,360,623	98.79%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.94%	1.09%	99.88%	55	0.94%	1.09%	$14,392,242	99.88%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.18%	0.12%	100.00%	56	0.18%	0.12%	$1,625,567	100.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

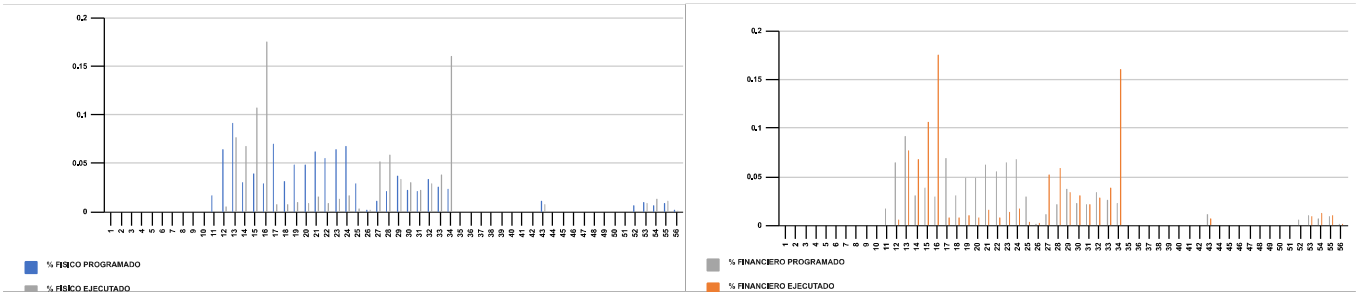

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CL. 74 # 9-06 SUR	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-26	Se instaló abanico sobre muro en aula modular, se les cambia bobina y se reparan 5 abanicos de muro que estaban dañados. Se sellan las juntas de las aulas modulares. Se sellan ventanas de las aulas modulares con sikaflex.	N/A
		2023-12-27	Se comenzó a ejecutar las escaleras de acceso para los 4 modulos, se comenzó excavacion y se realizo levante para huellas y contrahuellas, se fundió placa base para las escaleras.	N/A
		2023-12-28	Se terminó el levante en las escaleras, se fundieron las huellas de las escaleras, se aplica relleno de sitio.	N/A
		2023-12-29	Se terminan las escaleras, se realiza pañete allanado, se pulieron las huellas de las escaleras de las aulas modulares.	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	7118.46		7,118.46		$4,221	-	7,118.46	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	130		130.00		$454,545	-	130.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	7118.46		7,118.46		$9,648	-	7,118.46	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	446.84		446.84		$23,673	-	446.84	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	474.68		474.68		$25,396	-	474.68	0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	107.88		107.88		$252,961	-	107.88	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	735.13		735.13		$20,699	-	735.13	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	645.84		645.84		$20,853	-	645.84	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1.8		1.80		$266,275	-	1.80	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	966.84		966.84		$93,507	-	966.84	-
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	721.26		721.26		$90,362	-	721.26	-
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	227.7		227.70		$49,030	-	227.70	-

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	209.14		209.14		$34,062	-	209.14	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	938.115		938.12		$192,928	-	938.12	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	267.96		267.96		$54,171	-	267.96	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	8835.2		8,835.20		$9,568	-	8,835.20	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	230		230.00		$40,436	-	230.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.53		7.53		$894,392	-	7.53	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.15		8.15		$1,894,074	-	8.15	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	1067.64		1,067.64		$99,065	-	1,067.64	0.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	675.8		675.80		$27,186	-	675.80	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	1162.52		1,162.52		$18,074	-	1,162.52	-
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	270.52		270.52		$28,100	-	270.52	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	111.0705		111.07		$813,350	-	111.07	0.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	2		2.00		$32,154	-	2.00	-
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	2		2.00		$92,552	-	2.00	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	673.97		673.97		$100,669	-	673.97	0.00
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	17.2		-	17.20	$60,337	1,037,796.40	17.20	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	16.4		-	16.40	$27,794	455,821.60	16.40	-
3.14	IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS	MT2	84		84.00		$18,861	-	84.00	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	227.7		227.70		$20,457	-	227.70	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	2		2.00		$57,053	-	2.00	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	2		2.00		$5,040,480	-	2.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	32		32.00		$190,218	-	32.00	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	4		4.00		$439,996	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	35		35.00		$190,755	-	35.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		4.00		$282,244	-	4.00	-
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	15.45		15.45		$194,230	-	15.45	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		4.00		$235,052	-	4.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	20		20.00		$16,480	-	20.00	-

9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1		1.00		$693,591	-	1.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	1		1.00		$100,299	-	1.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	4		4.00		$212,527	-	4.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	1		1.00		$93,368	-	1.00	-
9.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 150w Luz Blanca 12700lm no incluye salida ni alimentador.	UND	3		3.00		$455,958	-	3.00	-
9.39	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-		$106,707	-	-	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	92		92.00		$121,310	-	92.00	-
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-	0.00	$283,058	-	-	-
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION JABALINA VERTICAL. INCLUYE: 1 JABALINA DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-CU 9ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 25KG.	UND	1		1.00		$1,195,602	-	1.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4'', CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	32		32.00		$55,395	-	32.00	-
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS DE RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS	UND	1		1.00		$175,757	-	1.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	13		13.00		$29,990	-	13.00	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	217.41		217.41		$67,760	-	217.41	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1DQywQkdufm2opYt1Tf0q41RY34VRNK

FOTO 1	Excavacion manual COMUNITARIA SIETE DE ABRIL



https://drive.google.com/open?id=1FWa7TdAMRuLB3Xw9mheBv3RP0DUHL

FOTO 2	Escaleras de acceso para los 4 módulos COMUNITARIA SIETE DE ABRIL

			
FOTO 3	Fundición de placa base para las escaleras. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	**FOTO 4**	Terminación de las escaleras y realización de pañete allanado. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL
			
FOTO 5	Terminación de las escaleras. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	**FOTO 6**	Sellado de juntas y ventanas. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL
			
FOTO 7	Instalación y reparación de abanicos de muro en aulas modulares. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	**FOTO 8**	Instalación y reparación de abanicos de muro en aulas modulares. COMUNITARIA SIETE DE ABRIL

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordonez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	0.65%	24.14%	41	3.01%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	0.94%	25.08%	42	1.22%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	1.46%	26.54%	43	1.38%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.81%	27.35%	44	2.74%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

50	12/11/2023	18/11/2023	2,25%	1,05%	29,84%	50	2,25%	1,05%	**$38,064,216**	29,84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	**$29,511,676**	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.98%	0.00%	30,65%	52	1,98%	0.00%	**$0**	30,65%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

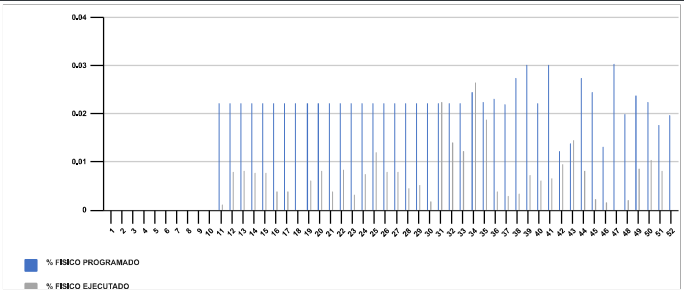

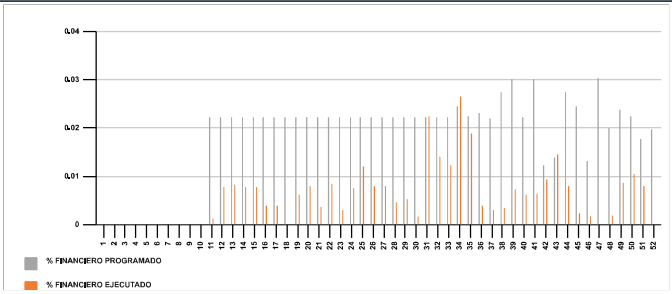

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	802.75
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		852.12		$32,154	$0	852.12	717.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		10,790.00		$21,652	-	10,790.00	21,551.31
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	16,800.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81

5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	0.65%	24.14%	41	3.01%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	0.94%	25.08%	42	1.22%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	1.46%	26.54%	43	1.38%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.81%	27.35%	44	2.74%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.98%	0.00%	30.65%	52	1.98%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	2.37%	1.30%	31.95%	53	2.37%	1.30%	$47,302,475	31.95%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

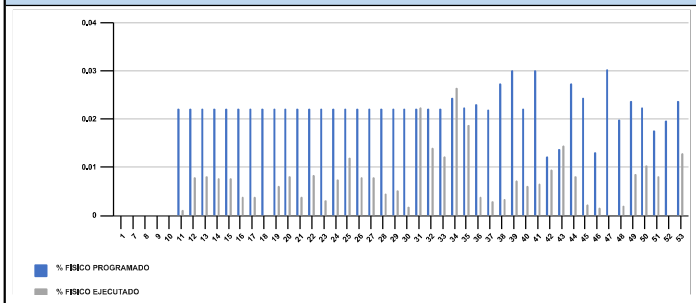

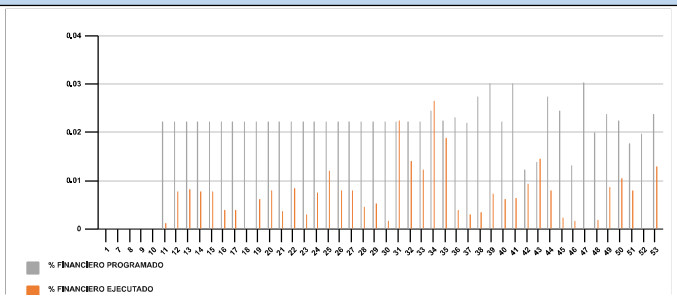

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-05	Se realiza pintura de vigas IPE e instalación de las mismas	N/A
		2023-12-06	Se realiza pintura de vigas IPE y soldadura.	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	802.75
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		852.12		$32,154	$0	852.12	717.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		10,790.00	2,184.67	$21,652	47,302,474.84	12,974.67	19,366.64
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	16,800.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87

6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

VALOR DE OBRA	47,302,474.84
INCIDENCIA	1.30%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1UK4lnKo1PhUH1BSXJhJ_DvSidYRa4Jdv



https://drive.google.com/open?id=1bCAEuIOABkvHAvaV3QHkQUvOYCRekju

FOTO 1	Soldadura de vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Pintura de las vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 54**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	0.65%	24.14%	41	3.01%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	0.94%	25.08%	42	1.22%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	1.46%	26.54%	43	1.38%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.81%	27.35%	44	2.74%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.98%	0.00%	30.65%	52	1.98%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	2.37%	1.30%	31.95%	53	2.37%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.76%	1.12%	33.07%	54	1.76%	1.12%	$40,589,705	33.07%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

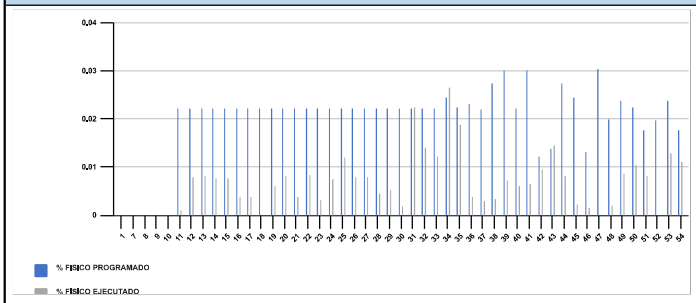

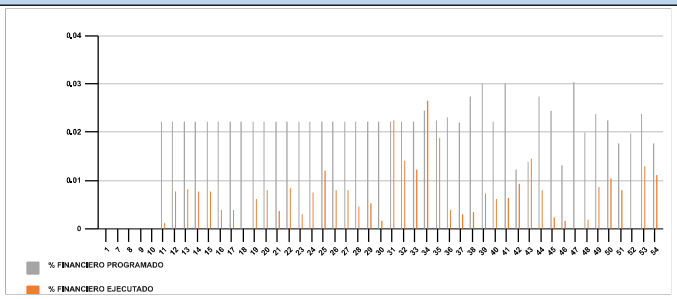

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-11	Se realiza pintura de vigas IPE	N/A
		2023-12-12	Se realiza pintura de vigas IPE y soldadura.	N/A
		2023-12-13	Se realiza soldadura y pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-12-14	Se realiza soldadura y pintura de vigas IPE.	N/A
		2023-12-15	Se realiza actividades de pintura y soldadura.	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	802.75
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3,00 M Y H<10,00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		852.12		$32,154	$0	852.12	717.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		12,974.67	1,874.64	$21,652	40,589,705.28	14,849.31	17,492.00
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	16,800.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81

5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

VALOR DE OBRA	40,589,705.28
INCIDENCIA	1.12%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Soldadura de vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Pintura de las vigas IPE MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 55**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	17	AL	23	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	0.65%	24.14%	41	3.01%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	0.94%	25.08%	42	1.22%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	1.46%	26.54%	43	1.38%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.81%	27.35%	44	2.74%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	**$38,064,216**	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	**$29,511,676**	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.98%	0.00%	30.65%	52	1.98%	0.00%	**$0**	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	2.37%	1.30%	31.95%	53	2.37%	1.30%	**$47,302,475**	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.76%	1.12%	33.07%	54	1.76%	1.12%	**$40,589,705**	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.88%	0.00%	33.07%	55	1.88%	0.00%	**$0**	33.07%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

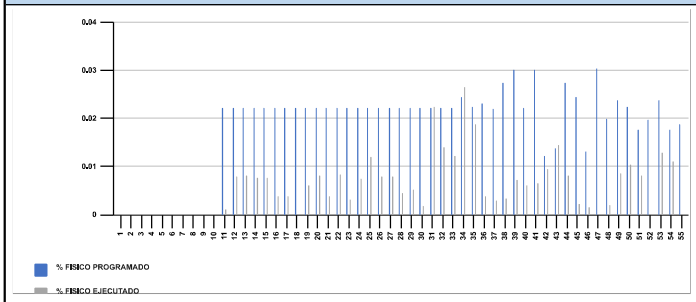

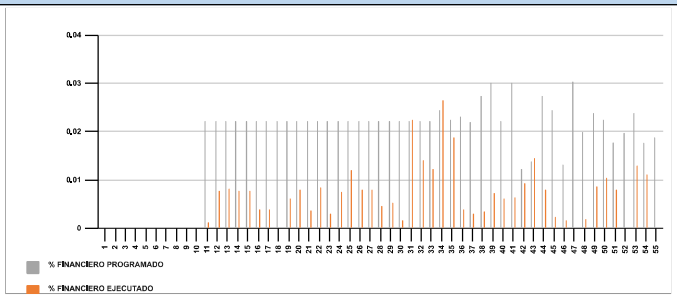

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	802.75
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		852.12		$32,154	$0	852.12	717.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		14,849.31		$21,652	-	14,849.31	17,492.00

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	16,800.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**	
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.22%	0.12%	0.12%	11	2.22%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	2.22%	0.79%	0.90%	12	2.22%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.22%	0.82%	1.72%	13	2.22%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.22%	0.78%	2.50%	14	2.22%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.22%	0.78%	3.27%	15	2.22%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.22%	0.39%	3.66%	16	2.22%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.22%	0.39%	4.05%	17	2.22%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.22%	0.00%	4.05%	18	2.22%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.22%	0.61%	4.66%	19	2.22%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.22%	0.81%	5.47%	20	2.22%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.22%	0.38%	5.85%	21	2.22%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.22%	0.83%	6.68%	22	2.22%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.22%	0.31%	6.99%	23	2.22%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.22%	0.75%	7.74%	24	2.22%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.22%	1.20%	8.94%	25	2.22%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.22%	0.79%	9.73%	26	2.22%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.22%	0.80%	10.53%	27	2.22%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.22%	0.45%	10.98%	28	2.22%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.22%	0.53%	11.52%	29	2.22%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.22%	0.17%	11.69%	30	2.22%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.22%	2.25%	13.94%	31	2.22%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.22%	1.41%	15.35%	32	2.22%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.23%	1.22%	16.57%	33	2.23%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.44%	2.65%	19.22%	34	2.44%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.24%	1.88%	21.11%	35	2.24%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.31%	0.39%	21.50%	36	2.31%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.21%	0.29%	21.79%	37	2.21%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.74%	0.35%	22.14%	38	2.74%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.02%	0.73%	22.87%	39	3.02%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.22%	0.62%	23.49%	40	2.22%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.01%	0.65%	24.14%	41	3.01%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.22%	0.94%	25.08%	42	1.22%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.38%	1.46%	26.54%	43	1.38%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.74%	0.81%	27.35%	44	2.74%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.44%	0.23%	27.58%	45	2.44%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.31%	0.16%	27.73%	46	1.31%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.04%	0.00%	27.73%	47	3.04%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.99%	0.19%	27.93%	48	1.99%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.37%	0.87%	28.80%	49	2.37%	0.87%	$31,568,616	28.80%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.25%	1.05%	29.84%	50	2.25%	1.05%	**$38,064,216**	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.76%	0.81%	30.65%	51	1.76%	0.81%	**$29,511,676**	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.98%	0.00%	30.65%	52	1.98%	0.00%	**$0**	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	2.37%	1.30%	31.95%	53	2.37%	1.30%	**$47,302,475**	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.76%	1.12%	33.07%	54	1.76%	1.12%	**$40,589,705**	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.88%	0.00%	33.07%	55	1.88%	0.00%	**$0**	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.20%	0.00%	33.07%	56	0.20%	0.00%	**$0**	33.07%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

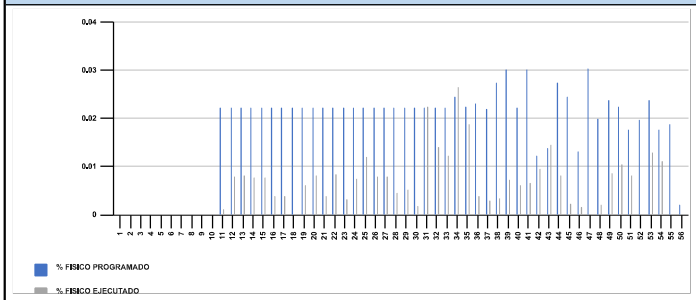

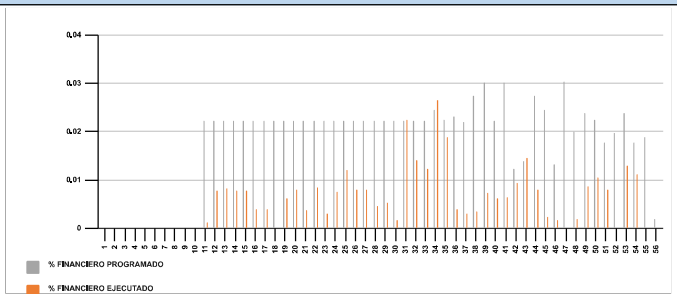

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		2,717.92		$4,221	-	2,717.92	802.75
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		5.80		$266,275	$0	5.80	16.74
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		621.40		$32,124	$0	621.40	827.70
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		29,068.96		$9,568	$0	29,068.96	16,336.54
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,063.00		$14,939	$0	1,063.00	673.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		852.12		$32,154	$0	852.12	717.88
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		14,849.31		$21,652	-	14,849.31	17,492.00

5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00

VALOR DE OBRA	-
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Angelo Sanchez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	**$6,589,763**	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	**$2,268,191**	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	**$0**	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	**$0**	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	**$0**	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**51**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**52**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

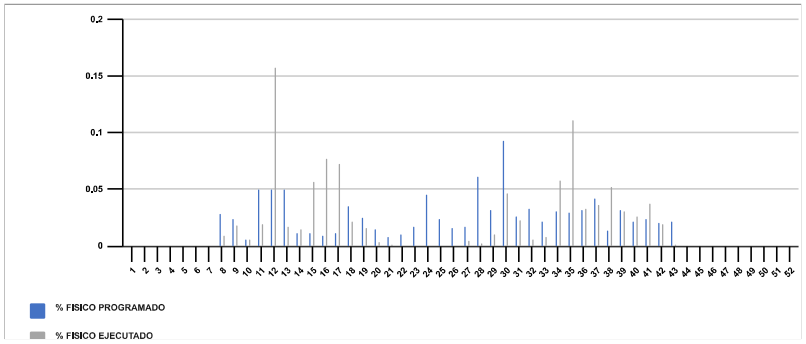

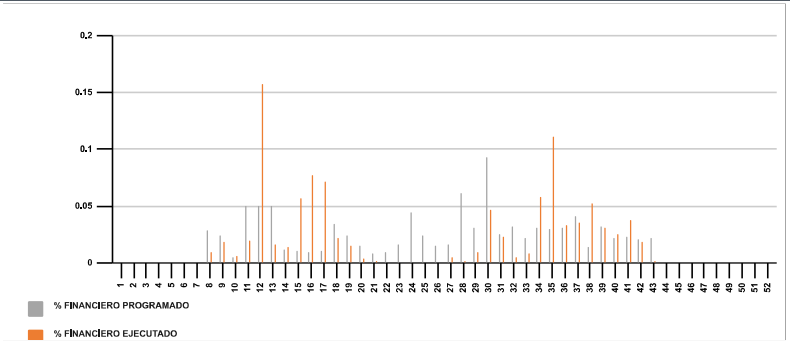

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26

2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00

2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-

9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-

*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
	NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
	NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-
							VALOR DE OBRA	$0.00		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%

21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	21	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	23	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	24	4.50%	0.00%	$0	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	25	2.43%	0.00%	$0	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	26	1.57%	0.00%	$0	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	42	2.05%	1.90%	$84,187,270	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	44	0.00%	0.00%	$0	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	45	0.00%	0.00%	$0	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	46	0.00%	0.00%	$0	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	47	0.00%	0.00%	$0	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	48	0.00%	0.00%	$0	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	49	0.00%	0.00%	$0	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	50	0.00%	0.00%	$0	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	51	0.00%	0.00%	$0	99.47%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	52	0.00%	0.00%	$0	99.47%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	53	0.00%	0.00%	$0	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

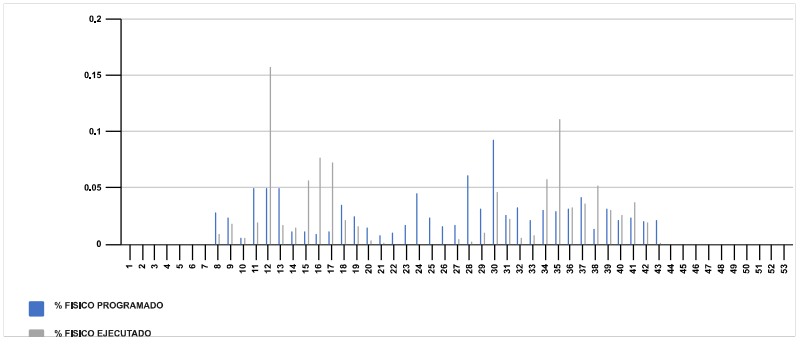

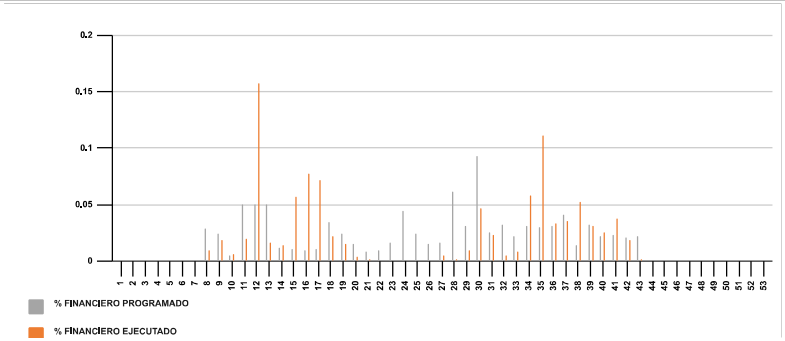

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26

2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00

2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00

2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-

9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-

*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
	NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
	NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 54**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	$0	49.09%

25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	**$0**	49.09%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**51**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**52**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**53**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**54**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

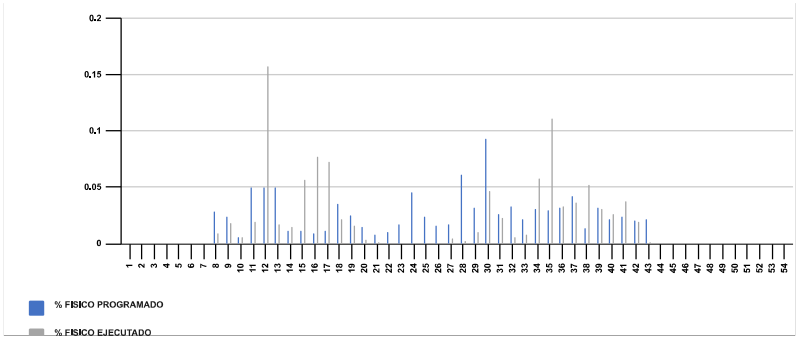

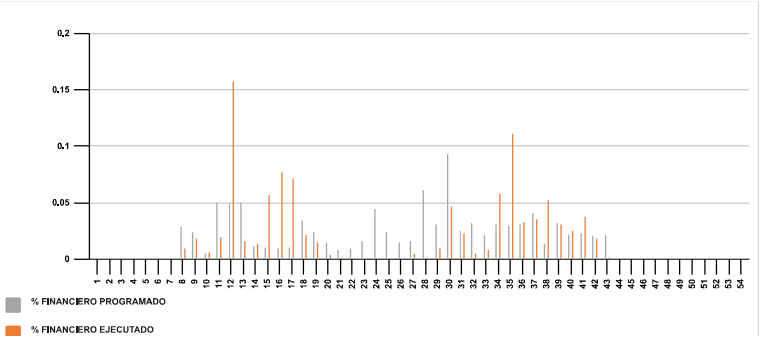

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00

2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-

5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-

	9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
	9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
	9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
	9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
	10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
	11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
	11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
	11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
	13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
	NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 55**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	$0	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	$0	49.09%

26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**51**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**52**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**53**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**54**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**55**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

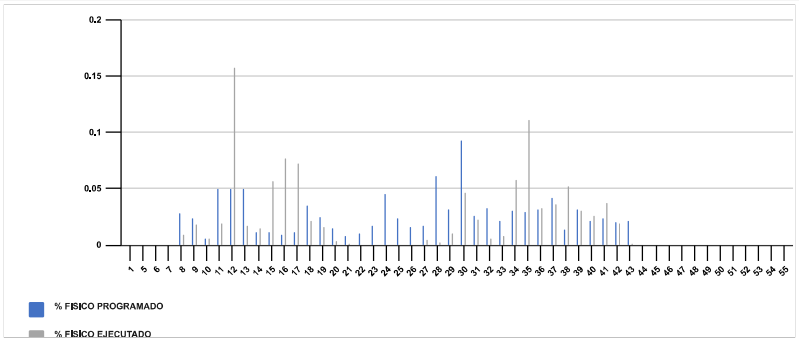

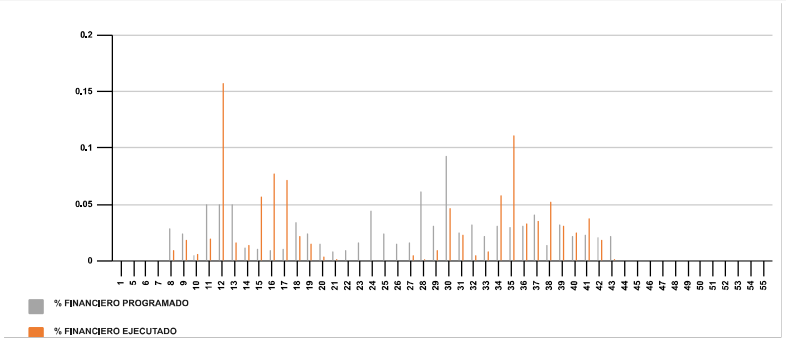

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00

2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-

5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-

	9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
	9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
	9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
	9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
	10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
	11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
	11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
	11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
	13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
	NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	**18**	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	**19**	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	**20**	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.16%	49.04%	**21**	0.85%	0.16%	$6,589,763	49.04%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.09%	**22**	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.09%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.09%	**23**	1.67%	0.00%	$0	49.09%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.09%	**24**	4.50%	0.00%	$0	49.09%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.09%	**25**	2.43%	0.00%	$0	49.09%

26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.09%	**26**	1.57%	0.00%	**$0**	49.09%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.56%	**27**	1.65%	0.47%	**$20,773,648**	49.56%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.76%	**28**	6.15%	0.20%	**$8,795,520**	49.76%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.74%	**29**	3.12%	0.98%	**$43,538,904**	50.74%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.42%	**30**	9.34%	4.67%	**$206,551,586**	55.42%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.67%	**31**	2.56%	2.25%	**$99,578,028**	57.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.21%	**32**	3.26%	0.55%	**$24,153,673**	58.21%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	59.04%	**33**	2.20%	0.83%	**$36,484,967**	59.04%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.79%	**34**	3.11%	5.75%	**$254,306,263**	64.79%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.94%	**35**	2.98%	11.15%	**$493,076,897**	75.94%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.25%	**36**	3.12%	3.30%	**$146,115,854**	79.25%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.83%	**37**	4.14%	3.58%	**$158,463,112**	82.83%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.05%	**38**	1.36%	5.22%	**$230,845,241**	88.05%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.12%	**39**	3.17%	3.07%	**$135,536,410**	91.12%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.70%	**40**	2.14%	2.58%	**$113,924,587**	93.70%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.46%	**41**	2.33%	3.76%	**$166,330,679**	97.46%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.36%	**42**	2.05%	1.90%	**$84,187,270**	99.36%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.47%	**43**	2.15%	0.11%	**$4,944,373**	99.47%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**44**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**45**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**46**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**47**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**48**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**49**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**50**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**51**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**52**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**53**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**54**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**55**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.00%	0.00%	99.47%	**56**	0.00%	0.00%	**$0**	99.47%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

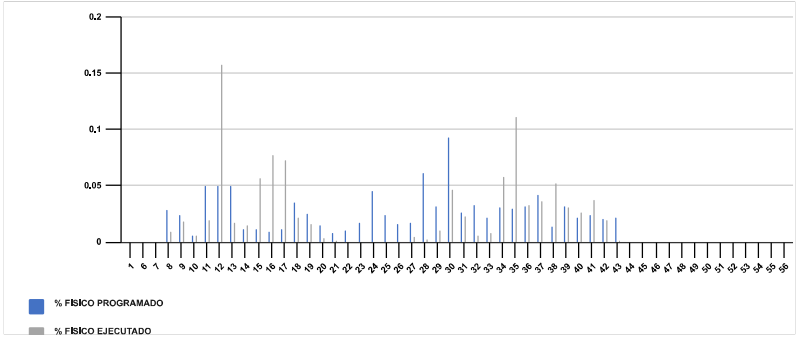

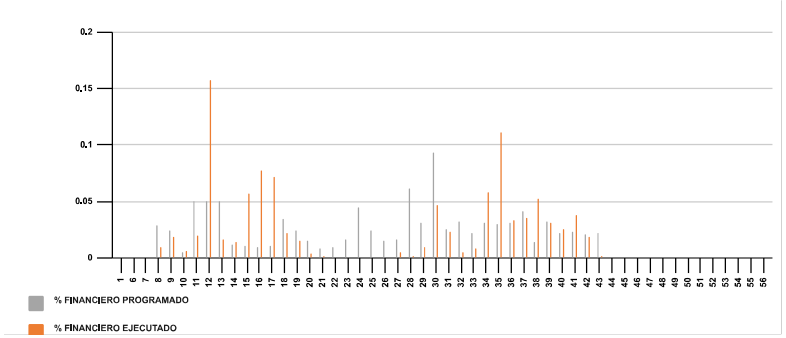

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	0.00	0.00	$20,699	-	0.00	355.00
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,084.32	0.00	$93,507	$0.00	1,084.32	33.26
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,561.94	0.00	$49,030	$0.00	1,561.94	0.00

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	0.00	0.00	$34,062	-	0.00	150.68
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	117.96	0.00	$9,568	$0.00	117.96	717.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	0.00	0.00	$99,065	-	0.00	112.47
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	0.00	0.00	$513,566	-	0.00	240.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	431.50	0.00	$18,074	$0.00	431.50	0.00

2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-

5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-

	9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
	9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
	9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
	9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
	10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
	10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
	11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
	11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
	11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
	13	NO PREVISTOS				0%			-	0%	0%
	NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65

NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	30.00		$125,227	$0.00	30.00	2.00
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81

NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	209.60		$44,136	-	209.60	-
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-

NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-

VALOR DE OBRA	$0.00
INCIDENCIA	0.00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el frente de obra se encuentra suspendido.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.50%	0.90%	52.84%	52	3.50%	0.90%	$59,329,804	52.84%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

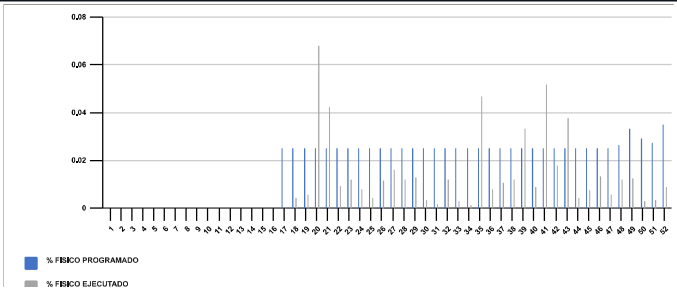

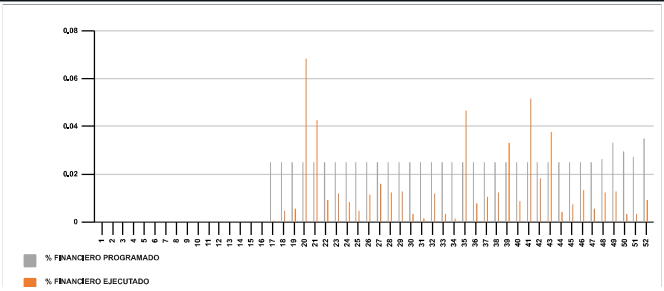

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-11-27	Levante de mampostería. Acabado de losa de entrepiso. Pañete impermeabilizado en cocina. Excavación para de redes hidrosanitarias y vigas para rampa. Armado de acero de vigas de rampa. Levante de cuchilla para cubierta. Suministro y fabricacion de perfiles metálicos de cubierta. Armado de acero para tanque de almacenamiento. Instalación de redes eléctricas. Instalación de ventanas, perfiles de cubierta, flanches. Instalacion de laminas de cubierta.	N/A
		2023-11-28	Levante de cuchilla. Fundida en concreto de viga sobre muro. Levante de mampostería. Armado y encofrado de muros para tanque de almacenamiento. Excavación y armado de acero para viga de cimentación de rampa. Armado de viga dintel. Corte y figuración de acero para viga y alfajia. Se continuó con el pañete impermeabilizado para cocina y baños. Instalación de redes hidrosanitarias. Instalacion de tuberias para red eléctrica.	N/A
		2023-11-29	Levante de mampostería. Levante de cuchilla. Suministro y fabricacion de perfiles metálicos de cubierta. Se continuó con el pañete impermeabilizado para cocina y baños. Excavación y armado de acero para viga de cimentación de rampa. Resane de vigas. Armado y encofrado de muros para tanque de almacenamiento. Excavación e instalación para de redes hidrosanitarias. Instalacion de tuberias para red eléctrica. Corte y figuración de acero para alfajia, perfiles de cubierta, flanches. Instalacion de laminas de cubierta.	N/A
		2023-11-30	Fabricación de perfiles de cubierta. Levante de cuchilla. Fundida en concreto de viga sobre muro. Se continuó con el pañete impermeabilizado para cocina y baños. Levante de mampostería. Armado y encofrado de para tanque de almacenamiento. Armado de acero para vigas cimentacion para rampa. Instalación de tubería eléctrica. Fundida en concreto de registros sanitarios, perfiles de cubierta, flanches. Instalacion de laminas de cubierta.	N/A
		2023-12-01	Visita de Edubar. Levante de mamposteria, levante de cuchilla y fundida en concreto de viga sobre muro. Suministro y fabricación de correas para cubierta. Armado de acero para viga de cimentación en rampa. Encofrado para tanque de almacenamiento. Instalación de ventanas en aulas. Armado de acero para viga dintel y alfajías. Se continuó con el pañete impermeabilizado para cocina y baños.	N/A
		2023-12-02	Suministro y fabricación de correas para cubierta. Instalación de red hidráulica y sanitaria. Encofrado de muros para tanque de almacenamiento. Instalación de ventanas. levante de cuchilla y fundida en concreto de viga sobre muro. Levante de mampostería, Instalacion de tuberia electrica. Fundida en concreto para viga de cimentación en inicio de rampa. Se continuó con el pañete impermeabilizado para cocina y baños. Instalación de red hidráulica y sanitaria.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		168.36	48.80	$93,507	4,563,141.60	217.16	314.17
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24		$34,062	-	6,581.24	965.76
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,852.32	92.71	$9,568	887,049.28	73,945.03	4,203.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		644.00		$40,436	-	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88

2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,930.17	12.34	$27,186	335,475.24	1,942.51	158.95
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,833.56	27.15	$100,669	2,733,163.35	1,860.71	249.29
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		98.33	56.17	$17,610	989,153.70	154.50	305.50
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		269.84	78.94	$39,705	3,134,312.70	348.78	333.22
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		30.81	17.64	$27,794	490,286.16	48.45	29.69
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9738.9		-	973.31	$24,307	23,658,246.17	973.31	8,765.59
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		4.00	1.00	$190,755	190,755.00	5.00	61.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		1.00		$282,244	-	1.00	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		2.00	2.00	$235,052	470,104.00	4.00	33.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		1.00		$282,196	-	1.00	8.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		3.00	6.00	$1,488,291	8,929,746.00	9.00	9.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		42.00	16.00	$64,019	1,024,304.00	58.00	41.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		78.29	16.00	$35,397	566,352.00	94.29	49.71
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-

10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		229.93	52.00	$58,180	3,025,360.00	281.93	307.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		38.00		$65,771.40	$0.00	38.00	20.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		43.57	5.77	$806,382.59	$4,652,827.54	49.34	15.66
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		242.45	1.28	$1,913,254.50	$2,448,965.76	243.73	6.27
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405			24	$51,273.41	$1,230,561.84	24.00	137.41
								VALOR DE OBRA	$59,329,804.34	
								INCIDENCIA	0.90%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1b1yiUhaqnIBVOqIpIewOB4BIZVAHE_

FOTO 1	Instalación de tubería EMT



https://drive.google.com/open?id=1_Is262DYbDvzSwEZTU46GmA1NG8BS-Z

FOTO 2	Armado y figurado de acero para rampa



https://drive.google.com/open?id=1bYVyYbmb7oWmb_qZ6oDBYNSEZ

FOTO 3	Soldadura de correas galvanizadas para Estructura



https://drive.google.com/open?id=1fKCmhLDAdcpDuBWbOxOE-KOYdo

FOTO 4	encofrado para muros del tanque de almacenamiento

			
FOTO 5	encofrado para muros del tanque de almacenamiento	FOTO 6	Levante de muro

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.50%	0.90%	52.84%	52	3.50%	0.90%	$59,329,804	52.84%

53	3/12/2023	9/12/2023	2.64%	1.79%	54.62%	53	2.64%	1.79%	$117,715,638	54.62%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

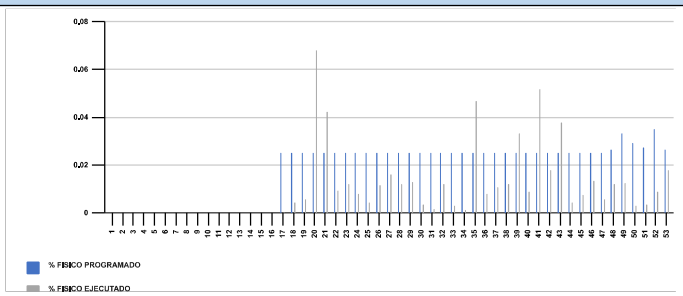

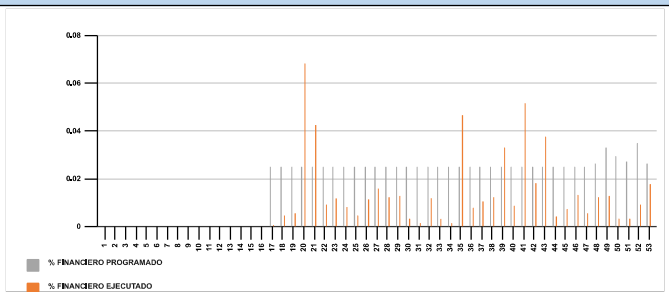

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-04	Levante de mampostería, Instalación de ventanas. Suministro y fabricación de correas para cubierta. Levante de muro en en inicio de rampa. Corte y figuración de acero para viga dintel y alfajías. Resane de vigas. Instalacion de tuberia electrica. Fundida en concreto de viga sobre muro para cuchillas. Pañete en laboratorios.	N/A
		2023-12-05	Se continuó suministro y fabricación de correas para cubierta, levante de mampostería, instalación de red hidráulica y sanitaria, Pañete en laboratorio, levante de muro en inicio de rampa, levante de cuchilla y fundida en concreto de viga sobre muro, instalación de ventanas, fundida en concreto de muros para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-12-06	Se continuó levante de mampostería, relleno y compactación para inicio de rampa, instalación de red hidráulica y sanitaria, suministro, fabricación e instalación de correas para cubierta, Pañete en laboratorio, corte y figuración de acero para viga dintel, armado de acero para rampa, instalación de ventanas.	N/A
		2023-12-07	Se continuó instalación de correas para cubierta, armado de acero para rampa, instalación de ventanas, armado de acero para rampa, levante de mampostería. Pañete en laboratorio, instalación de red hidráulica y sanitaria, levante y fundida de cuchilla, excavación para zapata en acceso, fundida en concreto de registro sanitario.	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-09	Corte y figuración de acero para zapatas y vigas de amarre en el acceso. levante en mampostería. Instalación de correas para cubierta. Armado de acero para rampa. instalación de red hidráulica y sanitaria. Levante de cuchilla. Corte y figuración de acero para columnas de acceso. Pañete en laboratorio, nivelación y compactación en el acceso del colegio.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		217.16	14.40	$93,507	1,346,500.80	231.56	299.77
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,581.24	12.15	$34,062	413,853.30	6,593.39	953.61
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,945.03		$9,568	-	73,945.03	4,203.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		644.00		$40,436	-	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,942.51	15.16	$27,186	412,139.76	1,957.67	143.79
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,860.71	26.14	$100,669	2,631,487.66	1,886.85	223.15
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		154.50	48.15	$17,610	847,921.50	202.65	257.35
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		348.78	134.64	$39,705	5,345,881.20	483.42	198.58
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		48.45	14.15	$27,794	393,285.10	62.60	15.54
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0,12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9738.9		973.31	1,724.13	$24,307	41,908,427.91	2,697.44	7,041.46
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		5.00	1.00	$190,755	190,755.00	6.00	60.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		1.00		$282,244	-	1.00	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		4.00		$235,052	-	4.00	33.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		1.00		$282,196	-	1.00	8.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		9.00	6.00	$1,488,291	8,929,746.00	15.00	3.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		58.00	9.00	$64,019	576,171.00	67.00	32.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		94.29	12.34	$35,397	436,798.98	106.63	37.37
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		281.93	53.00	$58,180	3,083,540.00	334.93	254.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
