NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		38.00		$65,771.40	$0.00	38.00	20.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		49.34		$806,382.59	$0.00	49.34	15.66
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		243.73	1.14	$1,913,254.50	$2,181,110.13	244.87	5.13
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		24.00		$51,273.41	$0.00	24.00	137.41
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	54.71			12.15	$85,913.13	$1,043,844.53	12.15	42.56
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PROVISE O BLANCO CON	M2	306.58			17.63	$436,793.97	$7,700,677.69	17.63	288.95
NP 105	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A 7 DÍAS, NO INCLUYE	M3	34.76			22.48	$1,701,650.00	$38,253,092.00	22.48	12.28
NP 106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC WATER STOP V-15	ML	38.2			22.76	$88,770.00	$2,020,405.20	22.76	15.44
							VALOR DE OBRA	$117,715,637.76		
							INCIDENCIA	1.79%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1Q1qEc8ZqdcyvUxN3am3AXCbd_Ar1p



https://drive.google.com/open?id=1qd8R8TFO_IKhUgo2N7dVqGRHcIJ0sha

FOTO 1	Levante de muro	FOTO 2	Levante de muro



https://drive.google.com/open?id=1tWmTODvj3h51fQEEHm6gONHF-qqIY



https://drive.google.com/open?id=1MhHYCbXmLr1Siw_knWZCZ9XET7wAynnn

FOTO 3	Relleno con material de sitio	**FOTO 4**	Instalación de ventanas
			
FOTO 5	Instalación de Estructura metalica	**FOTO 6**	Instalación de Estructura metalica

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL** **No. 54**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.50%	0.90%	52.84%	52	3.50%	0.90%	$59,329,804	52.84%

53	3/12/2023	9/12/2023	2.64%	1.79%	54.62%	53	2.64%	1.79%	$117,715,638	54.62%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.74%	1.80%	56.43%	54	2.74%	1.80%	$118,632,013	56.43%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

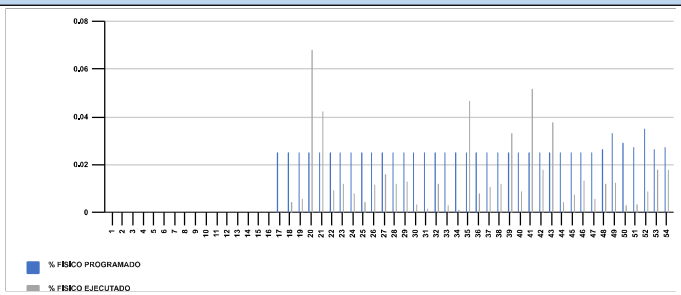

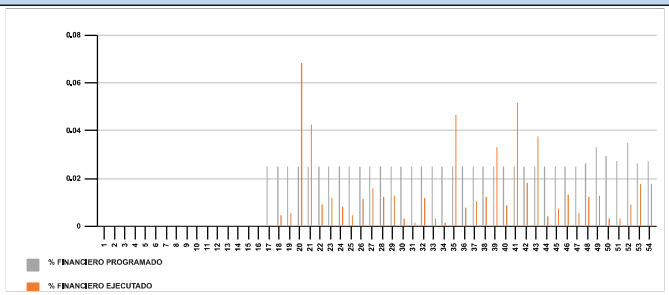

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-11	Se continuó instalación de correas para cubierta, instalación de ventanas, corte y figuración de acero para tanques de almacenamiento, viga dintel y rampa, armado de acero en rampa, fundida en concreto de cimentación para acceso del colegio, Levante de mamposteria, levante de cuchillas, fundida en concreto, compactación y nivelación de terreno en acceso. pañete y filos en laboratorio	N/A
		2023-12-12	se continuó levante de mampostería, Perforación de losa se realizó pañete y filos en laboratorio, instalación de red hidráulica y sanitaria, fundida en concreto de sección de rampa, desencofrado de formaletas en muros de tanque de almacenamiento, instalación de correas para cubierta, levante de cuchilla, corte y figuración de acero para viga dintel.	N/A
		2023-12-13	Levante de mampostería.Perforación de losa Instalación de puertas y ventanas. Instalación de correas para cubierta. Armado de acero para columnas en acceso, armado de mesa para tanque de tapa de almacenamiento. Instalación de red hidráulica y sanitaria. Pañete y filos en cocina. Corte y figuración de acero para rampa.	N/A
		2023-12-14	se continuó instalación de puertas y ventanas. Perforación de losa fundida en concreto de columnas en acceso. instalación de correas para cubiertas. levante de cuchilla y fundida en concreto de viga sobre muro. se continuó levante de mampostería. corte, figuración y fundida en concreto de viga dintel, relleno y nivelación de terreno, armado de acero para tanque de almacenamiento.	N/A
		2023-12-15	se continuó levante de mampostería, armado de acero para tanque de almacenamiento, levante de cuchilla, instalación de red hidráulica de agua lluvia y sanitaria, Instalación de puertas y ventanas. Nivelación y compactación de terreno, fundida en concreto de columnas de acceso.	N/A
		2023-12-16	levante de mamposteria, levante de cuchilla, instalación de redes hidrosanitarias e hidráulica, instalación de puertas y ventanas, armado de acero y figurado para losa de garita y acceso. corte y figuración de acero para rampa y escalera, suministro e instalación de correas para cubiertas.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		231.56		$93,507	-	231.56	299.77
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,593.39		$34,062	-	6,593.39	953.61
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,945.03		$9,568	-	73,945.03	4,203.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		644.00		$40,436	-	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.72		-		$1,894,074	-	-	8.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,957.67	20.08	$27,186	545,894.88	1,977.75	123.71

2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,886.85	38.57	$100,669	3,882,803.33	1,925.42	184.58
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		202.65	60.15	$17,610	1,059,241.50	262.80	197.20
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		483.42	88.82	$39,705	3,526,598.10	572.24	109.76
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		62.60	9.60	$27,794	266,822.40	72.20	5.94
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9738.9		2,697.44	3,260.30	$24,307	79,248,112.10	5,957.74	3,781.16
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		6.00		$190,755	-	6.00	60.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		1.00		$282,244	-	1.00	5.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		4.00		$235,052	-	4.00	33.00
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	18		-		$212,527	-	-	18.00
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	108.64		-		$121,310	-	-	108.64
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	173		-		$283,058	-	-	173.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		1.00		$282,196	-	1.00	8.00

10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		15.00		$1,488,291	-	15.00	3.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		67.00	9.00	$64,019	576,171.00	76.00	23.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		106.63	18.00	$35,397	637,146.00	124.63	19.37
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		-		$29,367	-	-	45.16
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		334.93	56.00	$58,180	3,258,080.00	390.93	198.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		38.00	7	$65,771.40	$460,399.80	45.00	13.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		49.34		$806,382.59	$0.00	49.34	15.66
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		244.87	1.26	$1,913,254.50	$2,410,700.67	246.13	3.87
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		24.00	12.08	$51,273.41	$619,382.79	36.08	125.33
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	29		-	8	$125,226.57	$1,001,812.56	8.00	21.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	25.44		-	1.81	$49,184.56	$89,024.05	1.81	23.63
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	54.71		12.15	21.33	$85,913.13	$1,832,527.06	33.48	21.23
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON	M2	306.58		17.63	27.14	$436,793.97	$11,854,588.35	44.77	261.81
NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ	UND	36		-	4	$1,199,560.00	$4,798,240.00	4.00	32.00
NP 103	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0,20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO	ML	321.87		-	33.54	$76,460.00	$2,564,468.40	33.54	288.33
NP 105	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A 7 DÍAS, NO INCLUYE	M3	34.76		22.48		$1,701,650.00	$0.00	22.48	12.28
NP 106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC WATER STOP V-15	ML	38.2		22.76		$88,770.00	$0.00	22.76	15.44
							VALOR DE OBRA	$118,632,013.00		
							INCIDENCIA	1.80%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levante de muro



FOTO 2	Instalación de Estructura metalica



FOTO 3	Instalación de Estructura metalica



FOTO 4	Instalación de ventanas

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL No. 55	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.50%	0.90%	52.84%	52	3.50%	0.90%	$59,329,804	52.84%

53	3/12/2023	9/12/2023	2.64%	1.79%	54.62%	53	2.64%	1.79%	$117,715,638	54.62%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.74%	1.80%	56.43%	54	2.74%	1.80%	$118,632,013	56.43%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.84%	1.28%	57.70%	55	1.84%	1.28%	$84,082,041	57.70%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

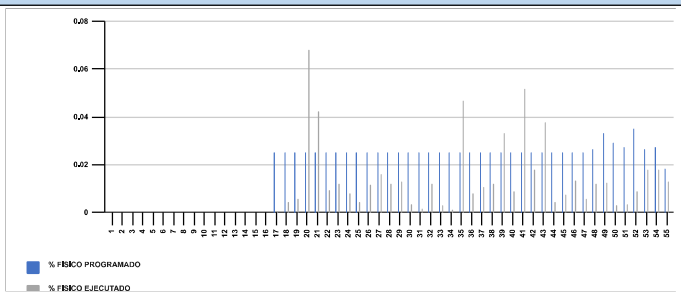

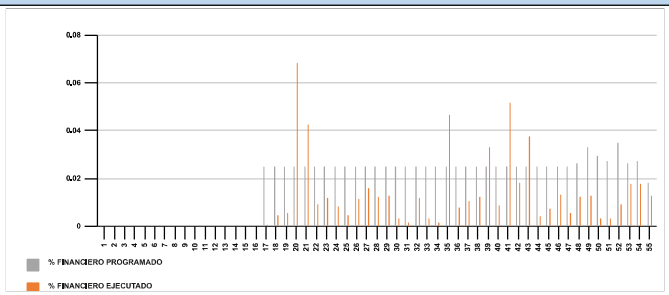

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-18	Se continuó suministro e instalación de correa metálica para cubierta,Perforación de losa levante de mampostería, corte y figuración de acero para rampa y escalera, instalación de ventana y puertas, levante de cuchilla, instalación de redes hidrosanitarias e hidráulica, armado de acero y figurado para losa de garita y acceso.	N/A
		2023-12-19	Se continuó corte y figuración de acero para rampa y escalera, suministro e instalación de correas metálicas para cubierta, Levante de mampostería. Instalación de puertas y ventanas. Instalación de redes hidráulicas e hidrosanitarias. Se continuó corte y figuración de acero para garita y acceso. Fundida en concreto de viga para cuchilla.	N/A
		2023-12-20	Se continuó instalación de ventanas y puertas. Se continuó corte y figuración de acero para rampa y escalera. Armado de acero para losa de garita y acceso. Instalación de redes hidrosanitarias, hidráulica y aguas lluvias. Suministro e instalación de correas metálicas para cubierta. Levante de mampostería.	N/A
		2023-12-21	Se continuó instalación de redes hidrosanitarias, hidráulica y aguas lluvias. Instalación de tubería eléctrica. Levante de mampostería. corte y figuración de acero para viga dintel y alfajía, suministro e instalación de correas metálicas para cubierta, levante de cuchilla, instalación de puertas y ventanas, fundida en concreto de viga sobre muro para cuchilla. Perforación de losa	N/A
		2023-12-22	se continuó instalación de tubería eléctrica, levante de mampostería, Instalación de redes hidrosanitarias, hidráulica y agua lluvia. Instalación de puertas y ventanas. Corte y figuración de acero para rampa y escalera. Suministro e instalación de correas metálicas para cubierta.	N/A
		2023-12-23	Se continuó con la instalación de tubería eléctrica. suministro en instalación de correas metálicas para cubierta, corte y figuración de acero para rampa y escalera, instalación de ventanas y rampa, levante de mampostería, fin de obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		231.56		$93,507	-	231.56	299.77
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,593.39		$34,062	-	6,593.39	953.61
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,945.03		$9,568	-	73,945.03	4,203.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		644.00		$40,436	-	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,977.75		$27,186	-	1,977.75	123.71
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12

3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,925.42		$100,669	-	1,925.42	184.58
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		262.80		$17,610	-	262.80	197.20
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		572.24		$39,705	-	572.24	109.76
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		72.20		$27,794	-	72.20	5.94
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9738.9		5,957.74	1,845.14	$24,307	44,849,817.98	7,802.88	1,936.02
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		6.00	1.00	$190,755	190,755.00	7.00	59.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		1.00	1.00	$282,244	282,244.00	2.00	4.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		4.00	1.00	$235,052	235,052.00	5.00	32.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		1.00	2.00	$282,196	564,392.00	3.00	6.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		15.00		$1,488,291	-	15.00	3.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		76.00	7.00	$64,019	448,133.00	83.00	16.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		124.63	14.33	$35,397	507,239.01	138.96	5.04
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		390.93	57.00	$58,180	3,316,260.00	447.93	141.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72

NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		45.00	9	$65,771.40	$591,942.60	54.00	4.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		49.34	10.68	$806,382.59	$8,612,166.06	60.02	4.98
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		246.13	1.94	$1,913,254.50	$3,711,713.73	248.07	1.93
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		36.08	16.33	$51,273.41	$837,294.79	52.41	109.00
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	29		8.00	12	$125,226.57	$1,502,718.84	20.00	9.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	25.44		1.81	7.15	$49,184.56	$351,669.60	8.96	16.48
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	54.71		33.48		$85,913.13	$0.00	33.48	21.23
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6 MM, DOS CUERPOS CORREDIZOS Y 4 FIJOS.	M2	306.58		44.77	22.17	$436,793.97	$9,683,722.31	66.94	239.64
NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ ENTAMBORADA Y MARCO CALIBRE 18 DE DE HASTA 1.00 X 2.10 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES. CON MIRILLA O SIN MIRILLA	UND	36		4.00	7	$1,199,560.00	$8,396,920.00	11.00	25.00
NP 103	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0.20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO LONGITUDINAL DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8". INCLUYE TRIPLEX FORMALETA	ML	321.87		33.54		$76,460.00	$0.00	33.54	288.33
NP 105	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A 7 DÍAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	34.76		22.48		$1,701,650.00	$0.00	22.48	12.28
NP 106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC WATER STOP V-15	ML	38.2		22.76		$88,770.00	$0.00	22.76	15.44
								VALOR DE OBRA	$84,082,040.93	
								INCIDENCIA	1.28%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1qmJ6PWlcHJLnCEVGdkCABVIBSCtkHt

FOTO 1	Instalación de Estructura metalica	FOTO 2	Instalación de ventanas

 https://drive.google.com/open?id=1TK8lx6sC6Dv_pea_eGOz8vcDLoGoCZLy		 https://drive.google.com/open?id=1CZkGLwjEX0lXpS01rXjNuc7d4mH1KID	
FOTO 3	Instalación de puertas metálicas	**FOTO 4**	Instalación de tuberías de agua

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE CARRIZAL**	**No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
			VERSION:	**01**
			FECHA:	**6/9/2021**
			Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.50%	0.05%	0.05%	17	2.50%	0.05%	$3,508,625	0.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.50%	0.46%	0.51%	18	2.50%	0.46%	$30,045,710	0.51%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.50%	0.57%	1.08%	19	2.50%	0.57%	$37,579,885	1.08%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.50%	6.82%	7.90%	20	2.50%	6.82%	$449,147,148	7.90%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.50%	4.25%	12.15%	21	2.50%	4.25%	$279,734,841	12.15%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.50%	0.92%	13.08%	22	2.50%	0.92%	$60,767,090	13.08%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.50%	1.19%	14.27%	23	2.50%	1.19%	$78,310,009	14.27%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.50%	0.81%	15.08%	24	2.50%	0.81%	$53,337,490	15.08%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.50%	0.45%	15.53%	25	2.50%	0.45%	$29,591,797	15.53%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.50%	1.15%	16.67%	26	2.50%	1.15%	$75,381,582	16.67%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.50%	1.60%	18.27%	27	2.50%	1.60%	$105,403,495	18.27%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.50%	1.23%	19.50%	28	2.50%	1.23%	$80,841,942	19.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.50%	1.30%	20.80%	29	2.50%	1.30%	$85,509,108	20.80%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.50%	0.35%	21.15%	30	2.50%	0.35%	$22,787,554	21.15%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.50%	0.15%	21.30%	31	2.50%	0.15%	$9,837,339	21.30%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.50%	1.21%	22.51%	32	2.50%	1.21%	$79,944,264	22.51%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.50%	0.32%	22.83%	33	2.50%	0.32%	$20,812,122	22.83%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.50%	0.14%	22.97%	34	2.50%	0.14%	$9,179,539	22.97%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.50%	4.68%	27.65%	35	2.50%	4.68%	$308,210,669	27.65%
36	6/8/2023	12/8/2023	2.50%	0.80%	28.45%	36	2.50%	0.80%	$52,413,511	28.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.50%	1.07%	29.52%	37	2.50%	1.07%	$70,595,711	29.52%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.50%	1.22%	30.74%	38	2.50%	1.22%	$80,488,817	30.74%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.50%	3.32%	34.06%	39	2.50%	3.32%	$218,562,621	34.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.50%	0.88%	34.95%	40	2.50%	0.88%	$58,225,489	34.95%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.50%	5.17%	40.12%	41	2.50%	5.17%	$340,486,699	40.12%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.50%	1.81%	41.92%	42	2.50%	1.81%	$118,885,874	41.92%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.50%	3.77%	45.70%	43	2.50%	3.77%	$248,442,934	45.70%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.50%	0.44%	46.14%	44	2.50%	0.44%	$28,919,037	46.14%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.50%	0.76%	46.90%	45	2.50%	0.76%	$50,018,999	46.90%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.50%	1.32%	48.22%	46	2.50%	1.32%	$87,113,652	48.22%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.50%	0.56%	48.79%	47	2.50%	0.56%	$37,131,499	48.79%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.65%	1.22%	50.00%	48	2.65%	1.22%	$80,223,416	50.00%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.31%	1.27%	51.27%	49	3.31%	1.27%	$83,279,725	51.27%
50	12/11/2023	18/11/2023	2.94%	0.33%	51.60%	50	2.94%	0.33%	$21,489,612	51.60%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.74%	0.34%	51.93%	51	2.74%	0.34%	$22,201,331	51.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.50%	0.90%	52.84%	52	3.50%	0.90%	$59,329,804	52.84%

53	3/12/2023	9/12/2023	2.64%	1.79%	54.62%	53	2.64%	1.79%	$117,715,638	54.62%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.74%	1.80%	56.43%	54	2.74%	1.80%	$118,632,013	56.43%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.84%	1.28%	57.70%	55	1.84%	1.28%	$84,082,041	57.70%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.14%	0.76%	58.46%	56	0.14%	0.76%	$49,766,887	58.46%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

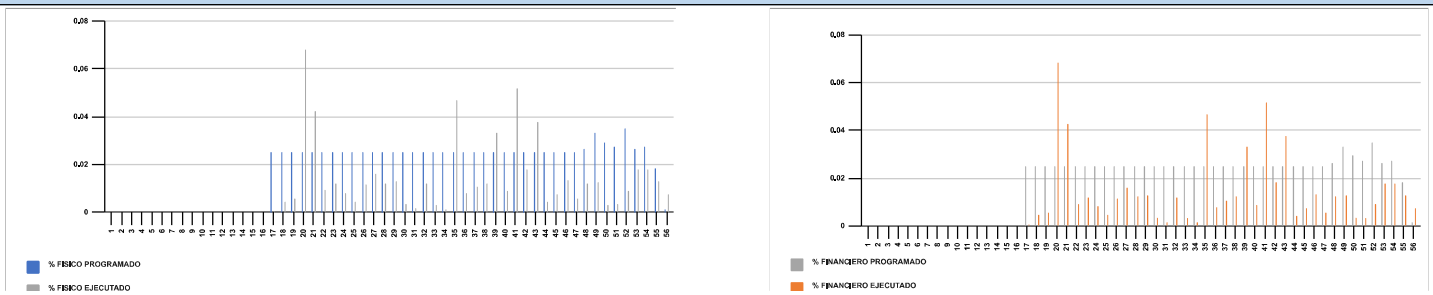

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
CARRIZAL	CL 50 D# 3- 15	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra.	N/A
		2023-12-26	se continuó armado de acero para losa de garita de seguridad y acceso, instalación de puertas y ventanas, corte y figuración de acero para rampa y escalera, instalación de tubería eléctrica, suministro e instalación de correas metálicas para cubierta, Instalación de redes hidrosanitarias e hidráulica.	N/A
		2023-12-27	Se realizó fundida en concreto de losa de garita de seguridad y acceso. Se continuó corte y figuración de acero y armado para rampa. Instalación de puertas y ventanas. Levante de mampostería, suministro e instalación de correa metálica para cubierta. Instalación de redes hidrosanitarias e hidráulica. Se continuó instalación de tubería eléctrica.	N/A
		2023-12-28	Se realizó limpieza general de la obra.	N/A
		2023-12-29	Se realizó limpieza general de la obra.	N/A
		2023-12-30	Se realizó limpieza general de la obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3487.3505		3,487.35		$4,221	-	3,487.35	0.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	45		45.00		$454,545	-	45.00	-
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	32		32.00		$116,390	-	32.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	69.605		69.60		$252,961	-	69.60	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	1136		1,034.72		$20,699	-	1,034.72	101.28
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	70.1		70.10		$266,275	-	70.10	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	531.33		231.56		$93,507	-	231.56	299.77
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12450		6,937.03		$90,362	-	6,937.03	5,512.97
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	7547		6,593.39		$34,062	-	6,593.39	953.61
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	463.21		335.70		$54,171	-	335.70	127.51
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	78148.67		73,945.03		$9,568	-	73,945.03	4,203.64
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	945		644.00		$40,436	-	644.00	301.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	50.21		0.00		$894,392	-	0.00	50.21
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	81.17		59.29		$1,742,818	-	59.29	21.88
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	8.72		-		$1,894,074	-	-	8.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	2101.46		1,977.75		$27,186	-	1,977.75	123.71
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	191.12		0.00		$813,350	-	0.00	191.12
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	467		466.87		$32,154	-	466.87	0.13
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	2110		1,925.42		$100,669	-	1,925.42	184.58

3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	460		262.80		$17,610	-	262.80	197.20
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	682		572.24		$39,705	-	572.24	109.76
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	78.14		72.20		$27,794	-	72.20	5.94
3.16	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m .	MT2	125.15		96.00		$38,862	-	96.00	29.15
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9738.9		7,802.88	949.89	$24,307	23,088,976.23	8,752.77	986.13
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	286.12		286.02		$34,014	-	286.02	0.10
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	259.67		259.67		$16,524	-	259.67	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	222.38		222.38		$20,865	-	222.38	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	221.69		58.22		$32,600	-	58.22	163.47
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	3.09		3.09		$77,644	-	3.09	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		16.00		$38,451	-	16.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	34		34.00		$57,053	-	34.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	18		18.00		$32,669	-	18.00	-
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE TRIPLEX O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ROBLE, BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y PINTADA CON LACA COLOR NATURAL	M2	2		2.00		$204,956	-	2.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	4		4.00		$16,601	-	4.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	66		7.00	2.00	$190,755	381,510.00	9.00	57.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		2.00		$282,244	-	2.00	4.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	37		5.00	1.00	$235,052	235,052.00	6.00	31.00
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	18		-		$212,527	-	-	18.00
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	108.64		-		$121,310	-	-	108.64
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	173		-		$283,058	-	-	173.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	9		3.00		$282,196	-	3.00	6.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	18		15.00		$1,488,291	-	15.00	3.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	99		83.00	4.00	$64,019	256,076.00	87.00	12.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	29		29.00		$96,952	-	29.00	-
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC D= 2"	ML	144		138.96		$35,397	-	138.96	5.04
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	45.16		-		$29,367	-	-	45.16
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ACUACER O SIMILAR DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	2		2.00		$859,102	-	2.00	-
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O SOBREPONER ACUACER O SIMILAR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA	UND	1		1.00		$212,285	-	1.00	-
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	67.17		19.12		$45,401	-	19.12	48.05
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	128.12		86.22		$27,015	-	86.22	41.90

10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	589		447.93	37.00	$58,180	2,152,660.00	484.93	104.07
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	48.72		11.00		$173,513	-	11.00	37.72
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	58		54.00		$65,771.40	$0.00	54.00	4.00
NP 15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	UND	11		11.00		$134,924	$0.00	11.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	151		149.14		$760,000.00	$0.00	149.14	1.86
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	65		60.02		$806,382.59	$0.00	60.02	4.98
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	712.62		712.62		$15,410.72	$0.00	712.62	-
NP 60	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,60 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,12 METROS EN CONCRETO DE BOMBEO DE 3500 PSI.	M2	1251		1,235.15		$439,795.34	$0.00	1,235.15	15.85
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	250		248.07		$1,913,254.50	$0.00	248.07	1.93
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	706.75		706.75		$92,835.16	$0.00	706.75	0.00
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	161.405		52.41	10.96	$51,273.41	$561,956.57	63.37	98.04
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	29		20.00		$125,226.57	$0.00	20.00	9.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	25.44		8.96	3.42	$49,184.56	$168,211.20	12.38	13.06
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	54.71		33.48		$85,913.13	$0.00	33.48	21.23
NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON	M2	306.58		66.94	44.24	$436,793.97	$19,323,765.23	111.18	195.40
NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ	UND	36		11.00	3	$1,199,560.00	$3,598,680.00	14.00	22.00
NP 103	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DINTEL 0.15 X 0,20 MTS EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE VARILLA DE REFUERZO	ML	321.87		33.54		$76,460.00	$0.00	33.54	288.33
NP 105	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A 7 DÍAS, NO INCLUYE	M3	34.76		22.48		$1,701,650.00	$0.00	22.48	12.28
NP 106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC WATER STOP V-15	ML	38.2		22.76		$88,770.00	$0.00	22.76	15.44
							VALOR DE OBRA	$49,766,887.23		
							INCIDENCIA	0.76%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
CARRIZAL	Carlos Mendoza	Ricardo Caballero	Herramientas menores	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1M7O9A9YndDC1a64KnwlK7vEhBalz3e4



https://drive.google.com/open?id=189lwZd1MG7UA0VPHtbcMM5nVUBnAjvF

FOTO 1	Instalación de ventanas	FOTO 2	Instalación de puertas metálicas.

 https://drive.google.com/open?id=15plMylvxaBkOI-eVCeU1Q-eWRpraHorG		 https://drive.google.com/open?id=1ZqteCavKkfenanPvGm2O3r941xu4C-aY	
FOTO 3	Instalación de Estructura metalica	**FOTO 4**	Instalación de Estructura metalica

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,045,649	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$59,640,946	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$40,054,659	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$22,481,858	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.24%	16.18%	23	2.70%	1.24%	$10,787,932	16.18%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.55%	16.73%	24	3.04%	0.55%	$4,760,176	16.73%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.31%	18.04%	25	2.68%	1.31%	$11,392,850	18.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.78%	19.82%	26	2.14%	1.78%	$15,539,638	19.82%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.30%	23.11%	27	4.12%	3.30%	$28,721,045	23.11%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.39%	26.50%	28	1.78%	3.39%	$29,524,638	26.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	3.07%	29.57%	29	2.24%	3.07%	$26,740,797	29.57%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.38%	32.95%	30	3.68%	3.38%	$29,444,723	32.95%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.85%	42.80%	31	4.62%	9.85%	$85,857,097	42.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.87%	51.67%	32	3.22%	8.87%	$77,283,801	51.67%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.62%	55.29%	33	5.62%	3.62%	$31,520,369	55.29%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.30%	56.58%	34	3.68%	1.30%	$11,286,493	56.58%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	2.00%	58.59%	35	4.44%	2.00%	$17,458,690	58.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.87%	62.45%	36	3.07%	3.87%	$33,708,177	62.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.63%	67.08%	37	2.04%	4.63%	$40,307,650	67.08%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.57%	72.65%	38	2.94%	5.57%	$48,570,220	72.65%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.85%	77.50%	39	3.84%	4.85%	$42,273,194	77.50%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.41%	80.92%	40	2.94%	3.41%	$29,745,969	80.92%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.40%	85.32%	41	3.77%	4.40%	$38,365,450	85.32%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.43%	89.75%	42	2.68%	4.43%	$38,569,083	89.75%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	7.19%	96.93%	43	3.94%	7.19%	$62,619,047	96.93%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	44	0.00%	0.00%	$0	96.93%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	45	0.00%	0.00%	$0	96.93%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	46	0.00%	0.00%	$0	96.93%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	47	0.00%	0.00%	$0	96.93%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	48	0.00%	0.00%	$0	96.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	49	0.00%	0.00%	$0	96.93%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	50	0.00%	0.00%	$0	96.93%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	51	0.00%	0.00%	$0	96.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.34%	0.28%	97.21%	52	1.34%	0.28%	$2,436,709	97.21%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

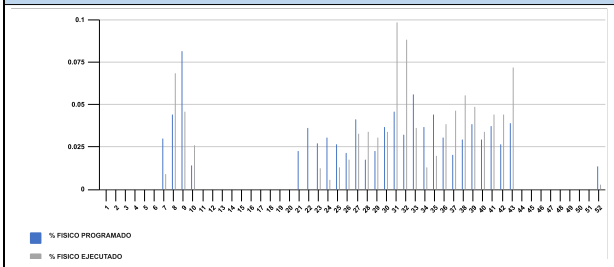

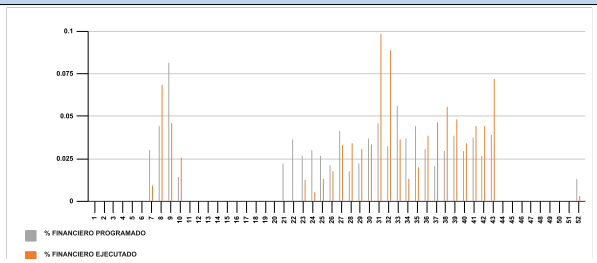

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-01	Levante muro bajo el área del pasillo y descapote manual en la parte posterior de la institución para realizar andén .	N/A
		2023-12-02	Levante muro bajo el área del pasillo y descapote manual en la parte posterior de la institución para realizar andén .	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	819.51		711.87	107.64	$4,221	$454,348	819.51	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	1475.68		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	102.15
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	852.91		803.29	17.15	$25,396	$435,541	820.44	32.47
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	48.57		48.57		$252,961	$0	48.57	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	455.23		454.03		$20,699	-	454.03	1.20
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.7905		894.35		$93,507	$0	894.35	0.44
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.25		162.86		$34,062	-	162.86	0.39
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	24.71		24.71		$192,928	$0	24.71	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	461		459.89		$54,171	$0	459.89	1.11
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	22974.305		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	106.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	156		128.00		$40,436	-	128.00	28.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.14		69.14		$894,392	$0	69.14	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	7.5		-	7.50	$27,186	203,895.00	7.50	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	154.31		140.97	13.34	$100,669	$1,342,924	154.31	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	136.78		136.78		$534,334	-	136.78	-

11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.69		80.00		$67,760	$0	80.00	3.69
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	360.13		358.93		$70,000	$0	358.93	1.20

VALOR DE OBRA	$2,436,709
INCIDENCIA	0.28%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levantamiento de muro. INOCENCIO CHINCA



FOTO 2	Descapote manual en la parte posterior de la institución. INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 53	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,045,649	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$59,640,946	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$40,054,659	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$22,481,858	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.24%	16.18%	23	2.70%	1.24%	$10,787,932	16.18%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.55%	16.73%	24	3.04%	0.55%	$4,760,176	16.73%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.31%	18.04%	25	2.68%	1.31%	$11,392,850	18.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.78%	19.82%	26	2.14%	1.78%	$15,539,638	19.82%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.30%	23.11%	27	4.12%	3.30%	$28,721,045	23.11%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.39%	26.50%	28	1.78%	3.39%	$29,524,638	26.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	3.07%	29.57%	29	2.24%	3.07%	$26,740,797	29.57%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.38%	32.95%	30	3.68%	3.38%	$29,444,723	32.95%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.85%	42.80%	31	4.62%	9.85%	$85,857,097	42.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.87%	51.67%	32	3.22%	8.87%	$77,283,801	51.67%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.62%	55.29%	33	5.62%	3.62%	$31,520,369	55.29%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.30%	56.58%	34	3.68%	1.30%	$11,286,493	56.58%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	2.00%	58.59%	35	4.44%	2.00%	$17,458,690	58.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.87%	62.45%	36	3.07%	3.87%	$33,708,177	62.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.63%	67.08%	37	2.04%	4.63%	$40,307,650	67.08%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.57%	72.65%	38	2.94%	5.57%	$48,570,220	72.65%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.85%	77.50%	39	3.84%	4.85%	$42,273,194	77.50%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.41%	80.92%	40	2.94%	3.41%	$29,745,969	80.92%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.40%	85.32%	41	3.77%	4.40%	$38,365,450	85.32%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.43%	89.75%	42	2.68%	4.43%	$38,569,083	89.75%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	7.19%	96.93%	43	3.94%	7.19%	$62,619,047	96.93%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	44	0.00%	0.00%	$0	96.93%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	45	0.00%	0.00%	$0	96.93%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	46	0.00%	0.00%	$0	96.93%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	47	0.00%	0.00%	$0	96.93%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	48	0.00%	0.00%	$0	96.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	49	0.00%	0.00%	$0	96.93%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	50	0.00%	0.00%	$0	96.93%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	51	0.00%	0.00%	$0	96.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.34%	0.28%	97.21%	52	1.34%	0.28%	$2,436,709	97.21%
53	3/12/2023	9/12/2023	3.01%	0.76%	97.97%	53	3.01%	0.76%	$6,595,331	97.97%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-12-03	Descapote manual en el área donde se realiza el andén. Se realiza pañete allanado al levante del muro bajo de pasillo.	N/A
		2023-12-04	Descapote manual en el área del andén y se realiza armado más posterior fundida de alfajía en concreto sobre el levante del muro bajo en pasillo.	N/A
		2023-12-05	Se comienza armado de malla electrosoldada y se comienza a fundir el andén en la parte posterior de la institución , además se comienza a realizar excavación para la viga de cimiento del levante del muro de cerramientos que falta por ejecutar.	N/A
		2023-12-06	Se continúa realizando fundidas de andén en la parte posterior de la institución , además se comienza a realizar figuración y armado para la viga de cimientos del muro de cerramiento.Se realizó fundida de solado de limpieza	N/A
		2023-12-07	Se continúa realizando fundida de anden y se realiza fundida de viga de cimiento del muro de cerramiento en la institución.	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	Se continúa realizando fundida de andén y se comenzó a realizar corte y demolición de placa para desarenadores, se realizó relleno con material de sitio	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	819.51		819.51		$4,221	$0	819.51	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	1475.68		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	102.15
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	852.91		820.44	32.47	$25,396	$824,608	852.91	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	48.57		48.57		$252,961	$0	48.57	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	455.23		454.03	0.48	$20,699	9,935.52	454.51	0.72
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.7905		894.35	0.44	$93,507	$41,143	894.79	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.25		162.86	0.39	$34,062	13,284.18	163.25	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	24.71		24.71		$192,928	$0	24.71	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	461		459.89	1.11	$54,171	$60,130	461.00	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	22974.305		22,868.26		$9,568	$0	22,868.26	106.04
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	156		128.00	18.00	$40,436	727,848.00	146.00	10.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.14		69.14		$894,392	$0	69.14	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	7.5		7.50		$27,186	-	7.50	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	153.78		-	74.86	$18,074	1,353,019.64	74.86	78.92
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	154.31		154.31		$100,669	$0	154.31	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	14.11		-	14.11	$39,705	560,237.55	14.11	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	136.78		136.78		$534,334	-	136.78	-

11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.69		80.00		$67,760	$0	80.00	3.69
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	68.76			21.64	$92,835	$2,008,953	21.64	47.12
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	360.13		358.93		$70,000	$0	358.93	1.20
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	8.82			8.82	$112,945	$996,172	8.82	-

VALOR DE OBRA	$6,595,331
INCIDENCIA	0.76%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Armado y fundición de alfajía INOCENCIO CHINCA



FOTO 2	Descapote manual INOCENCIO CHINCA



FOTO 3	Excavacion Manual. INOCENCIO CHINCA



FOTO 4	Armado de malla electrosoldada INOCENCIO CHINCA



FOTO 5	Pañete sobre muro INOCENCIO CHINCA



FOTO 6	Tuberia de 2 pulgadas. INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 54	Código:	IP-FM-31
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,045,649	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$59,640,946	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$40,054,659	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$22,481,858	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.24%	16.18%	23	2.70%	1.24%	$10,787,932	16.18%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.55%	16.73%	24	3.04%	0.55%	$4,760,176	16.73%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.31%	18.04%	25	2.68%	1.31%	$11,392,850	18.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.78%	19.82%	26	2.14%	1.78%	$15,539,638	19.82%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.30%	23.11%	27	4.12%	3.30%	$28,721,045	23.11%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.39%	26.50%	28	1.78%	3.39%	$29,524,638	26.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	3.07%	29.57%	29	2.24%	3.07%	$26,740,797	29.57%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.38%	32.95%	30	3.68%	3.38%	$29,444,723	32.95%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.85%	42.80%	31	4.62%	9.85%	$85,857,097	42.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.87%	51.67%	32	3.22%	8.87%	$77,283,801	51.67%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.62%	55.29%	33	5.62%	3.62%	$31,520,369	55.29%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.30%	56.58%	34	3.68%	1.30%	$11,286,493	56.58%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	2.00%	58.59%	35	4.44%	2.00%	$17,458,690	58.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.87%	62.45%	36	3.07%	3.87%	$33,708,177	62.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.63%	67.08%	37	2.04%	4.63%	$40,307,650	67.08%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.57%	72.65%	38	2.94%	5.57%	$48,570,220	72.65%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.85%	77.50%	39	3.84%	4.85%	$42,273,194	77.50%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.41%	80.92%	40	2.94%	3.41%	$29,745,969	80.92%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.40%	85.32%	41	3.77%	4.40%	$38,365,450	85.32%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.43%	89.75%	42	2.68%	4.43%	$38,569,083	89.75%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	7.19%	96.93%	43	3.94%	7.19%	$62,619,047	96.93%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	44	0.00%	0.00%	$0	96.93%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	45	0.00%	0.00%	$0	96.93%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	46	0.00%	0.00%	$0	96.93%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	47	0.00%	0.00%	$0	96.93%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	48	0.00%	0.00%	$0	96.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	49	0.00%	0.00%	$0	96.93%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	50	0.00%	0.00%	$0	96.93%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	51	0.00%	0.00%	$0	96.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.34%	0.27%	97.20%	52	1.34%	0.27%	$2,342,243	97.20%
53	3/12/2023	9/12/2023	3.01%	0.76%	97.96%	53	3.01%	0.76%	$6,595,331	97.96%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.64%	1.01%	98.97%	54	2.64%	1.01%	$8,793,995	98.97%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-12-10	Se terminó de fundir placa de contrapiso apra andén posteriormente se realizó el corte de losa previamente fundida, por ultimo se culminó la demolicion de placa en concreto para los desarenadores.	N/A
		2023-12-11	Se realizó la instalacion de tuberia de 2" para drenaje posterior a esto se realizó pintura del muro bajo del pastillo , además se realizó levante de muro para armado de puente que conecta pasillo con el kiosco.	N/A
		2023-12-12	Se realizó fundida de placa de contrapiso para puente , se realizó pañete impermeabilizado en el apoyo de la placa para el punto y se realizó fundida de plantilla en los desarenadores.	N/A
		2023-12-13	Se realizó levante de muro en bloque dovelado para el muro de cerramiento, en paralelo se realizó el figurado de acero para viga cinta.	N/A
		2023-12-14	Se realizó armado de encofrado para viga cinta y posterior se fundió la viga cinta en el muro de cerramiento de la institución educativa.	N/A
		2023-12-15	Se continó con levante de muro en bloque vibrado del muro de cerramiento y paralelo a esto se continuó el figurado de acero para viga superior del muro.	N/A
		2023-12-16	Se continuó con el armado de formaleta para viga superior y posterior fundida en concreto de la viga superior del muro de cerramiento.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	819.51		797.13		$4,221	$0	797.13	22.38
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	1475.68		1,373.53		$9,648	$0	1,373.53	102.15
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	852.91		852.91		$25,396	$0	852.91	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	48.57		48.57		$252,961	$0	48.57	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	455.23		454.51	0.72	$20,699	14,903.28	455.23	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.7905		894.79		$93,507	$0	894.79	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.25		163.25		$34,062	-	163.25	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	24.71		24.71		$192,928	$0	24.71	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	461		461.00		$54,171	$0	461.00	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	22974.305		22,868.26	106.04	$9,568	$1,014,591	22,974.30	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	156		146.00	10.00	$40,436	404,360.00	156.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.14		69.14		$894,392	$0	69.14	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	7.5		7.50		$27,186	-	7.50	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	153.78		74.86	78.92	$18,074	1,426,400.08	153.78	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	154.31		154.31		$100,669	$0	154.31	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	5.8		-	5.80	$60,337	349,954.60	5.80	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	14.11		14.11		$39,705	-	14.11	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	4.62		-	4.62	$27,794	128,408.28	4.62	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	14.11		-	14.11	$20,720	292,359.20	14.11	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-

10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	136.78		136.78		$534,334	-	136.78	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6,50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.69		80.00		$67,760	$0	80.00	3.69
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	68.76		21.64	47.12	$92,835	$4,374,393	68.76	0.00
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	360.13		358.93	1.20	$70,000	$84,000	360.13	-
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0.83		-	0.83	$806,383	$669,298	0.83	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	8.82		8.82		$112,945	$0	8.82	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	0.6		-	0.60	$58,881	$35,329	0.60	-
							VALOR DE OBRA	$8,793,995		
							INCIDENCIA	1.01%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Figuración de hierro para viga INOCENCIO CHINCA



FOTO 2	Pintura sobre muro. INOCENCIO CHINCA



FOTO 3	Fundida de puente con pañete impermeabilizado. INOCENCIO CHINCA



FOTO 4	Armado y fundición de viga cinta en el muro de cerramiento. INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE INOCENCIO CHINCA No. 55	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	3.02%	0.92%	0.92%	7	3.02%	0.92%	$8,045,649	0.92%
8	22/1/2023	28/1/2023	4.45%	6.84%	7.77%	8	4.45%	6.84%	$59,640,946	7.77%
9	29/1/2023	4/2/2023	8.15%	4.60%	12.36%	9	8.15%	4.60%	$40,054,659	12.36%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.41%	2.58%	14.94%	10	1.41%	2.58%	$22,481,858	14.94%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	11	0.00%	0.00%	$0	14.94%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	14.94%	12	0.00%	0.00%	$0	14.94%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	13	0.00%	0.00%	$0	14.94%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	14	0.00%	0.00%	$0	14.94%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	15	0.00%	0.00%	$0	14.94%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	14.94%	16	0.00%	0.00%	$0	14.94%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	17	0.00%	0.00%	$0	14.94%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	18	0.00%	0.00%	$0	14.94%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	19	0.00%	0.00%	$0	14.94%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	14.94%	20	0.00%	0.00%	$0	14.94%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.24%	0.00%	14.94%	21	2.24%	0.00%	$0	14.94%
22	30/4/2023	6/5/2023	3.61%	0.00%	14.94%	22	3.61%	0.00%	$0	14.94%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.70%	1.24%	16.18%	23	2.70%	1.24%	$10,787,932	16.18%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.04%	0.55%	16.73%	24	3.04%	0.55%	$4,760,176	16.73%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.68%	1.31%	18.04%	25	2.68%	1.31%	$11,392,850	18.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.14%	1.78%	19.82%	26	2.14%	1.78%	$15,539,638	19.82%
27	4/6/2023	10/6/2023	4.12%	3.30%	23.11%	27	4.12%	3.30%	$28,721,045	23.11%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.78%	3.39%	26.50%	28	1.78%	3.39%	$29,524,638	26.50%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.24%	3.07%	29.57%	29	2.24%	3.07%	$26,740,797	29.57%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.68%	3.38%	32.95%	30	3.68%	3.38%	$29,444,723	32.95%
31	2/7/2023	8/7/2023	4.62%	9.85%	42.80%	31	4.62%	9.85%	$85,857,097	42.80%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.22%	8.87%	51.67%	32	3.22%	8.87%	$77,283,801	51.67%
33	16/7/2023	22/7/2023	5.62%	3.62%	55.29%	33	5.62%	3.62%	$31,520,369	55.29%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.68%	1.30%	56.58%	34	3.68%	1.30%	$11,286,493	56.58%
35	30/7/2023	5/8/2023	4.44%	2.00%	58.59%	35	4.44%	2.00%	$17,458,690	58.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.07%	3.87%	62.45%	36	3.07%	3.87%	$33,708,177	62.45%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	4.63%	67.08%	37	2.04%	4.63%	$40,307,650	67.08%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.94%	5.57%	72.65%	38	2.94%	5.57%	$48,570,220	72.65%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.84%	4.85%	77.50%	39	3.84%	4.85%	$42,273,194	77.50%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.94%	3.41%	80.92%	40	2.94%	3.41%	$29,745,969	80.92%
41	10/9/2023	16/9/2023	3.77%	4.40%	85.32%	41	3.77%	4.40%	$38,365,450	85.32%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.68%	4.43%	89.75%	42	2.68%	4.43%	$38,569,083	89.75%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.94%	7.19%	96.93%	43	3.94%	7.19%	$62,619,047	96.93%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	44	0.00%	0.00%	$0	96.93%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	45	0.00%	0.00%	$0	96.93%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	46	0.00%	0.00%	$0	96.93%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	96.93%	47	0.00%	0.00%	$0	96.93%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	48	0.00%	0.00%	$0	96.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	49	0.00%	0.00%	$0	96.93%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	50	0.00%	0.00%	$0	96.93%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	96.93%	51	0.00%	0.00%	$0	96.93%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.34%	0.28%	97.21%	52	1.34%	0.28%	$2,436,709	97.21%
53	3/12/2023	9/12/2023	3.01%	0.76%	97.97%	53	3.01%	0.76%	$6,595,331	97.97%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.64%	1.01%	98.98%	54	2.64%	1.01%	$8,793,995	98.98%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.95%	1.02%	100.00%	55	0.95%	1.02%	$8,871,070	100.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
INOCENCIO CHINCA	CL 53 D # 21 B - 181	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-18	Se realizó instalación de concertina sobre el muro de cerramiento , además se instalaron rejillas para cárcamo en el área de parqueadero mas el área donde se realizó los desarenadores por último se realizó limpieza y aseo en todos los áreas intervenidas.	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	819.51		819.51		$4,221	$0	819.51	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	55		55.00		$454,545	$0	55.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	1475.68		1,373.53	102.15	$9,648	$985,543	1,475.68	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	339.31		339.31		$23,673	$0	339.31	-
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	852.91		852.91		$25,396	$0	852.91	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	48.57		48.57		$252,961	$0	48.57	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	455.23		455.23		$20,699	-	455.23	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	894.7905		894.79		$93,507	$0	894.79	0.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	163.25		163.25		$34,062	-	163.25	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	24.71		24.71		$192,928	$0	24.71	-
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	461		461.00		$54,171	$0	461.00	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	22974.305		22,974.30		$9,568	$0	22,974.30	0.00
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	156		156.00		$40,436	-	156.00	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	69.14		69.14		$894,392	$0	69.14	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	7.45		7.45		$1,742,818	$0	7.45	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	4.93		4.93		$1,894,074	$0	4.93	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	7.5		7.50		$27,186	-	7.50	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	153.78		153.78		$18,074	-	153.78	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	87.64		87.64		$813,350	$0	87.64	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	118.85		118.85		$32,154	$0	118.85	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	154.31		154.31		$100,669	$0	154.31	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	5.8		5.80		$60,337	-	5.80	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	14.11		14.11		$39,705	-	14.11	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	4.62		4.62		$27,794	-	4.62	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	14.11		14.11		$20,720	-	14.11	-
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	22.28		22.28		$58,180	-	22.28	-

10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	136.78		136.78		$534,334	-	136.78	-
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	83.69		80.00	3.69	$67,760	$250,034	83.69	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	170.66		170.66		$134,924	$0	170.66	-
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1/2" X cal 16 Y MARCO EN ANGULO 1-1/4" X 1/8". ANCHOS VARIABLES ENTRE 0.30 MT, 0.44 MT Y 0.80 MT DE LONGITUD, PINTURA EN ZINC Y ACABADO EN ESMALTE NEGRO. INCLUYE EL DESBASTE DE ACABADO DE PISO, EL CORTE Y PERFILAMIENTO DE CANAL EN CONCRETO Y LIMPIEZA DEL CANAL	UND	18		-	18.00	$424,194	$7,635,493	18.00	-
NP 51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR	M2	442		442.00		$15,411	$0	442.00	-
NP 52	EMPEDRADO e=20CM, INCLUYE PIEDRA RAJON	M2	442		442.00		$233,155	$0	442.00	-
NP 62	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	68.76		68.76		$92,835	$0	68.76	0.00
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	360.13		360.13		$70,000	$0	360.13	-
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0.83		0.83		$806,383	$0	0.83	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	8.82		8.82		$112,945	$0	8.82	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	0.6		0.60		$58,881	$0	0.60	-

VALOR DE OBRA	$8,871,070
INCIDENCIA	1.02%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
INOCENCIO CHINCA	Alberto Diaz	SAHAIR ORDOÑEZ	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de concertina INOCENCIO CHINCA



FOTO 2	Limpieza, Orden y aseo INOCENCIO CHINCA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 52	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	8.14%	0.00%	14.42%	52	8.14%	0.00%	$0	14.42%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

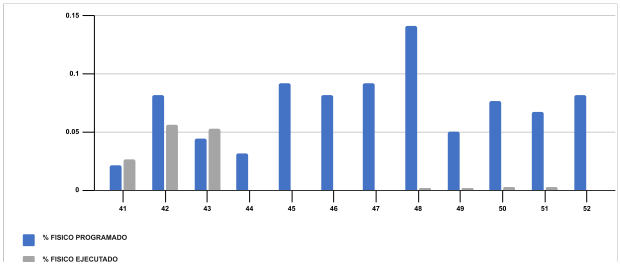

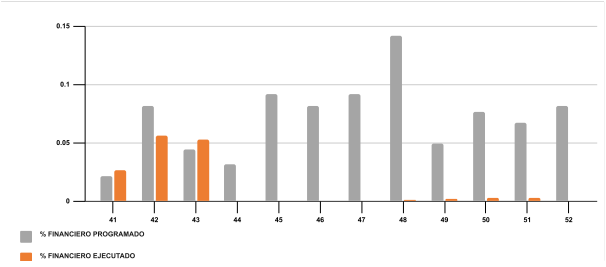

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$4,221**	**-**	**307.05**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$9,648**	**-**	**307.05**	**-**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**40**		**40.00**		**$23,673**	**-**	**40.00**	**-**

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	NO APLICA	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	8.14%	0.00%	14.42%	52	8.14%	0.00%	$0	14.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	7.17%	0.31%	14.73%	53	7.17%	0.31%	$1,245,534	14.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

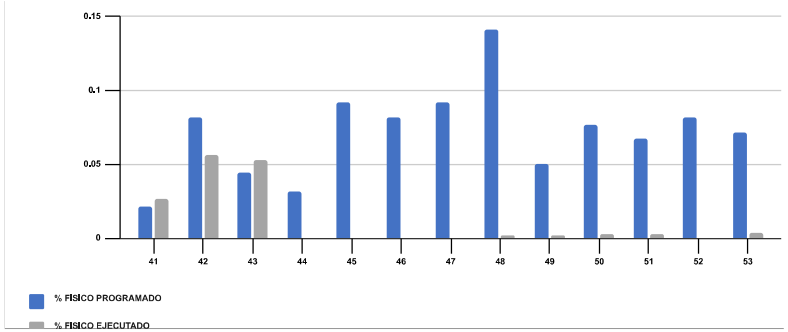

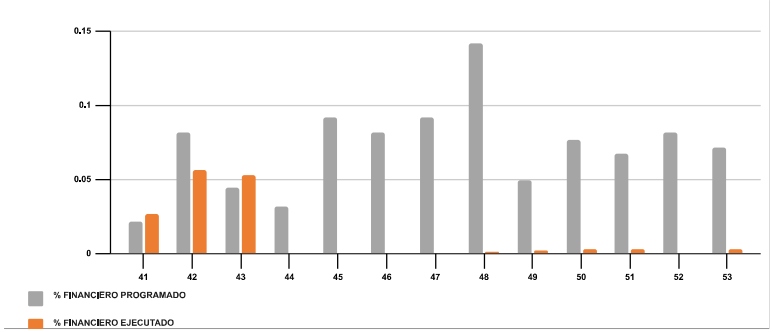

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-04	Se tomaron filos de puertas y ventanas. Pañete allanado sobre muro.	N/A
		2023-12-05	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-06	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10

2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	420.84		111.16	44.16	$23,961	1,058,117.76	155.32	265.52
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		59.00	12.00	$15,618	187,416.00	71.00	43.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	58		34.00		$19,629	-	34.00	24.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	58		34.00		$16,601	-	34.00	24.00
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000.0	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000.0	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 54	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	8.14%	0.00%	14.42%	52	8.14%	0.00%	$0	14.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	7.17%	0.31%	14.73%	53	7.17%	0.31%	$1,245,534	14.73%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.12%	0.00%	14.73%	54	2.12%	0.00%	$0	14.73%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

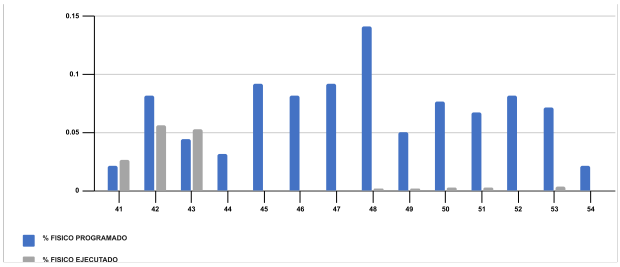

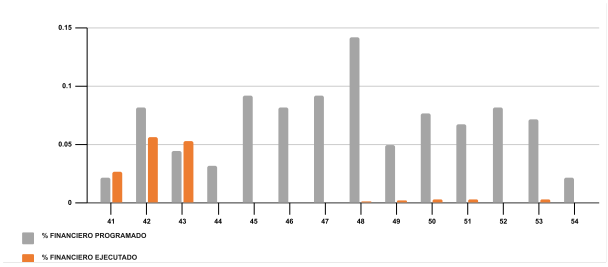

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$4,221**	**-**	**307.05**	**-**
1.03	**LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE**	MT2	**307.05**		**307.05**		**$9,648**	**-**	**307.05**	**-**
1.05	**CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS**	ML	**40**		**40.00**		**$23,673**	**-**	**40.00**	**-**

2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	34		34.00		$19,629	-	34.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	34		34.00		$16,601	-	34.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000	-	4.28	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	NO APLICA	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 55**	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	8.14%	0.00%	14.42%	52	8.14%	0.00%	$0	14.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	7.17%	0.31%	14.73%	53	7.17%	0.31%	$1,245,534	14.73%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.12%	0.00%	14.73%	54	2.12%	0.00%	$0	14.73%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.78%	0.15%	14.87%	55	1.78%	0.15%	$588,546	14.87%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-18	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-19	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas. Visita de interventoría en Obra.	N/A
		2023-12-20	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-21	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-22	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-23	Limpieza de área de trabajo. Acopio de residuos.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25

2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	420.84		155.32	20.00	$23,961	479,220.00	175.32	245.52
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		71.00	7.00	$15,618	109,326.00	78.00	36.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3,00 METROS < 10,00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	58		34.00		$19,629	-	34.00	24.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	58		34.00		$16,601	-	34.00	24.00
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000.0	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000.0	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO





FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON	FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por: Ricardo Caballero	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	2.12%	2.62%	2.62%	41	2.12%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	8.15%	5.65%	8.27%	42	8.15%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	4.45%	5.26%	13.53%	43	4.45%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.15%	0.00%	13.53%	44	3.15%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	9.16%	0.00%	13.53%	45	9.16%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	8.15%	0.00%	13.53%	46	8.15%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	9.15%	0.00%	13.53%	47	9.15%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	14.14%	0.15%	13.68%	48	14.14%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	4.98%	0.20%	13.89%	49	4.98%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	7.62%	0.26%	14.14%	50	7.62%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.74%	0.27%	14.42%	51	6.74%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	8.14%	0.00%	14.42%	52	8.14%	0.00%	$0	14.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	7.17%	0.31%	14.73%	53	7.17%	0.31%	$1,245,534	14.73%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.12%	0.00%	14.73%	54	2.12%	0.00%	$0	14.73%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.78%	0.15%	14.87%	55	1.78%	0.15%	$588,546	14.87%
56	24/12/2023	30/12/2023	2.98%	0.13%	15.00%	56	2.98%	0.13%	$536,115	15.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

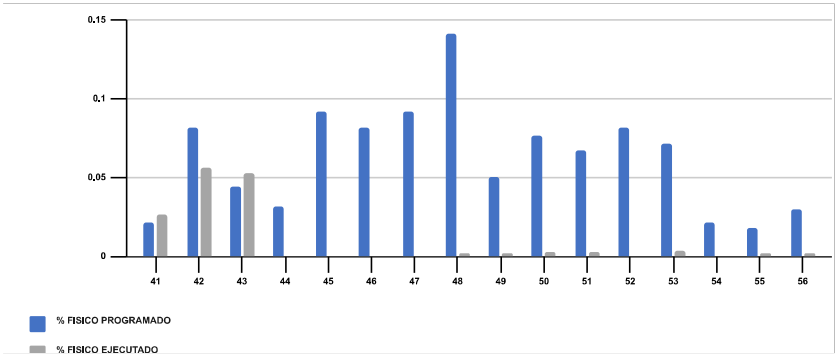

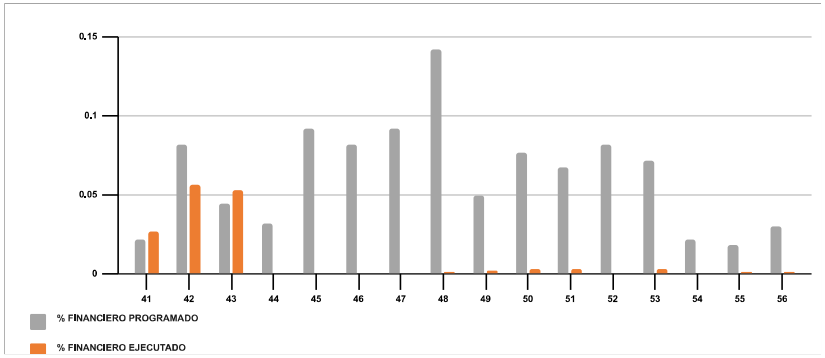

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-26	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-27	Pañete allanado sobre muro. Se tomaron filos de puertas y ventanas.	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11

2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		138.63		$32,154	-	138.63	25.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	420.84		175.32	17.16	$23,961	411,170.76	192.48	228.36
3.12	FÍLETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		78.00	8.00	$15,618	124,944.00	86.00	28.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	58		34.00		$19,629	-	34.00	24.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	58		34.00		$16,601	-	34.00	24.00
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000.0	-	8.15	-

NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000.0	-	4.28	-

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	Ricardo Caballero	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
		Inspector Luis Mendoza		NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Pañete allanado sobre muro JUAN JOSE RONDON



FOTO 2	Filos de puertas y ventanas JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ricardo Caballero		
NOMBRE Ricardo Caballero	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 53	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES 12	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL 3	AL	9	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.36%	6.48%	30	6.85%	6.36%	$61,521,756	6.48%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.19%	32.67%	31	9.18%	26.19%	$253,433,782	32.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	24.60%	57.27%	32	15.13%	24.60%	$238,102,232	57.27%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.49%	64.76%	33	14.13%	7.49%	$72,449,480	64.76%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	3.98%	68.74%	34	27.02%	3.98%	$38,520,668	68.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.57%	72.30%	35	2.17%	3.57%	$34,509,150	72.30%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.01%	75.31%	36	3.32%	3.01%	$29,133,887	75.31%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.66%	77.97%	37	4.14%	2.66%	$25,746,376	77.97%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.22%	3.40%	81.37%	38	3.22%	3.40%	$32,928,405	81.37%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.23%	3.41%	84.79%	39	3.23%	3.41%	$33,009,530	84.79%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	2.92%	87.71%	40	2.04%	2.92%	$28,267,485	87.71%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.04%	89.75%	41	1.59%	2.04%	$19,760,126	89.75%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	2.31%	92.06%	42	1.67%	2.31%	$22,353,123	92.06%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.09%	2.78%	94.84%	43	1.09%	2.78%	$26,924,978	94.84%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.37%	95.21%	44	0.74%	0.37%	$3,583,897	95.21%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.37%	0.30%	95.51%	45	0.37%	0.30%	$2,927,776	95.51%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.76%	1.52%	97.04%	46	0.76%	1.52%	$14,752,752	97.04%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.34%	0.11%	97.15%	47	0.34%	0.11%	$1,097,211	97.15%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	48	0.00%	0.00%	$0	97.15%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	49	0.00%	0.00%	$0	97.15%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	50	0.00%	0.00%	$0	97.15%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	51	0.00%	0.00%	$0	97.15%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	97.15%	52	0.00%	0.00%	$0	97.15%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.78%	0.79%	97.93%	53	0.78%	0.79%	$7,598,736	97.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-04	Desmonte de tubería de 4". de desague de la parte externa del colegio en la fachada	N/A
		2023-12-05	Suministro e instalacion de tuberia de 6" en la parte externa de la institución en la fachada. Se realiza punto sanitario de tubería de 6". de desagüe de la parte externa del colegio en la fachada. Limpieza del área de trabajo. Acopio de residuos.	N/A
		2023-12-06	Se realiza pintura de la parte externa de la institución fachada. Limpieza del área de trabajo. Acopio de residuos y retiro.	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	937.48		926.47	11.01	$4,221	46,473.21	937.48	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	937.48		926.47	11.01	$9,648	106,224.48	937.48	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	18.74		18.74		$20,699	-	18.74	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	5.93		5.93		$25,547	-	5.93	-
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	1458.19		1,458.19		$9,568	-	1,458.19	-
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	312		312.00		$40,436	-	312.00	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	14.57		14.57		$1,894,074	-	14.57	-
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	19.8		19.80		$27,186	-	19.80	-
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	5.93		5.93		$559,014	-	5.93	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	8.2		8.20		$32,154	-	8.20	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	124.8		124.80		$100,669	-	124.80	-
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML	14.82		14.82		$60,337	-	14.82	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.11	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	14.82		14.82		$27,794	-	14.82	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	11945.48		11,945.48		$24,307	-	11,945.48	-
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML	65.5		-	65.50	$8,357	547,383.50	65.50	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	796.53		796.53		$138,761	-	796.53	-
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML	14.93		14.93		$90,800	-	14.93	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		25.00		$59,248	-	25.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	796.53		796.53		$34,014	-	796.53	-

6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	796.53		796.53		$20,865	-	796.53	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	1121.88		1,121.88		$17,948	-	1,121.88	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,214.20		$17,384	-	1,214.20	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		60.76		$20,720	-	60.76	0.00
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	25		25.00		$32,600	-	25.00	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	5.4		5.40		$73,815	-	5.40	-
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARD	MT2	48.11		48.11		$77,644	-	48.11	-
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	903.47		903.47		$67,320	-	903.47	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	20.07		20.07		$323,953	-	20.07	-
7.07	MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA	M2	35.68		35.68		$37,426	-	35.68	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	79		79.00		$19,629	-	79.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	79		79.00		$16,601	-	79.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	160		160.00		$190,218	-	160.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	90		90.00		$40,541	-	90.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	147		147.00		$27,090	-	147.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	104		79.00		$235,052	-	79.00	25.00

9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6		6.00		$191,338	-	6.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	333.5		240.50		$16,480	-	240.50	93.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		2.00		$872,036	-	2.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	6		5.00		$100,299	-	5.00	1.00
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	17		16.00		$212,527	-	16.00	1.00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	562.6		562.60		$18,863	-	562.60	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO DE 15A HASTA 30A	UND	27		27.00		$24,609	-	27.00	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.38	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITOS	UND	2		2.00		$447,467	-	2.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	183.5		117.50		$121,310	-	117.50	66.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	176		176.00		$283,058	-	176.00	-
9.47	Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar	UND	1		1.00		$814,922	-	1.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	592.6		547.60		$55,395	-	547.60	45.00
9.53	SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO SEGUN PICTOGRAMA RETIE PARA SUBESTACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS, PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO Y ADHESIVOS	UND	2		2.00		$175,757	-	2.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	199		174.00		$29,990	-	174.00	25.00
NP 11	DESBASTE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO PULIDO	M2	200		200.00		$39,320	-	200.00	-
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1075.2		1,075.20		$6,641	-	1,075.20	-

NP 86	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PARA CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	156.5		156.50		$80,343	-	156.50	-
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	65.5			65.50	$85,913	5,627,310.02	65.50	-
NP 90	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 6"	UND	4			4.00	$317,836	1,271,345.00	4.00	-
							VALOR DE OBRA	7,598,736.21		
							INCIDENCIA	0.79%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1bOb2bNCzI_BrHQOZxkIKYhrOiQ

FOTO 1	Desmonte de tuberia desague NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	FOTO 2	Instalación de tuberia de desague NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO



https://drive.google.com/open?id=1pCs57qRZ3YvHUEvMOOZA1In_1tS



https://drive.google.com/open?id=1ZtWbkU_xVf2RKjbLz75QhFCt9ewvNZZ

FOTO 3	Pintura exterior NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	FOTO 4	Limpieza del area de trabajo. NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 54	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES 12	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL 10	AL	16	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.36%	6.48%	30	6.85%	6.36%	$61,521,756	6.48%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.19%	32.67%	31	9.18%	26.19%	$253,433,782	32.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	24.60%	57.27%	32	15.13%	24.60%	$238,102,232	57.27%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.49%	64.76%	33	14.13%	7.49%	$72,449,480	64.76%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	3.98%	68.74%	34	27.02%	3.98%	$38,520,668	68.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.57%	72.30%	35	2.17%	3.57%	$34,509,150	72.30%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.01%	75.31%	36	3.32%	3.01%	$29,133,887	75.31%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.66%	77.97%	37	4.14%	2.66%	$25,746,376	77.97%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.22%	3.40%	81.37%	38	3.22%	3.40%	$32,928,405	81.37%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.23%	3.41%	84.79%	39	3.23%	3.41%	$33,009,530	84.79%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	2.92%	87.71%	40	2.04%	2.92%	$28,267,485	87.71%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.04%	89.75%	41	1.59%	2.04%	$19,760,126	89.75%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	2.31%	92.06%	42	1.67%	2.31%	$22,353,123	92.06%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.09%	2.78%	94.84%	43	1.09%	2.78%	$26,924,978	94.84%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.37%	95.21%	44	0.74%	0.37%	$3,583,897	95.21%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.37%	0.30%	95.51%	45	0.37%	0.30%	$2,927,776	95.51%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.76%	1.52%	97.04%	46	0.76%	1.52%	$14,752,752	97.04%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.34%	0.11%	97.15%	47	0.34%	0.11%	$1,097,211	97.15%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	48	0.00%	0.00%	$0	97.15%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	49	0.00%	0.00%	$0	97.15%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	50	0.00%	0.00%	$0	97.15%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	51	0.00%	0.00%	$0	97.15%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	97.15%	52	0.00%	0.00%	$0	97.15%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.78%	0.79%	97.93%	53	0.78%	0.79%	$7,598,736	97.93%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	54	0.00%	0.00%	$0	97.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-11	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-12	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-13	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-14	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-15	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	937.48		926.47		$4,221	-	926.47	11.01
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	937.48		926.47		$9,648	-	926.47	11.01
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0		-		$23,673	-	-	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	0		-		$20,794	-	-	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	0		-		$93,507	-	-	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		-		$894,392	-	-	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	0		-		$99,065	-	-	-
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	0		-		$260,694	-	-	-
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		-		$274,649	-	-	-
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		-		$229,078	-	-	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2			-		$13,644	-	-	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	0		-		$17,610	-	-	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	0		-		$39,705	-	-	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT2	0		-		$107,045	-	-	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0		-		$96,354	-	-	-
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML	65.5		-		$8,357	-	-	65.50
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	0		-		$151,298	-	-	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		25.00		$59,248	-	25.00	-
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	0		-		$133,816	-	-	-
6	ACABADOS				-			-	-	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,214.20		$17,384	-	1,214.20	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		60.76		$20,720	-	60.76	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2			-		$18,887	-	-	-

6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		-		$20,457	-	-	-
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML	0		-		$19,156	-	-	-
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	0		-		$12,513	-	-	-
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT2	0		-		$89,140	-	-	-
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML	0		-		$21,660	-	-	-
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2	0		-		$493,556	-	-	-
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		-		$334,742	-	-	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND			-		$19,709	-	-	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND			-		$320,817	-	-	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	0		-		$439,996	-	-	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		-		$194,230	-	-	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	104		79.00		$235,052	-	79.00	25.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	333.5		240.50		$16,480	-	240.50	93.00
9.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-		$60,015	-	-	-
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-	-
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$53,959	-	-	-
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	UND	0		-		$4,003,454	-	-	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND	0		-		$765,112	-	-	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-	-

9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO MAYOR DE 40A	UND	0		-		$99,435	-	-	-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-		$117,110	-	-	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	1		-		$298,701	-	-	1.00
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND	0		-		$298,801	-	-	-
9.49	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		-		$161,147	-	-	-
9.54	S.E.I. SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYE, Transformador Monofasico en Aceite de 75 KVA - 13.2Kv - 120 - 240v 2 CORTACIRCUITOS DE 27 KV, 100A, 2 PARARRAYOS DE 15 KV, KIT SPT, ARMADO Y ELEMENTOS Y TRAMITES NO DESCRITOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E.	UND	0		-		$19,388,197	-	-	-
9.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO EN POSTE DE HORMIGON 12m X 1050 INCLUYE TRANSPORTE, HOYADO, APLOMADO Y CIMENTADO.	UND	0		-		$3,300,808	-	-	-
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND	0		-		$831,933	-	-	-
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	65.5				$85,913	-	-	65.50
NP 90	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 6"	UND	4				$317,836	-	-	4.00
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES
Durante el periodo del presente informe el contratista no ejecutó actividades constructivas.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUMBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 55	Código:	IP-FM-31
		VERSION:	01
		FECHA:	6/9/2021
		Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES 12	DE	2023	
PERÍODO:	SEMANA DEL 17	AL	23	

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.36%	6.48%	30	6.85%	6.36%	$61,521,756	6.48%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.19%	32.67%	31	9.18%	26.19%	$253,433,782	32.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	24.60%	57.27%	32	15.13%	24.60%	$238,102,232	57.27%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.49%	64.76%	33	14.13%	7.49%	$72,449,480	64.76%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	3.98%	68.74%	34	27.02%	3.98%	$38,520,668	68.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.57%	72.30%	35	2.17%	3.57%	$34,509,150	72.30%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.01%	75.31%	36	3.32%	3.01%	$29,133,887	75.31%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.66%	77.97%	37	4.14%	2.66%	$25,746,376	77.97%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.22%	3.40%	81.37%	38	3.22%	3.40%	$32,928,405	81.37%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.23%	3.41%	84.79%	39	3.23%	3.41%	$33,009,530	84.79%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	2.92%	87.71%	40	2.04%	2.92%	$28,267,485	87.71%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.04%	89.75%	41	1.59%	2.04%	$19,760,126	89.75%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	2.31%	92.06%	42	1.67%	2.31%	$22,353,123	92.06%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.09%	2.78%	94.84%	43	1.09%	2.78%	$26,924,978	94.84%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.37%	95.21%	44	0.74%	0.37%	$3,583,897	95.21%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.37%	0.30%	95.51%	45	0.37%	0.30%	$2,927,776	95.51%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.76%	1.52%	97.04%	46	0.76%	1.52%	$14,752,752	97.04%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.34%	0.11%	97.15%	47	0.34%	0.11%	$1,097,211	97.15%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	48	0.00%	0.00%	$0	97.15%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	49	0.00%	0.00%	$0	97.15%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	50	0.00%	0.00%	$0	97.15%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	51	0.00%	0.00%	$0	97.15%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	97.15%	52	0.00%	0.00%	$0	97.15%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.78%	0.79%	97.93%	53	0.78%	0.79%	$7,598,736	97.93%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	54	0.00%	0.00%	$0	97.93%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	55	0.00%	0.00%	$0	97.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

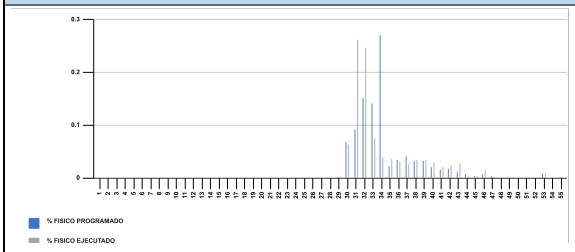



3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-18	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	937.48		926.47		$4,221	-	926.47	11.01
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	937.48		926.47		$9,648	-	926.47	11.01
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0		-		$23,673	-	-	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	0		-		$20,794	-	-	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	0		-		$93,507	-	-	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		-		$894,392	-	-	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		0.50		$1,742,818	-	0.50	-
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	0		-		$99,065	-	-	-
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	0		-		$260,694	-	-	-
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		-		$274,649	-	-	-
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		-		$229,078	-	-	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2			-		$13,644	-	-	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		219.57		$23,961	-	219.57	-
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	0		-		$17,610	-	-	-
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	0		-		$39,705	-	-	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		187.26		$20,000	-	187.26	-
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT2	0		-		$107,045	-	-	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0		-		$96,354	-	-	-
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML	65.5		-		$8,357	-	-	65.50
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	0		-		$151,298	-	-	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		25.00		$59,248	-	25.00	-

5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	0		-		$133,816	-	-	-
6	ACABADOS				-			-	-	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		1,214.20		$17,384	-	1,214.20	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		60.76		$20,720	-	60.76	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2			-		$18,887	-	-	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		-		$20,457	-	-	-
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML	0		-		$19,156	-	-	-
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	0		-		$12,513	-	-	-
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT2	0		-		$89,140	-	-	-
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML	0		-		$21,660	-	-	-
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2	0		-		$493,556	-	-	-
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		-		$334,742	-	-	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND			-		$19,709	-	-	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		537.97		$57,278	-	537.97	-
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND			-		$320,817	-	-	-
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	0		-		$439,996	-	-	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		161.00		$190,755	-	161.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		20.00		$282,244	-	20.00	-
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		-		$194,230	-	-	-

9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	104		79.00		$235,052	-	79.00	25.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	333.5		240.50		$16,480	-	240.50	93.00
9.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-		$60,015	-	-	-
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-	-
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$53,959	-	-	-
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	UND	0		-		$4,003,454	-	-	-
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00	-
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND	0		-		$765,112	-	-	-
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		1.00		$794,611	-	1.00	-
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-	-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		21.00		$93,368	-	21.00	-
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO MAYOR DE 40A	UND	0		-		$99,435	-	-	-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		-		$117,110	-	-	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	1		-		$298,701	-	-	1.00
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND	0		-		$298,801	-	-	-
9.49	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		-		$161,147	-	-	-
9.54	S.E.I. SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYE, Transformador Monofasico en Aceite de 75 KVA - 13.2Kv - 120 - 240v 2 CORTACIRCUITOS DE 27 KV, 100A, 2 PARARRAYOS DE 15 KV, KIT SPT, ARMADO Y ELEMENTOS Y TRAMITES NO DESCRITOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E.	UND	0		-		$19,388,197	-	-	-

9.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO EN POSTE DE HORMIGON 12m X 1050 INCLUYE TRANSPORTE, HOYADO, APLOMADO Y CIMENTADO.	UND	0		-		$3,300,808	-	-	-
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND	0		-		$831,933	-	-	-
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	65.5				$85,913	-	-	65.50
NP 90	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 6"	UND	4				$317,836	-	-	4.00
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el contratista no ejecutó actividades constructivas.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO No. 56	Código:	IP-FM-31
	VERSION:	01
	FECHA:	6/9/2021
	Paginas:	1 de 1

FECHA:	MES	12	DE	2023
PERÍODO:	SEMANA DEL	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	11	0.00%	0.00%	$0	0.00%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	12	0.00%	0.00%	$0	0.00%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	13	0.00%	0.00%	$0	0.00%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	14	0.00%	0.00%	$0	0.00%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	15	0.00%	0.00%	$0	0.00%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.00%	0.00%	0.00%	16	0.00%	0.00%	$0	0.00%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	17	0.00%	0.00%	$0	0.00%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	18	0.00%	0.00%	$0	0.00%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	19	0.00%	0.00%	$0	0.00%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	20	0.00%	0.00%	$0	0.00%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.00%	0.00%	0.00%	21	0.00%	0.00%	$0	0.00%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	22	0.00%	0.00%	$0	0.00%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	23	0.00%	0.00%	$0	0.00%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	24	0.00%	0.00%	$0	0.00%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.00%	0.00%	0.00%	25	0.00%	0.00%	$0	0.00%
26	28/5/2023	3/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	26	0.00%	0.00%	$0	0.00%
27	4/6/2023	10/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	27	0.00%	0.00%	$0	0.00%
28	11/6/2023	17/6/2023	0.00%	0.00%	0.00%	28	0.00%	0.00%	$0	0.00%
29	18/6/2023	24/6/2023	0.16%	0.13%	0.13%	29	0.16%	0.13%	$1,212,442	0.13%
30	25/6/2023	1/7/2023	6.85%	6.36%	6.48%	30	6.85%	6.36%	$61,521,756	6.48%
31	2/7/2023	8/7/2023	9.18%	26.19%	32.67%	31	9.18%	26.19%	$253,433,782	32.67%
32	9/7/2023	15/7/2023	15.13%	24.60%	57.27%	32	15.13%	24.60%	$238,102,232	57.27%
33	16/7/2023	22/7/2023	14.13%	7.49%	64.76%	33	14.13%	7.49%	$72,449,480	64.76%
34	23/7/2023	29/7/2023	27.02%	3.98%	68.74%	34	27.02%	3.98%	$38,520,668	68.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.17%	3.57%	72.30%	35	2.17%	3.57%	$34,509,150	72.30%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.32%	3.01%	75.31%	36	3.32%	3.01%	$29,133,887	75.31%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	2.66%	77.97%	37	4.14%	2.66%	$25,746,376	77.97%
38	20/8/2023	26/8/2023	3.22%	3.40%	81.37%	38	3.22%	3.40%	$32,928,405	81.37%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.23%	3.41%	84.79%	39	3.23%	3.41%	$33,009,530	84.79%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.04%	2.92%	87.71%	40	2.04%	2.92%	$28,267,485	87.71%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.59%	2.04%	89.75%	41	1.59%	2.04%	$19,760,126	89.75%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	2.31%	92.06%	42	1.67%	2.31%	$22,353,123	92.06%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.09%	2.78%	94.84%	43	1.09%	2.78%	$26,924,978	94.84%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.74%	0.37%	95.21%	44	0.74%	0.37%	$3,583,897	95.21%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.37%	0.30%	95.51%	45	0.37%	0.30%	$2,927,776	95.51%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.76%	1.52%	97.04%	46	0.76%	1.52%	$14,752,752	97.04%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.34%	0.11%	97.15%	47	0.34%	0.11%	$1,097,211	97.15%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	48	0.00%	0.00%	$0	97.15%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	49	0.00%	0.00%	$0	97.15%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	50	0.00%	0.00%	$0	97.15%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	97.15%	51	0.00%	0.00%	$0	97.15%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	97.15%	52	0.00%	0.00%	$0	97.15%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.78%	0.79%	97.93%	53	0.78%	0.79%	$7,598,736	97.93%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	54	0.00%	0.00%	$0	97.93%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	55	0.00%	0.00%	$0	97.93%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.00%	0.00%	97.93%	56	0.00%	0.00%	$0	97.93%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES				
IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	CL 47 #44 - 100	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-26	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-27	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en el frente de obra.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	937.48		937.48		$4,221	-	937.48	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	937.48		-		$9,648	-	-	937.48
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	0		-		$23,673	-	-	-
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	0		-		$20,794	-	-	-
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	0		-		$93,507	-	-	-
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		14.57		$894,392	-	14.57	- 14.57
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.5		-		$1,742,818	-	-	0.50
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	0		-		$99,065	-	-	-
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	0		-		$260,694	-	-	-
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		-		$274,649	-	-	-
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		-		$229,078	-	-	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2			124.80		$13,644	-	124.80	- 124.80
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	219.57		-		$23,961	-	-	219.57
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	0		14.82		$17,610	-	14.82	- 14.82
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	0		-		$39,705	-	-	-
3.13	ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA	ML	187.26		-		$20,000	-	-	187.26
3.15	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA.	MT2	0		-		$107,045	-	-	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0		-		$96,354	-	-	-
5.07	DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO	ML	65.5		-		$8,357	-	-	65.50
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA	ML	0		-		$151,298	-	-	-
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	25		-		$59,248	-	-	25.00

5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	0		-		$133,816	-	-	-
6	ACABADOS				-			-	-	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	1214.2		-		$17,384	-	-	1,214.20
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	60.76		-		$20,720	-	-	60.76
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2			-		$18,887	-	-	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		25.00		$20,457	-	25.00	- 25.00
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML	0		5.40		$19,156	-	5.40	- 5.40
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO	ML	0		-		$12,513	-	-	-
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO AUTOADHESIVO	MT2	0		-		$89,140	-	-	-
6.26	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO	ML	0		-		$21,660	-	-	-
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2	0		-		$493,556	-	-	-
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		-		$334,742	-	-	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND			160.00		$19,709	-	160.00	- 160.00
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	537.97		-		$57,278	-	-	537.97
9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND			90.00		$320,817	-	90.00	- 90.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	0		147.00		$439,996	-	147.00	- 147.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	161		-		$190,755	-	-	161.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		79.00		$282,244	-	79.00	- 59.00
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		6.00		$194,230	-	6.00	- 6.00

9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	104		240.50		$235,052	-	240.50	-	136.50
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	333.5		-		$16,480	-	-		333.50
9.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		2.00		$60,015	-	2.00	-	2.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		-		$441,714	-	-		-
9.20	TUBERIA EMT DE 1 1/2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		-		$53,959	-	-		-
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	UND	0		562.60		$4,003,454	-	562.60	-	562.60
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS BIFASICO	UND	1		1.00		$550,917	-	1.00		-
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO	UND	0		27.00		$765,112	-	27.00	-	27.00
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 36 CIRCUTOS	UND	1		-		$794,611	-	-		1.00
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO MAYOR DE 30A	UND	0		-		$27,466	-	-		-
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15A HASTA 40A	UND	21		-		$93,368	-	-		21.00
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO MAYOR DE 40A	UND	0		-		$99,435	-	-		-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	0		176.00		$117,110	-	176.00	-	176.00
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	1		-		$298,701	-	-		1.00
9.44	Breaker Industrial Graduable ABB 44 1 - 63A - 25 KA - XT1B TMAX XT - Ref: 1SDA066805R1 o similar	UND	0		-		$298,801	-	-		-
9.49	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. (REGULADAS) EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	0		-		$161,147	-	-		-
9.54	S.E.I. SUBESTACION TIPO POSTE INCLUYE, Transformador Monofasico en Aceite de 75 KVA - 13.2Kv - 120 - 240v 2 CORTACIRCUITOS DE 27 KV, 100A, 2 PARARRAYOS DE 15 KV, KIT SPT, ARMADO Y ELEMENTOS Y TRAMITES NO DESCRITOS PARA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E.	UND	0		-		$19,388,197	-	-		-

9.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO EN POSTE DE HORMIGON 12m X 1050 INCLUYE TRANSPORTE, HOYADO, APLOMADO Y CIMENTADO.	UND	0		-		$3,300,808	-	-	-
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND	0		-		$831,933	-	-	-
NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 6"	ML	65.5				$85,913	-	-	65.50
NP 90	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 6"	UND	4				$317,836	-	-	4.00
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO	Anderson Saavedra	SAHAIR ORDOÑEZ	Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Durante el periodo del presente informe el contratista no ejecutó actividades constructivas.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE SAHAIR ORDOÑEZ	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.56%	0.14%	81.14%	52	0.56%	0.14%	$1,629,621	81.14%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

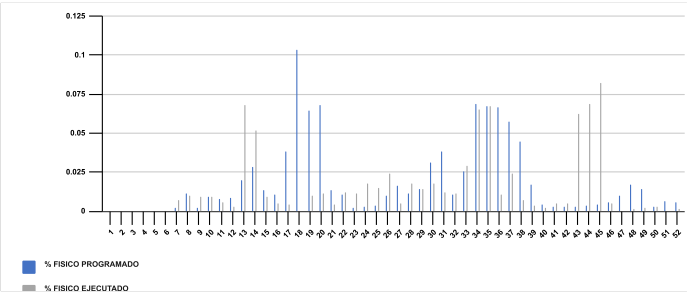

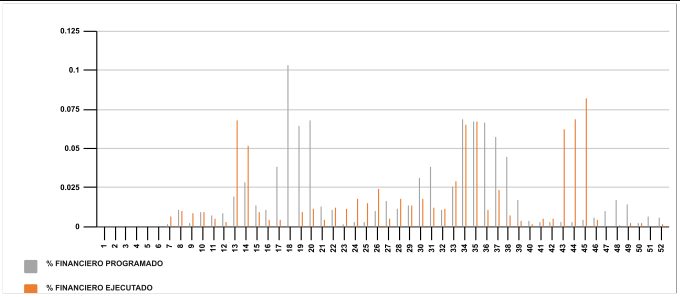

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-11-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-11-28	Pañete en muro de bloque nuevo.	N/A
		2023-11-29	Pañete en muro del area de afuera	N/A
		2023-11-30	Filo de ventanas y puertas de afuera.	N/A
		2023-12-01	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		858.07	56.12	$23,961	1,344,691.32	914.19	209.81
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		225.15	16.18	$17,610	284,929.80	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-

VALOR DE OBRA	1,629,621.12
INCIDENCIA	0.14%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1GMMvd8mcmlxV3eLYGp5DcLwgntI



https://drive.google.com/open?id=1S-wOdxl3LIciEyDZ0D5lVSMS3_59LLx

FOTO 1	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Pañete en muro REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.56%	0.14%	81.14%	52	0.56%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.79%	0.00%	81.14%	53	0.79%	0.00%	$0	81.14%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

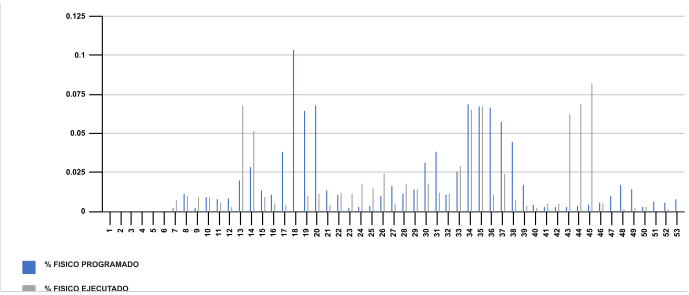

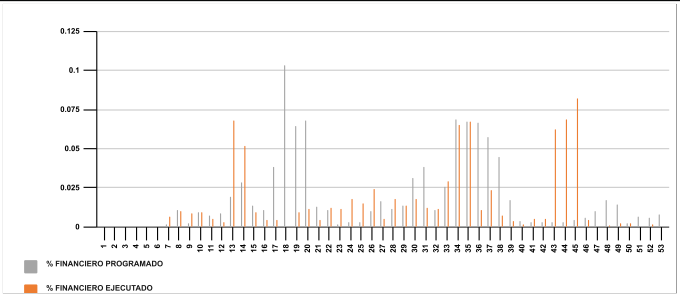

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-12-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		914.19	0.00	$23,961	-	914.19	209.81
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33	0.00	$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 54**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.56%	0.14%	81.14%	52	0.56%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.79%	0.00%	81.14%	53	0.79%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.62%	0.06%	81.21%	54	0.62%	0.06%	$746,385	81.21%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

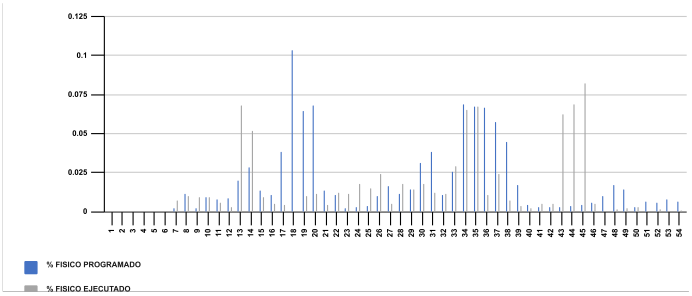

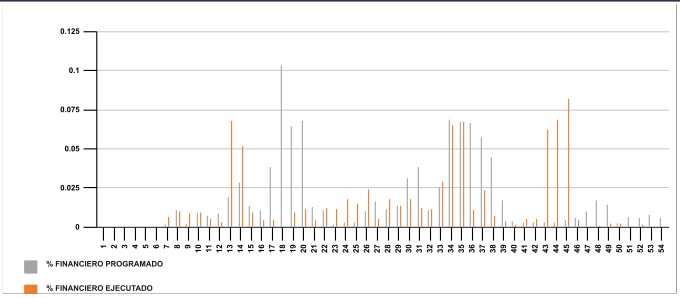

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-12-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-12	Pañete en muro de bloque nuevo.	N/A
		2023-12-13	Pañete en muro de bloque nuevo.	N/A
		2023-12-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		914.19	31.15	$23,961	746,385.15	945.34	178.66
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33	0.00	$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-
								VALOR DE OBRA	746,385.15	
								INCIDENCIA	0.06%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1fEUi8T5TWGARvRvFSE7CPEXi-KT



https://drive.google.com/open?id=1zmZIueTEaInvSL290KAqp6tQYDxFRnLH

FOTO 1	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Pañete sobre muro REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 55**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.56%	0.14%	81.14%	52	0.56%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.79%	0.00%	81.14%	53	0.79%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.62%	0.06%	81.21%	54	0.62%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.10%	0.00%	81.21%	55	0.10%	0.00%	$0	81.21%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

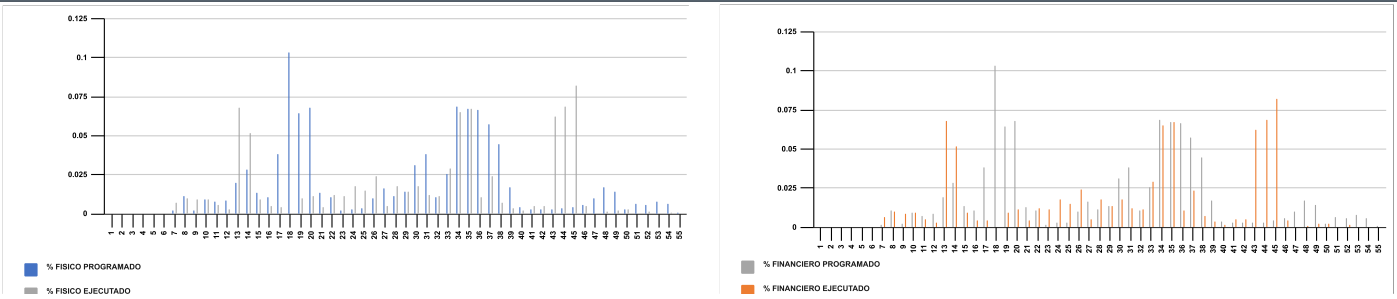

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-12-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20

2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		945.34	0.00	$23,961	-	945.34	178.66
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33	0.00	$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-

4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00

10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.96%	6.81%	11.19%	13	1.96%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.85%	5.17%	16.35%	14	2.85%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.38%	0.95%	17.31%	15	1.38%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.07%	0.49%	17.80%	16	1.07%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	3.81%	0.42%	18.22%	17	3.81%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	10.36%	0.00%	18.22%	18	10.36%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	6.42%	0.96%	19.18%	19	6.42%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	6.83%	1.14%	20.33%	20	6.83%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.33%	0.43%	20.76%	21	1.33%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.08%	1.24%	21.99%	22	1.08%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	0.18%	1.15%	23.14%	23	0.18%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	0.29%	1.80%	24.94%	24	0.29%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	0.34%	1.49%	26.43%	25	0.34%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.01%	2.43%	28.86%	26	1.01%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.50%	29.35%	27	1.65%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.16%	1.78%	31.13%	28	1.16%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.40%	1.40%	32.54%	29	1.40%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	3.12%	1.76%	34.30%	30	3.12%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	3.81%	1.22%	35.52%	31	3.81%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.09%	1.14%	36.65%	32	1.09%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.54%	2.93%	39.59%	33	2.54%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	6.87%	6.53%	46.12%	34	6.87%	6.53%	$78,082,088	46.12%
35	30/7/2023	5/8/2023	6.70%	6.72%	52.84%	35	6.70%	6.72%	$80,320,133	52.84%
36	6/8/2023	12/8/2023	6.65%	1.08%	53.92%	36	6.65%	1.08%	$12,943,077	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	5.72%	2.38%	56.30%	37	5.72%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	4.47%	0.71%	57.02%	38	4.47%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.72%	0.35%	57.37%	39	1.72%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.40%	0.19%	57.55%	40	0.40%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.31%	0.50%	58.05%	41	0.31%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.31%	0.51%	58.56%	42	0.31%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	0.31%	6.27%	64.83%	43	0.31%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.32%	6.90%	71.73%	44	0.32%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.46%	8.19%	79.92%	45	0.46%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.58%	0.47%	80.39%	46	0.58%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.01%	0.00%	80.39%	47	1.01%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.73%	0.12%	80.52%	48	1.73%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.42%	0.24%	80.76%	49	1.42%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.26%	0.25%	81.01%	50	0.26%	0.25%	$2,996,515	81.01%

51	19/11/2023	25/11/2023	0.67%	0.00%	81.01%	51	0.67%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.56%	0.14%	81.14%	52	0.56%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.79%	0.00%	81.14%	53	0.79%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.62%	0.06%	81.21%	54	0.62%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.10%	0.00%	81.21%	55	0.10%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.21%	0.00%	81.21%	56	0.21%	0.00%	$0	81.21%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

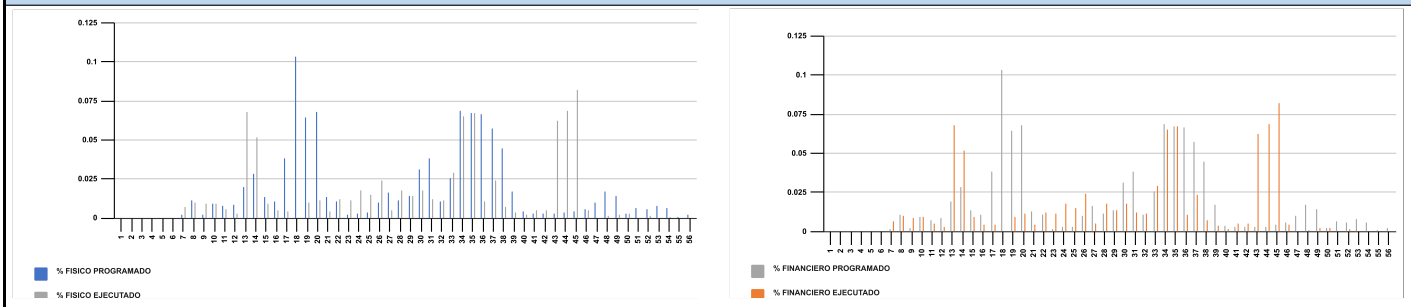

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2023-12-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-26	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-27	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21	0.00	4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00	0.00	$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21	0.00	$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07	0.00	$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15	0.00	$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58	0.00	$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87	0.00	$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00	0.00	$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00	0.00	$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05	0.00	$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54	0.00	$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95	0.00	$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52	0.00	$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94	0.00	$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90	0.00	$49,030	-	20.90	45.53

2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80	0.00	$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22	0.00	$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74	0.00	$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	0.00	$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	0.00	$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14	0.00	$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04	0.00	$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69	0.00	$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64	0.00	$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08	0.00	$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80	0.00	$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55	0.00	$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17	0.00	$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17	0.00	$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58	0.00	$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01	0.00	$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17	0.00	$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36	0.00	$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60	0.00	$13,644	-	223.60	160.00
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29	0.00	$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		945.34	0.00	$23,961	-	945.34	178.66
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33	0.00	$17,610	-	241.33	126.67

3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00	0.00	$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80	0.00	$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08	0.00	$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	0.00	$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06	0.00	$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55	0.00	$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	0.00	$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00	0.00	$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	0.00	$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33	0.00	$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00	0.00	$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	0.00	$20,865	-	86.73	468.43
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00	0.00	$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00	0.00	$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00	0.00	$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	0.00	$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00	0.00	$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00	0.00	$1,488,291	-	7.00	7.00

10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00	0.00	$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00	0.00	$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00	0.00	$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00	0.00	$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00	0.00	$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00	0.00	$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00	0.00	$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750	-	82.80	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	No Aplica	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 52**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	26	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%
52	26/11/2023	2/12/2023	2.04%	0.13%	49.75%	52	2.04%	0.13%	**$1,586,757**	49.75%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

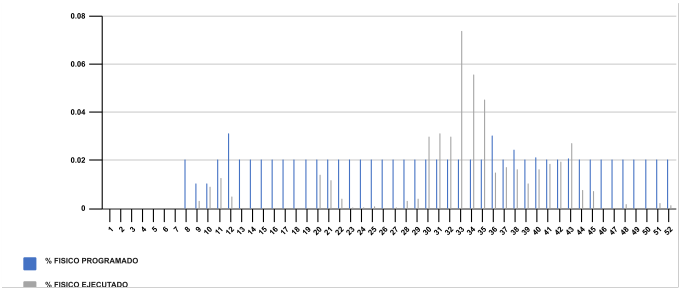

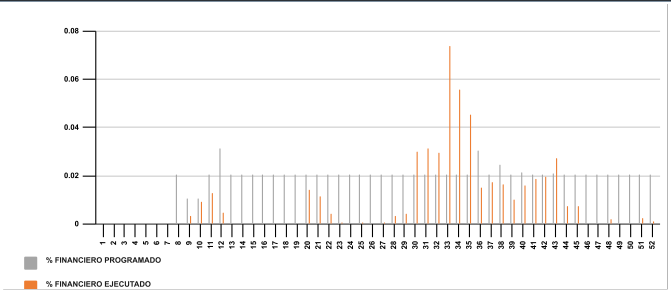

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-11-26	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-27	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-28	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-11-29	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-11-30	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-01	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-02	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		10,111.40	165.84	$9,568	1,586,757.12	10,277.24	4,409.93
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81

2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-

NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-

VALOR DE OBRA	1,586,757.12
INCIDENCIA	0.13%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=12UnrZY422UxUEqz4eX8FsAh5mcjqdHRa



https://drive.google.com/open?id=1cOep-LrOdx0JlhasumBcUyHkm1zN2RFdT

FOTO 1	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO	FOTO 2	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 53**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	3	AL	9

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%
52	26/11/2023	2/12/2023	2.04%	0.13%	49.75%	52	2.04%	0.13%	**$1,586,757**	49.75%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.44%	0.00%	49.75%	53	1.44%	0.00%	**$0**	49.75%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

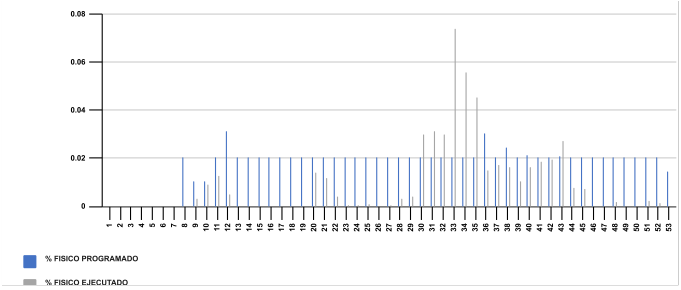

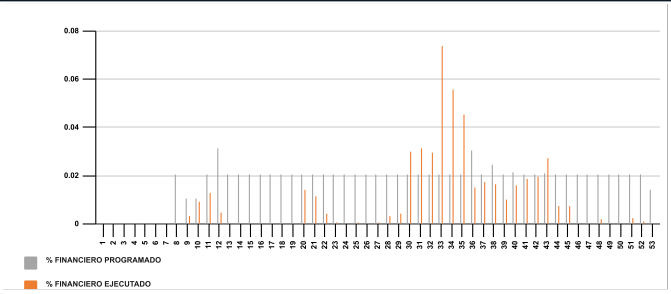

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-12-03	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-04	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-05	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-06	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-07	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-08	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-09	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	80		875.15		$116,390	-	875.15	- 795.15
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		942.32		$25,396	-	942.32	- 942.32
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	0		41.12		$36,506	-	41.12	- 41.12
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		93.66		$252,961	-	93.66	- 93.66
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		127.12		$25,547	$0	127.12	58.38
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	0		9.23		$90,362	-	9.23	- 9.23
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	0		90.00		$49,030	-	90.00	- 90.00
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		85.50		$34,062	-	85.50	- 85.00
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		30.19		$192,928	-	30.19	58.99
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0		45.97		$54,171	-	45.97	- 45.97
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		165.84		$40,436	-	165.84	5,334.16
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		312.67		$894,392	-	312.67	- 309.95
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		43.41		$1,742,818	-	43.41	4.74
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		9,799.23		$99,065	-	9,799.23	- 9,674.23
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	0		5,349.00		$260,694	-	5,349.00	- 5,349.00

2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		2.72		$149,548	-	2.72	-	2.72
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0		6.86		$513,566	-	6.86	-	6.86
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			116.19		$48,408	-	116.19	-	116.19
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML			10.54		$9,165	-	10.54	-	10.54
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2			23.71		$13,644	-	23.71	-	23.71
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2			140.00		$100,669	-	140.00	-	140.00
3.07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	ML			96.00		$60,337	-	96.00	-	96.00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	0		7.00		$127,907	-	7.00	-	7.00
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	0		545.17		$3,615	-	545.17	-	545.17
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		7.21		$20,865	$0	7.21		523.51
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	0		530.72		$20,457	-	530.72	-	530.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	0		47.02		$5,765	-	47.02	-	47.02
6.12	PISO EN BALDOSA DURO PISO	MT2	0		32.02		$96,982	-	32.02	-	32.02
6.13	ZÓCALO EN BALDOSA DURO PISO	ML	0		42.00		$19,156	-	42.00	-	42.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		42.00		$57,053	$0	42.00	-	38.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	MT2	3		1.00		$493,556	-	1.00		2.00
7.07	MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICAS CON VARILLA CORRUGADA O LISA DE DIAMETRO ENTRE 1/4" A 1/2" Y ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.10 HASTA 0.10 X 0.30 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA CON SISTEMA EPOXICO, DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA Y GRATA METÁLICA	M2	0		4.00		$37,426	-	4.00	-	4.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA FORTINET, DOBLE HILO, CLÁSICA O SIMILAR. INCLUYE FIJACIONES, POSTES VERTICALES Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO-POLIURETANO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		5.00		$162,600	-	5.00	-	5.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		4.00		$334,742	-	4.00	-	4.00
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PUERTA, TABIQUE LISO, PARAL Y C EXTREMA.	MT2	0		2.00		$1,381,283	-	2.00	-	2.00

9.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reflector Led 100w Luz Blanca 8500lm PARA EXTERIORES, INCLUYE SALIDA 5m.	UND	0		68.00		$320,817	-	68.00	- 68.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P	UND	0		22.00		$439,996	-	22.00	- 22.00
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	80		4.00		$40,541	-	4.00	76.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML			6.00		$16,480	-	6.00	- 6.00
9.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML			10.00		$60,015	-	10.00	- 10.00
9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	43		2.00		$282,196	-	2.00	41.00
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UND	0		16.00		$756,617	-	16.00	- 16.00
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	No Aplica	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 54**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	10	AL	16

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%
52	26/11/2023	2/12/2023	2.04%	0.13%	49.75%	52	2.04%	0.13%	**$1,586,757**	49.75%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.44%	0.00%	49.75%	53	1.44%	0.00%	**$0**	49.75%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.98%	0.12%	49.87%	54	1.98%	0.12%	**$1,487,824**	49.87%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

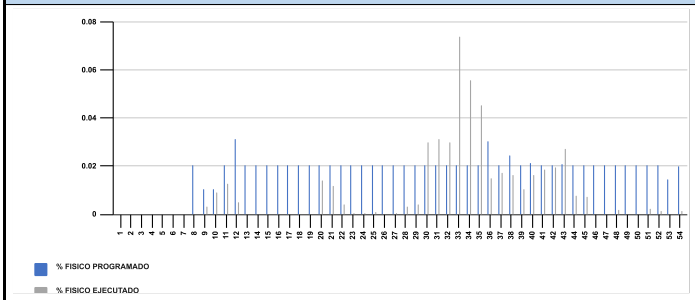

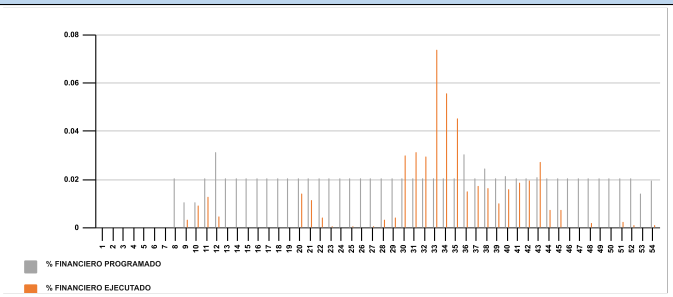

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-12-10	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-11	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-12	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-13	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-14	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-15	Se realizó figuración y armado de acero para vigas.	N/A
		2023-12-16	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	93.66		93.66		$140,481	$0	93.66	-
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		10,277.24	155.50	$9,568	1,487,824.00	10,432.74	4,254.43
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		116.19		$99,065	-	116.19	8.81

2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	22.54		10.54		$1,933,197	-	10.54	12.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	102.15		96.00		$32,154	-	96.00	6.15
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-

NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,025	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-

VALOR DE OBRA	1,487,824.00
INCIDENCIA	0.12%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1vvU7IAX0c4PHaBdahsGnqTvvid0ARP

FOTO 1	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO



https://drive.google.com/open?id=1m9xVbFOPL3c8YfShlV3gPdDhgk1HwUxv

FOTO 2	Figuración de acero y armado de vigas JOSE EUSEBIO CARO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 55**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	17	AL	23

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%
52	26/11/2023	2/12/2023	2.04%	0.13%	49.75%	52	2.04%	0.13%	**$1,586,757**	49.75%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.44%	0.00%	49.75%	53	1.44%	0.00%	**$0**	49.75%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.98%	0.12%	49.87%	54	1.98%	0.12%	**$1,487,824**	49.87%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.04%	0.00%	49.87%	55	1.04%	0.00%	**$0**	49.87%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

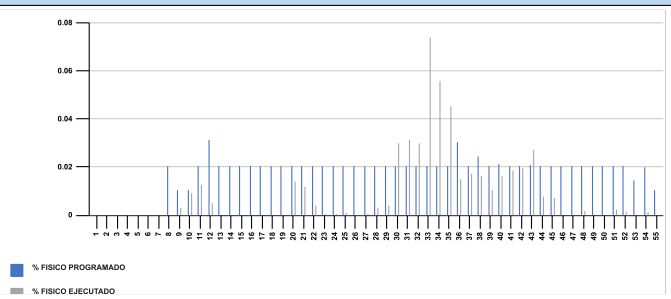

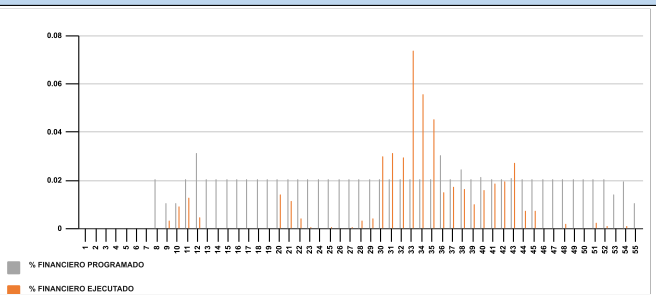

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-12-17	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-18	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-19	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-20	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-21	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-22	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-23	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0		875.15		$25,396	-	875.15	- 875.15
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	0		942.32		$36,506	-	942.32	- 942.32
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		41.12		$252,961	-	41.12	- 41.12
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	0		93.66		$20,853	-	93.66	- 93.66
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		127.12		$93,507	$0	127.12	28.68
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		9.23		$34,062	-	9.23	- 8.73
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		90.00		$192,928	-	90.00	- 0.82
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0		85.50		$54,171	-	85.50	- 85.50
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		30.19		$9,568	-	30.19	14,656.98
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		201.47		$40,436	-	201.47	5,298.53
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		165.84		$1,742,818	-	165.84	- 117.69
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	12.8		312.67		$1,894,074	-	312.67	- 299.87
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	125		43.41		$99,065	-	43.41	81.59
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		9,799.23		$149,548	-	9,799.23	- 9,799.23

2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	0		5,349.00		$513,566	-	5,349.00	-	5,349.00
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	0		2.72		$27,186	-	2.72	-	2.72
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			6.86		$48,408	-	6.86	-	6.86
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2			116.19		$559,014	-	116.19	-	116.19
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		10.54		$354,181	-	10.54	-	10.54
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2			23.71		$100,669	-	23.71	-	23.71
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2			140.00		$23,961	-	140.00	-	140.00
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML			96.00		$17,610	-	96.00	-	96.00
5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)	ML			7.00		$90,800	-	7.00	-	7.00
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		545.17		$17,948	$0	545.17		71.43
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	616.6		7.21		$17,384	-	7.21		609.39
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	0		530.72		$32,600	-	530.72	-	530.72
6.12	PISO EN BALDOSA DURO PISO	MT2	0		47.02		$96,982	-	47.02	-	47.02
6.14	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO INCLUYE RELLENO DE JUNTAS	MT2	0		32.02		$115,802	-	32.02	-	32.02
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES	MT2	0		42.00		$73,815	-	42.00	-	42.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		42.00		$323,953	-	42.00	-	38.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA FORTINET, DOBLE HILO, CLÁSICA O SIMILAR. INCLUYE FIJACIONES, POSTES VERTICALES Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO-POLIURETANO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		1.00		$162,600	-	1.00	-	1.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS EN VARILLA LISA O CORRUGADA DE 1/4" A 5/8" ENTRAMADO DE ENTRE 0.05 X 0.05 Y 0.20 X 0.20 PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE RESANES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	M2	0		4.00		$334,742	-	4.00	-	4.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	0		5.00		$306,616	-	5.00	-	5.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO CON SISTEMA EPOXICO. INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES	M2	0		4.00		$387,804	-	4.00	-	4.00
8	CARPINTERIA DE MADERA				2.00			-	2.00	-	2.00
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	80		68.00		$40,541	-	68.00		12.00
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	0		22.00		$27,090	-	22.00	-	22.00

9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		4.00		$190,755	-	4.00		16.00
9.12	SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	1		6.00		$194,230	-	6.00	-	5.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	0		6.00		$441,714	-	6.00	-	6.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	0		10.00		$872,036	-	10.00	-	10.00
9.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISP. TRIANGULO B=3M. INCLUYE: 3 JABALINAS DE Cu 5/8 X 2.40M EN CU-20ML DE CABLE 1/0 CU, SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE Y TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0. INCLUYE SUELO ARTIFICIAL 75KG.	UND	0		2.00		$3,158,957	-	2.00	-	2.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	0		16.00		$27,015	-	16.00	-	16.00
							VALOR DE OBRA	-			
							INCIDENCIA	0.00%			

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JOSE EUSEBIO CARO No. 56**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**12**	DE	**2023**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	24	AL	30

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.04%	0.00%	0.00%	8	2.04%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	1.04%	0.34%	0.34%	9	1.04%	0.34%	$4,125,634	0.34%
10	5/2/2023	11/2/2023	1.04%	0.93%	1.27%	10	1.04%	0.93%	$11,284,822	1.27%
11	12/2/2023	18/2/2023	2.04%	1.27%	2.54%	11	2.04%	1.27%	$15,410,456	2.54%
12	19/2/2023	25/2/2023	3.12%	0.49%	3.03%	12	3.12%	0.49%	$5,945,767	3.03%
13	26/2/2023	4/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	13	2.04%	0.00%	$0	3.03%
14	5/3/2023	11/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	14	2.04%	0.00%	$0	3.03%
15	12/3/2023	18/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	15	2.04%	0.00%	$0	3.03%
16	19/3/2023	25/3/2023	2.04%	0.00%	3.03%	16	2.04%	0.00%	$0	3.03%
17	26/3/2023	1/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	17	2.04%	0.00%	$0	3.03%
18	2/4/2023	8/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	18	2.04%	0.00%	$0	3.03%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.04%	0.00%	3.03%	19	2.04%	0.00%	$0	3.03%
20	16/4/2023	22/4/2023	2.04%	1.42%	4.45%	20	2.04%	1.42%	$17,260,208	4.45%
21	23/4/2023	29/4/2023	2.04%	1.16%	5.61%	21	2.04%	1.16%	$14,045,656	5.61%
22	30/4/2023	6/5/2023	2.04%	0.41%	6.02%	22	2.04%	0.41%	$4,931,309	6.02%
23	7/5/2023	13/5/2023	2.04%	0.06%	6.08%	23	2.04%	0.06%	$784,581	6.08%
24	14/5/2023	20/5/2023	2.04%	0.03%	6.11%	24	2.04%	0.03%	$306,564	6.11%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.04%	0.08%	6.19%	25	2.04%	0.08%	$964,813	6.19%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.04%	0.01%	6.19%	26	2.04%	0.01%	$67,212	6.19%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.04%	0.05%	6.24%	27	2.04%	0.05%	$549,462	6.24%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.04%	0.34%	6.57%	28	2.04%	0.34%	$4,080,259	6.57%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.04%	0.40%	6.98%	29	2.04%	0.40%	$4,913,054	6.98%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.04%	2.98%	9.96%	30	2.04%	2.98%	$36,207,192	9.96%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.04%	3.12%	13.08%	31	2.04%	3.12%	$37,840,801	13.08%
32	9/7/2023	15/7/2023	2.04%	2.97%	16.05%	32	2.04%	2.97%	$36,089,216	16.05%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.04%	7.40%	23.46%	33	2.04%	7.40%	$89,822,794	23.46%
34	23/7/2023	29/7/2023	2.04%	5.57%	29.02%	34	2.04%	5.57%	$67,542,563	29.02%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.04%	4.55%	33.57%	35	2.04%	4.55%	$55,217,154	33.57%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.04%	1.50%	35.08%	36	3.04%	1.50%	$18,220,715	35.08%
37	13/8/2023	19/8/2023	2.04%	1.74%	36.81%	37	2.04%	1.74%	$21,060,865	36.81%
38	20/8/2023	26/8/2023	2.45%	1.63%	38.44%	38	2.45%	1.63%	$19,812,551	38.44%
39	27/8/2023	2/9/2023	2.04%	1.03%	39.47%	39	2.04%	1.03%	$12,502,601	39.47%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	1.62%	41.09%	40	2.14%	1.62%	$19,617,539	41.09%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.04%	1.88%	42.97%	41	2.04%	1.88%	$22,780,575	42.97%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.04%	1.97%	44.94%	42	2.04%	1.97%	$23,878,960	44.94%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.08%	2.73%	47.67%	43	2.08%	2.73%	$33,168,151	47.67%
44	1/10/2023	7/10/2023	2.04%	0.76%	48.43%	44	2.04%	0.76%	$9,186,334	48.43%
45	8/10/2023	14/10/2023	2.04%	0.74%	49.17%	45	2.04%	0.74%	$9,003,858	49.17%
46	15/10/2023	21/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	46	2.04%	0.00%	$0	49.17%
47	22/10/2023	28/10/2023	2.04%	0.00%	49.17%	47	2.04%	0.00%	$0	49.17%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.04%	0.20%	49.37%	48	2.04%	0.20%	$2,470,075	49.37%
49	5/11/2023	11/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	49	2.04%	0.00%	$0	49.37%

50	12/11/2023	18/11/2023	2.04%	0.00%	49.37%	50	2.04%	0.00%	**$0**	49.37%
51	19/11/2023	25/11/2023	2.04%	0.25%	49.62%	51	2.04%	0.25%	**$2,986,843**	49.62%
52	26/11/2023	2/12/2023	2.04%	0.13%	49.75%	52	2.04%	0.13%	**$1,586,757**	49.75%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.44%	0.00%	49.75%	53	1.44%	0.00%	**$0**	49.75%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.98%	0.12%	49.87%	54	1.98%	0.12%	**$1,487,824**	49.87%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.04%	0.00%	49.87%	55	1.04%	0.00%	**$0**	49.87%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.04%	0.00%	49.87%	56	1.04%	0.00%	**$0**	49.87%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

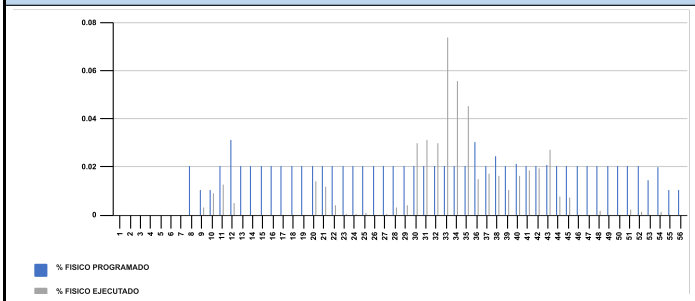

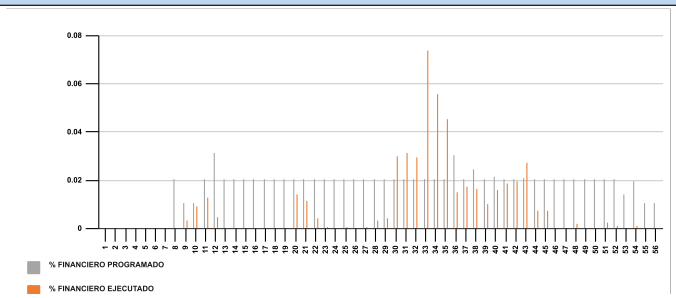

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JOSE EUSEBIO CARO	KR 33 #45 - 71	2023-12-24	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-25	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-26	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-27	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-28	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-29	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A
		2023-12-30	No se ejecutaron actividades constructivas	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	875.15		875.15		$4,221	-	875.15	0.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	942.32		942.32		$9,648	-	942.32	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	41.1205		41.12		$23,673	-	41.12	0.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt	ML	130		93.66		$140,481	$0	93.66	36.34
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	215.15		127.12		$20,699	$0	127.12	88.03
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	111.28		9.23		$266,275	$0	9.23	102.05
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	90		90.00		$32,124	-	90.00	-
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	185.5		85.50		$25,547	$0	85.50	100.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	651.5		30.19		$16,513	$0	30.19	621.31
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	155.8		45.97		$93,507	$0	45.97	109.83
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	0.5		0.50		$34,062	-	0.50	-
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	89.18		43.41		$192,928	-	43.41	45.77
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	14687.17		10,432.74		$9,568	-	10,432.74	4,254.43
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	5500		5,349.00		$40,436	-	5,349.00	151.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	2.72		2.72		$894,392	-	2.72	-
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	48.15		6.86		$1,742,818	-	6.86	41.29

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	153		116.19		$99,065	-	116.19	36.81
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	39.44		10.54		$1,933,197	-	10.54	28.90
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	74.15		23.71		$3,219,697	$0	23.71	50.44
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	280		140.00		$14,939	$0	140.00	140.00
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	199		96.00		$32,154	-	96.00	103.00
5.04	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	7		7.00		$22,404	$0	7.00	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	740.25		545.17		$34,014	$0	545.17	195.08
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PVC TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA . INCLUYE CABALLETES, CAPELOTES, ACCESORIOS, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	MT2	7.21		7.21		$133,816	$0	7.21	-
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	530.72		530.72		$20,865	$0	530.72	-
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	616.6		47.02		$17,948	$0	47.02	569.58
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	132.02		32.02		$20,720	$0	32.02	100.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	136.46		42.00		$18,887	-	42.00	94.46
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2	42		42.00		$67,320	-	42.00	-
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	1		1.00		$38,451	$0	1.00	-
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	4		4.00		$57,053	$0	4.00	-
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	5		5.00		$32,669	$0	5.00	-
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	MT2	4		4.00		$323,953	-	4.00	-
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR	M2	2		2.00		$891,836	-	2.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	85		68.00		$19,629	$0	68.00	17.00
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	22		22.00		$16,601	$0	22.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	4		4.00		$19,709	$0	4.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	6		6.00		$190,218	-	6.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	20		6.00		$190,755	-	6.00	14.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	10		10.00		$282,244	-	10.00	-
9.43	Breaker Industrial ABB Formula 50A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B - Ref: 1SDA066702R1 o similar	UND	2		2.00		$298,701	-	2.00	-

10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	16		16.00		$29,367	$0	16.00	-
NP 31	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UND	4		4.00		$180,300.00	-	4.00	-
NP 32	CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR.	M3	27.131		15.98		$1,732,447.00	-	15.98	11.15
NP 40	CONSTRUCCIÓN MURO EN ETERBOARD DE 8 MM A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS.	M2	97.86		97.86		$120,024.98	-	97.86	-
NP 41	INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO	UND	2		2.00		$195,000.00	-	2.00	-
NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, PANEL CIEGO, DE 0,6 MM DE ESPESOR, ACABADO. INCLUYE CAJÓN RECOGEDOR, EJES, GUÍAS, MUELLES Y ACCESORIOS.	M2	4.4		4.40		$859,000	-	4.40	-
							VALOR DE OBRA	-		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JOSE EUSEBIO CARO	Junior Massa	Angelo Sanchez	NO APLICA	NO APLICA
	Edgar Arias			NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

"El contratista de obra no ejecutó actividades durante el periodo del presente informe."

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Angelo Sanchez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
