9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		1.00	1.00	$693,591	693,591.00	2.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	1		1.00		$100,299	-	1.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		5.00		$212,527	-	5.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	75		52.00	23.00	$18,863	433,849.00	75.00	-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	37		26.00	11.00	$117,110	1,288,210.00	37.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	39		21.00	18.00	$121,310	2,183,580.00	39.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	88		32.00	44.00	$55,395	2,437,380.00	76.00	12.00
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	31		31.00		$29,990	-	31.00	-
NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000.0	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000.0	-	4.28	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	267.53		84.16	97.41	$134,924	13,142,946.84	181.57	85.96
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	130.07		-	84.66	$39,518	3,345,593.88	84.66	45.41
							VALOR DE OBRA	54,835,782.94		
							INCIDENCIA	13.54%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	DANIEL CANTILLO E	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

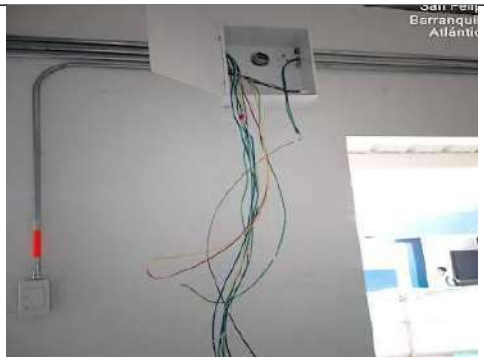
6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de cubierta termoacústica. JUAN JOSE RONDON



FOTO 2	Instalación de cubierta termoacústica. JUAN JOSE RONDON

			
FOTO 3	Suministro e instalación de materiales eléctricos JUAN JOSE RONDON	**FOTO 4**	Suministro e instalación de materiales eléctricos JUAN JOSE RONDON
			
FOTO 5	Instalación de piso en baldosa JUAN JOSE RONDON	**FOTO 6**	Instalación de luminarias. JUAN JOSE RONDON
			
FOTO 7	Aplicacion de estuco JUAN JOSE RONDON	**FOTO 8**	Aplicacion de pintura JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE JUAN JOSE RONDON No. 65**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**3**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL


CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
41	10/9/2023	16/9/2023	3.33%	2.62%	2.62%	41	3.33%	2.62%	$10,624,185	2.62%
42	17/9/2023	23/9/2023	3.33%	5.65%	8.27%	42	3.33%	5.65%	$22,863,434	8.27%
43	24/9/2023	30/9/2023	3.33%	5.26%	13.53%	43	3.33%	5.26%	$21,311,110	13.53%
44	1/10/2023	7/10/2023	3.33%	0.00%	13.53%	44	3.33%	0.00%	$0	13.53%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.33%	0.00%	13.53%	45	3.33%	0.00%	$0	13.53%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.33%	0.00%	13.53%	46	3.33%	0.00%	$0	13.53%
47	22/10/2023	28/10/2023	3.33%	0.00%	13.53%	47	3.33%	0.00%	$0	13.53%
48	29/10/2023	4/11/2023	3.33%	0.15%	13.68%	48	3.33%	0.15%	$601,900	13.68%
49	5/11/2023	11/11/2023	3.33%	0.20%	13.89%	49	3.33%	0.20%	$825,627	13.89%
50	12/11/2023	18/11/2023	3.33%	0.26%	14.14%	50	3.33%	0.26%	$1,047,483	14.14%
51	19/11/2023	25/11/2023	3.33%	0.27%	14.42%	51	3.33%	0.27%	$1,109,955	14.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	3.33%	0.00%	14.42%	52	3.33%	0.00%	$0	14.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	3.33%	0.31%	14.73%	53	3.33%	0.31%	$1,245,534	14.73%
54	10/12/2023	16/12/2023	3.33%	0.00%	14.73%	54	3.33%	0.00%	$0	14.73%
55	17/12/2023	23/12/2023	3.33%	0.28%	15.00%	55	3.33%	0.28%	$1,124,661	15.00%
56	24/12/2023	30/12/2023	3.33%	0.00%	15.00%	56	3.33%	0.00%	$0	15.00%
57	31/12/2023	6/1/2024	3.33%	0.35%	15.36%	57	3.33%	0.35%	$1,433,793	15.36%
58	7/1/2024	13/1/2024	5.51%	2.37%	17.72%	58	5.51%	2.37%	$9,584,072	17.72%
59	14/1/2024	20/1/2024	5.89%	4.73%	22.45%	59	5.89%	4.73%	$19,149,341	22.45%
60	21/1/2024	27/1/2024	3.41%	3.19%	25.64%	60	3.41%	3.19%	$12,912,513	25.64%
61	28/1/2024	3/2/2024	5.68%	2.73%	28.37%	61	5.68%	2.73%	$11,041,249	28.37%
62	4/2/2024	10/2/2024	4.17%	16.62%	44.99%	62	4.17%	16.62%	$67,309,519	44.99%
63	11/2/2024	17/2/2024	7.54%	25.87%	70.86%	63	7.54%	25.87%	$104,736,149	70.86%
64	18/2/2024	24/2/2024	3.96%	13.54%	84.40%	64	3.96%	13.54%	$54,835,783	84.40%
65	25/2/2024	2/3/2024	3.74%	6.49%	90.89%	65	3.74%	6.49%	$26,290,042	90.89%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

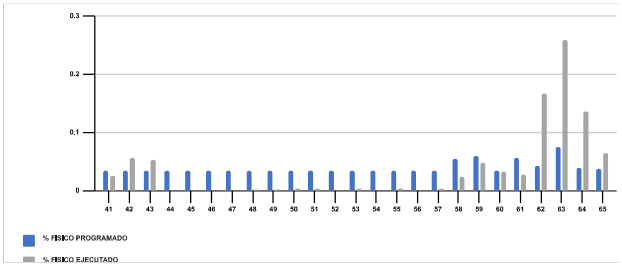

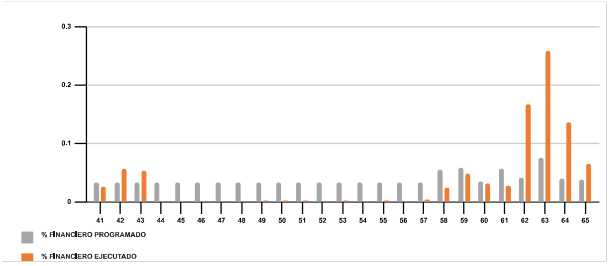

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
JUAN JOSE RONDON	KR 25 B #68 -20	2024-02-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-26	Suministro e instalación de cubierta termoacustica. Instalacion de tuberia EMT. Instalacion de piso en baldosa de granito en aulas. Instalación de luminarias. Instalacion de zocalo. Pintura sobre muro en aulas. Instalacion de tomacorriente doble.	N/A
		2024-02-27	Instalacion de piso en baldosa de granito en aulas. Alimentador de cable CU. Pintura sobre muro en aulas. Instalacion de zocalo en piso de granito. Instalación de luminarias.	N/A
		2024-02-28	Pintura sobre muro en aulas. Instalacion de zocalo. Instalacion de tomacorriente doble.	N/A
		2024-02-29	Instalacion de zocalo. Instalacion de piso en baldosa de granito en aulas. Instalación de luminarias. Pintura sobre muro en aulas. Instalación de interruptor doble.	N/A

		2024-03-01	Instalacion de piso en baldosa de granito en aulas. Alimentador de cable CU. Pintura sobre muro en aulas. Instalacion de zocalo en piso de granito. Instalación de luminarias.	N/A
		2024-03-02	Instalacion de piso en baldosa de granito en aulas. Alimentador de cable CU. Pintura sobre muro en aulas. Instalacion de zocalo en piso de granito. Instalación de luminarias.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	307.05		307.05		$4,221	-	307.05	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	307.05		307.05		$9,648	-	307.05	-
1.05	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERÍMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	40		40.00		$23,673	-	40.00	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	2.63		0.38		$252,961	-	0.38	2.25
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	243.27		55.16		$20,699	-	55.16	188.11
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	6.15		6.05		$266,275	-	6.05	0.10
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	57.6		23.28		$93,507	-	23.28	34.32
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	2509.23		801.48		$9,568	-	801.48	1,707.75
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	240		280.00		$40,436	-	280.00	- 40.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	312		220.04		$99,065	-	220.04	91.96
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	20.14		-		$260,694	-	-	20.14
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	36.03		-		$351,058	-	-	36.03
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	118.2		118.20		$14,939	-	118.20	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	163.63		163.63		$32,154	-	163.63	-
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	120.03		120.03		$13,644	-	120.03	-
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	29.15		25.05		$100,669	-	25.05	4.10
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	420.84		420.84		$23,961	-	420.84	0.00
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	114		86.00		$15,618	-	86.00	28.00
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	4117.76		3,748.01		$24,307	-	3,748.01	369.75
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	320.25		270.30	49.95	$138,761	6,931,111.95	320.25	-
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	278.27		278.27		$34,014	-	278.27	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	235		233.42		$16,524	-	233.42	1.58
6.02	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	MT2	46.1		32.37		$24,487	-	32.37	13.73
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	101.2		49.10		$3,615	-	49.10	52.10
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	95		85.67		$20,865	-	85.67	9.33

6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	740.1505		740.15		$17,948	-	740.15	0.00
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	740.1505		620.91	119.24	$17,384	2,072,868.16	740.15	0.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	8		8.00		$57,053	-	8.00	-
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	9		9.00		$32,643	-	9.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	58		58.00		$19,629	-	58.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	58		58.00		$16,601	-	58.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	67		60.00	7.00	$57,278	400,946.00	67.00	-
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300	UND	31		33.00	10.00	$190,218	1,902,180.00	43.00	- 12.00
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	100		12.00		$40,541	-	12.00	88.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	45		45.00		$190,755	-	45.00	-
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		5.00		$282,244	-	5.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	26		26.00		$235,052	-	26.00	-
9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	1		1.00		$191,338	-	1.00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	34.86		32.30	2.56	$16,480	42,188.80	34.86	-
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W 220VAC No incluye alimentador o salida.	UND	2		-	2.00	$441,714	883,428.00	2.00	-
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2		2.00		$693,591	-	2.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	1		1.00		$100,299	-	1.00	-
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		5.00		$212,527	-	5.00	-
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG X3 METRO LINEAL LIBRE DE HALOGENO	ML	75		75.00		$18,863	-	75.00	-
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	37		37.00		$117,110	-	37.00	-
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	39		39.00		$121,310	-	39.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4'', CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	88		76.00	12.00	$55,395	664,740.00	88.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	31		31.00		$29,990	-	31.00	-

NP 37	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 3000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8.15		8.15		$760,000.0	-	8.15	-
NP 64	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4.28		4.28		$1,500,000.0	-	4.28	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	267.53		181.57	85.96	$134,924	11,598,067.04	267.53	-
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	130.07		84.66	45.41	$39,518	1,794,512.38	130.07	-
							VALOR DE OBRA	26,290,042.33		
							INCIDENCIA	6.49%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JUAN JOSE RONDON	Alberto Diaz	DANIEL CANTILLO E	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Instalación de cubierta termoacústica. JUAN JOSE RONDON



FOTO 2	Instalación de piso en baldosa granito JUAN JOSE RONDON



FOTO 3	Suministro e instalación de materiales eléctricos JUAN JOSE RONDON



FOTO 4	Suministro e instalación de materiales eléctricos JUAN JOSE RONDON

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 61**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.67%	0.12%	0.12%	11	1.67%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.67%	0.79%	0.90%	12	1.67%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.67%	0.82%	1.72%	13	1.67%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.67%	0.78%	2.50%	14	1.67%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.67%	0.78%	3.27%	15	1.67%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.67%	0.39%	3.66%	16	1.67%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.67%	0.39%	4.05%	17	1.67%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.67%	0.00%	4.05%	18	1.67%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	1.67%	0.61%	4.66%	19	1.67%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.67%	0.81%	5.47%	20	1.67%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.67%	0.38%	5.85%	21	1.67%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.67%	0.83%	6.68%	22	1.67%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.31%	6.99%	23	1.67%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.67%	0.75%	7.74%	24	1.67%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	1.67%	1.20%	8.94%	25	1.67%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.67%	0.79%	9.73%	26	1.67%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.67%	0.80%	10.53%	27	1.67%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.67%	0.45%	10.98%	28	1.67%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.67%	0.53%	11.52%	29	1.67%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	1.67%	0.17%	11.69%	30	1.67%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.67%	2.25%	13.94%	31	1.67%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.67%	1.41%	15.35%	32	1.67%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.67%	1.22%	16.57%	33	1.67%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.67%	2.65%	19.22%	34	1.67%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.67%	1.88%	21.11%	35	1.67%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	1.67%	0.39%	21.50%	36	1.67%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	1.67%	0.29%	21.79%	37	1.67%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.67%	0.35%	22.14%	38	1.67%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.67%	0.73%	22.87%	39	1.67%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	1.67%	0.62%	23.49%	40	1.67%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.67%	0.65%	24.14%	41	1.67%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	0.94%	25.08%	42	1.67%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.67%	1.46%	26.54%	43	1.67%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.67%	0.81%	27.35%	44	1.67%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	1.67%	0.23%	27.58%	45	1.67%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.67%	0.16%	27.73%	46	1.67%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.67%	0.00%	27.73%	47	1.67%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.67%	0.19%	27.93%	48	1.67%	0.19%	$7,081,751	27.93%

49	5/11/2023	11/11/2023	1.67%	0.87%	28.80%	49	1.67%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	1.67%	1.05%	29.84%	50	1.67%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.67%	0.81%	30.65%	51	1.67%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.67%	0.00%	30.65%	52	1.67%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.67%	1.30%	31.95%	53	1.67%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.67%	1.12%	33.07%	54	1.67%	1.12%	$40,589,705	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	55	1.67%	0.00%	$0	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	56	1.67%	0.00%	$0	33.07%
57	31/12/2023	6/1/2024	1.67%	0.14%	33.20%	57	1.67%	0.14%	$4,978,669	33.20%
58	7/1/2024	13/1/2024	1.21%	0.40%	33.61%	58	1.21%	0.40%	$14,734,779	33.61%
59	14/1/2024	20/1/2024	1.67%	2.01%	35.62%	59	1.67%	2.01%	$73,310,798	35.62%
60	21/1/2024	27/1/2024	1.67%	1.55%	37.17%	60	1.67%	1.55%	$56,400,287	37.17%
61	28/1/2024	3/2/2024	1.79%	2.68%	39.85%	61	1.79%	2.68%	$97,393,224	39.85%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

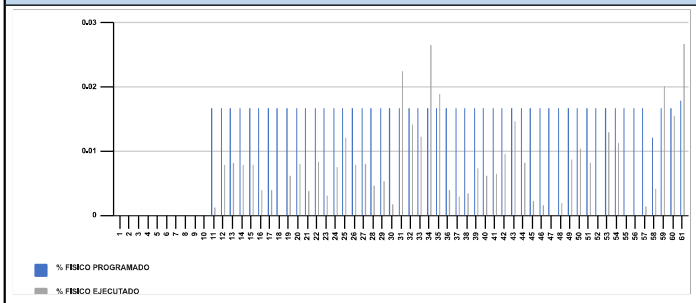

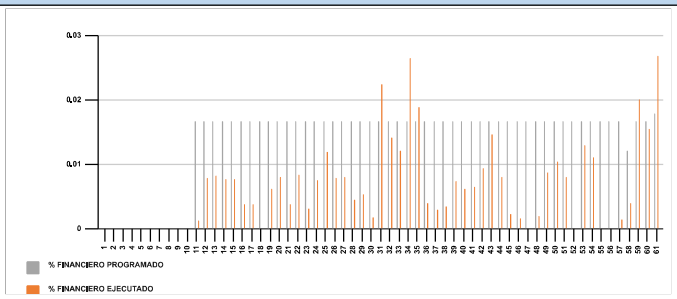

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2024-01-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-01-29	Levante de muro en bloque, bloque 1, piso 2 y 3. Dovelas en levante de muro. Acopio de residuos.	N/A
		2024-01-30	Levante de muro en bloque, bloque 1, piso 2 y 3. Dovelas en levante de muro. Corte y perfilado en bloque o ladrillo, mampostería en bloque 1.	N/A
		2024-01-31	Levante de muro en bloque, bloque 1, piso 2 y 3. Dovelas en levante de muro.	N/A
		2024-02-01	Pañete exterior allanado sobre muro bloque 3. Levante de muro en ladrillo, bloque 1, 2 y 3. Filetes o juntas de muro bloque 3.	N/A
		2024-02-02	Pañete exterior allanado sobre muro bloque 3. Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Filetes o juntas de muro bloque 3.	N/A
		2024-02-03	Filetes o juntas de muro bloque 3. Pañete exterior allanado sobre muro bloque 3. Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		3,520.67		$4,221	-	3,520.67	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		13.31		$266,275	$0	13.31	9.23
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		677.06		$32,124	$0	677.06	772.04
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		31,058.23		$9,568	$0	31,058.23	14,347.27
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00		$40,436	$0	2,690.00	462.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	652		317.00	175.00	$27,186	4,757,550.00	492.00	160.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-

3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,200.16	102.97	$14,939	$1,538,269	1,303.13	432.87
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		1,172.13		$32,154	$0	1,172.13	397.87
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1385		829.16	381.44	$100,669	38,399,183.36	1,210.60	174.40
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	2800		-	1,375.86	$23,961	32,966,981.46	1,375.86	1,424.14
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	120		-	12.14	$39,705	482,018.70	12.14	107.86
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	361.8		-	171.14	$15,618	2,672,864.52	171.14	190.66
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		14,849.31		$21,652	-	14,849.31	17,492.00
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00		$24,307	-	- 0.00	16,800.00
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	555.6		113.29		$16,524	-	113.29	442.31
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	147.21		-	89.46	$129,524.7	11,587,279.66	89.46	57.75
NP 88	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	ML	222		222.00		$76,197	-	222.00	-
								VALOR DE OBRA	97,393,223.81	
								INCIDENCIA	2.68%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

 https://drive.google.com/open?id=1FyHTPS-WghSYMvehFabz5b_lO5vaX99I		 https://drive.google.com/open?id=133nnmk8n8ig7NKBPPmle31biD3sdaCBQ	
FOTO 1	Levante de muro MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 2**	Pañete en muros MAYOR DE BARRANQUILLA
 https://drive.google.com/open?id=133nnmk8n8ig7NKBPPmle31biD3sdaCBQ		 https://drive.google.com/open?id=1GNngqx1V1rDyyoFYW7KvVJkKHuEU	
FOTO 3	Filos de ventanas y juntas MAYOR DE BARRANQUILLA	**FOTO 4**	Levante de muro con dovelas MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 62**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.67%	0.12%	0.12%	11	1.67%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.67%	0.79%	0.90%	12	1.67%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.67%	0.82%	1.72%	13	1.67%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.67%	0.78%	2.50%	14	1.67%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.67%	0.78%	3.27%	15	1.67%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.67%	0.39%	3.66%	16	1.67%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.67%	0.39%	4.05%	17	1.67%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.67%	0.00%	4.05%	18	1.67%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	1.67%	0.61%	4.66%	19	1.67%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.67%	0.81%	5.47%	20	1.67%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.67%	0.38%	5.85%	21	1.67%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.67%	0.83%	6.68%	22	1.67%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.31%	6.99%	23	1.67%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.67%	0.75%	7.74%	24	1.67%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	1.67%	1.20%	8.94%	25	1.67%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.67%	0.79%	9.73%	26	1.67%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.67%	0.80%	10.53%	27	1.67%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.67%	0.45%	10.98%	28	1.67%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.67%	0.53%	11.52%	29	1.67%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	1.67%	0.17%	11.69%	30	1.67%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.67%	2.25%	13.94%	31	1.67%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.67%	1.41%	15.35%	32	1.67%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.67%	1.22%	16.57%	33	1.67%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.67%	2.65%	19.22%	34	1.67%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.67%	1.88%	21.11%	35	1.67%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	1.67%	0.39%	21.50%	36	1.67%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	1.67%	0.29%	21.79%	37	1.67%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.67%	0.35%	22.14%	38	1.67%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.67%	0.73%	22.87%	39	1.67%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	1.67%	0.62%	23.49%	40	1.67%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.67%	0.65%	24.14%	41	1.67%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	0.94%	25.08%	42	1.67%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.67%	1.46%	26.54%	43	1.67%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.67%	0.81%	27.35%	44	1.67%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	1.67%	0.23%	27.58%	45	1.67%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.67%	0.16%	27.73%	46	1.67%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.67%	0.00%	27.73%	47	1.67%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.67%	0.19%	27.93%	48	1.67%	0.19%	$7,081,751	27.93%

49	5/11/2023	11/11/2023	1.67%	0.87%	28.80%	49	1.67%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	1.67%	1.05%	29.84%	50	1.67%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.67%	0.81%	30.65%	51	1.67%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.67%	0.00%	30.65%	52	1.67%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.67%	1.30%	31.95%	53	1.67%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.67%	1.12%	33.07%	54	1.67%	1.12%	$40,589,705	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	55	1.67%	0.00%	$0	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	56	1.67%	0.00%	$0	33.07%
57	31/12/2023	6/1/2024	1.67%	0.14%	33.20%	57	1.67%	0.14%	$4,978,669	33.20%
58	7/1/2024	13/1/2024	1.21%	0.40%	33.61%	58	1.21%	0.40%	$14,734,779	33.61%
59	14/1/2024	20/1/2024	1.67%	2.01%	35.62%	59	1.67%	2.01%	$73,310,798	35.62%
60	21/1/2024	27/1/2024	1.67%	1.55%	37.17%	60	1.67%	1.55%	$56,400,287	37.17%
61	28/1/2024	3/2/2024	1.79%	2.68%	39.85%	61	1.79%	2.68%	$97,393,224	39.85%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.67%	7.11%	46.96%	62	1.67%	7.11%	$258,766,595	46.96%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

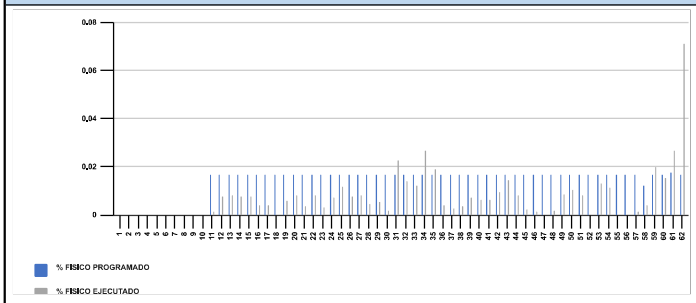

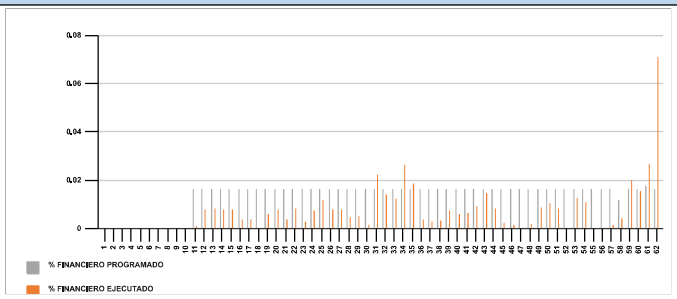

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2024-02-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-05	Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Resane en mortero de reparación para elementos en concreto bloque 1 y 2. Alfajia bloque 1 piso 2. Viga aerea fundida bloque 2 piso 3.	N/A
		2024-02-06	Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Fundida de Viga aérea y columnas bloque 2 piso 3. Alfajia bloque 1 piso 1 y 2.	N/A
		2024-02-07	Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Fundida de Viga aérea y columnas bloque 2 piso 3. Acopio de residuos. Pañete exterior allanado sobre muro bloque 3.	N/A
		2024-02-08	Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Instalacion de estructura metálica con conexiones y soldadura bloque 1 y 2.	N/A
		2024-02-09	Levante de muro en ladrillo (antepecho), bloque 2 y 3. Instalacion de estructura metálica con conexiones y soldadura bloque 1 , 2 y 3.	N/A
		2024-02-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		3,520.67		$4,221	-	3,520.67	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		13.31		$266,275	$0	13.31	9.23
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		677.06		$32,124	$0	677.06	772.04
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		31,058.23	361.56	$9,568	$3,459,406	31,419.79	13,985.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,690.00	175.00	$40,436	$7,076,300	2,865.00	287.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	652		492.00	93.00	$27,186	2,528,298.00	585.00	67.00

2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	45.6		-		$48,408	-	-	45.60
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	8.64		-	8.64	$559,014	4,829,880.96	8.64	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,303.13		$14,939	$0	1,303.13	432.87
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		1,172.13		$32,154	$0	1,172.13	397.87
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1385		1,210.60		$100,669	-	1,210.60	174.40
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	2800		1,375.86	825.48	$23,961	19,779,326.28	2,201.34	598.66
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	120		12.14	71.13	$39,705	2,824,216.65	83.27	36.73
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	361.8		171.14	38.86	$15,618	606,915.48	210.00	151.80
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		14,849.31	1,044.14	$21,652	22,607,719.28	15,893.45	16,447.86
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		- 0.00	6,454.17	$24,307	156,881,510.19	6,454.17	10,345.83
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0,05m	MT2	555.6		113.29		$16,524	-	113.29	442.31
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	147.21		89.46	57.75	$129,524.7	7,480,051.43	147.21	0.00
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	20.52		-	11.70	$1,913,254.5	22,385,077.65	11.70	8.82
NP 88	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	ML	222		222.00		$76,197	-	222.00	-

VALOR DE OBRA	258,766,594.8(
INCIDENCIA	7.11%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1QWZXdRPXuhFWvmnyUHEFJsbCE_3eGxJE

FOTO 1	Pañete en muros MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1CeaURv_zeaSnESUadHJlFKeUJlKbTARN

FOTO 2	Instalación de estructura metalica MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1zickmxlb8l1b—hXAah_bj4jHg_4-bX

FOTO 3	Instalación de estructura metalica MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1kmQVfquCBqXtiBjw5haMkUjvL5038nJw

FOTO 4	Instalación de dovelas MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 63**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.67%	0.12%	0.12%	11	1.67%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.67%	0.79%	0.90%	12	1.67%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.67%	0.82%	1.72%	13	1.67%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.67%	0.78%	2.50%	14	1.67%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.67%	0.78%	3.27%	15	1.67%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.67%	0.39%	3.66%	16	1.67%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.67%	0.39%	4.05%	17	1.67%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.67%	0.00%	4.05%	18	1.67%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	1.67%	0.61%	4.66%	19	1.67%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.67%	0.81%	5.47%	20	1.67%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.67%	0.38%	5.85%	21	1.67%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.67%	0.83%	6.68%	22	1.67%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.31%	6.99%	23	1.67%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.67%	0.75%	7.74%	24	1.67%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	1.67%	1.20%	8.94%	25	1.67%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.67%	0.79%	9.73%	26	1.67%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.67%	0.80%	10.53%	27	1.67%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.67%	0.45%	10.98%	28	1.67%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.67%	0.53%	11.52%	29	1.67%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	1.67%	0.17%	11.69%	30	1.67%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.67%	2.25%	13.94%	31	1.67%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.67%	1.41%	15.35%	32	1.67%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.67%	1.22%	16.57%	33	1.67%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.67%	2.65%	19.22%	34	1.67%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.67%	1.88%	21.11%	35	1.67%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	1.67%	0.39%	21.50%	36	1.67%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	1.67%	0.29%	21.79%	37	1.67%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.67%	0.35%	22.14%	38	1.67%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.67%	0.73%	22.87%	39	1.67%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	1.67%	0.62%	23.49%	40	1.67%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.67%	0.65%	24.14%	41	1.67%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	0.94%	25.08%	42	1.67%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.67%	1.46%	26.54%	43	1.67%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.67%	0.81%	27.35%	44	1.67%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	1.67%	0.23%	27.58%	45	1.67%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.67%	0.16%	27.73%	46	1.67%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.67%	0.00%	27.73%	47	1.67%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.67%	0.19%	27.93%	48	1.67%	0.19%	$7,081,751	27.93%

49	5/11/2023	11/11/2023	1.67%	0.87%	28.80%	49	1.67%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	1.67%	1.05%	29.84%	50	1.67%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.67%	0.81%	30.65%	51	1.67%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.67%	0.00%	30.65%	52	1.67%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.67%	1.30%	31.95%	53	1.67%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.67%	1.12%	33.07%	54	1.67%	1.12%	$40,589,705	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	55	1.67%	0.00%	$0	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	56	1.67%	0.00%	$0	33.07%
57	31/12/2023	6/1/2024	1.67%	0.14%	33.20%	57	1.67%	0.14%	$4,978,669	33.20%
58	7/1/2024	13/1/2024	1.21%	0.40%	33.61%	58	1.21%	0.40%	$14,734,779	33.61%
59	14/1/2024	20/1/2024	1.67%	2.01%	35.62%	59	1.67%	2.01%	$73,310,798	35.62%
60	21/1/2024	27/1/2024	1.67%	1.55%	37.17%	60	1.67%	1.55%	$56,400,287	37.17%
61	28/1/2024	3/2/2024	1.79%	2.68%	39.85%	61	1.79%	2.68%	$97,393,224	39.85%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.67%	7.11%	46.96%	62	1.67%	7.11%	$258,766,595	46.96%
63	11/2/2024	17/2/2024	2.12%	9.20%	56.15%	63	2.12%	9.20%	$334,826,144	56.15%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

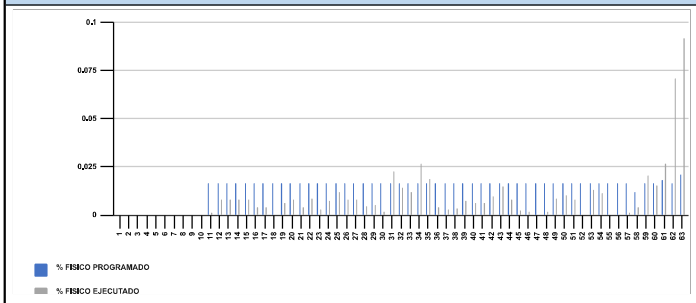

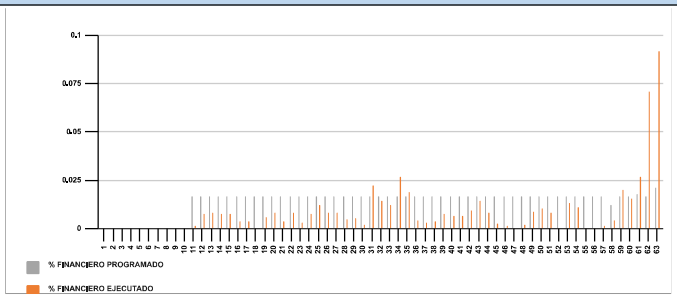

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2024-02-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-14	Instalacion de estructura metálica con conexiones bloque 1 y 2. Suministro e instalación de cubierta termo acústica bloque 1	N/A
		2024-02-15	Instalacion de estructura metálica con conexiones piso 1 y 2. Estuco plástico sobre muro en bloque 3 piso 1,2,3. Escarificación de estuco sobre muro en bloque 3 pisos 1,2 y 3. Suministro e instalación de cubierta termo acústica bloque 1.	N/A
		2024-02-16	Instalación de cubierta termo acústica bloque 1. Estuco plástico sobre muro en bloque 3 piso 1,2,3. Pintura en muro para interiores en bloque 3 piso 1,2 y 3. Instalacion de estructura metálica galvanizada con conexiones bloque 1 y 2.	N/A
		2024-02-17	Instalación de cubierta termo acústica bloque 1 . Pintura en muro para interiores en bloque 3 piso 1,2 y 3. Estuco plástico sobre muro en bloque 3 piso 1,2,3.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		3,520.67		$4,221	-	3,520.67	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		13.31		$266,275	$0	13.31	9.23
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		677.06		$32,124	$0	677.06	772.04
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		31,419.79		$9,568	$0	31,419.79	13,985.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,865.00	124.00	$40,436	$5,014,064	2,989.00	163.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72

2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	652		585.00		$27,186	-	585.00	67.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	45.6		-		$48,408	-	-	45.60
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	8.64		8.64		$559,014	-	8.64	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,303.13		$14,939	$0	1,303.13	432.87
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		1,172.13		$32,154	$0	1,172.13	397.87
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1385		1,210.60		$100,669	-	1,210.60	174.40
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	2800		2,201.34		$23,961	-	2,201.34	598.66
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	120		83.27		$39,705	-	83.27	36.73
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	361.8		210.00		$15,618	-	210.00	151.80
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		15,893.45	963.10	$21,652	20,853,041.20	16,856.55	15,484.76
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		6,454.17	8,162.30	$24,307	198,401,026.10	14,616.47	2,183.53
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	1200		-	158.05	$138,761	21,931,176.05	158.05	1,041.95
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	555.6		113.29		$16,524	-	113.29	442.31
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3,00 METROS < 10,00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	8600		-	2,145.18	$17,948	38,501,690.64	2,145.18	6,454.82
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	8600		-	1,744.14	$17,384	30,320,129.76	1,744.14	6,855.86
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00		$190,755	-	2.00	309.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-

NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	2087.88		-	2,087.88	$6,641	13,865,611.08	2,087.88	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	147.21		147.21		$129,524.7	-	147.21	0.00
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	20.52		11.70		$1,913,254.5	-	11.70	8.82
NP 88	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	ML	222		222.00		$76,197	-	222.00	-

VALOR DE OBRA	334,826,144.11
INCIDENCIA	9.20%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1mOr67c-l0i8PAvPoTDMXEd4vhc_C5Dbl



https://drive.google.com/open?id=1DBMVfdfvdNRk6YOPwDCJOhmtLEiDsA

FOTO 1	Instalación de cubierta MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Instalación de estructura metálica MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=16xQxic2DyTg0Xe3K7bGBevQjjU41G0Bs



https://drive.google.com/open?id=1mdHJC3xNia4tjlqdKJc6OpL61XHNH7l7

FOTO 3	Instalación de cubierta MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 4	Aplicación de estuco y pintura MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 64**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.67%	0.12%	0.12%	11	1.67%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.67%	0.79%	0.90%	12	1.67%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.67%	0.82%	1.72%	13	1.67%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.67%	0.78%	2.50%	14	1.67%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.67%	0.78%	3.27%	15	1.67%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.67%	0.39%	3.66%	16	1.67%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.67%	0.39%	4.05%	17	1.67%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.67%	0.00%	4.05%	18	1.67%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	1.67%	0.61%	4.66%	19	1.67%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.67%	0.81%	5.47%	20	1.67%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.67%	0.38%	5.85%	21	1.67%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.67%	0.83%	6.68%	22	1.67%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.31%	6.99%	23	1.67%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.67%	0.75%	7.74%	24	1.67%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	1.67%	1.20%	8.94%	25	1.67%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.67%	0.79%	9.73%	26	1.67%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.67%	0.80%	10.53%	27	1.67%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.67%	0.45%	10.98%	28	1.67%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.67%	0.53%	11.52%	29	1.67%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	1.67%	0.17%	11.69%	30	1.67%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.67%	2.25%	13.94%	31	1.67%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.67%	1.41%	15.35%	32	1.67%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.67%	1.22%	16.57%	33	1.67%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.67%	2.65%	19.22%	34	1.67%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.67%	1.88%	21.11%	35	1.67%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	1.67%	0.39%	21.50%	36	1.67%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	1.67%	0.29%	21.79%	37	1.67%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.67%	0.35%	22.14%	38	1.67%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.67%	0.73%	22.87%	39	1.67%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	1.67%	0.62%	23.49%	40	1.67%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.67%	0.65%	24.14%	41	1.67%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	0.94%	25.08%	42	1.67%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.67%	1.46%	26.54%	43	1.67%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.67%	0.81%	27.35%	44	1.67%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	1.67%	0.23%	27.58%	45	1.67%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.67%	0.16%	27.73%	46	1.67%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.67%	0.00%	27.73%	47	1.67%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.67%	0.19%	27.93%	48	1.67%	0.19%	$7,081,751	27.93%
49	5/11/2023	11/11/2023	1.67%	0.87%	28.80%	49	1.67%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	1.67%	1.05%	29.84%	50	1.67%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.67%	0.81%	30.65%	51	1.67%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.67%	0.00%	30.65%	52	1.67%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.67%	1.30%	31.95%	53	1.67%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.67%	1.12%	33.07%	54	1.67%	1.12%	$40,589,705	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	55	1.67%	0.00%	$0	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	56	1.67%	0.00%	$0	33.07%
57	31/12/2023	6/1/2024	1.67%	0.14%	33.20%	57	1.67%	0.14%	$4,978,669	33.20%
58	7/1/2024	13/1/2024	1.21%	0.40%	33.61%	58	1.21%	0.40%	$14,734,779	33.61%

59	14/1/2024	20/1/2024	1.67%	2.01%	35.62%	59	1.67%	2.01%	$73,310,798	35.62%
60	21/1/2024	27/1/2024	1.67%	1.55%	37.17%	60	1.67%	1.55%	$56,400,287	37.17%
61	28/1/2024	3/2/2024	1.79%	2.68%	39.85%	61	1.79%	2.68%	$97,393,224	39.85%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.67%	7.11%	46.96%	62	1.67%	7.11%	$258,766,595	46.96%
63	11/2/2024	17/2/2024	2.12%	9.20%	56.15%	63	2.12%	9.20%	$334,826,144	56.15%
64	18/2/2024	24/2/2024	1.67%	4.75%	60.91%	64	1.67%	4.75%	$172,955,776	60.91%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

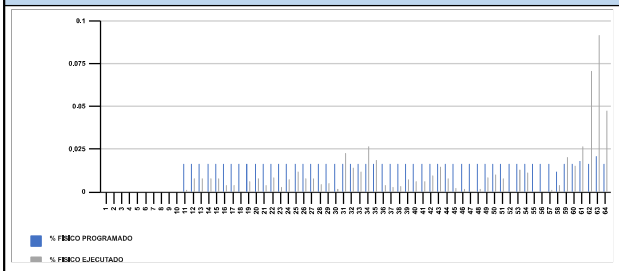

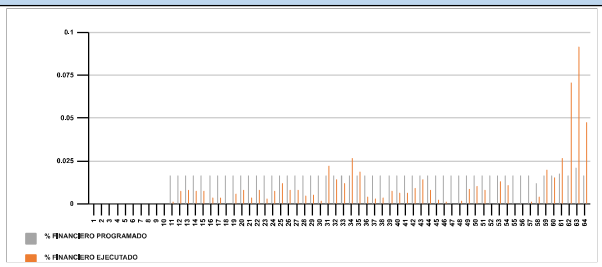

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2024-02-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-19	Instalación de cubierta termo acústica bloque 1. Alimentador de cable en tubo EMT. Instalación de salida de luminarias en bloque 1,2 y 3. Instalación de salida de tomacorriente en aulas.	N/A
		2024-02-20	Estuco plástico sobre muro en bloque 3 piso 1,2,3. Pintura en muro para interiores en bloque 3 piso 1,2 y 3. Alimentador de cable en tubo EMT. Instalación de salida de luminarias en bloque 1,2 y 3. Instalación de salida de tomacorrientes en aulas.	N/A
		2024-02-21	Estuco plástico sobre muro en bloque 3 piso 1,2,3. Suministro e instalación de tablero. Instalación de tomacorrientes dobles en aulas.	N/A
		2024-02-22	Suministro e instalación de caja de paso. Suministro e instalación de tablero. Instalación de interruptores dobles en aulas. Instalacion de tuberia EMT.	N/A
		2024-02-23	Instalacion de tuberia EMT. Salida de interruptores dobles. Suministro e instalación de tablero. Suministro e instalación de caja de paso. Suministro e instalacion de alimentador.	N/A
		2024-02-24	Alimentador en cable CU en tubería EMT. Caja rawelt o similar para salida eléctrica o de conformidad. S.E.I TCD tipo gabinete.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		3,520.67		$4,221	-	3,520.67	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		13.31		$266,275	$0	13.31	9.23
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		677.06		$32,124	$0	677.06	772.04
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		31,419.79		$9,568	$0	31,419.79	13,985.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,989.00		$40,436	$0	2,989.00	163.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	652		585.00		$27,186	-	585.00	67.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	45.6		-		$48,408	-	-	45.60
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	8.64		8.64		$559,014	-	8.64	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,303.13		$14,939	$0	1,303.13	432.87
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		1,172.13		$32,154	$0	1,172.13	397.87
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1385		1,210.60		$100,669	-	1,210.60	174.40

3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	2800		2,201.34		$23,961	-	2,201.34	598.66
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	120		83.27		$39,705	-	83.27	36.73
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	361.8		210.00		$15,618	-	210.00	151.80
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		16,856.55		$21,652	-	16,856.55	15,484.76
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		14,616.47		$24,307	-	14,616.47	2,183.53
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	1200		158.05	286.14	$138,761	39,705,072.54	444.19	755.81
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	555.6		113.29		$16,524	-	113.29	442.31
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	8600		2,145.18	3,814.17	$17,948	68,456,723.16	5,959.35	2,640.65
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	8600		1,744.14	3,175.17	$17,384	55,197,155.28	4,919.31	3,680.69
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	330		-		$57,278	-	-	330.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		2.00	4.00	$190,755	763,020.00	6.00	305.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00		$282,244	-	2.00	44.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	3		-		$872,036	-	-	3.00
9.36	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	110		-		$68,275	-	-	110.00
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	85		-		$117,110	-	-	85.00
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	85		-		$121,310	-	-	85.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	112		-		$29,990	-	-	112.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	2087.88		2,087.88		$6,641	-	2,087.88	-

NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	147.21		147.21		$129,524.7	-	147.21	0.00
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	20.52		11.70		$1,913,254.5	-	11.70	8.82
NP 88	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	ML	222		222.00		$76,197	-	222.00	-
								VALOR DE OBRA	172,955,776.2	
								INCIDENCIA	4.75%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Levante muros de antepecho MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 2	Instalacion elementos eléctricos MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 3	Instalacion elementos eléctricos MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 4	Aplicación de estuco MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 5	Aplicación de estuco MAYOR DE BARRANQUILLA



FOTO 6	Aplicación de estuco MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE MAYOR DE BARRANQUILLA**	**No. 65**	**Código:** IP-FM-31 **VERSION:** 01 **FECHA:** 6/9/2021 **Paginas:** 1 de 1

FECHA:	**MES**	**3**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	7	0.00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	8	0.00%	0.00%	$0	0.00%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	9	0.00%	0.00%	$0	0.00%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.00%	0.00%	0.00%	10	0.00%	0.00%	$0	0.00%
11	12/2/2023	18/2/2023	1.67%	0.12%	0.12%	11	1.67%	0.12%	$4,316,804	0.12%
12	19/2/2023	25/2/2023	1.67%	0.79%	0.90%	12	1.67%	0.79%	$28,578,248	0.90%
13	26/2/2023	4/3/2023	1.67%	0.82%	1.72%	13	1.67%	0.82%	$29,783,114	1.72%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.67%	0.78%	2.50%	14	1.67%	0.78%	$28,228,801	2.50%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.67%	0.78%	3.27%	15	1.67%	0.78%	$28,228,801	3.27%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.67%	0.39%	3.66%	16	1.67%	0.39%	$14,112,580	3.66%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.67%	0.39%	4.05%	17	1.67%	0.39%	$14,112,580	4.05%
18	2/4/2023	8/4/2023	1.67%	0.00%	4.05%	18	1.67%	0.00%	$0	4.05%
19	9/4/2023	15/4/2023	1.67%	0.61%	4.66%	19	1.67%	0.61%	$22,216,692	4.66%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.67%	0.81%	5.47%	20	1.67%	0.81%	$29,404,355	5.47%
21	23/4/2023	29/4/2023	1.67%	0.38%	5.85%	21	1.67%	0.38%	$13,861,882	5.85%
22	30/4/2023	6/5/2023	1.67%	0.83%	6.68%	22	1.67%	0.83%	$30,363,456	6.68%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.31%	6.99%	23	1.67%	0.31%	$11,294,914	6.99%
24	14/5/2023	20/5/2023	1.67%	0.75%	7.74%	24	1.67%	0.75%	$27,168,253	7.74%
25	21/5/2023	27/5/2023	1.67%	1.20%	8.94%	25	1.67%	1.20%	$43,713,028	8.94%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.67%	0.79%	9.73%	26	1.67%	0.79%	$28,760,680	9.73%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.67%	0.80%	10.53%	27	1.67%	0.80%	$29,144,889	10.53%
28	11/6/2023	17/6/2023	1.67%	0.45%	10.98%	28	1.67%	0.45%	$16,560,783	10.98%
29	18/6/2023	24/6/2023	1.67%	0.53%	11.52%	29	1.67%	0.53%	$19,388,185	11.52%
30	25/6/2023	1/7/2023	1.67%	0.17%	11.69%	30	1.67%	0.17%	$6,267,738	11.69%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.67%	2.25%	13.94%	31	1.67%	2.25%	$81,785,033	13.94%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.67%	1.41%	15.35%	32	1.67%	1.41%	$51,449,799	15.35%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.67%	1.22%	16.57%	33	1.67%	1.22%	$44,326,397	16.57%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.67%	2.65%	19.22%	34	1.67%	2.65%	$96,619,522	19.22%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.67%	1.88%	21.11%	35	1.67%	1.88%	$68,604,420	21.11%
36	6/8/2023	12/8/2023	1.67%	0.39%	21.50%	36	1.67%	0.39%	$14,337,494	21.50%
37	13/8/2023	19/8/2023	1.67%	0.29%	21.79%	37	1.67%	0.29%	$10,631,755	21.79%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.67%	0.35%	22.14%	38	1.67%	0.35%	$12,673,318	22.14%
39	27/8/2023	2/9/2023	1.67%	0.73%	22.87%	39	1.67%	0.73%	$26,582,871	22.87%
40	3/9/2023	9/9/2023	1.67%	0.62%	23.49%	40	1.67%	0.62%	$22,472,093	23.49%
41	10/9/2023	16/9/2023	1.67%	0.65%	24.14%	41	1.67%	0.65%	$23,632,656	24.14%
42	17/9/2023	23/9/2023	1.67%	0.94%	25.08%	42	1.67%	0.94%	$34,366,923	25.08%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.67%	1.46%	26.54%	43	1.67%	1.46%	$53,054,584	26.54%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.67%	0.81%	27.35%	44	1.67%	0.81%	$29,472,500	27.35%
45	8/10/2023	14/10/2023	1.67%	0.23%	27.58%	45	1.67%	0.23%	$8,315,874	27.58%
46	15/10/2023	21/10/2023	1.67%	0.16%	27.73%	46	1.67%	0.16%	$5,682,734	27.73%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.67%	0.00%	27.73%	47	1.67%	0.00%	$0	27.73%
48	29/10/2023	4/11/2023	1.67%	0.19%	27.93%	48	1.67%	0.19%	$7,081,751	27.93%

49	5/11/2023	11/11/2023	1.67%	0.87%	28.80%	49	1.67%	0.87%	$31,568,616	28.80%
50	12/11/2023	18/11/2023	1.67%	1.05%	29.84%	50	1.67%	1.05%	$38,064,216	29.84%
51	19/11/2023	25/11/2023	1.67%	0.81%	30.65%	51	1.67%	0.81%	$29,511,676	30.65%
52	26/11/2023	2/12/2023	1.67%	0.00%	30.65%	52	1.67%	0.00%	$0	30.65%
53	3/12/2023	9/12/2023	1.67%	1.30%	31.95%	53	1.67%	1.30%	$47,302,475	31.95%
54	10/12/2023	16/12/2023	1.67%	1.12%	33.07%	54	1.67%	1.12%	$40,589,705	33.07%
55	17/12/2023	23/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	55	1.67%	0.00%	$0	33.07%
56	24/12/2023	30/12/2023	1.67%	0.00%	33.07%	56	1.67%	0.00%	$0	33.07%
57	31/12/2023	6/1/2024	1.67%	0.14%	33.20%	57	1.67%	0.14%	$4,978,669	33.20%
58	7/1/2024	13/1/2024	1.21%	0.40%	33.61%	58	1.21%	0.40%	$14,734,779	33.61%
59	14/1/2024	20/1/2024	1.67%	2.01%	35.62%	59	1.67%	2.01%	$73,310,798	35.62%
60	21/1/2024	27/1/2024	1.67%	1.55%	37.17%	60	1.67%	1.55%	$56,400,287	37.17%
61	28/1/2024	3/2/2024	1.79%	2.68%	39.85%	61	1.79%	2.68%	$97,393,224	39.85%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.67%	7.11%	46.96%	62	1.67%	7.11%	$258,766,595	46.96%
63	11/2/2024	17/2/2024	2.12%	9.20%	56.15%	63	2.12%	9.20%	$334,826,144	56.15%
64	18/2/2024	24/2/2024	1.67%	4.75%	60.91%	64	1.67%	4.75%	$172,955,776	60.91%
65	25/2/2024	2/3/2024	3.08%	3.35%	64.26%	65	3.08%	3.35%	$122,010,003	64.26%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

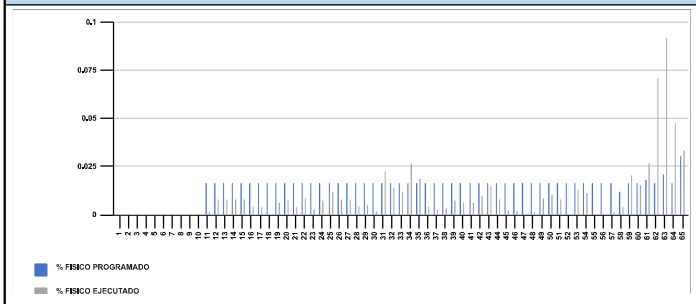

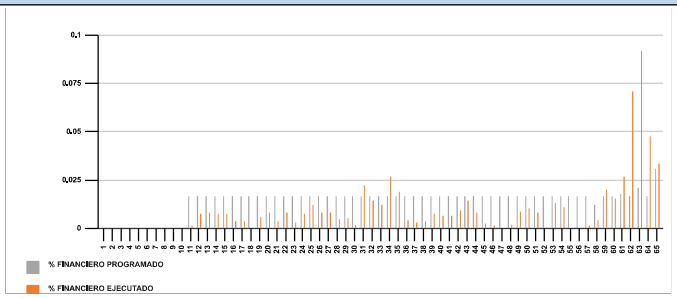

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
MAYOR DE BARRANQUILLA	KR 33 #45 - 71	2024-02-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-26	Instalación de salida de luminarias en aulas. Suministro e instalación de caja de paso de intemperie. Estuco en muro en bloque 3 pisos 1,2,3. Aplicacion de pintura. en bloque 3 pisos 1,2,3.	N/A
		2024-02-27	Pintura en muros de piso 1,2 y 3 de bloque 3. Instalacion de tomacorriente doble en aulas. Suministro e instalación de tablero. Estuco en muro en bloque 3 pisos 1,2,3	N/A
		2024-02-28	Instalación de salida de tomacorrientes. Salida de tomacorriente doble. Pintura en muros de piso 1,2 y 3 de bloque 3. Limpieza general.	N/A
		2024-02-29	Pintura en muros de piso 1,2 y 3 de bloque 3. Salida de tomacorriente doble. Tuberia EMT.	N/A
		2024-03-01	Escarificación de elementos estructurales en concreto en bloque 1 de pisos 1,2,3. Demolición de muros salones 1, 2, 3 bloque 2. Instalación de dovelas en levante de bloque en piso 3.	N/A
		2024-03-02	Escarificación de elementos estructurales en concreto en bloque 1 de pisos 1,2,3. Demolición de muros salones 1, 2, 3 bloque 2. Instalación de dovelas en levante de bloque en piso 3.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	**PRELIMINARES**									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	3520.67		3,520.67		$4,221	-	3,520.67	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	3519.87		2,909.43	610.44	$9,648	5,889,525.12	3,519.87	- 0.00
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3.15		0.84		$252,961	$0	0.84	2.31
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	586		344.06		$20,699	$0	344.06	241.94
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	22.5354		13.31		$266,275	$0	13.31	9.23
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	1449.1		677.06		$32,124	$0	677.06	772.04
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	225.18		224.10		$93,507	$0	224.10	1.08
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	192.81		181.52		$34,062	$0	181.52	11.29
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	45405.50004		31,419.79		$9,568	$0	31,419.79	13,985.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	3152		2,989.00		$40,436	$0	2,989.00	163.00

2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	139.69		123.54		$1,742,818	$0	123.54	16.15
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	658.168		200.45		$99,065	$0	200.45	457.72
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	652		585.00		$27,186	-	585.00	67.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	45.6		-		$48,408	-	-	45.60
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	8.64		8.64		$559,014	-	8.64	-
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	639		639.00		$18,074	$0	639.00	-
3.01	CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1736		1,303.13		$14,939	$0	1,303.13	432.87
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1570		1,172.13		$32,154	$0	1,172.13	397.87
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	1385		1,210.60		$100,669	-	1,210.60	174.40
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	2800		2,201.34		$23,961	-	2,201.34	598.66
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	120		83.27		$39,705	-	83.27	36.73
3.12	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	361.8		210.00		$15,618	-	210.00	151.80
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	32341.3092		16,856.55		$21,652	-	16,856.55	15,484.76
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	16800		14,616.47		$24,307	-	14,616.47	2,183.53
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	1254.6		664.79		$33,985	$0	664.79	589.81
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	570.6		451.73		$39,196	$0	451.73	118.87
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	1200		444.19		$138,761	-	444.19	755.81
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	555.6		113.29		$16,524	-	113.29	442.31
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	1530		1,048.21		$20,865	$0	1,048.21	481.79
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	8600		5,959.35	1,891.96	$17,948	33,956,898.08	7,851.31	748.69
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	8600		4,919.31	2,934.88	$17,384	51,019,953.92	7,854.19	745.81
8.01	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	12		12.00		$32,643	$0	12.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	105		105.00		$19,629	$0	105.00	-
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	82		82.00		$16,601	-	82.00	-
9.04	ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	330		-		$57,278	-	-	330.00
9.10	SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	311		6.00	1.00	$190,755	190,755.00	7.00	304.00
9.11	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220 VAC,EN CABLE 3#10 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	46		2.00	3.00	$282,244	846,732.00	5.00	41.00
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	1389		-		$235,052	-	-	1,389.00

9.14	SALIDA DE INTERUPTOR SENCILLO EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	5		-	2.00	$191,338	382,676.00	2.00	3.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO 220VAC DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIONES	UND	3		-		$872,036	-	-	3.00
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	6		-		$100,299	-	-	6.00
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 220VAC DE 12 CIRCUITOS, NO INCLUYE PROTECCIONES	UND	3		-		$615,867	-	-	3.00
9.24	SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	12		-		$212,527	-	-	12.00
9.36	TUBERIA EMT DE 2" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	110		-		$68,275	-	-	110.00
9.40	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 3#8F+1#8N+1#10T EN TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	85		-		$117,110	-	-	85.00
9.41	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#6F+1#6N+1#10T EN TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	85		-		$121,310	-	-	85.00
9.42	ALIMENTADOR EN CABLE CU THHN/THWN -2 LIBRE DE HALOGENOS EN 2#1/0F+1#1/0N+1#4T EN TUBERIA EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS MARCACION, SEÑALIZACION, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	174		22.00		$283,058	-	22.00	152.00
9.60	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 400A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 125A 1un, 80A 2 un, 60A 2 un 40A 3 un, barrajes FFFNT, 2 reservas, p/planos, f. muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	1		-		$9,564,962	-	-	1.00
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	112		-		$29,990	-	-	112.00
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	6		6.00		$1,488,291	-	6.00	-
NP 19	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	ML	259.21		259.21		$160,366	-	259.21	0.00
NP 24	ESCARIFICIACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	2087.88		2,087.88		$6,641	-	2,087.88	-
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	147.21		147.21		$129,524.7	-	147.21	0.00
NP 61	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	20.52		11.70		$1,913,254.5	-	11.70	8.82
NP 88	ANCLAJE CUÑA FISHER FWA 20/20 X160 045T800	ML	222		222.00		$76,197	-	222.00	-
NP 97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3#3/0F 1#3/0N 1#1/0T AWG THHN/THWN COBRE INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ETIQUETADO.	ML	63		-	63.00	$471,801	29,723,463.00	63.00	-

VALOR DE OBRA	122,010,003.1
INCIDENCIA	3.35%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

MAYOR DE BARRANQUILLA	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Pulidora, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1u9Oo-e4H9_GZvidXnnJnRqnJ3wpYL5mo



https://drive.google.com/open?id=1uQ5RcbWLYJIAqJuZSAL_zuwb2M92q9Mh

FOTO 1	Instalacion elementos eléctricos MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 2	Instalacion elementos eléctricos MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=18Vc6WTP0SD6Z3B6wp0lDQVvE1CEqkwu



https://drive.google.com/open?id=1fx8ZJdDqiSmdsNe-0nqUv2HvJE-CNv

FOTO 3	Aplicación de estuco y pintura MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 4	Aplicación de estuco y pintura MAYOR DE BARRANQUILLA



https://drive.google.com/open?id=1jaNr8kcsgBICDE1ZdB9RfTUUn7OdBWv



https://drive.google.com/open?id=1OIzmYLZJpeSbMt1m2AN0waqY5Rq1Ov_o

FOTO 5	Aplicación de estuco MAYOR DE BARRANQUILLA	FOTO 6	Retiro de material RCD MAYOR DE BARRANQUILLA

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 61**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	18	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	19	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	20	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.10%	48.98%	21	0.85%	0.10%	$4,297,271	48.98%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.04%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.04%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.04%	23	1.67%	0.00%	$0	49.04%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.04%	24	4.50%	0.00%	$0	49.04%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.04%	25	2.43%	0.00%	$0	49.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.04%	26	1.57%	0.00%	$0	49.04%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.51%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.51%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.70%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.70%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.69%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.69%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.36%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.36%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.61%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.61%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.16%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.16%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	58.98%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	58.98%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.74%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.89%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.89%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.19%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.19%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.78%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.78%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.00%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.00%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.06%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.64%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.64%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.40%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.40%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.31%	42	2.05%	1.90%	$84,187,270	99.31%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.42%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.42%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	44	0.00%	0.00%	$0	99.42%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	45	0.00%	0.00%	$0	99.42%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	46	0.00%	0.00%	$0	99.42%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	47	0.00%	0.00%	$0	99.42%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	48	0.00%	0.00%	$0	99.42%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	49	0.00%	0.00%	$0	99.42%

50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	50	0.00%	0.00%	$0	99.42%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	51	0.00%	0.00%	$0	99.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	52	0.00%	0.00%	$0	99.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	53	0.00%	0.00%	$0	99.42%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	54	0.00%	0.00%	$0	99.42%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	55	0.00%	0.00%	$0	99.42%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	56	0.00%	0.00%	$0	99.42%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	57	0.00%	0.00%	$0	99.42%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	58	0.00%	0.00%	$0	99.42%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	59	0.00%	0.00%	$0	99.42%
60	21/1/2024	27/1/2024	0.42%	0.35%	99.77%	60	0.42%	0.35%	$15,609,705	99.77%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.05%	0.05%	99.82%	61	0.05%	0.05%	$2,310,294	99.82%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

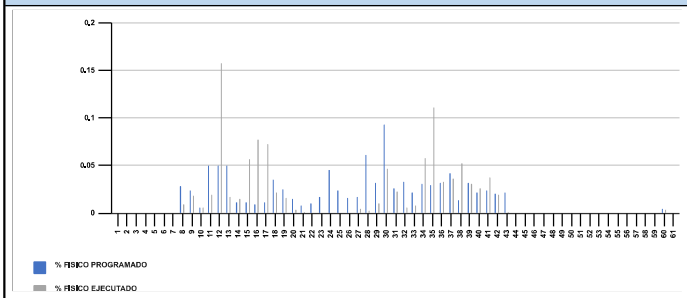

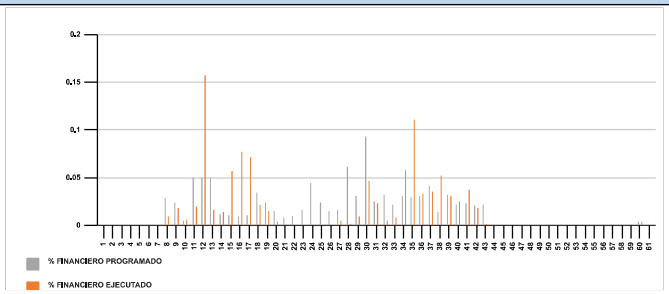

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2024-01-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-01-29	Continúa fundida de cárcamo y fundida de placa en parqueadero. Reinstalación grama paisajismo .	N/A
		2024-01-30	Instalación de lámpara en baño vestier de cocina. Corte de tubería metálica para instalación de rejilla en cuarto de basuras . Arreglo de filtración tubería cárcamos detrás de la sala de profesores.	N/A
		2024-01-31	Plantilla de desnivel en cárcamo bloque número dos para mejorar pendientes.	N/A
		2024-02-01	Plantilla desnivel en cárcamos bloque número dos y bloque número 3 .	N/A
		2024-02-02	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-03	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	34.40		$20,699	-	34.40	320.60
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38		$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00		$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,092.92		$93,507	$0.00	1,092.92	24.66

2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0,15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,579.14		$49,030	$0.00	1,579.14	-17.20
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	1.72		$34,062	-	1.72	148.96
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59		$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	285.29		$9,568	$0.00	285.29	549.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57		$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	6.12	1.72	$99,065	170,391.80	7.84	104.63
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0,06 METROS, ANCHO DE 0,60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0,20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	12.40	3.20	$513,566	1,643,411.20	15.60	224.40
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	461.50		$18,074	$0.00	461.50	-30.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00

2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45		$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63		$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69		$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56		$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18		$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00		$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0,05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58		$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00		$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00		$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00		$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00		$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00		$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00		$55,395	-	893.00	-

9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00		$7,695,992	-	3.00	-
9.63	S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND	1	-	-	1.00	$117,374	117,374.00	1.00	- 1.00
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00		$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00		$29,990	-	208.00	-
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND	12	-	12.00		$51,641	-	12.00	- 12.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	44.8	-	39.15	5.65	$58,180	328,717.00	44.80	- 44.80
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH O SIMILAR	UND	6	-	-		$451,081	-	-	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00		$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75		$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22		$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				-			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
* NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
* NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
* NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
* NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	32.00		$125,227	$0.00	32.00	-
* NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-

NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	4.5	4.5	3.78	0.72	$70,000	50,400.00	4.50	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	218.60		$44,136	-	218.60	- 9.00
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-

NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-
							VALOR DE OBRA	$2,310,294.00		
							INCIDENCIA	0.05%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1DC3CkeVIDlx5xfZPYpIos7JeMMC_HVB1

FOTO 1	Fundida de carcamo NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1nB6POYqGXrraC06CmkoY6zYnAfaxUfuZ

FOTO 2	Reinstalación de grama NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1wMCeTwejlMi760cIAMHWELK56hF9MrU

FOTO 3	Fundida de carcamo NUEVO BOSQUE SEDE 2



https://drive.google.com/open?id=1jHhecvlOof9c0wwATxYzhn1WZ512qHyA

FOTO 4	Placa de contrapiso NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 62**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	18	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	19	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	20	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.10%	48.98%	21	0.85%	0.10%	$4,297,271	48.98%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.04%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.04%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.04%	23	1.67%	0.00%	$0	49.04%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.04%	24	4.50%	0.00%	$0	49.04%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.04%	25	2.43%	0.00%	$0	49.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.04%	26	1.57%	0.00%	$0	49.04%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.51%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.51%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.70%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.70%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.69%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.69%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.36%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.36%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.61%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.61%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.16%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.16%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	58.98%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	58.98%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.74%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.89%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.89%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.19%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.19%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.78%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.78%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.00%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.00%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.06%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.64%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.64%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.40%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.40%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.31%	42	2.05%	1.90%	$84,187,270	99.31%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.42%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.42%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	44	0.00%	0.00%	$0	99.42%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	45	0.00%	0.00%	$0	99.42%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	46	0.00%	0.00%	$0	99.42%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	47	0.00%	0.00%	$0	99.42%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	48	0.00%	0.00%	$0	99.42%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	49	0.00%	0.00%	$0	99.42%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	50	0.00%	0.00%	$0	99.42%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	51	0.00%	0.00%	$0	99.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	52	0.00%	0.00%	$0	99.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	53	0.00%	0.00%	$0	99.42%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	54	0.00%	0.00%	$0	99.42%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	55	0.00%	0.00%	$0	99.42%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	56	0.00%	0.00%	$0	99.42%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	57	0.00%	0.00%	$0	99.42%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	58	0.00%	0.00%	$0	99.42%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	59	0.00%	0.00%	$0	99.42%
60	21/1/2024	27/1/2024	0.42%	0.35%	99.77%	60	0.42%	0.35%	$15,609,705	99.77%

61	28/1/2024	3/2/2024	0.05%	0.05%	99.82%	61	0.05%	0.05%	$2,310,294	99.82%
62	4/2/2024	10/2/2024	0.00%	0.00%	99.82%	62	0.00%	0.00%	$0	99.82%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

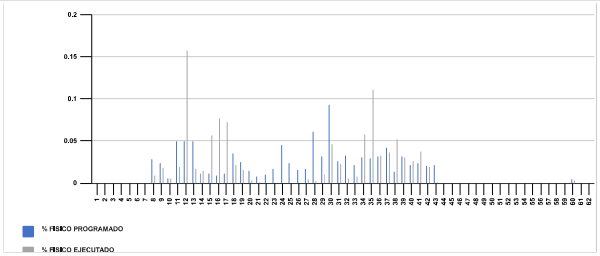

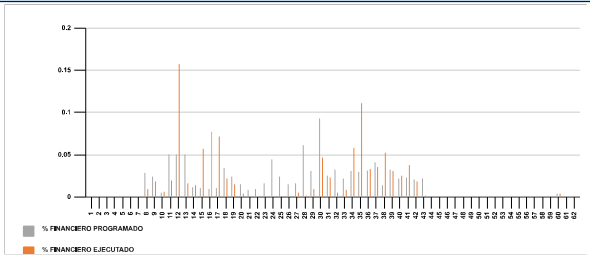

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2024-02-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-05	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-06	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-07	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-08	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-09	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-10	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	34.40		$20,699	-	34.40	320.60
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38		$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00		$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,092.92		$93,507	$0.00	1,092.92	24.66
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,579.14		$49,030	$0.00	1,579.14	-17.20
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	1.72		$34,062	-	1.72	148.96
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59		$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	285.29		$9,568	$0.00	285.29	549.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57		$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	7.84		$99,065	-	7.84	104.63
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	15.60		$513,566	-	15.60	224.40
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	461.50		$18,074	$0.00	461.50	-30.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45		$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63		$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69		$59,248	$0.00	1,347.69	47.55

6.05	ESTUCO PLASTÍCO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56		$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TÍPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18		$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00		$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58		$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00		$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00		$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00		$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00		$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00		$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00		$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00		$7,695,992	-	3.00	-
9.63	S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND	1	-	1.00		$117,374	-	1.00	- 1.00
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00		$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00		$29,990	-	208.00	-
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND	12	-	12.00		$51,641	-	12.00	- 12.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	44.8	-	44.80		$58,180	-	44.80	- 44.80
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TÍPO PUSH O SIMILAR	UND	6	-	-		$451,081	-	-	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00		$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75		$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22		$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				-			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00

	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	32.00		$125,227	$0.00	32.00	-
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
	NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
	NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81
	NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18'' DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
	NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
	NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	4.5	4.5	4.50		$70,000	-	4.50	-
	NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
	NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	218.60		$44,136	-	218.60	- 9.00
	NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
	NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
	NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
	NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
	NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-

NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-
							VALOR DE OBRA	$0.00		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	NO APLICA	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 63**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	4	0,00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	5	0,00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	6	0,00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2.86%	0.94%	0.94%	8	2.86%	0.94%	$39,312,549	0.94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2.39%	1.85%	2.79%	9	2.39%	1.85%	$77,599,760	2.79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5.00%	1.96%	5.34%	11	5.00%	1.96%	$81,987,250	5.34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4.98%	15.75%	21.09%	12	4.98%	15.75%	$660,130,498	21.09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5.00%	1.68%	22.76%	13	5.00%	1.68%	$70,263,431	22.76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1.19%	1.44%	24.20%	14	1.19%	1.44%	$60,208,766	24.20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1.11%	5.68%	29.88%	15	1.11%	5.68%	$237,941,863	29.88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0.91%	7.71%	37.58%	16	0.91%	7.71%	$323,009,100	37.58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1.11%	7.21%	44.80%	17	1.11%	7.21%	$302,426,842	44.80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3.49%	2.16%	46.96%	18	3.49%	2.16%	$90,543,651	46.96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2.47%	1.54%	48.50%	19	2.47%	1.54%	$64,588,307	48.50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1.47%	0.38%	48.88%	20	1.47%	0.38%	$16,004,007	48.88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.85%	0.10%	48.98%	21	0.85%	0.10%	$4,297,271	48.98%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.99%	0.05%	49.04%	22	0.99%	0.05%	$2,268,191	49.04%
23	7/5/2023	13/5/2023	1.67%	0.00%	49.04%	23	1.67%	0.00%	$0	49.04%
24	14/5/2023	20/5/2023	4.50%	0.00%	49.04%	24	4.50%	0.00%	$0	49.04%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.43%	0.00%	49.04%	25	2.43%	0.00%	$0	49.04%
26	28/5/2023	3/6/2023	1.57%	0.00%	49.04%	26	1.57%	0.00%	$0	49.04%
27	4/6/2023	10/6/2023	1.65%	0.47%	49.51%	27	1.65%	0.47%	$20,773,648	49.51%
28	11/6/2023	17/6/2023	6.15%	0.20%	49.70%	28	6.15%	0.20%	$8,795,520	49.70%
29	18/6/2023	24/6/2023	3.12%	0.98%	50.69%	29	3.12%	0.98%	$43,538,904	50.69%
30	25/6/2023	1/7/2023	9.34%	4.67%	55.36%	30	9.34%	4.67%	$206,551,586	55.36%
31	2/7/2023	8/7/2023	2.56%	2.25%	57.61%	31	2.56%	2.25%	$99,578,028	57.61%
32	9/7/2023	15/7/2023	3.26%	0.55%	58.16%	32	3.26%	0.55%	$24,153,673	58.16%
33	16/7/2023	22/7/2023	2.20%	0.83%	58.98%	33	2.20%	0.83%	$36,484,967	58.98%
34	23/7/2023	29/7/2023	3.11%	5.75%	64.74%	34	3.11%	5.75%	$254,306,263	64.74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2.98%	11.15%	75.89%	35	2.98%	11.15%	$493,076,897	75.89%
36	6/8/2023	12/8/2023	3.12%	3.30%	79.19%	36	3.12%	3.30%	$146,115,854	79.19%
37	13/8/2023	19/8/2023	4.14%	3.58%	82.78%	37	4.14%	3.58%	$158,463,112	82.78%
38	20/8/2023	26/8/2023	1.36%	5.22%	88.00%	38	1.36%	5.22%	$230,845,241	88.00%
39	27/8/2023	2/9/2023	3.17%	3.07%	91.06%	39	3.17%	3.07%	$135,536,410	91.06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2.14%	2.58%	93.64%	40	2.14%	2.58%	$113,924,587	93.64%
41	10/9/2023	16/9/2023	2.33%	3.76%	97.40%	41	2.33%	3.76%	$166,330,679	97.40%
42	17/9/2023	23/9/2023	2.05%	1.90%	99.31%	42	2.05%	1.90%	$84,187,270	99.31%
43	24/9/2023	30/9/2023	2.15%	0.11%	99.42%	43	2.15%	0.11%	$4,944,373	99.42%
44	1/10/2023	7/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	44	0.00%	0.00%	$0	99.42%
45	8/10/2023	14/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	45	0.00%	0.00%	$0	99.42%
46	15/10/2023	21/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	46	0.00%	0.00%	$0	99.42%
47	22/10/2023	28/10/2023	0.00%	0.00%	99.42%	47	0.00%	0.00%	$0	99.42%
48	29/10/2023	4/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	48	0.00%	0.00%	$0	99.42%
49	5/11/2023	11/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	49	0.00%	0.00%	$0	99.42%
50	12/11/2023	18/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	50	0.00%	0.00%	$0	99.42%
51	19/11/2023	25/11/2023	0.00%	0.00%	99.42%	51	0.00%	0.00%	$0	99.42%
52	26/11/2023	2/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	52	0.00%	0.00%	$0	99.42%
53	3/12/2023	9/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	53	0.00%	0.00%	$0	99.42%
54	10/12/2023	16/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	54	0.00%	0.00%	$0	99.42%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	55	0.00%	0.00%	$0	99.42%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.00%	0.00%	99.42%	56	0.00%	0.00%	$0	99.42%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	57	0.00%	0.00%	$0	99.42%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	58	0.00%	0.00%	$0	99.42%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.00%	0.00%	99.42%	59	0.00%	0.00%	$0	99.42%
60	21/1/2024	27/1/2024	0.42%	0.35%	99.77%	60	0.42%	0.35%	$15,609,705	99.77%

61	28/1/2024	3/2/2024	0.05%	0.05%	99.82%	61	0.05%	0.05%	$2,310,294	99.82%
62	4/2/2024	10/2/2024	0.00%	0.00%	99.82%	62	0.00%	0.00%	$0	99.82%
63	11/2/2024	17/2/2024	0.00%	0.00%	99.82%	63	0.00%	0.00%	$0	99.82%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

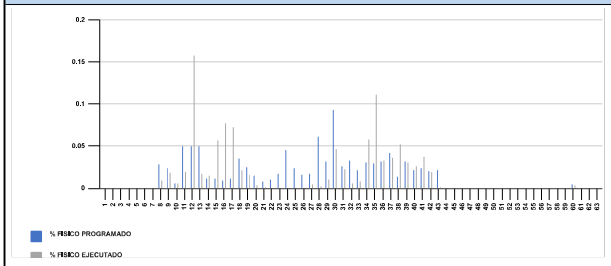

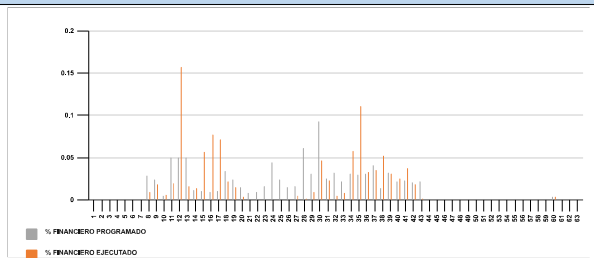

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2024-02-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-17	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63		$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00		$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74		$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00		$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00		$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	34.40		$20,699	-	34.40	320.60
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38		$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00		$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00		$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00		$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00		$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00		$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,092.92		$93,507	$0.00	1,092.92	24.66
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65		$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,579.14		$49,030	$0.00	1,579.14	-17.20
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	1.72		$34,062	-	1.72	148.96
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59		$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13		$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	285.29		$9,568	$0.00	285.29	549.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00		$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57		$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$1,894,074	-	0.00	0.00

2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	7.84		$99,065	-	7.84	104.63
2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49		$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00		$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	15.60		$513,566	-	15.60	224.40
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00		$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00		$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00		$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	461.50		$18,074	$0.00	461.50	-30.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00		$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00		$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90		$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00		$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00		$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00		$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00		$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00		$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00		$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00		$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00		$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00		$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00		$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45		$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63		$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42		$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69		$59,248	$0.00	1,347.69	47.55

6.05	ESTUCO PLASTÍCO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55		$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56		$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TÍPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63		$18,887	$0.00	298.63	-
6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18		$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00		$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58		$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63		$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00		$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00		$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERÍA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00		$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00		$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00		$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00		$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00		$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00		$7,695,992	-	3.00	-
9.63	S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND	1	-	1.00		$117,374	-	1.00	- 1.00
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00		$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00		$29,990	-	208.00	-
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND	12	-	12.00		$51,641	-	12.00	- 12.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	44.8	-	44.80		$58,180	-	44.80	- 44.80
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00		$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TÍPO PUSH O SIMILAR	UND	6	-	-		$451,081	-	-	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00		$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57		$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75		$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22		$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				-			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00

	NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
	NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
	NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
*	NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
*	NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
	NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
*	NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
*	NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00
	NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
	NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	32.00		$125,227	$0.00	32.00	-
*	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
	NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
	NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
	NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
	NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
	NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
	NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
	NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
	NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
	NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
	NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
	NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81
	NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18'' DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
	NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
	NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	4.5	4.5	4.50		$70,000	-	4.50	-
	NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
	NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	218.60		$44,136	-	218.60	- 9.00
	NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
	NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
	NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
	NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
	NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00		$15,663	-	108.00	-

NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-
							VALOR DE OBRA	$0.00		
							INCIDENCIA	0.00%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE NUEVO BOSQUE SEDE 2 No. 64**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	1	0,00%	0,00%	$0	0,00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00%	0,00%	$0	0,00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0,00%	0.00%	0.00%	3	0,00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	$0	0,00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0,00%	0,00%	0,00%	5	0,00%	0,00%	$0	0,00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0,00%	0.00%	0,00%	6	0,00%	0,00%	$0	0,00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0,00%	0.00%	0.00%	7	0,00%	0.00%	$0	0.00%
8	22/1/2023	28/1/2023	2,86%	0,94%	0,94%	8	2,86%	0,94%	$39,312,549	0,94%
9	29/1/2023	4/2/2023	2,39%	1,85%	2,79%	9	2,39%	1,85%	$77,599,760	2,79%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.54%	0.59%	3.38%	10	0.54%	0.59%	$24,854,496	3.38%
11	12/2/2023	18/2/2023	5,00%	1,96%	5,34%	11	5,00%	1,96%	$81,987,250	5,34%
12	19/2/2023	25/2/2023	4,98%	15.75%	21,09%	12	4,98%	15.75%	$660,130,498	21,09%
13	26/2/2023	4/3/2023	5,00%	1,68%	22,76%	13	5,00%	1,68%	$70,263,431	22,76%
14	5/3/2023	11/3/2023	1,19%	1,44%	24,20%	14	1,19%	1,44%	$60,208,766	24,20%
15	12/3/2023	18/3/2023	1,11%	5,68%	29,88%	15	1,11%	5,68%	$237,941,863	29,88%
16	19/3/2023	25/3/2023	0,91%	7,71%	37,58%	16	0,91%	7,71%	$323,009,100	37,58%
17	26/3/2023	1/4/2023	1,11%	7,21%	44,80%	17	1,11%	7,21%	$302,426,842	44,80%
18	2/4/2023	8/4/2023	3,49%	2,16%	46,96%	18	3,49%	2,16%	$90,543,651	46,96%
19	9/4/2023	15/4/2023	2,47%	1,54%	48,50%	19	2,47%	1,54%	$64,588,307	48,50%
20	16/4/2023	22/4/2023	1,47%	0,38%	48,88%	20	1,47%	0,38%	$16,004,007	48,88%
21	23/4/2023	29/4/2023	0,85%	0,10%	48,98%	21	0,85%	0,10%	$4,297,271	48,98%
22	30/4/2023	6/5/2023	0,99%	0,05%	49,04%	22	0,99%	0,05%	$2,268,191	49,04%
23	7/5/2023	13/5/2023	1,67%	0,00%	49,04%	23	1,67%	0,00%	$0	49,04%
24	14/5/2023	20/5/2023	4,50%	0,00%	49,04%	24	4,50%	0,00%	$0	49,04%
25	21/5/2023	27/5/2023	2,43%	0,00%	49,04%	25	2,43%	0,00%	$0	49,04%
26	28/5/2023	3/6/2023	1,57%	0,00%	49,04%	26	1,57%	0,00%	$0	49,04%
27	4/6/2023	10/6/2023	1,65%	0,47%	49,51%	27	1,65%	0,47%	$20,773,648	49,51%
28	11/6/2023	17/6/2023	6,15%	0,20%	49,70%	28	6,15%	0,20%	$8,795,520	49,70%
29	18/6/2023	24/6/2023	3,12%	0,98%	50,69%	29	3,12%	0,98%	$43,538,904	50,69%
30	25/6/2023	1/7/2023	9,34%	4,67%	55,36%	30	9,34%	4,67%	$206,551,586	55,36%
31	2/7/2023	8/7/2023	2,56%	2,25%	57,61%	31	2,56%	2,25%	$99,578,028	57,61%
32	9/7/2023	15/7/2023	3,26%	0,55%	58,16%	32	3,26%	0,55%	$24,153,673	58,16%
33	16/7/2023	22/7/2023	2,20%	0,83%	58,98%	33	2,20%	0,83%	$36,484,967	58,98%
34	23/7/2023	29/7/2023	3,11%	5,75%	64,74%	34	3,11%	5,75%	$254,306,263	64,74%
35	30/7/2023	5/8/2023	2,98%	11,15%	75,89%	35	2,98%	11,15%	$493,076,897	75,89%
36	6/8/2023	12/8/2023	3,12%	3,30%	79,19%	36	3,12%	3,30%	$146,115,854	79,19%
37	13/8/2023	19/8/2023	4,14%	3,58%	82,78%	37	4,14%	3,58%	$158,463,112	82,78%
38	20/8/2023	26/8/2023	1,36%	5,22%	88,00%	38	1,36%	5,22%	$230,845,241	88,00%
39	27/8/2023	2/9/2023	3,17%	3,07%	91,06%	39	3,17%	3,07%	$135,536,410	91,06%
40	3/9/2023	9/9/2023	2,14%	2,58%	93,64%	40	2,14%	2,58%	$113,924,587	93,64%
41	10/9/2023	16/9/2023	2,33%	3,76%	97,40%	41	2,33%	3,76%	$166,330,679	97,40%
42	17/9/2023	23/9/2023	2,05%	1,90%	99,31%	42	2,05%	1,90%	$84,187,270	99,31%
43	24/9/2023	30/9/2023	2,15%	0,11%	99,42%	43	2,15%	0,11%	$4,944,373	99,42%
44	1/10/2023	7/10/2023	0,00%	0,00%	99,42%	44	0,00%	0,00%	$0	99,42%
45	8/10/2023	14/10/2023	0,00%	0,00%	99,42%	45	0,00%	0,00%	$0	99,42%
46	15/10/2023	21/10/2023	0,00%	0,00%	99,42%	46	0,00%	0,00%	$0	99,42%
47	22/10/2023	28/10/2023	0,00%	0,00%	99,42%	47	0,00%	0,00%	$0	99,42%
48	29/10/2023	4/11/2023	0,00%	0,00%	99,42%	48	0,00%	0,00%	$0	99,42%
49	5/11/2023	11/11/2023	0,00%	0,00%	99,42%	49	0,00%	0,00%	$0	99,42%
50	12/11/2023	18/11/2023	0,00%	0,00%	99,42%	50	0,00%	0,00%	$0	99,42%
51	19/11/2023	25/11/2023	0,00%	0,00%	99,42%	51	0,00%	0,00%	$0	99,42%
52	26/11/2023	2/12/2023	0,00%	0,00%	99,42%	52	0,00%	0,00%	$0	99,42%
53	3/12/2023	9/12/2023	0,00%	0,00%	99,42%	53	0,00%	0,00%	$0	99,42%
54	10/12/2023	16/12/2023	0,00%	0,00%	99,42%	54	0,00%	0,00%	$0	99,42%
55	17/12/2023	23/12/2023	0,00%	0,00%	99,42%	55	0,00%	0,00%	$0	99,42%
56	24/12/2023	30/12/2023	0,00%	0,00%	99,42%	56	0,00%	0,00%	$0	99,42%
57	31/12/2023	6/1/2024	0,00%	0,00%	99,42%	57	0,00%	0,00%	$0	99,42%
58	7/1/2024	13/1/2024	0,00%	0,00%	99,42%	58	0,00%	0,00%	$0	99,42%
59	14/1/2024	20/1/2024	0,00%	0,00%	99,42%	59	0,00%	0,00%	$0	99,42%
60	21/1/2024	27/1/2024	0,42%	0,35%	99,77%	60	0,42%	0,35%	$15,609,705	99,77%
61	28/1/2024	3/2/2024	0,05%	0,05%	99,82%	61	0,05%	0,05%	$2,310,294	99,82%
62	4/2/2024	10/2/2024	0,00%	0,00%	99,82%	62	0,00%	0,00%	$0	99,82%
63	11/2/2024	17/2/2024	0,00%	0,00%	99,82%	63	0,00%	0,00%	$0	99,82%

64	18/2/2024	24/2/2024	0.17%	0.17%	100.00%	64	0.17%	0.17%	$7,575,818	100.00%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO





3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
NUEVO BOSQUE SEDE 2	KR 6 A # 60 B - 59	2024-02-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-19	Se realiza suministro e instalacion de rejillas para carcamos en bloque # 2 y carcamos de acceso peatonal.	N/A
		2024-02-20	Se realiza sondeo de tuberias de registros de cocina y limpieza de los mismos por taponamiento.	N/A
		2024-02-21	Se culminaron las actividades estipuladas a la fecha dentro del alcance del presente contrato de obra a ejecutar en la IED Nuevo Bosque Pies Descalzos.	N/A
		2024-02-22	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-23	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-24	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	2013	4,408.63	4,378.63	-	$4,221	$0.00	4,378.63	30.00
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	7	105.00	105.00	-	$454,545	$0.00	105.00	-
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	140	4,156.24	3,930.74	-	$9,648	$0.00	3,930.74	225.50
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	0	213.00	213.00	-	$25,396	$0.00	213.00	-
2	ESTRUCTURA									
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	0		0.00	0.00	$252,961	-	0.00	0.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	34.4	355.00	34.40	0.00	$20,699	-	34.40	320.60
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	33.15	425.88	387.38	0.00	$20,853	$0.00	387.38	38.50
2.04	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	33	388.00	388.00	0.00	$20,794	$0.00	388.00	0.00
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	0	695.00	0.00	0.00	$266,275	-	0.00	695.00
2.06	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M	M2	0		0.00	0.00	$32,124	-	0.00	0.00
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	0		0.00	0.00	$25,547	-	0.00	0.00
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	64.87	75.00	0.00	0.00	$16,513	-	0.00	75.00
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	76.59	1,117.58	1,092.92	0.00	$93,507	$0.00	1,092.92	24.66
2.10	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	108.11	1,578.18	1,463.65	0.00	$90,362	$0.00	1,463.65	114.53
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	162.01	1,561.94	1,579.14	0.00	$49,030	$0.00	1,579.14	-17.20
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	60.32	150.68	1.72	0.00	$34,062	-	1.72	148.96
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	60.3205	2,398.59	2,398.59	0.00	$192,928	$0.00	2,398.59	0.00
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	0	921.13	921.13	0.00	$54,171	$0.00	921.13	0.00
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	285.29	835.00	285.29	0.00	$9,568	$0.00	285.29	549.71
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	513	514.00	0.00	0.00	$40,436	-	0.00	514.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0.57	0.57	0.57	0.00	$894,392	-	0.57	0.00
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,742,818	-	0.00	0.00
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$1,894,074	-	0.00	0.00
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	7.84	112.47	7.84	0.00	$99,065	-	7.84	104.63

2.21	RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS.	MT2	56.49	61.14	56.49	0.00	$260,694	-	56.49	4.65
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	0		0.00	0.00	$149,548	-	0.00	0.00
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0,50M, ANCHO 0,80M, INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	15.605	240.00	15.60	0.00	$513,566	-	15.60	224.40
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	88	88.00	88.00	0.00	$27,186	$0.00	88.00	0.00
2.25	ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$48,408	-	0.00	0.00
2.26	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	ML	0		0.00	0.00	$274,649	-	0.00	0.00
2.27	RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO	MT2	34.7		0.00	0.00	$559,014	-	0.00	0.00
2.28	CORTE DE LOSA EN CONCRETO	ML	64.7	431.50	461.50	0.00	$18,074	$0.00	461.50	-30.00
2.29	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	0		0.00	0.00	$229,078	-	0.00	0.00
2.30	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0		0.00	0.00	$154,549	-	0.00	0.00
2.31	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	22.9	22.90	22.90	0.00	$154,549	$0.00	22.90	0.00
2.32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	0		0.00	0.00	$113,318	-	0.00	0.00
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	30.81		0.00	0.00	$1,933,197	-	0.00	0.00
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	32		0.00	0.00	$190,540	-	0.00	0.00
2.35	ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0		0.00	0.00	$351,058	-	0.00	0.00
2.36	FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	MT3	0		0.00	0.00	$1,254,738	-	0.00	0.00
2.37	SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO	ML	0		0.00	0.00	$28,100	-	0.00	0.00
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	0		0.00	0.00	$9,165	-	0.00	0.00
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	0		0.00	0.00	$813,350	-	0.00	0.00
2.40	LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI.	MT2	0		0.00	0.00	$354,181	-	0.00	0.00
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	0		0.00	0.00	$3,219,697	-	0.00	0.00
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	691.45	691.45	691.45	-	$13,644	-	691.45	-
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	45.63	45.63	45.63	-	$23,961	-	45.63	-
5.01	PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.	M2	0	1,765.79	661.42	-	$96,354	$0.00	661.42	1,104.37
5.13	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	MT2	1692	1,395.24	1,347.69	-	$59,248	$0.00	1,347.69	47.55
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,948	-	140.55	-
6.06	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	MT2	140.55	140.55	140.55	-	$17,384	-	140.55	-
6.07	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	MT2	472.56	472.56	472.56	-	$20,720	-	472.56	0.00
6.08	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	MT2	0	298.63	298.63	-	$18,887	$0.00	298.63	-

6.09	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A DOS MANOS	MT2	295.18	317.90	295.18	-	$20,457	-	295.18	22.72
6.10	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	180	180.00	180.00	-	$5,765	-	180.00	-
6.11	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS	MT2	27.85	496.58	496.58	-	$32,600	$0.00	496.58	0.00
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	MT2		298.63	298.63	-	$67,320	$0.00	298.63	-
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PARA LA FABRICACION DE DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRÍLICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	UND	6	6.00	6.00	-	$5,040,480	-	6.00	-
9.01	DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS	UND	0	57.00	57.00	-	$19,629	$0.00	57.00	-
9.08	TUBERIA EMT DE 1" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	187	187.00	187.00	-	$40,541	-	187.00	-
9.09	TUBERIA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	835	835.00	835.00	-	$27,090	-	835.00	-
9.13	SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	6	6.00	6.00	-	$235,052	-	6.00	-
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE INTERPERIE DE 240 X 310 X 120	UND	50	50.00	50.00	-	$100,299	-	50.00	-
9.52	ALIMENTADOR EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", CABLE AISLADO 3 LINEAS #12 DE 110 VOLTIOS, LIBRE DE HALOGENOS	ML	893	893.00	893.00	-	$55,395	-	893.00	-
9.57	S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE.	UND	3	3.00	3.00	-	$7,695,992	-	3.00	-
9.63	S.E.I. PANEL LED REDONDO Rd 24w Luz Blanca 100-240v 1600 Lúmenes incluye accesorios y elementos de soporte o fijacion.	UND	1	-	1.00	-	$117,374	-	1.00	- 1.00
9.64	S.E.I. CABLE UTP CAT 6 MARCA SIEMON O SIMILAR	ML	580.5	120.00	120.00	-	$39,900	-	120.00	-
9.65	S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES	UND	208	208.00	208.00	-	$29,990	-	208.00	-
10.08	LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO PESADO.	UND	12	-	12.00	-	$51,641	-	12.00	- 12.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	44.8	-	44.80	-	$58,180	-	44.80	- 44.80
10.19	CARCAMO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI H EFECTIVA =1,0M ANCHO 0,5 INCLUYE REJILLAS EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO CON CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1" - 1/2" X 1/8", MARCO EN ANGULO DE 1" X 1/8" Y PLATINA DE 1" X 1/8", NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0	267.65	255.00	-	$534,334	$0.00	255.00	12.65
10.23	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH O SIMILAR	UND	6	-	-	-	$451,081	-	-	-
10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC ≥ 0.15 X 0.15 METROS	UND	41	41.00	41.00	-	$43,887	-	41.00	-
11.01	MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES INCLUYE PLANTAS DE ORNAMETACION, CESPED Y ARENA NEGRA	MT2	450	450.00	276.57	-	$136,534	$0.00	276.57	173.43
11.02	ORNAMENTACIÓN Y JARDINERÍA - RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE	MT3	135	135.00	29.75	-	$146,312	-	29.75	105.25
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES	M2	144	789.40	766.22	-	$160,737	$0.00	766.22	23.18
13	NO PREVISTOS				-			-	0%	0%
NP 1	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 15 MBH 18000 BTU	UND	5	10	7.00		$6,216,101	$0.00	7.00	3.00
NP 2	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 48 MBH 24000 BTU	UND	10	20	12.00		$7,849,119	$0.00	12.00	8.00
NP 3	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 36 MBH 0 36000 BTU	UND	4	4	4.00		$10,977,640	$0.00	4.00	-
NP 4	SUMINISTRO AIRE MINISPLIT 28 MBH *2 0 60000 BTU	UND	34	34	34.00		$16,129,708	$0.00	34.00	-
* NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA K 1/2"	ML	215	668.25	215.00		$364,167	$0.00	215.00	453.25
* NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 5/8"	ML	188	188	113.00		$435,841	$0.00	113.00	75.00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 3/4"	ML	108.51	108.51	108.51		$439,158	$0.00	108.51	-
* NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 7/8"	ML	424.01	424.01	285.00		$771,685	$0.00	285.00	139.01
* NP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA K 1 1/8"	ML	253.8	253.8	158.15		$878,506	$0.00	158.15	95.65
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO 80X40X15CM	ML	668.25	668.25	648.25		$120,900	$0.00	648.25	20.00

NP 12	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 1-1/2", 2" X 0.15 MT SOBRE LOSA Y MURO	UND	6	6	6.00		$65,771	$0.00	6.00	-
NP 13	PERFORACIONES EN CONCRETO CON TALADRO EXTRACTOR DE NUCLEO Y BROCA DIAMANTADA DE 3" 4" 5" X 0.15 MTS SOBRE LOSA Y MURO	UND	32	32	32.00		$125,227	$0.00	32.00	-
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR EN PLATINA DE 2X 1/4, INCLUYE VARILLA REDONDA LISA 5/8, SOLDADURA 6011, ANTICORROSIVO, ESMALTE, DISCO DE CORTE, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS.	M2	187.07	187.07	11.75		$1,057,000	$0.00	11.75	175.32
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1/2" X cal 16 Y MARCO EN ANGULO 1-1/4" X 1/8". ANCHOS VARIABLES ENTRE 0.30 MT, 0.44 MT Y 0.80 MT DE LONGITUD, PINTURA EN ZINC Y ACABADO EN ESMALTE NEGRO. INCLUYE EL DESBASTE DE ACABADO DE PISO, EL CORTE Y PERFILAMIENTO DE CANAL EN CONCRETO Y LIMPIEZA DEL CANAL	UND	14.61		-	14.61	$424,194	$6,197,474.34	14.61	- 14.61
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GUIA 20X20 X 0.06	ML	349.9	349.9	349.90		$38,562.5	$0.00	349.90	-
NP 43	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI 0.30X0.15 ACERO 3/8	ML	37.9	37.9	37.90		$116,560.1	$0.00	37.90	-
NP 44	ANDEN EN ADOQUIN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE .15*.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA .32 METROS	M2	740.65	740.65	740.65		$200,000.0	$0.00	740.65	-
NP 45	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	102.3	102.3	102.30		$112,944.7	$0.00	102.30	-
NP 46	MEDIA CAÑA EN MORTERO DE 1:4 CUBIERTA CON SIKA 1	ML	117.3	117.3	102.30		$21,825.0	$0.00	102.30	15.00
NP 47	ANTEPECHO EN MURO DE BLOQUE CATALAN CONCRETO 14X9X29 CON MORTERO 1:3	ML	102.3	102.3	102.30		$129,524.7	$0.00	102.30	-
NP 48	LIMPIEZA DE MUROS CON ÁCIDO NÍTRICO	M2	102.3	102.3	102.30		$42,793.0	$0.00	102.30	-
NP 49	RAMPA VEHICULAR INCLUYE VIGAS DE CIMENTACION .20X.20 EN CONCRETO 3500 PSI 4 VARILLAS 1/2 Y ESTRIBOS DE 3/8 C/A .20 , PLACA EN CONCRETO 3500 PSI E. .30M CON VARILLAS 1/2	M2	26.57	26.57	26.57		$302,694.0	$0.00	26.57	-
NP 50	ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA	M2	246.2	246.2	156.49		$127,378.5	$0.00	156.49	89.71
NP 53	NIVELACION Y ADECUACION DE REGISTROS (AGUAS LLUVIAS, SANITARIOS Y ELECTRICOS)	UND	17	17	17.00		$510,721.9	-	17.00	-
NP 54	ASEO VERTICAL	M2	20207.81	20207.81	16,291.00		$5,078.3	-	16,291.00	3,916.81
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DOBLE ALTURA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO CON CUCHILLAS , LA INSTALACION INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE ½ A ¼ , TENSORES DE ¼ TORNILLOS DE ANCLAJES DE 3/8 X2 Y 2 ½ . ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 ALTURA DE INSTALACION > 6 MTS	ML	331.3	331.3	187.00		$190,000.0	-	187.00	144.30
NP 58	FABRICACION E INSTALACION ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA RIGID METAL , INCLUYE SOLDADURA Y DEMAS ACCESORIO (RETIE)	UND	1	1	1.00		$1,898,400.0	-	1.00	-
NP 65	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 METROS	M2	4.5	4.5	4.50		$70,000	-	4.50	-
NP 63	PISO BLANDO	M2	77.15	77.15	77.15		$300,000	-	77.15	-
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN DRYWALL 1 CARA	ML	218.6	209.6	218.60		$44,136	-	218.60	- 9.00
NP 67	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL	M2	265.69	265.69	265.69		$9,000	-	265.69	-
NP 68	CORTE DEMOLICION RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS REGATAS TUBERIA AA	ML	105.4105	105.41	105.41		$40,000	-	105.41	- 0.00
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4" RDE 21	ML	476	476	476.00		$49,185	-	476.00	-
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	121	121	121.00		$51,273	-	121.00	-
NP 71	SONDEO DE TUBERIAS DE CARCAMOS Y REGISTROS	ML	196	108	108.00	88.00	$15,663	1,378,344.00	196.00	- 88.00
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	ML	675	675	675.00		$118,104	-	675.00	-
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" CON ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	694	694	694.00		$128,434	-	694.00	-
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3" CON ALIMENTADOR 3#4/0F 1#2/0T AWG THHN/THWN EN ALUMINIO SERIE 8000 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	392	392	392.00		$401,408	-	392.00	-

NP 75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 3#10 AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$107,000	-	187.00	-
NP 76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 3/4" INCLUYE ALIMENTADOR 2#8 1#10T AWG THHN/THWN LIBRE DE HALOGENOS CONECTOR CORAZA 3/4" Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	187	187	187.00		$127,000	-	187.00	-
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE JACK CAT 6 RJ45 INLCUYE FACE PLATE DOBLE	UND	157	157	157.00		$52,469.3	-	157.00	-
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PUERTO HDMI	UND	12	12	12.00		$159,757	-	12.00	-
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 11RU (RACK)	UND	2	2	2.00		$5,926,990	-	2.00	-
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS NEMA 5-15 POLO A TIERRA	UND	4	4	4.00		$877,646	-	4.00	-
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS CDP 1,5 K VA/ ++600W	UND	2	2	2.00		$3,373,256	-	2.00	-
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACION DE Wi-Fi UBIQUITI U6-Lite WiFi6 x Mbps ENTERPRISE AP OUTDOOR	UND	13	13	13.00		$3,290,184	-	13.00	-
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6	ML	95	95	95.00		$51,974	-	95.00	-
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	229	229	229.00		$85,699	-	229.00	-
NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2"	ML	78	78	78.00		$58,881	-	78.00	-
							VALOR DE OBRA	$7,575,818.34		
							INCIDENCIA	0.17%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NUEVO BOSQUE SEDE 2	Anderson Saavedra	Daniel Cantillo	Herramientas menores, Andamios	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

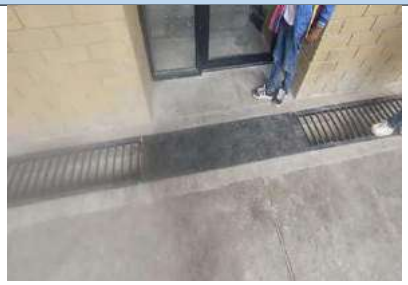


FOTO 1 — Cárcamos de acceso peatonal. NUEVO BOSQUE SEDE 2



FOTO 2 — Rejillas para carcamos NUEVO BOSQUE SEDE 2



FOTO 3 — Sondeo de tuberías de registros de cocina y limpieza NUEVO BOSQUE SEDE 2



FOTO 4 — Sondeo de tuberías de registros de cocina y limpieza NUEVO BOSQUE SEDE 2

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE: DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 61**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	28	AL	3

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.82%	6.81%	11.19%	13	0.82%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.75%	5.17%	16.35%	14	0.75%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.91%	0.95%	17.31%	15	0.91%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.30%	0.49%	17.80%	16	1.30%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.83%	0.42%	18.22%	17	0.83%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.71%	0.00%	18.22%	18	0.71%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.30%	0.96%	19.18%	19	0.30%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.54%	1.14%	20.33%	20	0.54%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.93%	0.43%	20.76%	21	0.93%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.66%	1.24%	21.99%	22	0.66%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.37%	1.15%	23.14%	23	4.37%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.02%	1.80%	24.94%	24	3.02%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.49%	26.43%	25	2.63%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.15%	2.43%	28.86%	26	2.15%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.79%	0.50%	29.35%	27	2.79%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.87%	1.78%	31.13%	28	2.87%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.31%	1.40%	32.54%	29	2.31%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.31%	1.76%	34.30%	30	2.31%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.94%	1.22%	35.52%	31	1.94%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.22%	1.14%	36.65%	32	1.22%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.22%	2.93%	39.59%	33	1.22%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.27%	6.29%	45.87%	34	1.27%	6.29%	$75,121,988	45.87%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.21%	6.72%	52.59%	35	1.21%	6.72%	$80,320,133	52.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.15%	1.33%	53.92%	36	0.15%	1.33%	$15,903,177	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.15%	2.38%	56.30%	37	0.15%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.14%	0.71%	57.02%	38	0.14%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.16%	0.35%	57.37%	39	0.16%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.33%	0.19%	57.55%	40	0.33%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.88%	0.50%	58.05%	41	0.88%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.98%	0.51%	58.56%	42	0.98%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.14%	6.27%	64.83%	43	1.14%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.16%	6.90%	71.73%	44	1.16%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.03%	8.19%	79.92%	45	3.03%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.82%	0.47%	80.39%	46	3.82%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.74%	0.00%	80.39%	47	1.74%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.02%	0.12%	80.52%	48	2.02%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	5.91%	0.24%	80.76%	49	5.91%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	6.71%	0.25%	81.01%	50	6.71%	0.25%	$2,996,515	81.01%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.65%	0.00%	81.01%	51	6.65%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	6.13%	0.14%	81.14%	52	6.13%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	5.22%	0.00%	81.14%	53	5.22%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.32%	0.06%	81.21%	54	2.32%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.40%	0.00%	81.21%	55	0.40%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.33%	0.00%	81.21%	56	0.33%	0.00%	$0	81.21%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.31%	0.00%	81.21%	57	0.31%	0.00%	$0	81.21%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.42%	0.00%	81.21%	58	0.42%	0.00%	$0	81.21%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.38%	0.00%	81.21%	59	0.38%	0.00%	$0	81.21%

60	21/1/2024	27/1/2024	0.58%	0.19%	81.39%	60	0.58%	0.19%	$2,232,053	81.39%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.69%	1.59%	82.98%	61	0.69%	1.59%	$18,974,925	82.98%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

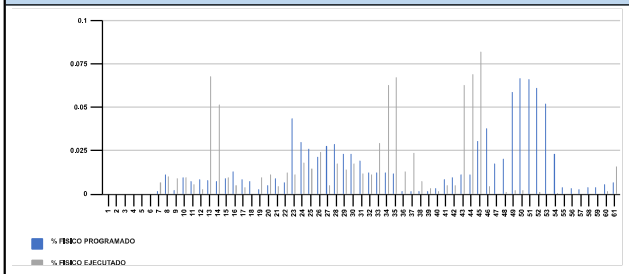

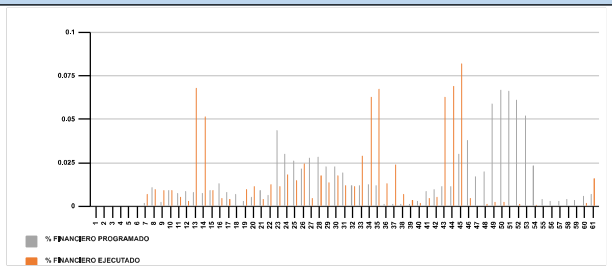

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2024-01-28	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-01-29	Pañete sobre muro. Levante en mampostería.	N/A
		2024-01-30	Pañete sobre muro. Levante en mampostería.	N/A
		2024-01-31	Pañete sobre muro. Levante en mampostería.	N/A
		2024-02-01	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros.	N/A
		2024-02-02	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros.	N/A
		2024-02-03	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21		$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00		$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05		$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94		$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90		$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80		$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22		$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74		$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86		$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00		$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46

2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04		$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64		$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80		$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17		$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60		$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		14.24	17.38	$92,552	1,608,553.76	31.62	788.74
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29		$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		983.49	55.24	$23,961	1,323,605.64	1,038.73	85.27
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33		$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80		$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08		$21,652	-	3,773.08	5,701.82

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02		$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06		$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55		$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79		$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00		$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80		$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73		$20,865	-	86.73	468.43
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		-	186.15	$17,948	3,341,020.20	186.15	369.01
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00		$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00		$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00		$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1,20 X 1,20 X 1,50 METROS, EN BLOQUE DE 0,15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00		$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00		$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00		$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00		$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00		$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00		$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00		$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00		$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750.0	-	82.80	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	302.33			94.14	$134,924	12,701,745.36	94.14	208.19
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	143.24				$39,518	-	-	143.24
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.02				$806,382.6	-	-	1.02
							VALOR DE OBRA	18,974,924.96		
							INCIDENCIA	1.59%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1PsuYOnVYPeDHTPkKekTbQ1F4C

FOTO 1	Levante en mamposteria. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1bRMeJeNeeSEIpIoyVeuYTDbSeJ1aMNq

FOTO 2	Pañete sobre muro. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1QJ9yoOqKyJeJ4Nn2OqhFBeBjH4P

FOTO 3	Estuco plastico sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1h92NEZmaNJAaLa-eFtdVuTjvMyZ4JlKl

FOTO 4	Instalación de piso en granito. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 62**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	4	AL	10

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024

2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.82%	6.81%	11.19%	13	0.82%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.75%	5.17%	16.35%	14	0.75%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.91%	0.95%	17.31%	15	0.91%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.30%	0.49%	17.80%	16	1.30%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.83%	0.42%	18.22%	17	0.83%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.71%	0.00%	18.22%	18	0.71%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.30%	0.96%	19.18%	19	0.30%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.54%	1.14%	20.33%	20	0.54%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.93%	0.43%	20.76%	21	0.93%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.66%	1.24%	21.99%	22	0.66%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.37%	1.15%	23.14%	23	4.37%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.02%	1.80%	24.94%	24	3.02%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.49%	26.43%	25	2.63%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.15%	2.43%	28.86%	26	2.15%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.79%	0.50%	29.35%	27	2.79%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.87%	1.78%	31.13%	28	2.87%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.31%	1.40%	32.54%	29	2.31%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.31%	1.76%	34.30%	30	2.31%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.94%	1.22%	35.52%	31	1.94%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.22%	1.14%	36.65%	32	1.22%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.22%	2.93%	39.59%	33	1.22%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.27%	6.29%	45.87%	34	1.27%	6.29%	$75,121,988	45.87%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.21%	6.72%	52.59%	35	1.21%	6.72%	$80,320,133	52.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.15%	1.33%	53.92%	36	0.15%	1.33%	$15,903,177	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.15%	2.38%	56.30%	37	0.15%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.14%	0.71%	57.02%	38	0.14%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.16%	0.35%	57.37%	39	0.16%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.33%	0.19%	57.55%	40	0.33%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.88%	0.50%	58.05%	41	0.88%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.98%	0.51%	58.56%	42	0.98%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.14%	6.27%	64.83%	43	1.14%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.16%	6.90%	71.73%	44	1.16%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.03%	8.19%	79.92%	45	3.03%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.82%	0.47%	80.39%	46	3.82%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.74%	0.00%	80.39%	47	1.74%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.02%	0.12%	80.52%	48	2.02%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	5.91%	0.24%	80.76%	49	5.91%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	6.71%	0.25%	81.01%	50	6.71%	0.25%	$2,996,515	81.01%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.65%	0.00%	81.01%	51	6.65%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	6.13%	0.14%	81.14%	52	6.13%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	5.22%	0.00%	81.14%	53	5.22%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.32%	0.06%	81.21%	54	2.32%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.40%	0.00%	81.21%	55	0.40%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.33%	0.00%	81.21%	56	0.33%	0.00%	$0	81.21%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.31%	0.00%	81.21%	57	0.31%	0.00%	$0	81.21%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.42%	0.00%	81.21%	58	0.42%	0.00%	$0	81.21%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.38%	0.00%	81.21%	59	0.38%	0.00%	$0	81.21%

60	21/1/2024	27/1/2024	0.58%	0.19%	81.39%	60	0.58%	0.19%	$2,232,053	81.39%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.69%	1.59%	82.98%	61	0.69%	1.59%	$18,974,925	82.98%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.73%	1.30%	84.28%	62	1.73%	1.30%	$15,478,152	84.28%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

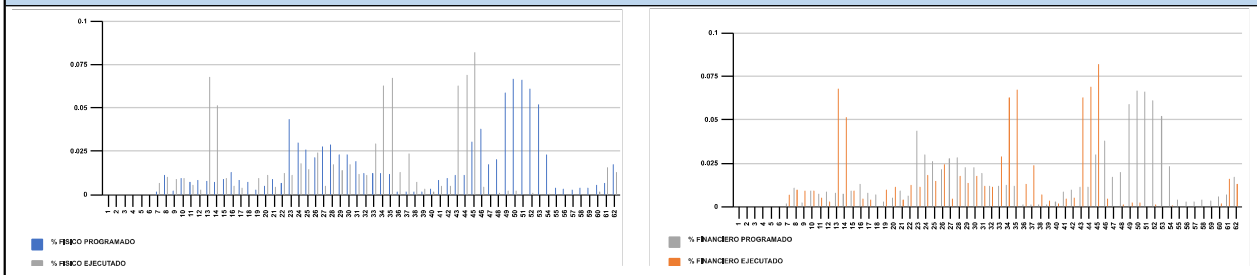

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2024-02-04	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-05	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-06	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-07	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-08	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-09	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-10	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21		$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00		$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05		$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94		$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90		$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80		$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22		$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74		$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86		$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00		$40,436	-	112.00	336.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46

2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04		$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64		$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80		$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17		$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60		$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		31.62	13.23	$92,552	1,224,462.96	44.85	775.51
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29		$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		1,038.73	41.12	$23,961	985,276.32	1,079.85	44.15
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33		$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80		$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08		$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02		$24,307	-	6,465.02	16,694.39

5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06		$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55		$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79		$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00		$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80		$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73		$20,865	-	86.73	468.43
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		186.15	144.26	$17,948	2,589,178.48	330.41	224.75
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00		$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00		$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00		$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00		$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00		$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00		$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00		$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00		$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00		$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00		$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00		$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750.0	-	82.80	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	302.33			79.15	$134,924	10,679,234.60	79.15	223.18
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	143.24				$39,518	-	-	143.24
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.02				$806,382.6	-	-	1.02
								VALOR DE OBRA	15,478,152.36	
								INCIDENCIA	1.30%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS

	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1FhWB-wdUo8WcOHTmd0zzlRaT3b

FOTO 1	Levante en mamposteria. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=19hzfG-OMrHenjhO11KIqR44IFsTUIbH0

FOTO 2	Pañete sobre muro. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1wsOpbE_NHUJm2HQEum5JC0bZr

FOTO 3	Estuco plastico sobre muros. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1Sh0dXBzWbJPDr9ZmQnUznZNO5V0jlOE

FOTO 4	Instalación de piso en granito. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 63**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	11	AL	17

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.82%	6.81%	11.19%	13	0.82%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.75%	5.17%	16.35%	14	0.75%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.91%	0.95%	17.31%	15	0.91%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.30%	0.49%	17.80%	16	1.30%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.83%	0.42%	18.22%	17	0.83%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.71%	0.00%	18.22%	18	0.71%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.30%	0.96%	19.18%	19	0.30%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.54%	1.14%	20.33%	20	0.54%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.93%	0.43%	20.76%	21	0.93%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.66%	1.24%	21.99%	22	0.66%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.37%	1.15%	23.14%	23	4.37%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.02%	1.80%	24.94%	24	3.02%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.49%	26.43%	25	2.63%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.15%	2.43%	28.86%	26	2.15%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.79%	0.50%	29.35%	27	2.79%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.87%	1.78%	31.13%	28	2.87%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.31%	1.40%	32.54%	29	2.31%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.31%	1.76%	34.30%	30	2.31%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.94%	1.22%	35.52%	31	1.94%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.22%	1.14%	36.65%	32	1.22%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.22%	2.93%	39.59%	33	1.22%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.27%	6.29%	45.87%	34	1.27%	6.29%	$75,121,988	45.87%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.21%	6.72%	52.59%	35	1.21%	6.72%	$80,320,133	52.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.15%	1.33%	53.92%	36	0.15%	1.33%	$15,903,177	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.15%	2.38%	56.30%	37	0.15%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.14%	0.71%	57.02%	38	0.14%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.16%	0.35%	57.37%	39	0.16%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.33%	0.19%	57.55%	40	0.33%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.88%	0.50%	58.05%	41	0.88%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.98%	0.51%	58.56%	42	0.98%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.14%	6.27%	64.83%	43	1.14%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.16%	6.90%	71.73%	44	1.16%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.03%	8.19%	79.92%	45	3.03%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.82%	0.47%	80.39%	46	3.82%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.74%	0.00%	80.39%	47	1.74%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.02%	0.12%	80.52%	48	2.02%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	5.91%	0.24%	80.76%	49	5.91%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	6.71%	0.25%	81.01%	50	6.71%	0.25%	$2,996,515	81.01%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.65%	0.00%	81.01%	51	6.65%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	6.13%	0.14%	81.14%	52	6.13%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	5.22%	0.00%	81.14%	53	5.22%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.32%	0.06%	81.21%	54	2.32%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.40%	0.00%	81.21%	55	0.40%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.33%	0.00%	81.21%	56	0.33%	0.00%	$0	81.21%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.31%	0.00%	81.21%	57	0.31%	0.00%	$0	81.21%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.42%	0.00%	81.21%	58	0.42%	0.00%	$0	81.21%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.38%	0.00%	81.21%	59	0.38%	0.00%	$0	81.21%

60	21/1/2024	27/1/2024	0.58%	0.19%	81.39%	60	0.58%	0.19%	$2,232,053	81.39%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.69%	1.59%	82.98%	61	0.69%	1.59%	$18,974,925	82.98%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.73%	1.30%	84.28%	62	1.73%	1.30%	$15,478,152	84.28%
63	11/2/2024	17/2/2024	1.73%	0.00%	84.28%	63	1.73%	0.00%	$0	84.28%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

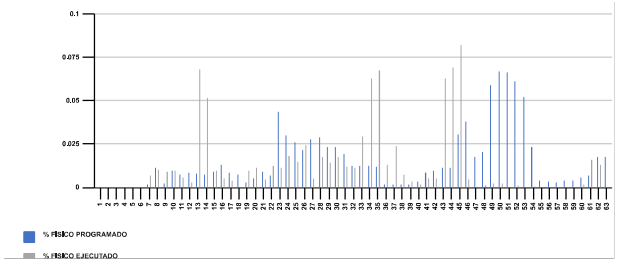

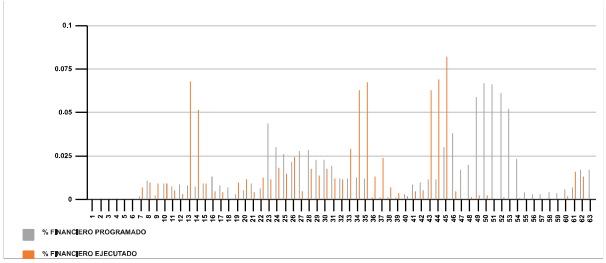

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2024-02-11	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-12	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-13	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-14	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-15	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-16	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-17	Recibo de material	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21		$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00		$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05		$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94		$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90		$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80		$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22		$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74		$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86		$9,568	-	6,151.86	1,669.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00		$40,436	-	112.00	336.00

2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04		$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64		$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80		$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17		$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60		$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		44.85		$92,552	-	44.85	775.51
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29		$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		1,079.85		$23,961	-	1,079.85	44.15
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33		$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80		$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08		$21,652	-	3,773.08	5,701.82

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02		$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06		$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55		$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79		$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00		$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80		$34,014	-	220.80	-
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73		$20,865	-	86.73	468.43
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		330.41		$17,948	-	330.41	224.75
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00		$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00		$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00		$16,601	-	16.00	-
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00		$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00		$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00		$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00		$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00		$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00		$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00		$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00		$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750.0	-	82.80	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	302.33				$134,924	-	-	302.33
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	143.24				$39,518	-	-	143.24
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.02				$806,382.6	-	-	1.02
							VALOR DE OBRA	-		

INCIDENCIA	0,00%

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

7. OBSERVACIONES
No se ejecutaron actividades durante esta semana.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 64**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**2**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	18	AL	24

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.82%	6.81%	11.19%	13	0.82%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.75%	5.17%	16.35%	14	0.75%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.91%	0.95%	17.31%	15	0.91%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.30%	0.49%	17.80%	16	1.30%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.83%	0.42%	18.22%	17	0.83%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.71%	0.00%	18.22%	18	0.71%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.30%	0.96%	19.18%	19	0.30%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.54%	1.14%	20.33%	20	0.54%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.93%	0.43%	20.76%	21	0.93%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.66%	1.24%	21.99%	22	0.66%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.37%	1.15%	23.14%	23	4.37%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.02%	1.80%	24.94%	24	3.02%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.49%	26.43%	25	2.63%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.15%	2.43%	28.86%	26	2.15%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.79%	0.50%	29.35%	27	2.79%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.87%	1.78%	31.13%	28	2.87%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.31%	1.40%	32.54%	29	2.31%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.31%	1.76%	34.30%	30	2.31%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.94%	1.22%	35.52%	31	1.94%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.22%	1.14%	36.65%	32	1.22%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.22%	2.93%	39.59%	33	1.22%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.27%	6.29%	45.87%	34	1.27%	6.29%	$75,121,988	45.87%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.21%	6.72%	52.59%	35	1.21%	6.72%	$80,320,133	52.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.15%	1.33%	53.92%	36	0.15%	1.33%	$15,903,177	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.15%	2.38%	56.30%	37	0.15%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.14%	0.71%	57.02%	38	0.14%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.16%	0.35%	57.37%	39	0.16%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.33%	0.19%	57.55%	40	0.33%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.88%	0.50%	58.05%	41	0.88%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.98%	0.51%	58.56%	42	0.98%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.14%	6.27%	64.83%	43	1.14%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.16%	6.90%	71.73%	44	1.16%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.03%	8.19%	79.92%	45	3.03%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.82%	0.47%	80.39%	46	3.82%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.74%	0.00%	80.39%	47	1.74%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.02%	0.12%	80.52%	48	2.02%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	5.91%	0.24%	80.76%	49	5.91%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	6.71%	0.25%	81.01%	50	6.71%	0.25%	$2,996,515	81.01%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.65%	0.00%	81.01%	51	6.65%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	6.13%	0.14%	81.14%	52	6.13%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	5.22%	0.00%	81.14%	53	5.22%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.32%	0.06%	81.21%	54	2.32%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.40%	0.00%	81.21%	55	0.40%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.33%	0.00%	81.21%	56	0.33%	0.00%	$0	81.21%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.31%	0.00%	81.21%	57	0.31%	0.00%	$0	81.21%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.42%	0.00%	81.21%	58	0.42%	0.00%	$0	81.21%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.38%	0.00%	81.21%	59	0.38%	0.00%	$0	81.21%

60	21/1/2024	27/1/2024	0.58%	0.19%	81.39%	60	0.58%	0.19%	$2,232,053	81.39%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.69%	1.59%	82.98%	61	0.69%	1.59%	$18,974,925	82.98%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.73%	1.30%	84.28%	62	1.73%	1.30%	$15,478,152	84.28%
63	11/2/2024	17/2/2024	1.73%	0.00%	84.28%	63	1.73%	0.00%	$0	84.28%
64	18/2/2024	24/2/2024	0.36%	2.18%	86.46%	64	0.36%	2.18%	$26,037,567	86.46%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

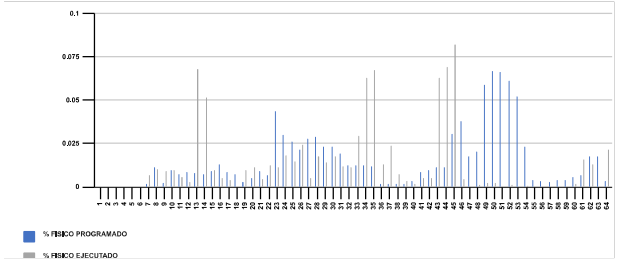

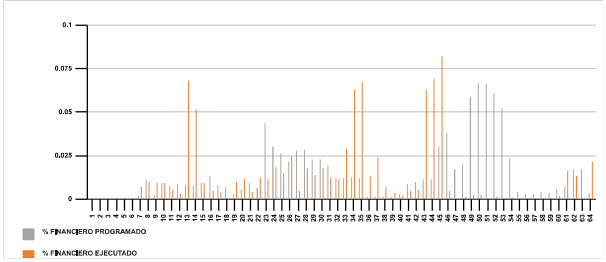

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2024-02-18	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-19	Recibo de material. Acarreo. Estuco en muro.	N/A
		2024-02-20	Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Levante de mampostería.	N/A
		2024-02-21	Instalación de piso en granito. Estuco plástico sobre muros. Acarreo de material.	N/A
		2024-02-22	Instalación de piso en granito. Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Figuración de acero.	N/A
		2024-02-23	Levante de mampostería. Instalación de piso en granito y zócalos. desmonte de cielo raso y desmonte de cubierta.	N/A
		2024-02-24	Pañete sobre muro. Estuco plástico sobre muros. Instalacion de pisos en granito. Desmonte de puntos eléctricos. Se realizó armado de acero para vigas de vigas laboratorio e informática. Limpieza general.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21		$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00		$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05		$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94		$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90		$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80		$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22		$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74		$54,171	-	20.74	17,270.38
2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,151.86	184.00	$9,568	1,760,512.00	6,335.86	1,485.07
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00		$40,436	-	112.00	336.00

2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04		$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64		$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80		$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17		$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60		$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		44.85	9.14	$92,552	845,925.28	53.99	766.37
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29		$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		1,079.85	33.15	$23,961	794,307.15	1,113.00	11.00
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33		$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80		$74,907	-	220.80	0.09
4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08		$21,652	-	3,773.08	5,701.82

4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02		$24,307	-	6,465.02	16,694.39
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06		$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55		$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79		$138,761	-	416.79	465.35
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00		$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		220.80	106.30	$34,014	3,615,688.20	327.10	- 106.30
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		86.73	78.80	$20,865	1,644,162.00	165.53	389.63
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		330.41	214.74	$17,948	3,854,153.52	545.15	10.01
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00		$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00		$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		16.00	28.00	$16,601	464,828.00	44.00	- 28.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1,20 X 1,20 X 1,50 METROS, EN BLOQUE DE 0,15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00		$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00		$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00		$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00		$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00		$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00		$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00		$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00		$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750.0	-	82.80	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	302.33			72.15	$134,924	9,734,766.60	72.15	230.18
NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	143.24			77.14	$39,518	3,048,418.52	77.14	66.10
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.02				$806,382.6	-	-	1.02
								VALOR DE OBRA	26,037,567.27	
								INCIDENCIA	2.18%	

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

			
FOTO 1	Estuco en muro. REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Instalación de piso en granito. REUVEN FEUERSTEIN
			
FOTO 3	Desmonte de cielo raso REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 4	Levante de mampostería. REUVEN FEUERSTEIN
			
FOTO 5	Corte y Figuración de acero REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 6	Desmonte de cubierta REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	NOMBRE DANIEL CANTILLO E	NOMBRE DANIEL CANTILLO E
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	**INFORME DE AVANCE SEMANAL DE INTERVENTORÍA IE REUVEN FEUERSTEIN No. 65**	**Código:**	**IP-FM-31**
		VERSION:	**01**
		FECHA:	**6/9/2021**
		Paginas:	**1 de 1**

FECHA:	**MES**	**3**	DE	**2024**
PERÍODO:	**SEMANA DEL**	25	AL	2

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA:	EDU-345-2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	SA-EDU-0001-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA:	CONSORCIO IE DISTRITO


VALOR INICIAL	$25,672,996,396.61	VALOR INICIAL	$1,349,952,660.00
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	HASTA 31 DE JULIO DE 2023	PRORROGA	HASTA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023	PRORROGA 2	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PRORROGA 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PRORROGA 4	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
SUSPENSION	N/A	SUSPENSION	N/A
PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024	PLAZO ACTUALIZADO	HASTA 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024


2. AVANCE DEL CONVENIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO	SEMANA	% FINANCIERO PROGRAMADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
1	6/12/2022	10/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	1	0.00%	0.00%	$0	0.00%
2	11/12/2022	17/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	2	0.00%	0.00%	$0	0.00%
3	18/12/2022	24/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	3	0.00%	0.00%	$0	0.00%
4	25/12/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	4	0.00%	0.00%	$0	0.00%
5	1/1/2023	7/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	5	0.00%	0.00%	$0	0.00%
6	8/1/2023	14/1/2023	0.00%	0.00%	0.00%	6	0.00%	0.00%	$0	0.00%
7	15/1/2023	21/1/2023	0.19%	0.68%	0.68%	7	0.19%	0.68%	$8,099,507	0.68%
8	22/1/2023	28/1/2023	1.11%	1.00%	1.68%	8	1.11%	1.00%	$11,993,915	1.68%
9	29/1/2023	4/2/2023	0.23%	0.90%	2.59%	9	0.23%	0.90%	$10,814,479	2.59%
10	5/2/2023	11/2/2023	0.94%	0.94%	3.53%	10	0.94%	0.94%	$11,261,398	3.53%
11	12/2/2023	18/2/2023	0.75%	0.55%	4.08%	11	0.75%	0.55%	$6,580,700	4.08%
12	19/2/2023	25/2/2023	0.85%	0.29%	4.37%	12	0.85%	0.29%	$3,500,067	4.37%
13	26/2/2023	4/3/2023	0.82%	6.81%	11.19%	13	0.82%	6.81%	$81,434,821	11.19%
14	5/3/2023	11/3/2023	0.75%	5.17%	16.35%	14	0.75%	5.17%	$61,751,274	16.35%
15	12/3/2023	18/3/2023	0.91%	0.95%	17.31%	15	0.91%	0.95%	$11,389,260	17.31%
16	19/3/2023	25/3/2023	1.30%	0.49%	17.80%	16	1.30%	0.49%	$5,823,089	17.80%
17	26/3/2023	1/4/2023	0.83%	0.42%	18.22%	17	0.83%	0.42%	$5,077,428	18.22%
18	2/4/2023	8/4/2023	0.71%	0.00%	18.22%	18	0.71%	0.00%	$0	18.22%
19	9/4/2023	15/4/2023	0.30%	0.96%	19.18%	19	0.30%	0.96%	$11,517,002	19.18%
20	16/4/2023	22/4/2023	0.54%	1.14%	20.33%	20	0.54%	1.14%	$13,675,512	20.33%
21	23/4/2023	29/4/2023	0.93%	0.43%	20.76%	21	0.93%	0.43%	$5,099,789	20.76%
22	30/4/2023	6/5/2023	0.66%	1.24%	21.99%	22	0.66%	1.24%	$14,793,637	21.99%
23	7/5/2023	13/5/2023	4.37%	1.15%	23.14%	23	4.37%	1.15%	$13,708,736	23.14%
24	14/5/2023	20/5/2023	3.02%	1.80%	24.94%	24	3.02%	1.80%	$21,552,923	24.94%
25	21/5/2023	27/5/2023	2.63%	1.49%	26.43%	25	2.63%	1.49%	$17,769,513	26.43%
26	28/5/2023	3/6/2023	2.15%	2.43%	28.86%	26	2.15%	2.43%	$29,016,888	28.86%
27	4/6/2023	10/6/2023	2.79%	0.50%	29.35%	27	2.79%	0.50%	$5,921,352	29.35%
28	11/6/2023	17/6/2023	2.87%	1.78%	31.13%	28	2.87%	1.78%	$21,262,879	31.13%
29	18/6/2023	24/6/2023	2.31%	1.40%	32.54%	29	2.31%	1.40%	$16,767,491	32.54%
30	25/6/2023	1/7/2023	2.31%	1.76%	34.30%	30	2.31%	1.76%	$21,056,726	34.30%
31	2/7/2023	8/7/2023	1.94%	1.22%	35.52%	31	1.94%	1.22%	$14,530,148	35.52%
32	9/7/2023	15/7/2023	1.22%	1.14%	36.65%	32	1.22%	1.14%	$13,609,871	36.65%
33	16/7/2023	22/7/2023	1.22%	2.93%	39.59%	33	1.22%	2.93%	$35,021,509	39.59%
34	23/7/2023	29/7/2023	1.27%	6.29%	45.87%	34	1.27%	6.29%	$75,121,988	45.87%
35	30/7/2023	5/8/2023	1.21%	6.72%	52.59%	35	1.21%	6.72%	$80,320,133	52.59%
36	6/8/2023	12/8/2023	0.15%	1.33%	53.92%	36	0.15%	1.33%	$15,903,177	53.92%
37	13/8/2023	19/8/2023	0.15%	2.38%	56.30%	37	0.15%	2.38%	$28,442,831	56.30%
38	20/8/2023	26/8/2023	0.14%	0.71%	57.02%	38	0.14%	0.71%	$8,505,919	57.02%
39	27/8/2023	2/9/2023	0.16%	0.35%	57.37%	39	0.16%	0.35%	$4,193,617	57.37%
40	3/9/2023	9/9/2023	0.33%	0.19%	57.55%	40	0.33%	0.19%	$2,239,657	57.55%
41	10/9/2023	16/9/2023	0.88%	0.50%	58.05%	41	0.88%	0.50%	$5,958,354	58.05%
42	17/9/2023	23/9/2023	0.98%	0.51%	58.56%	42	0.98%	0.51%	$6,042,924	58.56%
43	24/9/2023	30/9/2023	1.14%	6.27%	64.83%	43	1.14%	6.27%	$74,890,780	64.83%
44	1/10/2023	7/10/2023	1.16%	6.90%	71.73%	44	1.16%	6.90%	$82,454,976	71.73%
45	8/10/2023	14/10/2023	3.03%	8.19%	79.92%	45	3.03%	8.19%	$97,910,745	79.92%
46	15/10/2023	21/10/2023	3.82%	0.47%	80.39%	46	3.82%	0.47%	$5,632,834	80.39%
47	22/10/2023	28/10/2023	1.74%	0.00%	80.39%	47	1.74%	0.00%	$0	80.39%
48	29/10/2023	4/11/2023	2.02%	0.12%	80.52%	48	2.02%	0.12%	$1,489,655	80.52%
49	5/11/2023	11/11/2023	5.91%	0.24%	80.76%	49	5.91%	0.24%	$2,884,763	80.76%
50	12/11/2023	18/11/2023	6.71%	0.25%	81.01%	50	6.71%	0.25%	$2,996,515	81.01%
51	19/11/2023	25/11/2023	6.65%	0.00%	81.01%	51	6.65%	0.00%	$0	81.01%
52	26/11/2023	2/12/2023	6.13%	0.14%	81.14%	52	6.13%	0.14%	$1,629,621	81.14%
53	3/12/2023	9/12/2023	5.22%	0.00%	81.14%	53	5.22%	0.00%	$0	81.14%
54	10/12/2023	16/12/2023	2.32%	0.06%	81.21%	54	2.32%	0.06%	$746,385	81.21%
55	17/12/2023	23/12/2023	0.40%	0.00%	81.21%	55	0.40%	0.00%	$0	81.21%
56	24/12/2023	30/12/2023	0.33%	0.00%	81.21%	56	0.33%	0.00%	$0	81.21%
57	31/12/2023	6/1/2024	0.31%	0.00%	81.21%	57	0.31%	0.00%	$0	81.21%
58	7/1/2024	13/1/2024	0.42%	0.00%	81.21%	58	0.42%	0.00%	$0	81.21%
59	14/1/2024	20/1/2024	0.38%	0.00%	81.21%	59	0.38%	0.00%	$0	81.21%

60	21/1/2024	27/1/2024	0.58%	0.19%	81.39%	60	0.58%	0.19%	$2,232,053	81.39%
61	28/1/2024	3/2/2024	0.69%	1.59%	82.98%	61	0.69%	1.59%	$18,974,925	82.98%
62	4/2/2024	10/2/2024	1.73%	1.30%	84.28%	62	1.73%	1.30%	$15,478,152	84.28%
63	11/2/2024	17/2/2024	1.73%	0.00%	84.28%	63	1.73%	0.00%	$0	84.28%
64	18/2/2024	24/2/2024	0.36%	2.18%	86.46%	64	0.36%	2.18%	$26,037,567	86.46%
65	25/2/2024	2/3/2024	0.52%	5.39%	91.85%	65	0.52%	5.39%	$64,444,840	91.85%

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

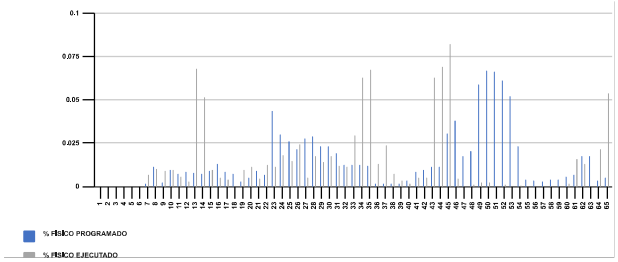

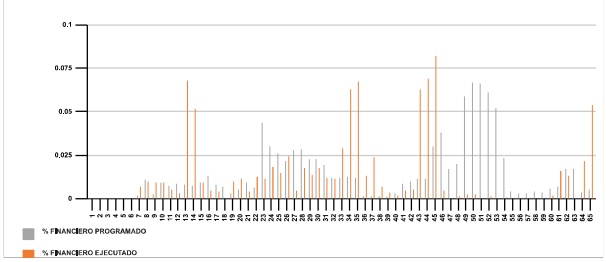

3. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES

IED	DIRECCIONES	FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
REUVEN FEUERSTEIN	KR 1 B #46 G - 18	2024-02-25	No se ejecutaron actividades en frente de obra	N/A
		2024-02-26	Estuco plástico sobre muros. Instalacion de pisos en granito. se realizó fundida de concreto en vigas de laboratorio e informática. y posterior se realizó instalacion de estructura metalica.	N/A
		2024-02-27	Instalacion de pisos en granito. Estuco plástico sobre muros. Pañete sobre muro. Levante de muro. Pulida de piso.se continuó con la instalacion de estructura metalica	N/A
		2024-02-28	Instalacion de pisos en granito. Estuco plástico sobre muros. Pulida de piso. Pañete sobre muro. Levante de muro. se culminó la Instalacion de estructura metálica y se inició la instalación de cubierta termoacustica.	N/A
		2024-02-29	Instalacion de zocalos en granito. Pulida de piso. Estuco plástico sobre muros. Instalación de cubierta.	N/A
		2024-03-01	Instalacion de zocalos en granito. Pulida de piso. Estuco plástico sobre muros. Instalación de cubierta.	N/A
		2024-03-02	Instalacion de zocalos en granito. Pulida de piso. Estuco plástico sobre muros. Instalación de cubierta.	N/A

4. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	PRELIMINARES									
1.01	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	MT2	949.21		949.21		4221	-	949.21	-
1.02	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACIÓN TOTAL	DIA	570		50.00		$454,545	-	50.00	520.00
1.03	LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	MT2	949.21		919.21		$9,648	-	919.21	30.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	84.42		26.07		$116,390	-	26.07	58.35
1.08	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	6.15		6.15		$25,396	-	6.15	-
1.09	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M	M2	223.58		223.58		$27,679	-	223.58	-
1.10	DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M	M2	20.87		20.87		$36,506	-	20.87	-
2.01	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	570		11.00		$252,961	-	11.00	559.00
2.02	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m	MT2	370		370.00		$20,699	-	370.00	-
2.03	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10M	M2	292.05		292.05		$20,853	-	292.05	-
2.05	DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AÉREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1280.62		1,207.54		$266,275	-	1,207.54	73.08
2.07	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M	M2	3.35		0.95		$25,547	-	0.95	2.40
2.08	ESCARIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO	ML	4.88		2.52		$16,513	-	2.52	2.36
2.09	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	MT3	175		167.94		$93,507	-	167.94	7.06
2.11	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	MT2	66.43		20.90		$49,030	-	20.90	45.53
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	MT3	224		144.80		$34,062	-	144.80	79.20
2.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MT3	212		179.22		$192,928	-	179.22	32.78
2.14	SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	MT2	17291.12		20.74		$54,171	-	20.74	17,270.38

2.15	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KGS	7820.93		6,335.86	18.64	$9,568	178,347.52	6,354.50	1,466.43
2.16	ANCLAJE EPOXICO	UND	448		112.00	96.00	$40,436	3,881,856.00	208.00	240.00
2.17	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	19.6		7.14		$894,392	-	7.14	12.46
2.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	20.06		5.04		$1,742,818	-	5.04	15.02
2.19	VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	267.23		6.69		$1,894,074	-	6.69	260.54
2.20	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	MT2	649.6205		390.64		$99,065	-	390.64	258.98
2.22	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE	ML	248.08		248.08		$149,548	-	248.08	-
2.23	CÁRCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0,50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO.	ML	147		3.80		$513,566	-	3.80	143.20
2.24	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES.	ML	636		278.55		$27,186	-	278.55	357.45
2.33	VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	25.83		24.17		$1,933,197	-	24.17	1.66
2.34	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	288.15		170.17		$190,540	-	170.17	117.98
2.38	SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119	ML	223.58		223.58		$9,165	-	223.58	-
2.39	ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MT3	42.62		24.01		$813,350	-	24.01	18.61
2.41	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA.	MT3	170.17		170.17		$3,219,697	-	170.17	-
3.02	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	436.39		191.36		$32,154	-	191.36	245.03
3.04	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	MT2	383.6		223.60		$13,644	-	223.60	160.00
3.05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4	MT2	820.36		53.99	5.03	$92,552	465,536.56	59.02	761.34
3.06	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	MT2	377.29		266.29		$100,669	-	266.29	111.00
3.08	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	MT2	1124		1,113.00	29.52	$23,961	707,328.72	1,142.52	- 18.52
3.09	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	ML	368		241.33		$17,610	-	241.33	126.67
3.10	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MT2	13		13.00		$39,705	-	13.00	-
4.01	MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.	MT2	220.89		220.80		$74,907	-	220.80	0.09

4.02	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	9474.9		3,773.08		$21,652	-	3,773.08	5,701.82
4.03	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO	KGS	23159.41		6,465.02	1,359.93	$24,307	33,055,818.51	7,824.95	15,334.46
5.02	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	320.23		150.06		$33,985	-	150.06	170.17
5.03	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	MT2	95.55		95.55		$39,196	-	95.55	-
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACUSTIC TIPO AJOVER O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	MT2	882.14		416.79	93.40	$138,761	12,960,277.40	510.19	371.95
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	MT2	456		138.00		$127,907	-	138.00	318.00
5.14	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	MT2	220.8		327.10		$34,014	-	327.10	- 106.30
6.01	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	MT2	330.33		330.33		$16,524	-	330.33	-
6.03	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS EN BALDOSA DE GRANITO DUROPISO, CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	456		54.00		$3,615	-	54.00	402.00
6.04	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	MT2	555.16		165.53		$20,865	-	165.53	389.63
6.05	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	MT2	555.16		545.15	116.18	$17,948	2,085,198.64	661.33	- 106.17
7.01	DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL	UND	15		11.00		$38,451	-	11.00	4.00
7.02	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	16		15.00		$57,053	-	15.00	1.00
7.03	DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL	UND	25.12		4.00		$32,669	-	4.00	21.12
9.02	DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UND	16		44.00		$16,601	-	44.00	- 28.00
9.03	DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO	UND	411.2		1.00		$19,709	-	1.00	410.20
10.03	REGISTRO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS, EN BLOQUE DE 0.15 METROS, RELLENOS DE CONCRETO Y REFUERZO DE ACERO D = 1/2" EN LAS ESQUINAS, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON VARILLAS D = 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE EXCAVACION	UND	14		7.00		$1,488,291	-	7.00	7.00
10.04	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND	34		17.00		$64,019	-	17.00	17.00
10.05	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND	40		13.00		$96,952	-	13.00	27.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC,DIÁMETRO DE 2	ML	24		12.00		$45,401	-	12.00	12.00
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1/2"	ML	184		92.00		$27,015	-	92.00	92.00
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	178		168.00		$58,180	-	168.00	10.00
10.21	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 4"	UND	12		6.00		$173,513	-	6.00	6.00
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA BOLA 1/2" O SIMILAR	UND	14		7.00		$38,138	-	7.00	7.00
NP 59	REINSTALACION DE CUBIERTA FIBROCEMENTO O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA EN LAMINAS	M2	82.8		82.80		$35,750.0	-	82.80	-
NP 20	PISO EN BALDOSA DE GRANITO	M2	302.33			56.89	$134,924	7,675,826.36	56.89	245.44

NP 21	ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO	ML	143.24			66.10	$39,518	2,612,139.80	66.10	77.14
NP 38	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1.02			1.02	$806,382.6	822,510.25	1.02	-
							VALOR DE OBRA	64,444,839.76		
							INCIDENCIA	5.39%		

5. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS				
	PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPOS EN OBRA	
FRENTE DE TRABAJO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
REUVEN FEUERSTEIN	Anderson Saavedra	Sahair Ordoñez	Trompo, Andamio, Herramienta Menor	NO APLICA
				NO APLICA

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



https://drive.google.com/open?id=1DvnVq1OrA-9CwUI5d4p0kaiP0f1FF



https://drive.google.com/open?id=1RzQU8P4oFatVuA4ojf5c9JIZ8cSHHX05

FOTO 1	Instalación estructura metalica REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 2	Estuco en muro. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1bA0hhqJuuSHcvMq3dHsnT0HIE



https://drive.google.com/open?id=1HYDUvvbXxGGa7XHSvnqEvYEBL

FOTO 3	Instalación de piso en granito. REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 4	Instalación de zocálos. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1KWwEX43hd3JIUE_tPOSBQ0XEH



https://drive.google.com/open?id=1uRL5vMnlo0NqmiDMd7f0HBPPinDnpA_4

FOTO 5	Pañete sobre muro. REUVEN FEUERSTEIN	FOTO 6	Pulida de piso. REUVEN FEUERSTEIN



https://drive.google.com/open?id=1G-YovOPkFy3oMkFHRwvKK0pah



https://drive.google.com/open?id=1ameAxLAC9Zx9OLzp9MU7pBCNRb-l85r

FOTO 7	Instalación de cubierta. REUVEN FEUERSTEIN	**FOTO 8**	Instalación de cubierta. REUVEN FEUERSTEIN

7. OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NOMBRE Sahair Ordoñez	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**	**NOMBRE DANIEL CANTILLO E**
CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
