Nota 95: Miercoles 29 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil, 1 de Marqueteria

Nota 96: Se adelantan actividades de terminacion enchape y guardaescobas escalera, lavado con acido enchape en yeso. Se adelanta Marqueteria de salon 210 y 208. Se recomienda a contratista realizar actividades pendientes como pintura y guardaescobas en los salones que fueron entregados provisionalmente y se tengan en cuenta la calidad de detalles y remates.

Nota 97: jueves 30 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil.


Nota 98: Se adelanta remates finales y lavado final enchape escalera. Se instala la Marqueteria del salon 210 y se realiza pulido de piso salon 210 para entrega. Quedan faltando actividades de pintura y guardaescobas. El salon 208 aun contiene mobiliario de la institucion

Nota 97: Se realiza entrega del salon 210 al señor rector Elmer Avendaño, quedando pendiente guardaescobas, pintura y puerta, lo que se subsanara durante el fin de semana. Se entrega pulida y brillada de piso, asi como ventaneria en aluminio. La escalera proxima a salones 106/206 se terminan trabajos de baldosa gres, alistado, cenefa y guardaescobas en gravilla lavada, se recomienda habilitarla un dia despues para el endurecimiento de los bordes y evitar roturas o desplacamientos. Se realiza durante el transcurso de la mañana

continua

Powered by CamScanner

por parte del colegio el traslado de los muebles que ocupan el 208, para habilitar el ingreso de personal de obra. De acuerdo a lo pactado se solicita comedidamente la entrega del aula 204 para su pronta intervención, de igual forma con la habilitación de la escalera se intervendra el corredor frente al aula 204, cerrandose este espacio.



Jaime Molina
Residente Obra

Nota 98: Viernes 31 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 2 de obra civil

Nota 99: Se adelanta con demolición de enchape pasillo segundo piso frente a Salon 204 y se inicia con el aislado de piso para enchape, Se instala la ventaneria en aula 208.

Nota 100: Sabado 01 de junio de 2024
Hora inico: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 7 de Marquetalia

Nota 101: Se adelantan actividades de aislado de piso para enchape pasillo segundo piso frente a salon 209 y se realiza la instalacion de la puerta corrediza de Salon 209 y el cambio de puerta salon 210.

Nota 102: Se le recomienda a contratista mejorar

la calidad de acabados de los persianas fijas y acabados de Muro exterior en los Salones ya entregados y en los posteriores, no se liberaran estas actividades hasta corregir estas anotaciones

Nota 103: Martes 04 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil (Se van a medio día)

Nota 104: No se pudieron avance en los Zonas intervenidas de salon 204 ni pasillo segundo piso por falta de Material, se solicito a contratista reactivar actividades y cumplir con los compromisos de entrega.

Nota 105: Se solicita a contratista realizar un buen lijado de enchape y revisar garantias de emboquillado, se solicita lijar los muros perimetrales a ejecutora intervenida.

Powered by CamScanner

la calidad de acabados de las persianas fijas y acabados de mampostería en los salones ya entregados y en los posteriores, no se liberaran estas actividades hasta corregir estas anotaciones

Nota 103: Martes 04 de junio de 2024
clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil (Se van a medio día)

Nota 104: No se evidencia avance en las zonas intervenidas de salon 204 ni pasillo segundo piso por falta de material, se solicita a contratista reactivar actividades y cumplir con los compromisos de entrega.

Nota 105: Se solicita a contratista realizar un buen lavado de enchape y revisar garantías de emboquillado, se solicita lavar los muros perimetrales a escalera intervenida.

Nota 106: Miercoles 05 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 02 de obra civil

Nota 107: Llega material de baldosa de yeso para continuar con enchapes de pasillos y Hall segundo piso y para escaleras.

Nota 108: Se adelantan actividades de alistado de piso para enchape pasillo frente a salon 204

Powered by CamScanner

Nota 109: ~~Miercoles~~ Jueves 06 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 02 de obra civil, 1 residente.

Nota 110: Se adelantan actividades de enchape pasillo frente al salon 204. en tableta de gres. Se recomienda a contratista adelantar actividades de ventaneria y pulido de piso en salon 204. para ponerse al dia en programacion

Nota 111: ~~Jueves~~ Viernes 07 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - Nublado en la tarde
personal: 02 de obra civil, 1 residente.

Nota 112: Se adelantan actividades de enchape en pasillo frente a salon 204 y fundida de cenefas en grapilla lavada. Aun no se adelantan actividades en aula 209 por falta de materiales

Nota 113: ~~Viernes~~ Sabado 08 de Junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 02 de obra civil

Nota 114: Se termina el enchape de piso del pasillo frente a 209, se sigue solicitando al contratista adelantar trabajo de ventaneria

Nota 115: Lunes 10 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Actividades: No se ejecutan actividades.

Nota 116: Martes 11 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 02 de obra civil

Nota 117: Se realiza desmonte de vidrios y ventanería del salón 204 para la instalación de la nueva ventanería en aluminio. Se debe terminar esta aula para seguir liberando espacios por parte del colegio

Nota 118: Miercoles 12 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 02 de aic y uno de ventanería

Nota 119: Se adelantan actividades de fabricación ventanería en aluminio para el salón 204. Se realiza pulido de piso y se adelanta con pintura de porticos

Nota 119: Jueves 13 de junio de 2024
Hora inicio 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 02 de obra civil.

Nota 120: Se adelantan actividades de pintura en porticos de salones 204, 206, 208, 209 y 210. Adicionalmente se avanza con ventanería 204

Nota 121: Viernes 14 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 02 de obra civil

Nota 122: Se adelantan actividades de pintura en salones de segundo piso en resanes muros salón 209, 210, 206 y 204. Adelantan fabricación de ventanería

Nota 123: Lunes 17 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 02 de o. c.

Nota 124: Adelantan actividades de resanes y pintura en salones 209 y 210 en porticos y muros. Se recomienda a contratista avanzar con la ventanería faltante ya que no hay estudiantes por periodo vacacional

Nota 125: Martes 18 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 02 de obra civil.

Nota 126: Se adelantan actividades de demolición tableta existente en primer piso y remates de pintura en salones

Nota 127: Miercoles 19 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado Personal: 02 de OC.

Powered by CamScanner

Nota 128: Se adelantan actividades de demolicion de piso en pasillo primer nivel y se termina ventaneria en salon 204. Se recomienda al contratista la instalacion de la pelicula Sun Blasting en los vidrios de fachada principal segun lo solicitado por la SED.

Nota 129: Jueves 20 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 02 de obra civil

Nota 130: Unicamente se evidencia avance en enlonamiento de escombros demolicion y pintura naranja en salones 209-210 y pintura Blanca en 209. Se recomienda al contratista solicitar a la institucion las demas areas de intervencion y avanzar inmediatamente con el cambio de la ventaneria y pintura en los salones y zonas que aplique

Nota 131: Viernes 21 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 02 de o.c., 1 residente

Nota 132: Se realiza jornada de fumigacion por parte de la institucion educativa, por lo tanto el contratista trabaja media jornada, se avanza con la fundicion de alistado de piso para enchape pasillos primer nivel

Powered by CamScanner

Nota 133; Domingo 23 de Junio de 2024
Personal: No hay personal
Actividades: Llega material y rejas para instalacion fuera de ventaneria pero no se instala.

Nota 134; Lunes 24 de junio de 2024
Clima: Soleado
personal: No hay personal por falta de materiales

Nota 135; Interventoria reconiendo y solicita la llegada de materiales para; ventaneria en aluminio, enchape de pisos pasillos, puertas aulas de ingles, estructura y cubierta pasillo segundo piso, cuarto auxiliar en superboard, A la fecha no se evidencia avance segun programacion acordada;

Powered by CamScanner

Nota 133; Domingo 23 de Junio de 2024
personal: No hay personal
Actividades: Llega material y rejas para instalacion fuera de ventaneria pero no se instala.

Nota 134: Lunes 24 de junio de 2024
clima: Soleado
personal: No hay personal por falta de materiales

Nota 135; Interventoria reconicida y solicita la llegada de materiales para; ventaneria en aluminio, enchape de pisos pasillos, puertas aulas de ingles, estructura y cubierta pasillo segundo piso, cuarto auxiliar en superboard, A la fecha no se evidencia avance segun programacion acordada.

Nota 136: Martes 25 de junio de 2024
clima: Soleado
personal: 4 de OC.

Nota 137: Se adelantan actividades de alistado piso en Hall primer nivel para enchape, y la instalacion de rejas proteccion ventaneria.
Aun no hallegado material de perfileria en aluminio para ventaneria. Se recomienda al contratista este suministro y avanzar con los salones y areas liberadas.

Nota 138; Llegan 15 Bultos de cemento y 25 tonos de arena de rio.

Nota 139: Miercoles 26 de junio de 2024
clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil, 1 de ventanería

Nota 140: Se adelantan actividades de enchape pasillos primer piso en tableta de gress y cenefas en granilla lavada. Se adelanta fabricacion de ventaneria en aluminio de subara primer piso.

Nota 141: Llegan 50 perfiles en aluminio para fabricación de ventanería.

Nota 142: Jueves 27 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal: 2 de oc y 1 de ventaneria

Nota 143: Se continua con instalación de enchape pasillos primer piso y con fabricacion de ventana en aluminio para zonas de primer piso.

Nota 144: Interventoria recomienda a contratista avanzar con los salones y aulas de clase ya que estos deben quedar terminados el 8 de julio de 2024, donde las zonas fueron despejadas parcialmente por la institución

Nota 145: Viernes 28 de junio de 2024
Clima: Nublado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 02 de obra civil

Nota 146: ~~Sabado~~ se adelantan actividades de enchape de piso en pasillos de primer nivel. No se evidencio mas avance de obra, se recomienda a contratista realizar la intervencion de los demas actividades en salones, cuarto auxiliar en superboard, instalacion de puertas en aulas de nivel inferior, estructura y cubierta pergola pasillo.

Nota 147: Sabado 29 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 obra civil, 1 de ventaneria

Nota 148: Se continua con la instalacion de enchape baldosa de gres pasillos de primer piso y con fabricacion de ventaneria. Se recomienda a contratista mejor el rendimiento y el numero de personal, para poner al dia las actividades atrasadas en programacion.

Nota 149: Domingo 30 de junio de 2024
Lunes 01 de julio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 1 de ventaneria

Nota 150: Se avanza con fabricacion de ventaneria de aluminio salones primer piso, no se avanzan mas actividades

Nota 151: Martes 02 de julio de 2024
Clima: Soleado
personal: 2 de obra civil
Hora inicio: 7:00 am

Powered by CamScanner

Nota 360: Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de piso caucho

Nota 361: Se adelanta instalacion de piso caucho EPDM En patio preescolar. No se termina aun ya que proyectado terminar esta actividad para viernes 31 de Mayo. Se instala Malla Anyr en los puertos y ventanas del shut de basuras

Nota 362: Viernes 31 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de piso caucho

Nota 363: Se termina la actividad de instalacion de piso caucho en patio preescolar. Interventoria recomienda a contratista realizar limpieza de residuos de resina en muros y piso de salon pues

Norma

Powered by CamScanner

la entrega a la instalacion y realizar remates faltantes de pintura exterior el shot de Basuras.

Nota 364: Martes 04 de junio de 2024
Clima: Soleado
Actividades: No se ejecutan actividades y no hay personal en obra. Pendientes remates en shot de Basuras, limpieza muros y piso en salon preescolar, y orden y Aseo.

Nota 365: Miercoles 05 de junio de 2024
clima: Soleado
Actividades: No se ejecutan actividades y no hay personal, Actividades pendientes descritas en la nota 364

Norma

Powered by CamScanner

Nota 366: Jueves 06 de junio de 2024
Hora inic: 2 de obra civil 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de O.C.

Nota 367: Se realiza remates de pintura en muros patio de preescolar que se hubiera impregnado con resina del piso caucho, pendiente limpieza piso en Aula preescolar, remates shut de basuras, aseo bodega y otros. Aseo general

Nota 368: Viernes 07 de junio de 2024
Hora inic: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 1 de obra civil

Nota 369: Se realizan remates de pintura shut de basuras y plataformas, se realizan

orden y aseo en baño de discapacitados, Interventoria solicita a contratista retirar el piso caucho SBR y EPDM que no se utilizo y solicita realizar mejo orde y aseo en general salon preescolar para la entrega programada el Martes 11 de junio de 2024

Norma

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

DTLE BOSA

Norma

Powered by CamScanner

recomienda avanzar con el desmonte del cielo raso y la intervención de cubierta faltante en area Atencion al usuario para asi avanzar a la etapa 2, teniendo en cuenta los alcances eléctricos de la etapa 1.

Nota 43: ~~Ultimo~~ Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 2 de cubierta

Nota 44: Se adelantan actividades de resanes, pintura en area de servicio, Se realiza la instalacion de la segunda capa de cubierta cuarto area de atención al usuario, Se recomienda a contratista avanzar con la estructura y cubierta de los cuartos de archivo continuos al área de servicio.

Nota 45: Viernes 31 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de Cubierta ; 3 obra civil

Nota 46: Se termino la instalacion de segunda capa de cubierta y se instala el ~~flanche~~ cabullete de la cubierta. Se avanza pintura de paredes y pasillos area de atención al usuario..
Se recomienda a Contratista avanzar con desmonte de techo raso y cambio de cubierta en cuarto de archivo

Nota 47: Sabado 01 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil

Nota 48: Se adelantan actividades de de pintura y resanes culatas en cuarto

Norma

Powered by CamScanner

áreas de atención al usuario. Se solicita a contratista realizar la instalación de flanche en culatas de la cubierta instalada.

Nota 49: Domingo 02 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil

Nota 50: Se adelantan actividades de pintura, recortes de pintura y remates acabados para área atención al usuario, se recomienda avanzar con cuartos de archivo, baños y pasillos cambio de cubierta para recuperar tiempos de atraso.

Nota 51: Lunes 03 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil, 2 de cubiertas

Norma

Powered by CamScanner

Nota 52: Se realiza el desmonte de Cielo raso en cuartos de archivo y se avanza con puñete, resanes areas de pasillos, Hall y baños area atencion al usuario.

Nota 53: Martes 04 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 3 de obra civil

Se adelanta acabados de pintura, en area de Atencion al usuario, se recomienda mejorar el rendimiento para recuperar atrasos en programacion.

Nota 54: Se realiza reunion de avance con personal de la institución para revisar tiempos de ejecución. Ver Acta

Norma

Powered by CamScanner

Nota 55. Miercoles 05 de Junio 2024.
Clima: Soleado.
Hora inicio: 7:00 AM.
Personal: (03) obra civil, (03) Ornamentación

Se continua con actividad de resanes yeso y aplicación de pintura en el area de extención al usuario, se realiza instalación de vigas metalicas en cubierta.

- Interventoria se retira de la obra siendo las 3:15 PM ya que el contratista no llega para realizar verificación del tablero electrico y consolidar el proceso a realizar de esta intervención.

Nota 56 Jueves 06 de junio 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado:
personal: 03 de obra civil

Norma

Powered by CamScanner

Nota 57: Se adelantan actividades de remates y acabados en pintura area de atencion al usuario y en zona de archivo, pasillo y Hall.
Se adelantan instalaciones eléctricas

Nota 58: viernes 07 de junio 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 03 de obra civil, 03 de ornamentación

Nota 59: Se adelantan actividades de remates y pintura para muros estructura y cerchos en area de archivo, se instala la nueva cubierta tipo sandwich en area de archivo y pasillo atencion al usuario

Norma

Powered by CamScanner

Nota 60: Sabado 08 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 03 de obra civil

Nota 61: Se adelanta resanes y pintura en muros de cuartos de archivo, hall y pasillo atencion al usuario. Se recomienda a contratista continuar con el rendimiento para entrega el dia Martes 11 de junio de acuerdo a lo programado en reunión con personal del DILE

Nota 62: Domingo 09 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 03 de obra civil

Nota 63: Continuan los resanes y pintura en cuartos de archivo y pasillos atencion

al usuario.

Nota 64: Martes 11 de junio de 2024
Hora inico: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 3 de o.c y 3 electricos

Nota 65: Se realiza la instalacion de luminarios en area de atencion al usuario y en pasillos. Se adelantan instalaciones electricas de tomacorrientes. Se continuan los resanes y pinturas en cuarto de archivos y Hall

Nota 66: Miercoles 12 de junio de 2024
Hora de inico: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 03 de obra civil, 1 maestro

Norma

Powered by CamScanner

Nota 67: Se realiza pre-entrega de area de atencion al usuario con observaciones puntuales de acabados, al personal de DILE (Revisor actual). Se continua con remates de Wall y pasillo, archivo para realizar entrega el 13/06/2024 al DILE y se programa empezar con el desmonte de divisiones en area administrativa el viernes 14/06/2024. El personal del DILE inicia el traslado de mobiliario a la zona entregada.

Nota 68: Para dar trazabilidad al seguimiento de calidad, se libera rezones para pintura e instalacion de cubierta area administrativa, queda pendiente instalacion de un Flanche y remates de pintura en estructuras.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 69: Jueves 13 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 03 de obra civil.

Nota 70: Se adelantan actividades de remates y resanes faltantes en baños y area de atencion al usuario. Se esta a la espera de liberacion de espacio area administrativa etapa 2 para iniciar con el desmonte de divisiones y cielo raso.

Nota 71: Viernes 14 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 03 de obra civil, 03 electricos

Nota 72: ya se cuenta con el espacio liberado en area administrativa por parte del Dike, por lo tanto se avanza con

Norma

Powered by CamScanner

el desmonte de divisiones existentes y mobiliario. Adicionalmente se cuenta con instalacion de tuberia electrico, pasa muros para tuberia emt desde tablero existente hacia cuarto electrico.

Nota 73: Sabado 15 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 electrico y 2 ac.

Nota 74: Se adelantan actividades de tuberia EMT y pasamuros para nuevo cableado y tablero a cuarto electrico y se cuenta con el desmonte de divisiones en el area administrativa.

Nota 75: Domingo 16 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado, Personal: 3 electrico, 3 DC

Norma

Powered by CamScanner

Nota 76: Se adelanta actividades de instalación de tubería emt, cajas de paso a cuarto electrico, Se avanza con el desmonte de divisiones y mobiliario.

Nota 77: Lunes 17 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 03 de O.C., 2 electricos

Nota 78: Se adelantan actividades de desmonte de luminarias y equipos electronicos area administrativa, se termina el desmonte de de divisiones y se inicia con el desmonte del cielo raso en madera en área administrativa y cuartos aledaños

Norma

Powered by CamScanner

Nota 79: Martes 18 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 03 de O.C. solo trabajan media jornada

Nota 80: Se avanza con el desmonte del cielo raso en madera de área administrativa. No se ejecutan mas actividades. Se recomienda a contratista avanzar con mejor rendimiento y suministro de todos los materiales ya que la fecha de entrega es el 29 de junio.

Nota 81: Miercoles 19 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 02 de OC.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 82: Se termina el desmonte de ciclo raso en madera de cuartos soleados y se inicia los resanes en muros - columnas.

Nota 83: Jueves 20 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 02 de OC

Nota 84: Se avanza los resanes y pañete en muros columnas, se recomienda al contratista aumentar el rendimiento o personal y flujo de materiales

Nota 85: Viernes 21 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 04 de OC.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 86: Se adelanta pañete y resanes de muros aulates contra cubierta en area administrativa y cuartos aledaños.

Nota 87: Se le recomienda a contratista el suministro de la estructura y cubierta tipo sandwich para avanzar y dar cumplimiento a la fecha de entrega.

Nota 88: para dar trazabilidad al seguimiento de calidad, se libera cubierta, flunches, estructura de repuesto, pintura estructura existente, vinilo y remates en muros.

Nota 89: Sabado 22 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 02 de OC.

Nota 90: Se adelantan resanes, paneteo en columnas existentes para alistamiento de pintura y cambio de cubierta.

Nota 91: Domingo 23 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 02 de OC.

Nota 92: Se adelantan actividades de resanes y paneteo en area administrativa.

Nota 93: Lunes 24 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 03 de O.C.

Nota 94: Se adelantan actividades de paneteo y resanes en area administrativa y cuartos aledaños

Norma

Powered by CamScanner

Nota 95: Se evidencia que no se encuentra en obra la cubierta y estructura de refuerzo del area administrativa. Se solicita al contratista la llegada de este material y el avance en obra para dar cumplimiento a la fecha de entrega el 29 de junio de 2024

Norma

Powered by CamScanner

Nota 95: Se evidencia que no se encuentra en obra la cubierta y estructura de refuerzo del area administrativa. Se solicita a contratista la llegada de este material y el avance en obra para dar cumplimiento a la fecha de entrega el 29 de junio de 2024

Nota 96: Martes 25 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado.
personal: 3 de obra civil

Nota 97: Se adelanta actividades de pañetes y resanes en vigas de Area administrativa. Se sigue recomendando a contratista el suministro de perfileria de refuerzo para cubierta en area administrativa.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 98: Miercoles 26 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 de oc, 2 de pintura

Nota 99: Se adelantan actividades de resane, pañete y pintura en area administrativa, no se ha instalado la estructura de refuerzo en area administrativa, interventoria recomienda estos suministros y la teja tipo Sandwich para dar cumplimiento a Fecha de entrega el 29 de junio de 2024

Nota 100: Jueves 27 de junio de 2024
Clima: Nublado
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 3 de obra civil, 2 de estructura

Norma

Powered by CamScanner

Nota 101: Se evidencia la llegada de 8 perfiles en C 160x60x3 para reforzamiento en cubierta zona administrativa, adicionalmente llegan 80 tejas tipo Sandwich y elementos para la zona administrativa.

Nota 102: Se avanza con la instalación de perfilería de refuerzo y pintura de estructura existente en area administrativa y retiros de puntete

Nota 103: Viernes 28 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 2 oc y 2 de estructura

Nota 104: Se avanza con la instalacion de estructura de refuerzo zona administrativa y pintura estructura existente.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 105: Interventoria recomienda a contratista mejorar el rendimiento con mayor personal para asi poder dar cumplimiento a la fecha de entrega el 29 de junio de 2024.

Nota 106: Sabado 29 de junio de 2024
clima: Soleado
Itora de inicio: 7:00 am
personal: 3 de estructura

Nota 107: Se adelanta la instalacion de perfiles en C para cubiertas arcos administrativa. y pintura de estructura existente.

Nota 108: Domingo 30 de junio de 2024
clima: Soleado
Itora inicio: 7:00 am personal: 3 de estructura

Norma

Powered by CamScanner

Nota 413: Se adelantan actividades de pintura y remates en dinteles y porticos aula de sistemas. Se recomienda a contratista proteger los equipos existentes.

Nota 414: No se evidencia ejecución en Submuracion excavacion tanque aguacatl, se ha reiterado esta solicitud, se cuenta con autorizacion de cobro y materiales y aun despues de casi 1 mes no se ha realizado la actividad, permaneciendo el riesgo de afectacion de áreas aledañas y personal de las instituciones.

Nota 415: Miercoles 29 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 3 obra civil, 2 electricos

Nota 416: Se adelantan actividades de pintura porticos estructura en aula de sistemas y remates generales en muros. Se avanza con instalacion de canaleta electrica.

Nota 417: No se evidencia avance en submuracion de excavacion de tanque. Interventoria sigue recomendando ejecutar esta actividad lo antes posible.

Nota 418: Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil, 2 electricos

Norma

Powered by CamScanner

Nota 419: Se adelantan actividades de pintura en porticos y aulas de sistemas. y se avanza con modulación e instalación de canaleta para cableado electrico y datos. No se evidencia avance en la submuracion de la excavación del tanque.

Nota 420: Viernes 31 de Mayo de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 de obra civil, 2 electricos

Nota 421: Se adelantan actividades de pintura en porticos aula de sistemas. Se le recomienda a contratista prestar atencion al detalle de acabados. Tambien se adelanta instalacción de canaleta electrica

Nota 422: No se evidencia avance en la submuracion del tanque aguacell ni en las canalizaciones y cajas aguas lluvia ya que a la fecha no se cuenta con aprobacion del NP del tanque

Nota 423: Dando trazabilidad a seguimiento de calidad, se liberan estructura y montaje de superboard aulas de sistemas y montaje de ventaneria de aulas de sistemas,, Las demas actividades electricas y de acabados no se pueden liberar ya que faltan detalles de acabado

Nota 424: Martes 04 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 2 eléctricos

Nota 425: Se avanza con la submuración de la excavación del tanque aquacell. Están pendientes actividades en Aulas de sistemas como guardaescobas muro intermedio aseo y limpieza.

Nota 426: Miercoles 05 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de O.C y 2 electricos

Nota 427: Se adelanta la submuración de la excavacion del tanque aquacell, y se adelanta instalación de canaletas para red electrica y datos. No se han terminado los pendientes de aulas de sistemas. Se recomienda a contratista mejorar el rendimiento de obra en la parte electrica y de entibación

Nota 428: Jueves 06 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de O.C. y 2 eléctricos

Nota 429: Se adelantan actividades de submuracion excavación tanque aquacell y la instalacion de Canaleta eléctrica.

Norma

Powered by CamScanner

94

Nota 430 : Viernes 07 de junio de 2024
Hora inicio : 7:00 am
Clima : Soleado
personal : 3 de obra civil

Nota 431 : Se adelantan actividades de Submuración en excavacion de tanque aguacell, se evidencia bajo rendimiento en esta actividad. No se adelantan más actividades.

Nota 432 : Se le recomienda a contratista por parte de la interventoría ejecutar las actividades pendientes con mayor rendimiento para cumplir con programación y poder entregar el frente lo antes posible. A la fecha no se cuenta con aprobacion del NP tanque Aguacell por parte de la SED.

Norma

Powered by CamScanner

94

Nota 430 : Viernes 07 de junio de 2024
Hora inicio : 7:00 am
Clima : Soleado
Personal : 3 de obra civil

Nota 431 : Se adelantan actividades de submuración en excavación de tanque aguacell, se evidencia bajo rendimiento en esta actividad. No se adelantan más actividades.

Nota 432 : Se le recomienda a contratista por parte de la interventoría ejecutar las actividades pendientes con mayor rendimiento para cumplir con programación y poder entregar el frente lo antes posible. A la fecha no se cuenta con aprobacion del NP tanque Aguacell por parte de la SED.

Nota 433 : Sabado 08 de junio de 2024
Clima soleado
Hora inicio : 7:00 am
Personal : 3 obra civil

Nota 434 : Se adelantan actividades de remates cubiertas en Aulas de sistemas, de avanza con caja de bombeo y submuracion de tanque

Nota 439 : Martes 11 de junio de 2024
Hora inicio : 7:00 am
clima : Soleado
Personal : 3 electricos, se adelantan actividades de cableado de datos y pintura aulas sistemas

Norma

Powered by CamScanner

Nota 435: Miercoles 12 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 electricos.

Nota 436: Se adelantan actividades de cableado datos y eléctrico en aulas de sistemas.
No se evidencia mas avance en la excavación Subexcavación de tanque aguacell.

Nota 437: Jueves 13 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 electricos

Nota 438: Se adelantan actividades de instalacion de cableado, canaleta cable UTP cat6 de Aulas de sistemas y conexion a rack

Nota 439: viernes 14 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 electricos

Nota 440: se continua cableando e instalando canaletas en aulas de sistemas para mesas equipos de computo. No se adelantan actividades en tanque aguacell. ni en aguas lluvias

Norma

Powered by CamScanner

Nota 441: Sabado 15 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 electricos

Nota 442: Continua el cableado de aula de sistemas, no se evidencia personal de obra civil adelantando submuracion del tanque.

Nota 443: Lunes 17 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 electricos

Nota 444: Se adelantan actividades de cableado otro aulas de sistemas. Llegan 400 m de cable #12 y 600 m cable UTP cat 6. No hay mas personal trabajando en otras areas.

Nota 445: Para dar seguimiento a trafobilidad, se revisa pinturas y acabados a aulas de sistemas donde aún no se libera debido a detalles y que se encuentran en obra electrica

Norma

Powered by CamScanner

Nota 441: Sabado 15 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 electricos

Nota 442: Continua el cableado de aula de sistemas, no se evidencian personal de obra civil adelantando submuracion del techo.

Nota 443: Lunes 17 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 electricos

Nota 444: Se adelantan actividades de cableado otra aulas de sistemas. Llegan 400 m de cable #12 y 600m cable UTP cat 6. No hay mas personal trabajando en otras areas.

Nota 445: para dar seguimiento a trafabilidad, se revisa pinturas y acabados a aulas de sistemas donde aún no se libera debido a detalles y que se encuentran en obra electricos

Nota 446: Martes 18 de junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 02 electricos

Nota: 447: Se adelantan canalizaciones y cableado para redes de datos y electricos en puestos de

Powered by CamScanner

trabajo aulas de sistemas. No se avanza ninguna otra actividad.

Nota 448: Miércoles 19 de junio de 2024
Hora inic : 7:00 am
clima: Soleado
personal: 02 electricos

Nota 449: Se avanza con actividades de cableado datos y electrico aulas de sistemas. No se avanza otra actividad

Nota 450: Se recomienda por parte de interventoria al contratista terminar las actividades de Submuración tanque aguacell. Se recuerda que cualquier afectación a la infraestructura de la institucion deberá ser reparada por el contratista

Nota 451: Jueves 20 de junio de 2024
Hora inic: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 02 electricos

Nota 452: Se sigue con el cableado datos e instalación de canaleta en aulas de sistemas. No se ejecuta ninguna otra actividad

Nota 453: viernes 21 de junio de 2024
Hora inic: 7:00 am
clima: Soleado personal: 02 electricos

Nota 454: Se adelantan y culminan actividades de canaleta y cableado voz y datos y electrica en aulas de sistemas. Queda pendiente conexión a rack con acompañamiento de OTIC para el proximo martes 25 de junio, No se adelantan mas actividades.

Nota455: Lunes 24 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 02 electricos.

Nota 456: Se terminan ultimos detalles y organizacion en cuartos aulas de sistemas por parte de cuadrillla eléctrica. No se ejecutan mas actividades.

Nota 457: Martes 25 de junio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 02 de obra civil

Nota 458: Se adelantan actividades de excavacion canalizaciones para bajantes aguas lluvias. No se adelantan actividades de submuracion ya que el contratista no tiene materiales (cemento). Se solicita por parte de la interventoria Suministro de Materiales y avance de actividades pendientes.

Nota 459: No se cumple la visita por parte de OTIC para acompañamiento conexionado redes de datos a rack.

Powered by CamScanner

Nota 460: No ha llegado el suministro del tanque aquacell, de acuerdo con plan de adquisiciones, el suministro debio llegar el dia de ayer 24/06/2024, Se recomienda a Contratista cumplir con la entrega de estos materiales ya que estos incumplimientos comprometen la entrega en Fecha acordada

Nota 461: Miercoles 26 de junio de 2024
clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 1 residente, 1 maestro, 2 de obra civil, 2 pintores

Nota 462: LLego a obra el suministro de tanque aquacell y accesorios. Se presenta remision N° 4203854853 de MEXICHEM COLOMBIA S.A.S PAVCO WAVIN.

Nota 463: No se evidencia por parte del contratista el avance en actividades de submuracion del tanque aquacell, dejando aun expuestas las paredes socavadas del tanque y permaneciendo el riesgo de derrumbe o afectacion a la infraestructura de la Institucion educativa. Por parte de interventoria se solicita nuevamente al contratista el suministro del material para ejecutar esta actividad. Se adelantan retoques de pintura en media jornada y se adelantan con excavaciones en canalizaciones aguas lluvias.

Nota 464: Jueves 27 de junio de 2024
clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 465: Por parte de interventoria se sigue solicitando a contratista la intervencion de submuracion en la excavacion del tanque aguacell ya que no se ha evidenciado avance en mas de 20 dias y se sigue exponiendo la integridad de la infraestructura. Se avanzan con actividades de canalizaciones aguas lluvias, sin embargo se le solicita a contratista mejorar el rendimiento aumentando el personal de obra que se requiere para hacer la instalacion final del tanque y actividades faltantes en aulas de sistemas y remates en salones y cubiertas tercer piso.

Nota 466: Se evidencia que en aula de sistemas falta conexionado de cable de datos a rack, sin embargo esta actividad debe ser con acompañamiento de OTIC, quienes incumplieron cita programada el pasado viernes 21 de junio de 2024. Se recomienda a contratista programar con Apoyo a la supervision la nueva cita con OTIC por terminar este conexionado y asi tener las aulas habilitadas para el 8 de julio de 2024 fecha de ingreso de los estudiantes.

Nota 467
Viernes 28 de junio de 2024
Clima: Nublado
Hora de inicio: 7:00 am
Personal: 2 de obra civil

Nota 468: Se avanzan actividades de excavacion y demolicion en canalizaciones aguas lluvia. No se evidencia mas avance.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 469: Sabado 29 de Junio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil

Nota 470: Llegan 15 bultos de cemento para actividades de Sobmuración. por parte de interventoría se hace la recomendación a contratista mayor Cantidad de suministro de este insumo ya que no es suficiente para obtener buen rendimiento.

Nota 471: Contratista manifiesta no poder avanzar en actividades por la falta de servicios de agua en la institución. se le recuerda al contratista que los insumos y programación de los mismos es responsabilidad de ellos y las afectaciones que conlleven en programacion de obra la falta de estos insumos es responsabilidad del contratista.

Nota 472: por parte de interventoria se evidencia que la socavación en la excavacion del tanque continua, por esta razón se solicita la intervencion inmediata de la sobmuración para asi realizar la instalación del tanque.

Nota 473: Martes 02 de Julio de 2024
Clima: Soleado
Hora inicio: 7:00 am
personal: 2 de obra civil

del primer piso en la entrada del colegio, ya que esta interfiriendo con la estabilidad de la estructura, se hara un movimiento de esta red.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Ernesto S. Guerrero A.
Residente de Obra.
UT GEPA 2023-1.

Martes 28 de Mayo de 2024.

Nota 074 Personal de obra: 1 residente, 1 residente SST, 1 inspector, 1 maestro. Personal de interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante de estructura metálica, 1 oficial para estuco y pintura. Estado del clima: mañana y tarde soleada. Herramienta y Equipos: Herramienta menor.

Nota 075 Actividades realizadas: Se hace el movimiento del tubo en PVC presión en la cuchilla occidental como autorizo interventoría.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoría.

Miercoles 29 de Mayo de 2024.

Nota 076 Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro. Personal

interventoria: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante estructura metálica. 1 oficial pintura. Estado del clima: Mañana soleada, tarde lluviosa. Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Nota 077 Actividades Realizadas: llegada de correa para instalación de estructura metálica y se prosigue con pintura.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Ernesto S. Guerrero G.
Residente de obra
UT GEPM 2023-1

Jueves 30 de Mayo de 2023

Nota 078 Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro. personal de interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 2 oficiales, 1 Ayudante de estructura metálica. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 079 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Mayo 31 de 2024.

Nota 080 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 oficiales.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/menor.

Nota 081 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso. Avanza el desmonte de la teja de asbesto cemento en la tercera aula del segundo piso del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 01 de 2024.

Nota 082 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 083 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso. Avanza el desmonte de la teja de asbesto cemento en la tercera aula del segundo piso del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 04 de 2024

Nota 084 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Junio 04 de 2024.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 085 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso. La protección de las cubiertas se corrió y hubo empozamiento de agua en el segundo piso que originó filtraciones en el primer piso. Se volvió a instalar el cerramiento provisional de obra a la subida de las escaleras.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 05 de 2024

Nota 086 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 088 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Junio 06 de 2024

Nota 089 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 oficial. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 06 de 2024.

CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna y soleado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 090 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se cubre con plástico negro el aula del segundo piso que queda sobre la sala de profesores.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Viernes. Junio 07 de 2024.

Nota 091 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro.

PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 092 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Sábado. Junio 08 de 2024

Nota 093 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 094 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se desmonta la cubierta del aula 4 y los dos depósitos del segundo piso en el Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 17 de Junio / 2024

Nota 095
Nota Antefechada

La rectora de la institución solicita que se suspendan las actividades de estructura metálica, teniendo en cuenta que se encuentra una de las docentes con migraña, el personal docente se retirará a partir de las 11:30 am.
Informamos que el personal está presente en obra desde las 7: am.

Sandra Cuesyambuco. Ing - SST.

Norma

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

Informe intervención obra 17/06/24

Cordialmente informamos la situación que se presentó hoy 17/06/2024 en la obra-intervención que se viene realizando en el Colegio José Antonio Galán - Bosa

1. Siendo las 8:30 am la señora rectora solicitó a los señores que estaban usando la cortadora de metal y el equipo de soldadura frente a la oficina de coordinación, que nos colaboraran parando un momento el trabajo temporalmente, mientras terminábamos de organizar los espacios de reubicación del personal que labora en la institución hasta antes de mediodía aproximadamente; los señores aceptaron y pararon la actividad solicitada y se dedicaron hacer otra actividad del mismo proceso que era de soldadura.
2. A las 9:30 retomaron nuevamente el proceso para el cual se solicitó para el proceso temporalmente, utilizando la cortadora, lo que generó un olor muy fuerte y mucho ruido frente a la oficina de coordinación y se procedió a solicitar por segunda vez que nos colaboraran parar temporalmente dicha labor.
3. A las 10:20 aproximadamente volvieron a iniciar sus labores por tercera vez, pero en vista de lo sucedido anteriormente, desde rectoría se les solicito parar nuevamente este tipo de trabajo, ya que la situación (ruido y el olor fuerte) se trasladó a los directivos docentes y docentes, afectando la salud la coordinadora que se encontraba en su oficina. La Sra. Sandra Guayambuco (SST) y los trabajadores le indicaron a la almacenista que si había algún inconveniente deberían manifestarlos a través de correo.
4. La rectora muy molesta por la situación de salud que presentaba la coordinadora reitero de manera telefónica a la Ing. María Victoria que por favor le colaboraran mientras se solucionaba la situación de reubicación del personal del colegio. Ella le indico que debería ser por escrito ya que el personal de trabajo no podía estar cesante y que había de por medio un proceso de contratación, a lo cual la rectora manifestó que estaban a menos de una hora de terminar la reorganización, que comprendiera
5. La rectora inmediatamente, siguiendo las indicaciones procedió hablar con el Arq. Enrique y le hizo la misma solicitud y contextualizó de lo que estaba sucediendo en el colegio y que la idea no era obstaculizar el avance de la obra sino facilitarla para garantizar la salud y el bienestar del personal que se encontraba en la institución, ya que "La salud y la vida es primero que una obra". Amablemente manifestó que comprendía y que la idea es que se llegue a un acuerdo para bienestar de todos.
6. Siempre hemos solicitado que la comunicación por parte del colegio y los contratistas sea efectiva y oportuna, situación que no se ha evidenciado como se demuestra en esta actividad el día de hoy.
7. **Finalmente, la rectora logró organizar el personal docente y administrativo, previa reunión y se entregó el sector del colegio intervenido a las 11:30 am aproximadamente.**

Es de resaltar que el colegio siempre ha estado presto a colaborar en la medida de lo posible, CON TIEMPO SUFICIENTE, CON AJUSTE DE HORARIO, ACTIVIDADES Y COMUNICACIÓN OPORTUNA PARA ARMONIZAR EL TRABAJO DE LA OBRA Y EL INSTITUCIONAL. La actividad del día de hoy "ESTRUCTURA METALICA" (Cortado de perfiles metálicos, soldadura de estructura entre otros) requieren de energía eléctrica institucional que genera excesivo ruido y olores imposibilita estar tranquilo frente a esta situación. Este tipo de actividad si se hubiese puesto en conocimiento previo a la rectora para haber ubicado otro lugar fuera del colegio, no hubiese generado traumatismo alguno, pues si bien es cierto que no están los estudiantes si se encuentran laborando los docentes y administrativos.

Agradezco su atención y compresión frente a la dificultad presentada el día de hoy y esperamos que se subsanen los inconvenientes, que por naturaleza genera este tipo de actividades

Cordialmente,

MARLENY AMANDA SARMIENTO MANCIPE
Rectora

Powered by CamScanner

Martes. Junio 11 de 2024

Nota 096 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna y Nublado. Tarde: llovizna y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 097 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de encorozados de muros sobre la fachada principal. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Miércoles. Junio 12 de 2024.

Nota 098 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 099 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de encorozados superiores de muros sobre la fachada principal. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Jueves. Junio 13 de 2024.

Nota 100 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 101 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de encorozados superiores de

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 13 de 2024.

muros sobre la fachada principal sobre la Carrera 78 J.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Viernes. Junio 14 de 2024.

Nota 102 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 103 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de encorozados superiores de muros sobre la fachada principal.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Sábado. Junio 15 de 2024.

Nota 104 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 105 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de encorozados superiores de muros sobre la fachada principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Nota 106 Nota de Interventoria: Se solicita al Contratista mantener protegidas las aulas del segundo piso, para evitar que el agua lluvia ingrese a los espacios del primer piso.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes. Junio 17 de 2024.

Nota 107 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes, 1 estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 108 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la estructura de la cubierta de las otras aulas que se está soldando en el patio del Bloque A. Se aplica pintura vinilo sobre los muros de aulas en el segundo piso del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Nota 109 NOTA DE INTERVENTORÍA: Durante el fín de semana se produjeron fuertes aguaceros que inundaron el segundo piso del Bloque A y se filtró el agua a espacios en el primer piso, ocasionando algunos estragos, que son responsabilidad del Contratista por mantener cubiertas las aulas del segundo piso y por no dinamizar el proceso de obra del cambio de cubiertas.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Martes. Junio 18 de 2024.

Nota 110 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Fuerte aguacero. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Junio 18 de 2024.

Nota 111 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se demuele un tramo de muro para conectar el segundo piso del Bloque A con el pasillo del segundo piso del Bloque B. Continúa la soldadura de la nueva estructura de cubierta del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 19 de 2024.

Nota 112 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. 1 Estructural, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 113 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la soldadura de la nueva estructura de cubierta del Bloque A. Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 20 de 2024.

Nota 114 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Estructural, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 115 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 20 de 2024.

Continúa la soldadura de la nueva estructura de cubierta del Bloque A. La almacenista hace entrega de los espacios restantes (aulas, oficinas y patio central del Bloque A), a la directora de obra. En ese orden de ideas, todas las áreas de trabajo están a disposición del Contratista.



Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 21 de 2024

Nota 116 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Estructural, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 117 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura de cubierta del Bloque A.



Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 22 de 2024.

Nota 118 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Estructural, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 119 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de

Norma

Powered by CamScanner

Sábado. Junio 22 de 2024.

muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de cubierta del Bloque A.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Junio 24 de 2024.

Nota 120 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Estructural, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 121 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta del Bloque A. Inicia la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de cubierta.

f/ Juan Carlos Delgado C.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 25 de 2024.

Nota 122 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 123 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Junio 25 de 2024.

de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Continúa la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Inicia la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en las aulas 201 y 202 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 26 de 2024

Nota 124 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Compresor para pintura. Herramienta menor.

Nota 125 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Continúa la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de la cubierta. Continúa la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en las aulas 201 y 202 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 27 de 2024.

Nota 126 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Compresor. Herramienta menor.

Nota 127 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Continúa la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de la cubierta. Continúa la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en las aulas 201 y 202 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal.

Viernes. Junio 28 de 2024.

Nota 128 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Compresor. Herramienta menor.

Nota 129 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Continúa la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de la

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Julio 28 de 2024.

cubierta. Continúa la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en las aulas 201 y 202 del Bloque A.

f/ Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 29 de 2024.

Nota 130 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/menor. Compresor.

Nota 131 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado superior de muros en aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la soldadura de la nueva estructura metálica de la cubierta en el Bloque A. Continúa la aplicación de anticorrosivo a la nueva estructura metálica de la cubierta. Continúa la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en las aulas 201 y 202 del Bloque A.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Julio 02 de 2024.

Nota 132 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes. 1 Estructural. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Compresor para pintura. Herramienta menor.

Nota 135 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia el pañetado del encorozado superior de muros de aulas del segundo piso del Bloque A. Avanza la instalación de

Norma

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - S.E.D.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 5305583
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

OBJETO: Adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

BITÁCORA DE OBRA COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1.PCCNTR 5313251.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARÍA 022

SUPERVISOR: Arq. CARLOS ROLANDO ARIAS.

DIRECCIÓN: CARRERA 87 K No. 69-40 sur
LOCALIDAD: 07-BOSA

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles. Mayo 29 de 2024

2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 105 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Geotextil en el cárcamo. Inicia el impermeabilizado de muros con Sika.

f: Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Jueves, Mayo 30 de 2024.

Nota 106 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 107 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de geotextil en el cárcamo. Avanza la construcción de una caja de inspección para cambio de dirección en la nueva red de aguas lluvias. Continúa el impermeabilizado de muros con sika.

f: Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Mayo 31 de 2024.

Nota 108 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Mayo 31 de 2024.

HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 109 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de geotextil en el cárcamo. Continúa la construcción de la caja de inspección de aguas lluvias. continúa el impermeabilizado con sika.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 01 de 2024.

Nota 110 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector, ESTADO DEL CLIMA. Mañana. Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 111 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de geotextil en el continúa la construcción de la caja de inspección de aguas lluvias. Continúa el impermeabilizado de muros con sika.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Lunes Festivo. Junio 03 de 2024

Nota 112 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 113 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el impermeabilizado con sika.

Powered by CamScanner

Se sella la puerta del baño de niñas con bloque de arcilla y se pañeta. Se demuele ~~ta~~ pw el muro para el vano de la puerta en el baño de niñas.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoría

Martes. Junio 04 de 2024

Nota 114 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales. 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 115 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Pañete impermeabilizado de muros. Desmonte de aparatos sanitarios en el baño de niñas. Desmonte de divisiones en acero inoxidable en el baño de niñas. Avanza el laminado de los muros en superboard. Reinstalación del cerramiento provisional en polisombra verde.

Juan Carlos Delgado Coneal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 05 de 2024.

Nota 116 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 117 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Pañete impermeabilizado de muros. Avanza el laminado de muros en superboard. Inicia la demolición del piso de la ludoteca en baldosa del piso en granito pulido.

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 05 de 2024.

Cimbrado de linea del zócalo de muro exterior.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Jueves. Junio 06 de 2024.

Nota 118 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado y llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 119 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Pañete impermeabilizado de muros. Avanza el laminado de muros y de cielo raso en superboard. Finaliza la demolición del piso de la ludoteca en baldesa de granito pulido. Inicia la construccion de la caja de inspección en el área de módulos.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Junio 07 de 2024.

Nota 120 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañaña: Soleado. Tarde: Nublado


Nota 121. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición del enchape del futuro baño de niñas. en los 4 muros, se definen espacios y divisiones para baños de niñas y niños,

Norma

Powered by CamScanner

NOTA 122 Se definen Puntos Sanitarios en batería de Mujeres de los cuales 2 se trasladan y 1 de infantil el baño central se mantiene el existente.
en el cuarto de refrigerios se define mesón en acero inoxidable con entrepaño y lavaplatos ó Zona de lavado costado izquierdo, mesón con facilidad de movimiento para aseo.

NOTA 123 Se define en conciliación con interventoría Arq. Juan Carlos Delgado un sistema de escorrentía de aguas lluvias lateral, con filtro francés y revestimiento en concreto para evitar filtración de aguas lluvias en muros y Pisos de sede escolar.

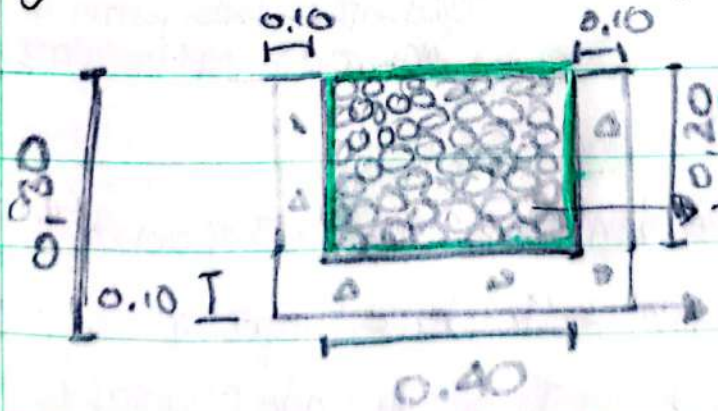

Sábado. Junio 08 de 2024.

Nota 124 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

Norma

Powered by CamScanner

Sábado. Junio 08 de 2024

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 125 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición del enchape de muros del futuro baño de niñas. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 11 de 2024.

Nota 126 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna y Nublado. Tarde: Llovizna y nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 127 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición del enchape de muros del futuro baño de niñas. Inicia la instalación de tubería hidráulica en el cuarto de camillas y el cuarto de aseo. Inicia la demolición del piso de la biblioteca. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 12 de 2024.

Nota 128 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 129 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición del enchape de muros del futuro baño de niñas. Continúa la instalación de tubería

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 12 de 2024.

hidráulica en el cuarto de camillas y el cuarto de aseo. Continúa la demolición del piso de la biblioteca.

Atte. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 13 de 2024.

Nota 130 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 131 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de enchape de muros en el futuro baño de niñas. Continúa la instalación de tubería hidráulica en el cuarto de camillas y el cuarto de aseo. Continúa la demolición del piso de la biblioteca

Atte. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Junio 14 de 2024

Nota 132 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante, PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y lluvioso. EQUIPOS: Herramienta menor.

Nota 133 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de enchape de muros en el futuro baño de niñas. Continúa la instalación de tubería hidráulica en el cuarto de camillas y el cuarto de aseo. Continúa la demolicion del piso de la biblioteca

Atte. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Sabado. 15 de junio de 2024.

Nota 134 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante, PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 135 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de enchape de muros en el futuro baño de niñas. Continúa la instalación de tubería hidráulica en el cuarto de camillas y el cuarto de aseo. Continúa la demolición del piso de la biblioteca.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Junio 17 de 2024.

Nota 136 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 137 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 18 de 2024.

Nota 138 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Fuerte Aguacero. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Junio 18 de 2024

Nota 139 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca. f/ Juan Carlos Delgado Correal. Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 19 de 2024.

Nota 140 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 141 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Jueves. Junio 20 de 2024

Nota 142 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 143 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca. f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Junio 21 de 2024

Nota 144 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Herramienta menor.

Nota 145 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 22 de 2024

PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/menor.

Nota 146 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de tubería hidráulica en el cuarto de refrigerios. Continúa la demolición del piso de la biblioteca.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Junio 24 de 2024

Nota 147 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector. 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes,
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Herramienta menor.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes. Junio 24 de 2024

Nota 148 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de rejas en las ventanas de la fachada lateral. Instalación de rejas en las ventanas de la fachada posterior. Ajustes al cubículo de vigilancia en superboard

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Junio 25 de 2024

Nota 149 PERSONAS DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado. Tarde: Soleado EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/menor.

Nota 150 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de rejas en las ventanas de la fachada lateral. Instalación de rejas en las ventanas de la fachada posterior. Avanza la instalación del superboard en el cielo raso de la zona de cubículos

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 26 de 2024.

Nota 151 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS: Herramienta menor.

Nota 152 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avanza el parete interior impermeabilizado de la ludoteca. Avanza la instalación de superboard en el cielo raso de la zona de cubículos

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 27 de 2024

Nota 153 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 154 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Desmonte de aparatos sanitarios en el futuro baño de niños. Demolición de enchapes de muros y de pisos del futuro baño de niños. Avanza el pañete impermeabilizado de la ludoteca. Avanza la instalación del superboard en el cielo raso de la zona de cubículos.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Junio 28 de 2024.

Nota 155 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 156 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición de enchapes de muros y de pisos del futuro baño de niños. Avanza el pañete interior impermeabilizado de la ludoteca. Avanza la instalación del superboard en el cielo raso de la zona de módulos. Continúa la instalación de rejas en las ventanas de las fachadas lateral y posterior. Inicia la instación de redes hidrosanitarias en el futuro baño de niños.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Sábado. Junio 29 de 2024.

Nota 157 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 158 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avanza el pañete interior impermeabilizado de la ludoteca. Inicia la primera mano de pintura vinilo en los muros en superboard en la zona de módulos. Continúa la instalación de redes hidrosanitarias en el futuro baño de niños.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Julio 02 de 2024

Nota 159 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 3 oficiales, 2 Ayudantes.
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA.
Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Herramienta menor.

Nota 160 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avanza el pañete impermeabilizado de la ludoteca. Continúa la instalación de redes hidrosanitarias en el futuro baño de niños. Inician las demoliciones de muros en el actual área de servicios del primer piso. Continúa la primera mano de pintura vinilo en los muros en superboard en la zona de módulos.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Nota 338: Del 15 de Mayo del 2024 al 30 de Mayo de 2024 No se ejecutan actividades en el frente de obra, quedando pendiente unicamente observaciones de remates en graderias, retoques de puertas y tratamiento de humedades en cuarto de rack e instalacion de barandas graderias.

Nota 339: Viernes 31 de Mayo de 2024 clima soleado:
Inicio: 7:00 am
Personal: 2 obra civil, 1 Residente.

Nota 340: Se realiza instalacion de barandas en graderias, remates de cañuelas y dilataciones y lavado de Mamposteria, se realiza pre-acta de entrega quedando como observaciones pendientes la instalacion de tapa registro agua potable, tapa-caja ciega punto electrico oficina a poste iluminacion graderias y se define realizar pintura en trafico pesado para las graderias aprobado por Arq Luis Enrique Compos apoyo a la supervision. Quedan como compromiso realizar entrega a la institución el dia 06 de junio de 2024.

Nota 341: Del 01 de junio de 2024 al 05 de junio de 2024 no se realiza ninguna actividad en el Colegio ni se cuenta con personal de obra. Se solicita a contratista en comite semanal realizar las actividades pendientes para entregar Frente

Powered by CamScanner

Nota 342: Jueves 06 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - Lluvias en la tarde
personal: 2 de obra civil

Nota 343: Se realiza tratamiento y arreglo humedad en muros cuarto de rack y se realizan retoques de pintura solicitados en puertas de cuarto de rack y aula de Ingles. No se puede ejecutar pintura en graderias por lluvias.

Nota 344: Viernes 07 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 345: Se realiza pintura de placas en concreto y media cañas graderias cancha. Queda pendiente la instalacion de tapa registro agua y caja-tapa ciega aledaño a poste de iluminación graderias. Se solicita a contratista cerrar pendiente para realizar entrega el morte 11 de junio de 2024 de acuerdo a compromiso con el comite de obra..

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA EL MOTORISTA I.E.D.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. - S.E.D.

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR 5305583

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

OBJETO: Adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR 5313251

INTERVENTOR: CONSORCIO SANTA MARÍA 022

SUPERVISOR: Arq. CARLOS ROLANDO ARIAS.

DIRECCIÓN:


LOCALIDAD: 07-BOSA

Powered by CamScanner

Lunes 27 de Mayo de 2024

Nota 066 Personal de Obra: 1 Residente, 1 inspector, 1 SST
Personal Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector
Estado Clima: Mañana Soleado; Tarde: Nublado.
Equipos y Herramientas: N/A

Nota 067 Actividades Ejecutadas: Se realiza reunion con personal de obra para revisar y replantear la ubicación y cantidad de postes para cerramiento tipo SED, para iniciar con su fabricación.

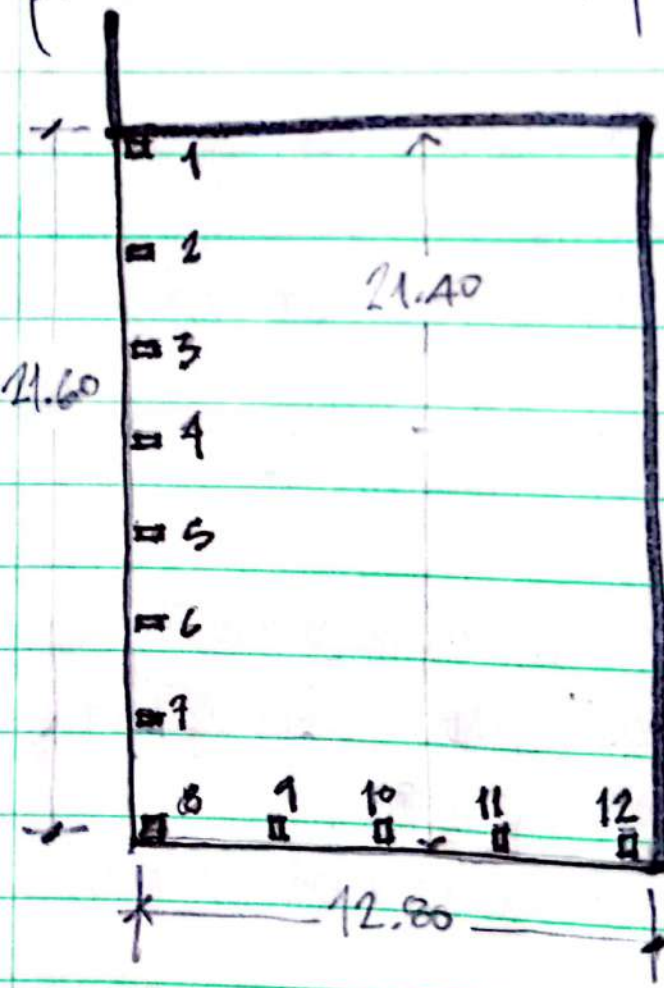

Se conversa con el Rector quien solicita una ventana frente a la oficina de rectoría para control e iluminación y aprobado por apoyo a la supervisión, de igual forma que el recubrimiento en concreto de la base del muro y la

Norma

Powered by CamScanner

conformación de la graderia.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jaime Molina
Residente Obra
UT GePM

Martes. Mayo 28 de 2024.

Nota 068 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lloviznas. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 069 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Mayo 29 de 2024.

Nota 070 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 071 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Mayo 30 de 2024

Nota 072 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Mayo 30 de 2024.

Nota 073 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Mayo 31 de 2024.

Nota 074 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 075 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 01 de 2024.

Nota 076 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 077 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.

Martes. Junio 04 de 2024.

Nota 078 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde. Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A

Nota 079 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se ejecutan.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 05 de 2024.

Nota 080 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 oficial, 1 Ayudante. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS: Herramienta menor.

Nota 081 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Excavación de hoyos para pedestales.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Junio 06 de 2024

Nota 082 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA. 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 083 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Excavación para vigas de cimentación del cerramiento tipo SED. Armado de aceros de refuerzo para pedestales.

Juan Carlos Delgado. Correal.
Residente de interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 07 de 2024.

Nota 084 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y soleado. EQUIPOS: Herramienta menor.

Nota 085 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Solado de limpieza en las zanjas de las vigas de cimentación del cerramiento perimetral tipo SED.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Junio 07 de 2024.

Armado de aceros de refuerzo para los pedestales del cerramiento perimetral tipo SED. → Juan Carlos Delgado Correal. Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 08 de 2024.

Nota 086 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 087 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Armado de aceros de refuerzo para los pedestales del cerramiento perimetral tipo SED. Fundida de pedestales del cerramiento perimetral tipo SED. → Juan Carlos Delgado Correal. Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022.

Martes: Lunes. Junio 11 de 2024.

Nota 088 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 Ayudantes, 1 oficial. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Interventoría Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna y Nublado. Tarde: Llovizna y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 089 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Armado de aceros de refuerzo para la viga de contrapiso del cerramiento tipo sed. → Juan Carlos Delgado C. Residente Interventoría Consorcio Sta María 022.

Miércoles. Junio 12 de 2024.

Nota 090 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 12 de 2024.

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 091 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Armado de aceros de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento tipo SED.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 13 de 2024.

Nota 092 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 093 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Armado de aceros de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento tipo SED. Llegan los aceros de refuerzo para la placa de contrapiso del nuevo patio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 14 de 2024.

Nota 094 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 095 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Armado de aceros de refuerzo para la

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Junio 14 de 2024.

placa de contrapiso del nuevo patio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 15 de 2024.

Nota 096 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 Ayudantes, 2 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 097. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se funde la viga de cimentación del cerramiento perimetral tipo SED. Continúa el armado de aceros de refuerzo para la placa de contrapiso del nuevo patio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Junio 17 de 2024.

Nota 098 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 099 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el armado de aceros de refuerzo para la placa de contrapiso del nuevo patio. Se desencofra la viga de cimentación del cerramiento perimetral tipo SED.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Junio 18 de 2024.

Nota 100 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: fuerte aguacero. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 101 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el armado de aceros de refuerzo para la placa de contrapiso del nuevo patio. Se realiza el encofrado de la placa de contrapiso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 19 de 2024.

Nota 102 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 2 Ayudantes. 2 operadores de bomba, 5 conductores de mixer. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 5 mixers de 8,00 m^3, 1 Bomba de concreto móvil, Herramienta menor.

Nota 103 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se funde la placa de contrapiso del nuevo patio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 20 de 2024

Nota 104 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 20 de 2024.

DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 105 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se cimbra la rampa y la escalera sobre la placa. Se refila con pulidora, el borde sur de la placa contra el cárcamo.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 21 de 2024.

Nota 106 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 2 Ayudantes.

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 107 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el refilado con pulidora del borde sur de la placa de contrapiso hacia el cárcamo.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sabado. Junio 22 de 2024.

Nota 108 PERSONAL DE OBRA. 1 Inspector, 1 Residente, 1 SST, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/menor.

Nota 109 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza el refilado con pulidora del borde sur de la placa contra el cárcamo

J.C. Delgado C.
Resid. Interventoría
Cons. Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes. Junio 24 de 2024.

Nota 110 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Residente. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTA: N/A.

Nota 111 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 25 de 2024

Nota 112 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 113 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 26 de 2024.

Nota 114 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 115 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 27 de 2024

Nota 116 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 117 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Junio 28 de 2024.

Nota 118 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 119 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 29 de 2023

Nota 120 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 121 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Las anteriores observaciones deben ser subsanadas en el transcurso de la semana junto con la actividades del segundo piso

Jaime Molina
Residente Obra
UT GePM

Nota 232: Miercoles 29 de Mayo de 2024
clima; Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal: 3 de obra civil

Nota 233: Se adelantan actividades de rembayuillos salones segundo piso y de hall segundo piso, primera mano de pintura blanca Salones segundo piso, Se recomienda a contratista tener atención al detalle de acabados en pintura muros y techos.

Nota 234: para dar trazabilidad a seguimiento de calidad, se han liberado placas y alistado de pisos de todos los salones, falta por liberar pintura de Muros en estuelte, en vinilo, cielo raso, luminarias, tomacorrientes, enchape piso en tableta terrazo por pendientes y detalles de acabados que se le solicitan al contratista corregir, de igual manera la ventaneria y vidrieria instalada.

Nota 235: Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Nublado

Powered by CamScanner

Personal: 4 de obra civil, 1 residente, 1 maestro

Nota 236: Se adelantan actividades de pintura en salones del segundo piso muros y estructura portico y se sigue avanzando con reemboquillado de muros en Hall y escaleras

Nota 237: Viernes 31 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil, 1 residente, 1 inspector

Nota 238: Se adelantan actividades de pintura en cemstite muros y estructura (portico) salones segundo piso y se realiza remates de filos y reemboquillado es Hall y escaleras segundo piso. Se recomienda al contratista terminar actividades lo antes posible, ya que hay un atraso en entrega de acuerdo a programación.

Nota 239: Se define con apoyo a la Supervision y con el contratista la intervención de la fachada interna del Bloque de preescolar, realizando actividades de resane y pintura. Se le solicita avanzar al contratista con este alcance y enviar presupuesto

Powered by CamScanner

Nota 240: Sabado 01 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil

Nota 241: Se adelantan actividades de pintura y acabados salones del segundo piso y se realiza pintura primera mano en Hall y escaleras segundo piso

Nota 242: Martes 04 de junio de 2024.
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 7 de obra civil

Nota 243: Se adelantan actividades de remates pintura salones segundo piso, hall y escaleras, Se adelanta la construccion de bocapuertos en granito salones segundo piso. Se Solicita a contratista realizar la pintura de los puertos de los 6 salones intervenidos y revisar detalles de filos, ventaneria, y acabados de pintura

Nota 244: Miercoles 05 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil

11 11

NKA

Powered by CamScanner

Nota 245: Se adelantan actividades de bocaporitos en granito sobre segundo piso y recortes de pintura en Hall y escaleras segundo piso. Los salones del primer piso estan en fraccionamiento por parte de la institucion sin embargo no se ha realizado entrega formal debido a detalles pendientes en cielo raso, interruptores, ventaneria, pintura puertas, y filos intervenidos.

Nota 246: Jueves 06 de junio de 2024
clima: Soleado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecutan actividades por falta de personal

Nota 247: viernes 07 de junio de 2024
clima: Nublado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecutan actividades por falta de personal

Nota 248: Actividades pendientes para entrega final no se han realizado, se solicita a contratista realizar acabados finales de pintura, cielo raso, luminarias, tomacorrientes, brillado de piso Hall segundo nivel, pintura de puertas y recortes ventaneria. A la fecha no se ha recibido el presupuesto para la pintura de fachada interna

Lunes 27 de Mayo 2024.

Nota 384. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector.

Nota 385. Actividades Realizadas: No se ejecutaron actividades.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra
UT GEPA 2023-1.

Martes 28 de Mayo 2024.

Nota 386. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector. 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoria: 1 residente, 1 inspector.

Nota 387. Actividades Realizadas: No se ejecutaron actividades.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra.
UT GEPA 2023-1.

Miercoles 29 de Mayo de 2024.

Nota 388. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoria: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante de cubiertas. Estado clima: Mañana soleado, tarde nublado y lluvia en la tarde. Herramientas y Equipos: Herramiente menor.

Nota 389. Actividades Ejecutadas: Se trabajo en cubierta en horas de la mañana.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra.
UT GEPA 2023-1.

Jueves. Mayo 30 de 2024.

Nota 390 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 391. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de teja tipo sándwich en la cubierta del área de orientación

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Viernes. Mayo 31 30 de 2024.

Nota 392 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 393 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 01 de 2024.

Nota 394 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 395 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Junio 04 de 2024.

Nota 396 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 397 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 05 de 2024.

Nota 398 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 399 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 06 de 2024.

Nota 400 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 instaladores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 401. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se instala un vidrio de una ventana del salón

Powered by CamScanner

Jueves. Junio 06 de 2024.

303. Se instala un vidrio del Basculante vertical en una ventana del salón 305. Se instala el espejo faltante en el baño de hombres del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 07 de 2024.

Nota 402 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 403 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realiza lavado de piso del patio de preescolar con hidrolavadora. Inicia el encorozado de muros en el aula 309.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 08 de 2024.

Nota 404 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: H/ menor.

Nota 405 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia el encorozado de muros en el aula de procesos básicos. Se aplica la pintura base color azul en el piso del patio de preescolar.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 11 de 2024.

Nota 406 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna y Nublado. Tarde: Llovizna y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 407 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado de muros en las aulas del costado sur del tercer piso. Se aplica la pintura de acabado de colores en el piso del patio de preescolar.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Junio 12 de 2024

Nota 408 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Llovizna. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 12 de 2024

HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 409 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado de muros en las aulas del costado sur del tercer piso. Inicia el desmonte de cubiertas en el auditorio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 13 de 2024.

Nota 410 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes, 2 eléctricos. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 411 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el encorozado de muros en las aulas del costado sur del tercer piso. Continúa el desmonte de cubiertas en el auditorio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Junio 14 de 2024.

Nota 412 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 ofical, 2 Ayudantes, 2 eléctricos. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 413 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de las tejas de asbesto cemento en la cubierta del auditorio. Se descuelgan las lámparas del salón 308 para que queden al nivel de la viga de amarre superior y no proyecten sombras. sobre el aula de clase.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Junio 15 de 2024.

Nota 414 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes, 2 eléctricos. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 415 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de tejas de asbesto cemento en la cubierta del auditorio. Se descuelgan las lámparas del salón de procesos básicos, para que queden al mismo nivel de las vigas.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Lunes
Martes. Junio 17 de 2024.

Nota 416 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 418 417 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de tejas de asbesto cemento en la cubierta del auditorio.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 18 de 2024.

Nota 418 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Fuerte Aguacero. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 419 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de tejas de asbesto cemento en la cubierta del auditorio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Junio 19 de 2024.

Nota 420 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales. 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 421 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Continúa el encorozado de muros en las aulas del costado sur del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Junio 20 de 2024

Nota 422 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor.

Nota 423 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la teja tipo sándwich (lámina inferior) en la cubierta del auditorio. Continúa el encorozado de muros en las aulas del costado sur del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Viernes. Junio 21 de 2024.

Nota 424 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 425 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Continúa el encorozado superior de muros en las aulas del costado sur del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 22 de 2024

Nota 426 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 427 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la instalación de la lámina inferior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Continúa el encorozado superior de muros en las aulas del costado sur del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente del Interventoría
Consorcio Santa Maria 022

Lunes. Junio 24 de 2024

Nota 428 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 429 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación del relleno termoacústico de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Junio 25 de 2024

Nota 430 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 431 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de lámina superior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del tercer piso de la sede educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Miércoles. Junio 26 de 2024.

Nota 432 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA, Mañana: Soleado. Tarde: llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 433 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la lámina superior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del piso 3.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 434 Jueves. Junio 27 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 435 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la lámina superior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del tercer piso

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Junio 28 de 2024

Nota 436 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales. 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 437 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la lámina superior de la teja tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del piso 3.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Junio 29 de 2024.

Nota 438 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 2 oficiales. 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado.

Nota 439 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Continúa la instalación de la lámina superior de la teja superior tipo sándwich en la cubierta del auditorio. Se instalan flanches laterales en la cubierta del auditorio. Avanza el encorozado superior de muros en las aulas del costado oriental del tercer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner
