ACTA DE COBRO N° 05

PERIODO: DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024 AL 26 DE MARZO DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

1. OFICIO DE RADICACION

Bogotá D.C, 10 de mayo de 2024 TOTALL-112-RJ-076

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL
Arq. Daniel Merchán
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
Tel: 310 852 5132
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 05

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 05 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
    1. Plan de Calidad
    2. PGAS
    3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,



Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

2. LISTA DE CHEQUEO

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	5

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 4	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		
3*	**Balance Financiero del Contrato de Interventoría.** Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	**CUMPLE**		
4*	**Cumplido técnico contrato de Interventoría.** Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		**N/A**	
5*	**Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra** Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	**CUMPLE**		
6*	**Acta parcial de pago de Interventoría**	**CUMPLE**		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra $ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría $ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
8*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)			
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura	**CUMPLE**		
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	**CUMPLE**		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	5

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 4	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
10*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	**CUMPLE**		
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		
12*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad		**N/A**	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		
14	**Informe de Interventoría.** Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	**CUMPLE**		
	Certificación entrada a almacén			
15	Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

CONSULTOR INTERVENTORIA : TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL : $222.158.720,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $111.079.360,00
VALOR TOTAL : $333.238.080,00
FECHA DE INICIO : 26-oct.-23
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Cincuenta y cinco (55) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : Sesenta (60) dias calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 24-abr.-24
PERIODO DEL CORTE : 26 FEBRERO DE 2024 - 26 MARZO DE 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No.)					$0,00	$0,00	$333.238.080,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. 9)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	$16.807.550,46	$0,00	$0,00	$16.807.550,46	$316.430.529,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No.)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	$22.372.203,87	$0,00	$0,00	$22.372.203,87	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No.)	28 diciembre - 26 enero 2024	OBRA	$34.023.212,80	$0,00	$0,00	$34.023.212,80	$260.035.112,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)	26 enero 2024 - 26 febrero 2024	OBRA	$30.708.152,82	$0,00	$0,00	$30.708.152,82	$229.326.960,05
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No.)	26 febrero 2024 - 26 marzo 2024	OBRA	$26.025.081,39	$0,00	$0,00	$26.025.081,39	$203.301.878,66
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$203.301.878,66
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$203.301.878,66
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No.)			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$203.301.878,66
TOTALES			**$129.936.201,34**		**$0,00**	**$129.936.201,34**	**$203.301.878,66**

SALDO POR EJECUTAR	**$203.301.878,66**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR CORTE POR PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)	OBRA		$0,00		$0,00	$333.238.080,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	OBRA	18/01/2024	$16.807.550,46		$0,00	$316.430.529,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. ___)	OBRA	8/02/2024	$22.372.203,87		$0,00	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$34.023.212,80	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$30.708.152,82	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$26.025.081,39	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$294.058.325,67
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00		$0,00	$294.058.325,67
TOTALES			**$39.179.754,33**		**$90.756.447,01**	**$294.058.325,67**

SALDO POR PAGAR	**$294.058.325,67**

VALOR A LIBERAR	**$0,00**

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

DANIEL MERCHAN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°5

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5				
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2	1,00	$ 4.522,00	$ 4.522,00
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	1,00	$ 19.137,00	$ 19.137,00
1.3	Cerramiento provisional en lámina galvanizada - Teja de zinc h=2,15m. (Incluye	ML	1,00	$ 143.744,00	$ 143.744,00
1.4	Cerramiento provisional h=2,14 M. Tipo Aceso o similar. (Incluye puertas y	ML	1,00	$ 60.994,00	$ 60.994,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon	M2	1,00	$ 13.171,00	$ 13.171,00
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 38.943,00	$ 38.943,00
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 14.121,00	$ 14.121,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.956,00	$ 12.956,00
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 16.392,00	$ 16.392,00
1.10	Desmonte de tanque elevado. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 91.901,00	$ 91.901,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	$ 15.954,00	$ 15.954,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	$ 18.314,00	$ 18.314,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios,	M2	1,00	$ 13.380,00	$ 13.380,00
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 10.934,00	$ 10.934,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 8.090,00	$ 8.090,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 14.438,00	$ 14.438,00
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 21.828,00	$ 21.828,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML	1,00	$ 3.686,00	$ 3.686,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	$ 6.103,00	$ 6.103,00
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 10.997,00	$ 10.997,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML	1,00	$ 2.749,00	$ 2.749,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN	1,00	$ 105.138,00	$ 105.138,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN	1,00	$ 14.145,00	$ 14.145,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML	1,00	$ 19.537,00	$ 19.537,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 14.913,00	$ 14.913,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 289.093,00	$ 289.093,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML	1,00	$ 30.082,00	$ 30.082,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML	1,00	$ 188.831,00	$ 188.831,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 18.106,00	$ 18.106,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2	1,00	$ 4.053,00	$ 4.053,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	1,00	$ 37.009,00	$ 37.009,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML	1,00	$ 8.173,00	$ 8.173,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 11.318,00	$ 11.318,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 11.601,00	$ 11.601,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 4.522,00
-	-1,00	$ 19.137,00
-	-1,00	$ 143.744,00
-	-1,00	$ 60.994,00
-	-1,00	$ 13.171,00
-	-1,00	$ 38.943,00
-	-1,00	$ 14.121,00
+	8,00	$ 103.648,00
-	-1,00	$ 16.392,00
-	-1,00	$ 91.901,00
-	-1,00	$ 15.954,00
+	2,00	$ 36.628,00
-	-1,00	$ 13.380,00
-	-1,00	$ 10.934,00
+	13,00	$ 105.170,00
-	-1,00	$ 14.438,00
-	-1,00	$ 21.828,00
+	46,12	$ 169.998,32
+	7,16	$ 43.697,48
+	17,00	$ 186.949,00
+	15,00	$ 41.235,00
-	-1,00	$ 105.138,00
-	-1,00	$ 14.145,00
-	-1,00	$ 19.537,00
-	-1,00	$ 14.913,00
-	-1,00	$ 289.093,00
-	-1,00	$ 30.082,00
-	-1,00	$ 188.831,00
-	-1,00	$ 18.106,00
-	-1,00	$ 4.053,00
-	-1,00	$ 37.009,00
-	-1,00	$ 8.173,00
-	-1,00	$ 11.318,00
-	-1,00	$ 11.601,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	9,00	$ 116.604,00	9,00	$ 116.604,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	3,00	$ 54.942,00	3,00	$ 54.942,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	14,00	$ 113.260,00	14,00	$ 113.260,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	47,12	$ 173.684,32	47,12	$ 173.684,32
	$ 0,00	8,16	$ 49.800,48	8,16	$ 49.800,48
6,00	$ 65.982,00	12,00	$ 131.964,00	18,00	$ 197.946,00
	$ 0,00	16,00	$ 43.984,00	16,00	$ 43.984,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 5.669,00	$ 5.669,00	-	-1,00	$ 5.669,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 10.600,00	$ 10.600,00	+	84,29	$ 893.474,00		$ 0,00	85,29	$ 904.074,00	85,29	$ 904.074,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 12.152,00	$ 12.152,00	-	-1,00	$ 12.152,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 12.703,00	$ 12.703,00	-	-1,00	$ 12.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	1,00	$ 12.053,00	$ 12.053,00	-	-1,00	$ 12.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 5.513,00	$ 5.513,00	+	44,35	$ 244.501,55		$ 0,00	45,35	$ 250.014,55	45,35	$ 250.014,55
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 6.487,00	$ 6.487,00	-	-1,00	$ 6.487,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 19.241,00	$ 19.241,00	-	-1,00	$ 19.241,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 40.606,00	$ 40.606,00	-	-1,00	$ 40.606,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 72.398,00	$ 72.398,00	-	-1,00	$ 72.398,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 15.067,00	$ 15.067,00	-	-1,00	$ 15.067,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 14.170,00	$ 14.170,00	+	42,73	$ 605.484,10		$ 0,00	43,73	$ 619.654,10	43,73	$ 619.654,10
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 24.395,00	$ 24.395,00	-	-1,00	$ 24.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN	1,00	$ 35.237,00	$ 35.237,00	-	-1,00	$ 35.237,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 59.197,00	$ 59.197,00	-	-1,00	$ 59.197,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML	1,00	$ 23.322,00	$ 23.322,00	-	-1,00	$ 23.322,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición	M3	1,00	$ 336.257,00	$ 336.257,00	-	-1,00	$ 336.257,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 54.128,00	$ 54.128,00	-	-1,00	$ 54.128,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 28.687,00	$ 28.687,00	-	-1,00	$ 28.687,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 29.343,00	$ 29.343,00	-	-1,00	$ 29.343,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 66.596,00	$ 66.596,00	-	-1,00	$ 66.596,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 23.443,00	$ 23.443,00	-	-1,00	$ 23.443,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 36.170,00	$ 36.170,00	-	-1,00	$ 36.170,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 30.862,00	$ 30.862,00	-	-1,00	$ 30.862,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 48.952,00	$ 48.952,00	-	-1,00	$ 48.952,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 82.887,00	$ 82.887,00	-	-1,00	$ 82.887,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 213.385,00	$ 213.385,00	-	-1,00	$ 213.385,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 129.405,00	$ 129.405,00	-	-1,00	$ 129.405,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN	1,00	$ 14.475,00	$ 14.475,00	-	-1,00	$ 14.475,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN	1,00	$ 234.377,00	$ 234.377,00	-	-1,00	$ 234.377,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 3.997,00	$ 3.997,00	-	-1,00	$ 3.997,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.219,00	$ 12.219,00	-	-1,00	$ 12.219,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 30.023,00	$ 30.023,00	-	-1,00	$ 30.023,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0.20 m. (Incluye trasiego, equipos	M3	1,00	$ 68.696,00	$ 68.696,00	-	-1,00	$ 68.696,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego,	M2	1,00	$ 96.509,00	$ 96.509,00	-	-1,00	$ 96.509,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 111.831,00	$ 111.831,00	-	-1,00	$ 111.831,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 116.987,00	$ 116.987,00	-	-1,00	$ 116.987,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		1,00		$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	1,00	$ 20.643,00	$ 20.643,00
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	1,00	$ 15.407,00	$ 15.407,00
3.3	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	1,00	$ 442.051,00	$ 442.051,00
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 721.408,00	$ 721.408,00
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	1,00	$ 36.099,00	$ 36.099,00
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17,5MPa (2500 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 237.345,00	$ 237.345,00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 685.272,00	$ 685.272,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3	1,00	$ 721.903,00	$ 721.903,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 865.466,00	$ 865.466,00
3.10	Viga canal en concreto 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 931.749,00	$ 931.749,00
3.11	Viga cinta en concreto h =0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.083,00	$ 46.083,00
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.032,00	$ 46.032,00
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 81.230,00	$ 81.230,00
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 95.266,00	$ 95.266,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 111.713,00	$ 111.713,00
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 186.508,00	$ 186.508,00
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 203.704,00	$ 203.704,00
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalosa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI.	M2	1,00	$ 158.175,00	$ 158.175,00
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 49.703,00	$ 49.703,00
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida,	M3	1,00	$ 953.125,00	$ 953.125,00
4.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**		1,00		$ 0,00
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 3.677,00	$ 3.677,00
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 4.474,00	$ 4.474,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 2.903,00	$ 2.903,00
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1,00	$ 4.748,00	$ 4.748,00
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.053,00	$ 15.053,00
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 11.551,00	$ 11.551,00
4.7	Anclaje epóxico 3/4". Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 21.451,00	$ 21.451,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.247,00	$ 15.247,00
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 31.613,00	$ 31.613,00
5.	**MAMPOSTERÍA**		1,00		$ 0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 92.751,00	$ 92.751,00
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h<50cm. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 56.313,00	$ 56.313,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 43.848,00	$ 43.848,00
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 27.354,00	$ 27.354,00
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 46.480,00	$ 46.480,00
5.6	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 28.304,00	$ 28.304,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e	M2	1,00	$ 131.339,00	$ 131.339,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 141.452,00	$ 141.452,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 42.207,00	$ 42.207,00
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 49.136,00	$ 49.136,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 20.643,00
-	-1,00	$ 15.407,00
-	-1,00	$ 442.051,00
-	-1,00	$ 721.408,00
-	-1,00	$ 36.099,00
-	-1,00	$ 237.345,00
-	-1,00	$ 685.272,00
-	-1,00	$ 721.903,00
-	-1,00	$ 865.466,00
-	-1,00	$ 931.749,00
-	-1,00	$ 46.083,00
-	-1,00	$ 46.032,00
-	-1,00	$ 81.230,00
-	-1,00	$ 95.266,00
-	-1,00	$ 111.713,00
-	-1,00	$ 186.508,00
-	-1,00	$ 203.704,00
-	-1,00	$ 158.175,00
-	-1,00	$ 49.703,00
-	-1,00	$ 953.125,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 3.677,00
-	-1,00	$ 4.474,00
-	-1,00	$ 2.903,00
-	-1,00	$ 4.748,00
-	-1,00	$ 15.053,00
-	-1,00	$ 11.551,00
-	-1,00	$ 21.451,00
-	-1,00	$ 15.247,00
-	-1,00	$ 31.613,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 92.751,00
-	-1,00	$ 56.313,00
-	-1,00	$ 43.848,00
-	-1,00	$ 27.354,00
-	-1,00	$ 46.480,00
-	-1,00	$ 28.304,00
-	-1,00	$ 131.339,00
-	-1,00	$ 141.452,00
-	-1,00	$ 42.207,00
-	-1,00	$ 49.136,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 68.983,00	$ 68.983,00	-	-1,00	$ 68.983,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 80.410,00	$ 80.410,00	-	-1,00	$ 80.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	Alfajía en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes requeridos)	ML	1,00	$ 45.815,00	$ 45.815,00	-	-1,00	$ 45.815,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	Alfajía en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo,	ML	1,00	$ 49.403,00	$ 49.403,00	-	-1,00	$ 49.403,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación,	UN	1,00	$ 335.619,00	$ 335.619,00	-	-1,00	$ 335.619,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	1,00	$ 316,00	$ 316,00	-	-1,00	$ 316,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2	1,00	$ 86.845,00	$ 86.845,00	+	7,06	$ 613.125,70		$ 0,00	8,06	$ 699.970,70	8,06	$ 699.970,70
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 56.445,00	$ 56.445,00	-	-1,00	$ 56.445,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1,00	$ 48.003,00	$ 48.003,00	-	-1,00	$ 48.003,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos,	M2	1,00	$ 89.843,00	$ 89.843,00	-	-1,00	$ 89.843,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos,	ML	1,00	$ 67.096,00	$ 67.096,00	-	-1,00	$ 67.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta	ML	1,00	$ 80.220,00	$ 80.220,00	-	-1,00	$ 80.220,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 14.539,00	$ 14.539,00	-	-1,00	$ 14.539,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 33.808,00	$ 33.808,00	+	86,33	$ 2.918.644,64		$ 0,00	87,33	$ 2.952.452,64	87,33	$ 2.952.452,64
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 17.758,00	$ 17.758,00	-	-1,00	$ 17.758,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 18.751,00	$ 18.751,00	-	-1,00	$ 18.751,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 25.035,00	$ 25.035,00	-	-1,00	$ 25.035,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 47.467,00	$ 47.467,00	-	-1,00	$ 47.467,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 65.462,00	$ 65.462,00	-	-1,00	$ 65.462,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 144.833,00	$ 144.833,00	-	-1,00	$ 144.833,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobeado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 78.260,00	$ 78.260,00	-	-1,00	$ 78.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones, fundida, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.094,00	$ 77.094,00	-	-1,00	$ 77.094,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (líquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye desbaste de superficie, reparación de	M2	1,00	$ 41.962,00	$ 41.962,00	-	-1,00	$ 41.962,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.301,00	$ 77.301,00	-	-1,00	$ 77.301,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.665,00	$ 23.665,00	-	-1,00	$ 23.665,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.519,00	$ 21.519,00	-	-1,00	$ 21.519,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 27.895,00	$ 27.895,00	-	-1,00	$ 27.895,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 24.268,00	$ 24.268,00
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 14.824,00	$ 14.824,00
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.016,00	$ 23.016,00
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 17.072,00	$ 17.072,00
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.736,00	$ 22.736,00
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.651,00	$ 22.651,00
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.284,00	$ 22.284,00
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.198,00	$ 21.198,00
8.12	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2	1,00	$ 22.656,00	$ 22.656,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 12.297,00	$ 12.297,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 15.819,00	$ 15.819,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 9.259,00	$ 9.259,00
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	1,00	$ 85.805,00	$ 85.805,00
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 68.281,00	$ 68.281,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	1,00	$ 80.151,00	$ 80.151,00
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 13.148,00	$ 13.148,00
9.5	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.557,00	$ 53.557,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 231.570,00	$ 231.570,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 6.566,00	$ 6.566,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.648,00	$ 10.648,00
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.967,00	$ 15.967,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.209,00	$ 15.209,00
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.887,00	$ 10.887,00
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 26.291,00	$ 26.291,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 18.160,00	$ 18.160,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 20.094,00	$ 20.094,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.859,00	$ 14.859,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.447,00	$ 8.447,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 8.588,00	$ 8.588,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 24.268,00
-	-1,00	$ 14.824,00
-	-1,00	$ 23.016,00
-	-1,00	$ 17.072,00
-	-1,00	$ 22.736,00
-	-1,00	$ 22.651,00
-	-1,00	$ 22.284,00
-	-1,00	$ 21.198,00
-	-1,00	$ 22.656,00
-	-1,00	$ 12.297,00
-	-1,00	$ 15.819,00
-	-1,00	$ 9.259,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 85.805,00
-	-1,00	$ 68.281,00
-	-1,00	$ 80.151,00
-	-1,00	$ 13.148,00
-	-1,00	$ 53.557,00
-	-1,00	$ 231.570,00
-	0,00	$ 0,00
+	59,06	$ 387.787,96
-	-1,00	$ 10.648,00
-	-1,00	$ 15.967,00
+	112,58	$ 1.712.229,22
+	85,62	$ 932.144,94
-	-1,00	$ 26.291,00
-	-1,00	$ 18.160,00
-	-1,00	$ 20.094,00
-	-1,00	$ 14.859,00
-	-1,00	$ 8.447,00
-	-1,00	$ 8.588,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.402,00	$ 8.402,00	-	-1,00	$ 8.402,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.430,00	$ 14.430,00	-	-1,00	$ 14.430,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.512,00	$ 8.512,00	-	-1,00	$ 8.512,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye	M2	1,00	$ 20.409,00	$ 20.409,00	-	-1,00	$ 20.409,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro.	ML	1,00	$ 17.917,00	$ 17.917,00	-	-1,00	$ 17.917,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.17	Pintura de guardaescoba en esmalte negro.	ML	1,00	$ 11.264,00	$ 11.264,00	-	-1,00	$ 11.264,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 112.056,00	$ 112.056,00	-	-1,00	$ 112.056,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 126.851,00	$ 126.851,00	-	-1,00	$ 126.851,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida cristalizada y brillada necesarios)	M2	1,00	$ 195.687,00	$ 195.687,00	-	-1,00	$ 195.687,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida,	M2	1,00	$ 20.733,00	$ 20.733,00	-	-1,00	$ 20.733,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado,	ML	1,00	$ 43.663,00	$ 43.663,00	-	-1,00	$ 43.663,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos,	ML	1,00	$ 46.157,00	$ 46.157,00	-	-1,00	$ 46.157,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	ML	1,00	$ 22.461,00	$ 22.461,00	-	-1,00	$ 22.461,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.8	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 98.137,00	$ 98.137,00	-	-1,00	$ 98.137,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.9	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 28.395,00	$ 28.395,00	-	-1,00	$ 28.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 47.594,00	$ 47.594,00	-	-1,00	$ 47.594,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 70.916,00	$ 70.916,00	-	-1,00	$ 70.916,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 71.823,00	$ 71.823,00	-	-1,00	$ 71.823,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.13	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2	1,00	$ 97.561,00	$ 97.561,00	-	-1,00	$ 97.561,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 25.755,00	$ 25.755,00	+	44,23	$ 1.139.143,65		$ 0,00	45,23	$ 1.164.898,65	45,23	$ 1.164.898,65
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 109.502,00	$ 109.502,00	-	-1,00	$ 109.502,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2	1,00	$ 133.911,00	$ 133.911,00	-	-1,00	$ 133.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	1,00	$ 146.671,00	$ 146.671,00	-	-1,00	$ 146.671,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.19	Piso en madera liston mh amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	$ 81.907,00	$ 81.907,00	-	-1,00	$ 81.907,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.20	Piso en madera liston mh guayacan. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	$ 132.058,00	$ 132.058,00	-	-1,00	$ 132.058,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.21	Pulida y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y	M2	1,00	$ 41.616,00	$ 41.616,00	-	-1,00	$ 41.616,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.556,00	$ 20.556,00	-	-1,00	$ 20.556,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 44.427,00	$ 44.427,00	-	-1,00	$ 44.427,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.24	Piso Vinilo tipo Vinisol 30x30. Tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 43.776,00	$ 43.776,00	-	-1,00	$ 43.776,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.25	Piso en Vinilo tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 144.861,00	$ 144.861,00	-	-1,00	$ 144.861,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.26	Piso en Vinilo antiestático. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 207.511,00	$ 207.511,00	-	-1,00	$ 207.511,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.27	Guardaescoba en Vinilo. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 10.273,00	$ 10.273,00	-	-1,00	$ 10.273,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.28	Piso en Tableta de Gres tipo Etrusca 7x25 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 41.583,00	$ 41.583,00	-	-1,00	$ 41.583,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.29	Piso en Tablón Gres Latino liso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye mortero	M2	1,00	$ 56.289,00	$ 56.289,00	-	-1,00	$ 56.289,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.30	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.576,00	$ 20.576,00	-	-1,00	$ 20.576,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.31	Guardaescoba en Mortero. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.314,00	$ 14.314,00	-	-1,00	$ 14.314,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.023,00	$ 14.023,00	-	-1,00	$ 14.023,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	1,00	$ 51.291,00	$ 51.291,00
11.34	Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	ML	1,00	$ 62.452,00	$ 62.452,00
11.35	Enchape pared cerámica tipo Egeo 20,5x20,5 cm o similar. (Suministro e	ML	1,00	$ 60.812,00	$ 60.812,00
11.36	Enchape pared cerámica 20x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.854,00	$ 77.854,00
11.37	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 75.008,00	$ 75.008,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.214,00	$ 77.214,00
11.39	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y	ML	1,00	$ 87.172,00	$ 87.172,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 654.844,00	$ 654.844,00
11.41	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones,	ML	1,00	$ 374.655,00	$ 374.655,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 175.254,00	$ 175.254,00
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.259,00	$ 18.259,00
11.44	Suministro e instalación de piso tipo deck WPC clic aligerado (lámina 16cm de	M2	1,00	$ 276.673,00	$ 276.673,00
11.45	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la	ML	1,00	$ 12.333,00	$ 12.333,00
12.	**CUBIERTA**		1,00		$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2	1,00	$ 62.059,00	$ 62.059,00
12.2	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e	M2	1,00	$ 42.530,00	$ 42.530,00
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm. (Suministro	M2	1,00	$ 85.987,00	$ 85.987,00
12.4	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 252.809,00	$ 252.809,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío	M2	1,00	$ 272.567,00	$ 272.567,00
12.6	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=38mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 143.309,00	$ 143.309,00
12.7	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 195.532,00	$ 195.532,00
12.8	Caminaderos Metálicos sobre teja Tipo Sandwich. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 194.542,00	$ 194.542,00
12.9	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de	M2	1,00	$ 111.182,00	$ 111.182,00
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 426.436,00	$ 426.436,00
12.11	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 249.808,00	$ 249.808,00
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm, color cristal. (Suministro e	M2	1,00	$ 429.412,00	$ 429.412,00
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles,	M2	1,00	$ 80.616,00	$ 80.616,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 52.489,00	$ 52.489,00
12.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 48.265,00	$ 48.265,00
12.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 135.858,00	$ 135.858,00
12.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=100 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 42.281,00	$ 42.281,00
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 67.484,00	$ 67.484,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación.	M2	1,00	$ 76.394,00	$ 76.394,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 41.114,00	$ 41.114,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.050,00	$ 33.050,00
12.22	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 25.939,00	$ 25.939,00
12.23	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 33.944,00	$ 33.944,00
12.24	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 28.325,00	$ 28.325,00
12.25	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 48.094,00	$ 48.094,00
12.26	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 71.122,00	$ 71.122,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.159,00	$ 63.159,00
12.28	Gárgolas preefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos	UN	1,00	$ 51.307,00	$ 51.307,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 51.291,00
-	-1,00	$ 60.812,00
-	-1,00	$ 77.854,00
-	-1,00	$ 75.008,00
-	-1,00	$ 77.214,00
-	-1,00	$ 87.172,00
-	-1,00	$ 654.844,00
-	-1,00	$ 374.655,00
-	-1,00	$ 175.254,00
-	-1,00	$ 18.259,00
-	-1,00	$ 276.673,00
-	-1,00	$ 12.333,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 62.059,00
-	-1,00	$ 42.530,00
-	-1,00	$ 85.987,00
-	-1,00	$ 252.809,00
-	-1,00	$ 272.567,00
-	-1,00	$ 143.309,00
-	-1,00	$ 195.532,00
-	-1,00	$ 194.542,00
-	-1,00	$ 111.182,00
-	-1,00	$ 426.436,00
-	-1,00	$ 249.808,00
-	-1,00	$ 429.412,00
-	-1,00	$ 80.616,00
-	-1,00	$ 52.489,00
-	-1,00	$ 48.265,00
-	-1,00	$ 135.858,00
-	-1,00	$ 42.281,00
-	-1,00	$ 67.484,00
-	-1,00	$ 76.394,00
-	-1,00	$ 41.114,00
-	-1,00	$ 33.050,00
-	-1,00	$ 25.939,00
-	-1,00	$ 33.944,00
-	-1,00	$ 28.325,00
-	-1,00	$ 48.094,00
-	-1,00	$ 71.122,00
-	-1,00	$ 63.159,00
-	-1,00	$ 51.307,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
13.	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de	UN	1,00	$ 353.056,00	$ 353.056,00
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 696.061,00	$ 696.061,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 835.729,00	$ 835.729,00
13.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 993.161,00	$ 993.161,00
13.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e	UN	1,00	$ 1.321.586,00	$ 1.321.586,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m.	ML	1,00	$ 1.444.783,00	$ 1.444.783,00
13.7	Entrepaño en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e	ML	1,00	$ 148.777,00	$ 148.777,00
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	$ 609.114,00	$ 609.114,00
14.2	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado	UN	1,00	$ 940.928,00	$ 940.928,00
14.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en	UN	1,00	$ 949.032,00	$ 949.032,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1,00x2,10 m, con acabado en pintura	UN	1,00	$ 1.247.332,00	$ 1.247.332,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 658.565,00	$ 658.565,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 729.125,00	$ 729.125,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 811.447,00	$ 811.447,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 987.848,00	$ 987.848,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 4.863.090,00	$ 4.863.090,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,80x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.135.298,00	$ 1.135.298,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0,90x2,30 m.	UN	1,00	$ 1.268.846,00	$ 1.268.846,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.298.178,00	$ 1.298.178,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro	UN	1,00	$ 1.422.703,00	$ 1.422.703,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN	1,00	$ 47.922,00	$ 47.922,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 382.740,00	$ 382.740,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 511.571,00	$ 511.571,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación.	M2	1,00	$ 511.552,00	$ 511.552,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suministro e	M2	1,00	$ 572.058,00	$ 572.058,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 357.938,00	$ 357.938,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes,	M2	1,00	$ 619.359,00	$ 619.359,00
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco,	ML	1,00	$ 153.461,00	$ 153.461,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura electrostatica.	ml	1,00	$ 39.461,00	$ 39.461,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML	1,00	$ 174.708,00	$ 174.708,00
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 264.036,00	$ 264.036,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable.	ML	1,00	$ 354.638,00	$ 354.638,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", parales 1	ML	1,00	$ 653.204,00	$ 653.204,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 67.991,00	$ 67.991,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 100.658,00	$ 100.658,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14 .	M2	1,00	$ 68.517,00	$ 68.517,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 101.422,00	$ 101.422,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 353.056,00
-	-1,00	$ 696.061,00
-	-1,00	$ 835.729,00
-	-1,00	$ 993.161,00
-	-1,00	$ 1.321.586,00
-	-1,00	$ 1.444.783,00
-	-1,00	$ 148.777,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 609.114,00
-	-1,00	$ 940.928,00
-	-1,00	$ 949.032,00
-	-1,00	$ 1.247.332,00
-	-1,00	$ 658.565,00
-	-1,00	$ 729.125,00
-	-1,00	$ 811.447,00
-	-1,00	$ 987.848,00
-	-1,00	$ 4.863.090,00
-	-1,00	$ 1.135.298,00
-	-1,00	$ 1.268.846,00
-	-1,00	$ 1.298.178,00
-	-1,00	$ 1.422.703,00
-	-1,00	$ 47.922,00
-	-1,00	$ 382.740,00
-	-1,00	$ 511.571,00
-	-1,00	$ 511.552,00
-	-1,00	$ 572.058,00
-	-1,00	$ 357.938,00
-	-1,00	$ 619.359,00
-	-1,00	$ 153.461,00
-	-1,00	$ 39.461,00
-	-1,00	$ 174.708,00
-	-1,00	$ 264.036,00
-	-1,00	$ 354.638,00
-	-1,00	$ 653.204,00
-	-1,00	$ 67.991,00
-	-1,00	$ 100.658,00
-	-1,00	$ 68.517,00
-	-1,00	$ 101.422,00
-	0,00	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 92.932,00	$ 92.932,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.196,00	$ 74.196,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 97.229,00	$ 97.229,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 255.594,00	$ 255.594,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e	UN	1,00	$ 394.999,00	$ 394.999,00
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0,60x2,00 m.	UN	1,00	$ 1.182.980,00	$ 1.182.980,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 1.384.208,00	$ 1.384.208,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado. (Suministro	UN	1,00	$ 2.653.216,00	$ 2.653.216,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 3.419.634,00	$ 3.419.634,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural. (Suministro	M2	1,00	$ 638.011,00	$ 638.011,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio.	M2	1,00	$ 572.051,00	$ 572.051,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes,	M2	1,00	$ 731.974,00	$ 731.974,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.729,00	$ 110.729,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.592,00	$ 110.592,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suminstro e instalación.	M2	1,00	$ 173.033,00	$ 173.033,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable.	M2	1,00	$ 675.164,00	$ 675.164,00
15.17	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 57.773,00	$ 57.773,00
16.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1,00	$ 59.800,00	$ 59.800,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1,00	$ 29.589,00	$ 29.589,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1,00	$ 47.492,00	$ 47.492,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.733,00	$ 9.733,00
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 565.137,00	$ 565.137,00
16.6	Sanitario de piso linea institucional con válvula antivandálica tipo push.	UN	1,00	$ 833.913,00	$ 833.913,00
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 823.422,00	$ 823.422,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	1,00	$ 1.063.970,00	$ 1.063.970,00
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 327.808,00	$ 327.808,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro	UN	1,00	$ 541.473,00	$ 541.473,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 651.467,00	$ 651.467,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e	UN	1,00	$ 729.983,00	$ 729.983,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye	UN	1,00	$ 292.750,00	$ 292.750,00
16.14	Grifería ducha. (Suminstro e instalación. Incluye mezclador, regadera,	UN	1,00	$ 72.549,00	$ 72.549,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"x3/4" para manguera. (Suministro e	UN	1,00	$ 48.377,00	$ 48.377,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 25.166,00	$ 25.166,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.239,00	$ 70.239,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 202.891,00	$ 202.891,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.593,00	$ 140.593,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.600,00	$ 140.600,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable.	UN	1,00	$ 785.075,00	$ 785.075,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable.	UN	1,00	$ 155.503,00	$ 155.503,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 523.997,00	$ 523.997,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 433.411,00	$ 433.411,00
16.25	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.101,00	$ 16.101,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.238,00	$ 32.238,00
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 43.327,00	$ 43.327,00
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e	UN	1,00	$ 340.967,00	$ 340.967,00
16.29	Grifería kit vpalvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 219.030,00	$ 219.030,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 92.932,00
-	-1,00	$ 74.196,00
-	-1,00	$ 97.229,00
-	-1,00	$ 255.594,00
-	-1,00	$ 394.999,00
-	-1,00	$ 1.182.980,00
-	-1,00	$ 1.384.208,00
-	-1,00	$ 2.653.216,00
-	-1,00	$ 3.419.634,00
-	-1,00	$ 638.011,00
-	-1,00	$ 572.051,00
-	-1,00	$ 731.974,00
-	-1,00	$ 110.729,00
-	-1,00	$ 110.592,00
-	-1,00	$ 173.033,00
-	-1,00	$ 675.164,00
-	-1,00	$ 57.773,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 59.800,00
-	-1,00	$ 29.589,00
-	-1,00	$ 47.492,00
-	-1,00	$ 9.733,00
-	-1,00	$ 565.137,00
-	-1,00	$ 833.913,00
-	-1,00	$ 823.422,00
-	-1,00	$ 1.063.970,00
-	-1,00	$ 327.808,00
-	-1,00	$ 541.473,00
-	-1,00	$ 651.467,00
-	-1,00	$ 729.983,00
-	-1,00	$ 292.750,00
-	-1,00	$ 72.549,00
-	-1,00	$ 48.377,00
-	-1,00	$ 25.166,00
-	-1,00	$ 70.239,00
-	-1,00	$ 202.891,00
-	-1,00	$ 140.593,00
-	-1,00	$ 140.600,00
-	-1,00	$ 785.075,00
-	-1,00	$ 155.503,00
-	-1,00	$ 523.997,00
-	-1,00	$ 433.411,00
-	-1,00	$ 16.101,00
-	-1,00	$ 32.238,00
-	-1,00	$ 43.327,00
-	-1,00	$ 340.967,00
-	-1,00	$ 219.030,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		1,00		$ 0,00
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 414.916,00	$ 414.916,00
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, niples,	UN	1,00	$ 768.866,00	$ 768.866,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.926,00	$ 2.926,00
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 4.365,00	$ 4.365,00
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 6.744,00	$ 6.744,00
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.969,00	$ 7.969,00
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.688,00	$ 10.688,00
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.855,00	$ 14.855,00
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.381,00	$ 32.381,00
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.945,00	$ 3.945,00
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 5.449,00	$ 5.449,00
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.412,00	$ 14.412,00
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.740,00	$ 33.740,00
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.300,00	$ 74.300,00
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 119.297,00	$ 119.297,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 18.883,00	$ 18.883,00
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 22.450,00	$ 22.450,00
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 25.215,00	$ 25.215,00
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 23.568,00	$ 23.568,00
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.392,00	$ 14.392,00
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 19.917,00	$ 19.917,00
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 34.049,00	$ 34.049,00
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 36.223,00	$ 36.223,00
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 44.503,00	$ 44.503,00
17.26	Tubería HG 1 ". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 55.733,00	$ 55.733,00
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.519,00	$ 63.519,00
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 89.556,00	$ 89.556,00
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 124.188,00	$ 124.188,00
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 159.866,00	$ 159.866,00
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 37.481,00	$ 37.481,00
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 47.636,00	$ 47.636,00
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 51.130,00	$ 51.130,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 53.824,00	$ 53.824,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 36.412,00	$ 36.412,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 39.983,00	$ 39.983,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 38.254,00	$ 38.254,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 40.622,00	$ 40.622,00
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.303,00	$ 7.303,00
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 13.392,00	$ 13.392,00
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 22.724,00	$ 22.724,00
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 50.397,00	$ 50.397,00
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.591,00	$ 55.591,00
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 80.351,00	$ 80.351,00
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 121.856,00	$ 121.856,00
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 137.729,00	$ 137.729,00
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.638,00	$ 53.638,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 414.916,00
-	-1,00	$ 768.866,00
-	-1,00	$ 2.926,00
-	-1,00	$ 4.365,00
-	-1,00	$ 6.744,00
-	-1,00	$ 7.969,00
-	-1,00	$ 10.688,00
-	-1,00	$ 14.855,00
-	-1,00	$ 32.381,00
-	-1,00	$ 3.945,00
-	-1,00	$ 5.449,00
-	-1,00	$ 14.412,00
-	-1,00	$ 26.858,00
-	-1,00	$ 33.740,00
-	-1,00	$ 74.300,00
-	-1,00	$ 119.297,00
-	-1,00	$ 18.883,00
-	-1,00	$ 22.450,00
-	-1,00	$ 25.215,00
-	-1,00	$ 23.568,00
-	-1,00	$ 14.392,00
-	-1,00	$ 19.917,00
-	-1,00	$ 34.049,00
-	-1,00	$ 36.223,00
-	-1,00	$ 44.503,00
-	-1,00	$ 55.733,00
-	-1,00	$ 63.519,00
-	-1,00	$ 89.556,00
-	-1,00	$ 124.188,00
-	-1,00	$ 159.866,00
-	-1,00	$ 37.481,00
-	-1,00	$ 47.636,00
-	-1,00	$ 51.130,00
-	-1,00	$ 53.824,00
-	-1,00	$ 36.412,00
-	-1,00	$ 39.983,00
-	-1,00	$ 38.254,00
-	-1,00	$ 40.622,00
-	-1,00	$ 7.303,00
-	-1,00	$ 13.392,00
-	-1,00	$ 22.724,00
-	-1,00	$ 50.397,00
-	-1,00	$ 55.591,00
-	-1,00	$ 80.351,00
-	-1,00	$ 121.856,00
-	-1,00	$ 137.729,00
-	-1,00	$ 53.638,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.938,00	$ 70.938,00
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 105.084,00	$ 105.084,00
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 454.751,00	$ 454.751,00
17.51	Tanque de reserva 1000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 1.000.416,00	$ 1.000.416,00
17.52	Tanque de reserva 2000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 978.265,00	$ 978.265,00
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto.	UN	1,00	$ 469.640,00	$ 469.640,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		1,00		$ 0,00
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 249.126,00	$ 249.126,00
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 494.687,00	$ 494.687,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 31.714,00	$ 31.714,00
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 50.008,00	$ 50.008,00
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 63.163,00	$ 63.163,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 103.338,00	$ 103.338,00
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ML	1,00	$ 135.295,00	$ 135.295,00
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ml	1,00	$ 70.433,00	$ 70.433,00
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.067,00	$ 12.067,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.775,00	$ 18.775,00
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 81.455,00	$ 81.455,00
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 76.794,00	$ 76.794,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 57.886,00	$ 57.886,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 77.408,00	$ 77.408,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 94.453,00	$ 94.453,00
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 84.417,00	$ 84.417,00
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 84.447,00	$ 84.447,00
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 73.140,00	$ 73.140,00
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 75.575,00	$ 75.575,00
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 65.987,00	$ 65.987,00
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 71.456,00	$ 71.456,00
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 85.906,00	$ 85.906,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.639,00	$ 20.639,00
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 18.388,00	$ 18.388,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 29.248,00	$ 29.248,00
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 69.405,00	$ 69.405,00
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.592,00	$ 12.592,00
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.339,00	$ 10.339,00
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 24.558,00	$ 24.558,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		1,00		$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 3.053,00	$ 3.053,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 5.604,00	$ 5.604,00
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 4.334,00	$ 4.334,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 70.938,00
-	-1,00	$ 105.084,00
-	-1,00	$ 454.751,00
-	-1,00	$ 1.000.416,00
-	-1,00	$ 978.265,00
-	-1,00	$ 469.640,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 249.126,00
-	-1,00	$ 494.687,00
-	-1,00	$ 31.714,00
-	-1,00	$ 50.008,00
-	-1,00	$ 63.163,00
-	-1,00	$ 103.338,00
-	-1,00	$ 135.295,00
-	-1,00	$ 70.433,00
-	-1,00	$ 12.067,00
-	-1,00	$ 18.775,00
-	-1,00	$ 81.455,00
-	-1,00	$ 76.794,00
-	-1,00	$ 57.886,00
-	-1,00	$ 77.408,00
-	-1,00	$ 94.453,00
-	-1,00	$ 84.417,00
-	-1,00	$ 84.447,00
-	-1,00	$ 73.140,00
-	-1,00	$ 75.575,00
-	-1,00	$ 65.987,00
-	-1,00	$ 71.456,00
-	-1,00	$ 85.906,00
-	-1,00	$ 20.639,00
-	-1,00	$ 18.388,00
-	-1,00	$ 29.248,00
-	-1,00	$ 69.405,00
-	-1,00	$ 12.592,00
-	-1,00	$ 10.339,00
-	-1,00	$ 19.388,00
-	-1,00	$ 19.388,00
-	-1,00	$ 24.558,00
-	-1,00	$ 0,00
+	59,00	$ 180.127,00
-	-1,00	$ 5.604,00
-	-1,00	$ 4.334,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
19.4	Cable desnudo de Cu No.2, Interconexión equipotencial en terreno. (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios necesarios)	ML	1,00	$ 47.316,00	$ 47.316,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 16.833,00	$ 16.833,00
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 17.646,00	$ 17.646,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 432.647,00	$ 432.647,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 504.034,00	$ 504.034,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con	UN	1,00	$ 606.758,00	$ 606.758,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 714.490,00	$ 714.490,00
19.11	Tablero electrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 787.745,00	$ 787.745,00
19.12	Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 804.661,00	$ 804.661,00
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e	UN	1,00	$ 16.100,00	$ 16.100,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.688,00	$ 30.688,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.499,00	$ 51.499,00
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.930,00	$ 74.930,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.537,00	$ 44.537,00
19.18	Breaker enchufable de 3x30A /20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 48.674,00	$ 48.674,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 113.810,00	$ 113.810,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 199.573,00	$ 199.573,00
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 215.331,00	$ 215.331,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 12.355,00	$ 12.355,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 18.345,00	$ 18.345,00
19.24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 21.074,00	$ 21.074,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 25.735,00	$ 25.735,00
19.26	Tubería EMT 1-1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 30.942,00	$ 30.942,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 33.734,00	$ 33.734,00
19.28	Tubería de 1/2", conduit de PVC. (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 8.539,00	$ 8.539,00
19.29	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 10.542,00	$ 10.542,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de	ML	1,00	$ 11.611,00	$ 11.611,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 17.642,00	$ 17.642,00
19.32	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 20.363,00	$ 20.363,00
19.33	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 18.264,00	$ 18.264,00
19.34	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 141.470,00	$ 141.470,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.963,00	$ 12.963,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.507,00	$ 53.507,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 47.457,00	$ 47.457,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 65.668,00	$ 65.668,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.738,00	$ 51.738,00
19.40	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m con conector. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 120.037,00	$ 120.037,00
19.41	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro	UN	1,00	$ 425.311,00	$ 425.311,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 96.439,00	$ 96.439,00
19.43	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 58.363,00	$ 58.363,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 47.316,00
-	-1,00	$ 16.833,00
-	-1,00	$ 17.646,00
-	-1,00	$ 432.647,00
-	-1,00	$ 504.034,00
-	-1,00	$ 606.758,00
-	-1,00	$ 714.490,00
-	-1,00	$ 787.745,00
-	-1,00	$ 804.661,00
-	-1,00	$ 16.100,00
-	-1,00	$ 30.688,00
-	-1,00	$ 51.499,00
-	-1,00	$ 74.930,00
-	-1,00	$ 44.537,00
-	-1,00	$ 48.674,00
-	-1,00	$ 113.810,00
-	-1,00	$ 199.573,00
-	-1,00	$ 215.331,00
-	-1,00	$ 12.355,00
-	-1,00	$ 18.345,00
-	-1,00	$ 21.074,00
-	-1,00	$ 25.735,00
-	-1,00	$ 30.942,00
-	-1,00	$ 33.734,00
-	-1,00	$ 8.539,00
-	-1,00	$ 10.542,00
-	-1,00	$ 11.611,00
-	-1,00	$ 17.642,00
-	-1,00	$ 20.363,00
-	-1,00	$ 18.264,00
-	-1,00	$ 141.470,00
-	-1,00	$ 12.963,00
-	-1,00	$ 53.507,00
-	-1,00	$ 47.457,00
-	-1,00	$ 65.668,00
-	-1,00	$ 51.738,00
-	-1,00	$ 120.037,00
-	-1,00	$ 425.311,00
-	-1,00	$ 96.439,00
-	-1,00	$ 58.363,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 102.138,00	$ 102.138,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 98.173,00	$ 98.173,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 160.047,00	$ 160.047,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 96.817,00	$ 96.817,00
19.48	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 291.419,00	$ 291.419,00
19.49	Salidas botón timbre. PVC (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 116.813,00	$ 116.813,00
19.50	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 62.770,00	$ 62.770,00
19.51	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 97.692,00	$ 97.692,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 95.313,00	$ 95.313,00
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 79.470,00	$ 79.470,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 82.723,00	$ 82.723,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN	1,00	$ 98.631,00	$ 98.631,00
19.56	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 61.762,00	$ 61.762,00
19.57	Salida de toma monofásica doble Regulada empotrada en muro. (Suministro e	UN	1,00	$ 97.533,00	$ 97.533,00
19.58	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 129.308,00	$ 129.308,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 71.478,00	$ 71.478,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 141.896,00	$ 141.896,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 77.518,00	$ 77.518,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 102.647,00	$ 102.647,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 310.863,00	$ 310.863,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 104.033,00	$ 104.033,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 111.951,00	$ 111.951,00
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 66.303,00	$ 66.303,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 61.246,00	$ 61.246,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 27.648,00	$ 27.648,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 48.073,00	$ 48.073,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro	UN	1,00	$ 87.049,00	$ 87.049,00
19.71	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e	UN	1,00	$ 60.280,00	$ 60.280,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería,	UN	1,00	$ 78.456,00	$ 78.456,00
19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN	1,00	$ 190.609,00	$ 190.609,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	1,00	$ 35.039,00	$ 35.039,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado	UN	1,00	$ 149.408,00	$ 149.408,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1,5 horas (2x5,4W),	UN	1,00	$ 216.990,00	$ 216.990,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad min. 20.000 horas.	UN	1,00	$ 175.289,00	$ 175.289,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 230.079,00	$ 230.079,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 184.438,00	$ 184.438,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad	UN	1,00	$ 28.131,00	$ 28.131,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000	UN	1,00	$ 84.016,00	$ 84.016,00
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado	UN	1,00	$ 122.471,00	$ 122.471,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas.	UN	1,00	$ 104.045,00	$ 104.045,00
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e	UN	1,00	$ 91.551,00	$ 91.551,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,00	$ 283.399,00	$ 283.399,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 102.138,00
-	-1,00	$ 98.173,00
-	-1,00	$ 160.047,00
-	-1,00	$ 96.817,00
-	-1,00	$ 291.419,00
-	-1,00	$ 116.813,00
-	-1,00	$ 62.770,00
-	-1,00	$ 97.692,00
-	-1,00	$ 95.313,00
-	-1,00	$ 79.470,00
-	-1,00	$ 82.723,00
-	-1,00	$ 98.631,00
-	-1,00	$ 61.762,00
-	-1,00	$ 97.533,00
-	-1,00	$ 129.308,00
-	-1,00	$ 71.478,00
+	17,00	$ 2.412.232,00
-	-1,00	$ 77.518,00
-	-1,00	$ 102.647,00
-	-1,00	$ 310.863,00
-	-1,00	$ 104.033,00
-	-1,00	$ 111.951,00
-	-1,00	$ 66.303,00
-	-1,00	$ 61.246,00
-	-1,00	$ 27.648,00
-	-1,00	$ 48.073,00
-	-1,00	$ 87.049,00
-	-1,00	$ 60.280,00
-	-1,00	$ 59.183,00
-	-1,00	$ 78.456,00
-	-1,00	$ 190.609,00
-	-1,00	$ 35.039,00
-	-1,00	$ 149.408,00
-	-1,00	$ 216.990,00
-	-1,00	$ 175.289,00
-	-1,00	$ 230.079,00
-	-1,00	$ 184.438,00
-	-1,00	$ 28.131,00
-	-1,00	$ 84.016,00
-	-1,00	$ 122.471,00
-	-1,00	$ 104.045,00
-	-1,00	$ 91.551,00
+	17,00	$ 4.817.783,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas.	UN	1,00	$ 68.245,00	$ 68.245,00	-	-1,00	$ 68.245,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*1200mm cool white 6000k, 100-240V	UN	1,00	$ 49.415,00	$ 49.415,00	-	-1,00	$ 49.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 23.173,00	$ 23.173,00	-	-1,00	$ 23.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 130.984,00	$ 130.984,00	-	-1,00	$ 130.984,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 132.344,00	$ 132.344,00	-	-1,00	$ 132.344,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e	UN	1,00	$ 133.707,00	$ 133.707,00	-	-1,00	$ 133.707,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 201.889,00	$ 201.889,00	-	-1,00	$ 201.889,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero.	UN	1,00	$ 550.749,00	$ 550.749,00	-	-1,00	$ 550.749,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 2.520.919,00	$ 2.520.919,00	-	-1,00	$ 2.520.919,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.620,00	$ 3.620,00	-	-1,00	$ 3.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 490.548,00	$ 490.548,00	-	-1,00	$ 490.548,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente.	ml	1,00	$ 70.263,00	$ 70.263,00	-	-1,00	$ 70.263,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 125.524,00	$ 125.524,00	-	-1,00	$ 125.524,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm, en	ML	1,00	$ 139.908,00	$ 139.908,00	-	-1,00	$ 139.908,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa, de	ML	1,00	$ 151.670,00	$ 151.670,00	-	-1,00	$ 151.670,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 141.954,00	$ 141.954,00	-	-1,00	$ 141.954,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 24.420,00	$ 24.420,00	-	-1,00	$ 24.420,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 48.093,00	$ 48.093,00	-	-1,00	$ 48.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 73.018,00	$ 73.018,00	-	-1,00	$ 73.018,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 50.662,00	$ 50.662,00	-	-1,00	$ 50.662,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN	1,00	$ 6.957,00	$ 6.957,00	+	7,00	$ 48.699,00	8,00	$ 55.656,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 55.656,00
20.11	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 42.716,00	$ 42.716,00	-	-1,00	$ 42.716,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.043.051,00	$ 2.043.051,00	-	-1,00	$ 2.043.051,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.13	Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 186.225,00	$ 186.225,00	-	-1,00	$ 186.225,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.14	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 459.671,00	$ 459.671,00	-	-1,00	$ 459.671,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.15	Switch de 24 Puertos Cat 6A tipo HP V1910-24G. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.003.820,00	$ 2.003.820,00	-	-1,00	$ 2.003.820,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.16	Switch administrable de 48 puertos con puertos MINI GIBI para fibra optica	UN	1,00	$ 4.175.789,00	$ 4.175.789,00	-	-1,00	$ 4.175.789,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 739.585,00	$ 739.585,00	-	-1,00	$ 739.585,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 775.982,00	$ 775.982,00	+	1,00	$ 775.982,00	2,00	$ 1.551.964,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.107.399,00	$ 1.107.399,00	-	-1,00	$ 1.107.399,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML	1,00	$ 7.609,00	$ 7.609,00	+	289,00	$ 2.199.001,00		$ 0,00	290,00	$ 2.206.610,00	290,00	$ 2.206.610,00
20.21	Tapa troquel metálica 15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.632,00	$ 9.632,00	-	-1,00	$ 9.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 94.361,00	$ 94.361,00	-	-1,00	$ 94.361,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	7,00	$ 313.642,00	8,00	$ 358.448,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 358.448,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	1,00	$ 44.806,00	2,00	$ 89.612,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 89.612,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.008,00	$ 14.008,00	+	7,00	$ 98.056,00	8,00	$ 112.064,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 112.064,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 15.153,00	$ 15.153,00	+	1,00	$ 15.153,00	2,00	$ 30.306,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 30.306,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.672,00	$ 30.672,00	+	7,00	$ 214.704,00	8,00	$ 245.376,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 245.376,00
20.28	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.294,00	$ 55.294,00	-	-1,00	$ 55.294,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 78.718,00	$ 78.718,00	-	-1,00	$ 78.718,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.30	Patch cord de 7 pies Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 68.704,00	$ 68.704,00	-	-1,00	$ 68.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.31	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 39.096,00	$ 39.096,00	-	-1,00	$ 39.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.32	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 163.107,00	$ 163.107,00	-	-1,00	$ 163.107,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	1,00	$ 13.363,00	$ 13.363,00	-	-1,00	$ 13.363,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN	1,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00	-	-1,00	$ 2.250,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

						CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
						OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)						(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)		
21.1	Adoquín de Concreto peatonal 20x10x6 cm (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 80.597,00	$ 80.597,00						-	-1,00	$ 80.597,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.2	Adoquín 20x12x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena	M2	1,00	$ 99.192,00	$ 99.192,00						-	-1,00	$ 99.192,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.3	Andén en concreto escobeado e=12,5 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 94.514,00	$ 94.514,00						-	-1,00	$ 94.514,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.4	Andén en concreto escobeado e=10 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 87.776,00	$ 87.776,00						-	-1,00	$ 87.776,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.5	Andén en concreto escobeado e=15 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 183.605,00	$ 183.605,00						-	-1,00	$ 183.605,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.6	Loseta prefabricada 40x40 (Incluye suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	1,00	$ 82.943,00	$ 82.943,00						-	-1,00	$ 82.943,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.7	Sardinel fundido en sitio, en concreto 3000 psi, h=0.40 m, e=0.15m (Incluye	ML	1,00	$ 83.480,00	$ 83.480,00						-	-1,00	$ 83.480,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.8	Sardinel prefabricado en concreto A-10. 80 x 50 x 20. (Incluye trasiego,	ML	1,00	$ 68.344,00	$ 68.344,00						-	-1,00	$ 68.344,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	ML	1,00	$ 72.191,00	$ 72.191,00						-	-1,00	$ 72.191,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.10	Bordillo prefabricado en concreto A-50. (Incluye trasiego, suministro, instalación,	ML	1,00	$ 56.371,00	$ 56.371,00						-	-1,00	$ 56.371,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML	1,00	$ 86.614,00	$ 86.614,00						-	-1,00	$ 86.614,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.	**ASEO Y VARIOS**										-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,00	$ 2.922,00	$ 2.922,00						-	-1,00	$ 2.922,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	NO PREVISTOS										-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79							+	1,00	$ 58.138,79		$ 0,00	1,00	$ 58.138,79	1,00	$ 58.138,79		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			**$ 108.732.037,00**									**$ 85.779.262,65**		**$ 2.509.408,00**		**$ 20.443.366,35**		**$ 22.952.774,35**		
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 18.484.446,29									$ 14.582.474,65		$ 426.599,36		$ 3.475.372,28		$ 3.901.971,64		
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11									$ 2.573.377,88		$ 75.282,24		$ 613.300,99		$ 688.583,23		
	UTIIDAD	5%		$ 5.436.601,85									$ 4.288.963,13		$ 125.470,40		$ 1.022.168,32		$ 1.147.638,72		
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 1.032.954,35									$ 814.903,00		$ 23.839,38		$ 194.211,98		$ 218.051,36		
A.	**TOTAL OBRA**			**$ 136.948.000,60**									**$ 108.038.981,31**		**$ 3.160.599,38**		**$ 25.748.419,92**		**$ 28.909.019,29**		
B.	**NO PREVISTOS**																				
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79												0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación,	ML		$ 15.200,00							+	304,00	$ 4.620.800,00	94,00	$ 1.428.800,00	210,00	$ 3.192.000,00	304,00	$ 4.620.800,00		
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2", (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 101.647,00							+	3,00	$ 304.941,00		$ 0,00	3,00	$ 304.941,00	3,00	$ 304.941,00		
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 97.327,00							+	14,00	$ 1.362.578,00	14,00	$ 1.362.578,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.362.578,00		
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 106.099,00							+	14,00	$ 1.485.386,00	14,00	$ 1.485.386,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.485.386,00		
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00							+	87,33	$ 8.427.345,00		$ 0,00	87,33	$ 8.427.345,00	87,33	$ 8.427.345,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS			**$ 0,00**									**$ 16.201.050,00**		**$ 4.276.764,00**		**$ 11.924.286,00**		**$ 16.201.050,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 0,00									$ 2.754.178,50		$ 727.049,88		$ 2.027.128,62		$ 2.754.178,50		
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11									$ 486.031,50		$ 128.302,92		$ 357.728,58		$ 486.031,50		
	UTIIDAD	5%		$ 0,00									$ 810.052,50		$ 213.838,20		$ 596.214,30		$ 810.052,50		
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 0,00									$ 153.909,98		$ 40.629,26		$ 113.280,72		$ 153.909,98		
B	**TOTAL NO PREVISTOS**			**$ 0,00**									**$ 20.405.222,48**		**$ 5.386.584,26**		**$ 15.018.638,22**		**$ 20.405.222,48**		
C. MOBILIARIO																					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**																				
1.	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**																				
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.234.710,00	$ 1.234.710,00						-	-1,00	$ 1.234.710,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.274.371,00	$ 1.274.371,00						-	-1,00	$ 1.274.371,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
1.3	EXTENCIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN	1,00	$ 958.093,00	$ 958.093,00						-	-1,00	$ 958.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
M1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.072.970,00	$ 1.072.970,00						-	-1,00	$ 1.072.970,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 863.818,00	$ 863.818,00						-	-1,00	$ 863.818,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 841.791,00	$ 841.791,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos	UN	1,00	$ 571.617,00	$ 571.617,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	$ 376.330,00	$ 376.330,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	$ 215.869,00	$ 215.869,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS. asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 515.549,00	$ 515.549,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS.s, asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 712.191,00	$ 712.191,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLLICO. tipo pesado para resistir	UN	1,00	$ 1.041.121,00	$ 1.041.121,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de	UN	1,00	$ 891.382,00	$ 891.382,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (	UN	1,00	$ 1.383.339,00	$ 1.383.339,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2)	UN	1,00	$ 2.070.962,00	$ 2.070.962,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de 4mm	M2	1,00	$ 452.990,00	$ 452.990,00
M1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2	1,00	$ 664.586,00	$ 664.586,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media	M2	1,00	$ 848.192,00	$ 848.192,00
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de	UN	1,00	$ 467.415,00	$ 467.415,00
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa	UN	1,00	$ 555.688,00	$ 555.688,00
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de	UN	1,00	$ 2.493.065,00	$ 2.493.065,00
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta	UN	1,00	$ 870.060,00	$ 870.060,00
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en	UN	1,00	$ 457.222,00	$ 457.222,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	$ 4.405.126,00	$ 4.405.126,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.044.053,00	$ 1.044.053,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVILI archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.503.385,00	$ 1.503.385,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 498.537,00	$ 498.537,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 413.948,00	$ 413.948,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de	M2	1,00	$ 185.117,00	$ 185.117,00
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	$ 4.010.911,00	$ 4.010.911,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA		1,00		$ 0,00
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2	1,00	$ 273.539,00	$ 273.539,00
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho	M2	1,00	$ 300.362,00	$ 300.362,00
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho	ML	1,00	$ 120.005,00	$ 120.005,00
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa cornza en madera	ML	1,00	$ 91.925,00	$ 91.925,00
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en	UN	1,00	$ 726.456,00	$ 726.456,00
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a	UN	1,00	$ 649.620,00	$ 649.620,00
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro	M2	1,00	$ 32.534,00	$ 32.534,00
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	$ 264.039,00	$ 264.039,00
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de	UN	1,00	$ 3.337.510,00	$ 3.337.510,00
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a	UN	1,00	$ 1.327.180,00	$ 1.327.180,00
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas	UN	1,00	$ 1.718.350,00	$ 1.718.350,00
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie	UN	1,00	$ 586.753,00	$ 586.753,00
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja	UN	1,00	$ 782.338,00	$ 782.338,00
M2.14	SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 1.606.587,00	$ 1.606.587,00
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 2.347.014,00	$ 2.347.014,00
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauracion de	UN	1,00	$ 5.567.173,00	$ 5.567.173,00
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2	UN	1,00	$ 9.164.530,00	$ 9.164.530,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 841.791,00
-	-1,00	$ 571.617,00
-	-1,00	$ 376.330,00
-	-1,00	$ 215.869,00
-	-1,00	$ 515.549,00
-	-1,00	$ 712.191,00
-	-1,00	$ 1.041.121,00
-	-1,00	$ 891.382,00
-	-1,00	$ 1.383.339,00
-	-1,00	$ 2.070.962,00
-	-1,00	$ 452.990,00
-	-1,00	$ 664.586,00
-	-1,00	$ 848.192,00
-	-1,00	$ 467.415,00
-	-1,00	$ 555.688,00
-	-1,00	$ 2.493.065,00
-	-1,00	$ 870.060,00
-	-1,00	$ 457.222,00
-	-1,00	$ 4.405.126,00
-	-1,00	$ 1.044.053,00
-	-1,00	$ 1.503.385,00
-	-1,00	$ 498.537,00
-	-1,00	$ 413.948,00
-	-1,00	$ 185.117,00
-	-1,00	$ 4.010.911,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 273.539,00
-	-1,00	$ 300.362,00
-	-1,00	$ 120.005,00
-	-1,00	$ 91.925,00
-	-1,00	$ 726.456,00
-	-1,00	$ 649.620,00
-	-1,00	$ 32.534,00
-	-1,00	$ 264.039,00
-	-1,00	$ 3.337.510,00
-	-1,00	$ 1.327.180,00
-	-1,00	$ 1.718.350,00
-	-1,00	$ 586.753,00
-	-1,00	$ 782.338,00
-	-1,00	$ 1.606.587,00
-	-1,00	$ 2.347.014,00
-	-1,00	$ 5.567.173,00
-	-1,00	$ 9.164.530,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL																	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
									CANTIDAD	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
3	**OTROS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +-	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00	-	-1,00	$ 12.090.817,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v,	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00	-	-1,00	$ 12.090.817,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	$ 4.141.263,00	$ 4.141.263,00	-	-1,00	$ 4.141.263,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN	1,00	$ 577.420,00	$ 577.420,00	-	-1,00	$ 577.420,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	$ 441.425,00	$ 441.425,00	-	-1,00	$ 441.425,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO			**$ 91.132.065,00**				**$ 91.132.065,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 17.315.092,35				$ 17.315.092,35		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
C.	**TOTAL MOBILIARIO**			**$ 108.447.157,35**				**$ 108.447.157,35**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	TOTAL PISO 5			**$ 245.395.157,95**				**$ 196.080.916,18**		**$ 8.547.183,63**		**$ 40.767.058,13**		**$ 49.314.241,77**
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		$ 4.522,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 19.137,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	3,90	$ 50.528,40		$ 0,00	3,90	$ 50.528,40	3,90	$ 50.528,40
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	25,00	$ 202.250,00		$ 0,00	25,00	$ 202.250,00	25,00	$ 202.250,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	66,39	$ 244.713,54		$ 0,00	66,39	$ 244.713,54	66,39	$ 244.713,54
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	22,26	$ 135.852,78	8,01	$ 48.885,03	14,25	$ 86.967,75	22,26	$ 135.852,78
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	53,00	$ 582.841,00	38,00	$ 417.886,00	15,00	$ 164.955,00	53,00	$ 582.841,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	212,20	$ 583.337,80	212,20	$ 583.337,80	0,00	$ 0,00	212,20	$ 583.337,80
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	2,00	$ 210.276,00	2,00	$ 210.276,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 210.276,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		$ 19.537,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	+	10,24	$ 152.709,12		$ 0,00	10,24	$ 152.709,12	10,24	$ 152.709,12
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 289.093,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		$ 188.831,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 18.106,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 37.009,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		$ 8.173,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 11.318,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.601,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	8,19	$ 86.814,00		$ 0,00	8,19	$ 86.814,00	8,19	$ 86.814,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 12.152,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 12.703,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		$ 12.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 6.487,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 40.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 72.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	36,87	$ 522.447,90		$ 0,00	36,87	$ 522.447,90	36,87	$ 522.447,90
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**					-	0,00	$ 0,00						
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2		$ 86.845,00	$ 0,00	+	21,87	$ 1.899.300,15		$ 0,00	21,87	$ 1.899.300,15	21,87	$ 1.899.300,15
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2		$ 80.151,00	$ 0,00	+	107,27	$ 8.597.797,77		$ 0,00	107,27	$ 8.597.797,77	107,27	$ 8.597.797,77
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	17,60	$ 115.561,60		$ 0,00	17,60	$ 115.561,60	17,60	$ 115.561,60
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	97,45	$ 1.482.117,05		$ 0,00	97,45	$ 1.482.117,05	97,45	$ 1.482.117,05
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2		$ 97.561,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00	+	16,38	$ 421.866,90		$ 0,00	16,38	$ 421.866,90	16,38	$ 421.866,90
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	132,24	$ 403.728,72	12,24	$ 37.368,72	120,00	$ 366.360,00	132,24	$ 403.728,72
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN		$ 714.490,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.428.980,00	2,00	$ 1.428.980,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.428.980,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.688,00	$ 30.688,00	+	29,00	$ 889.952,00	30,00	$ 920.640,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 920.640,00
19,24	Tubería EMT 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	40,34	$ 850.125,16		$ 0,00	40,34	$ 850.125,16	40,34	$ 850.125,16
19,45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00	+	1,00	$ 98.173,00	1,00	$ 98.173,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 98.173,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	28,00	$ 3.973.088,00		$ 0,00	28,00	$ 3.973.088,00	28,00	$ 3.973.088,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	28,00	$ 7.935.172,00		$ 0,00	28,00	$ 7.935.172,00	28,00	$ 7.935.172,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	19,57	$ 2.778.039,78		$ 0,00	19,57	$ 2.778.039,78	19,57	$ 2.778.039,78
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML		$ 50.662,00	$ 0,00	+	37,44	$ 1.896.785,28		$ 0,00	37,44	$ 1.896.785,28	37,44	$ 1.896.785,28
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	29,00	$ 201.753,00	29,00	$ 201.753,00	0,00	$ 0,00	29,00	$ 201.753,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN		$ 739.585,00	$ 0,00	+	1,00	$ 739.585,00		$ 0,00	1,00	$ 739.585,00	1,00	$ 739.585,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	1.225,00	$ 9.321.025,00		$ 0,00	1.225,00	$ 9.321.025,00	1.225,00	$ 9.321.025,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	26,00	$ 1.164.956,00		$ 0,00	26,00	$ 1.164.956,00	26,00	$ 1.164.956,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	8,00	$ 358.448,00		$ 0,00	8,00	$ 358.448,00	8,00	$ 358.448,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	24,00	$ 336.192,00		$ 0,00	24,00	$ 336.192,00	24,00	$ 336.192,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	8,00	$ 121.224,00		$ 0,00	8,00	$ 121.224,00	8,00	$ 121.224,00
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00						
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	108,78	$ 317.855,16		$ 0,00	108,78	$ 317.855,16	108,78	$ 317.855,16
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 48.103.496,11**		**$ 3.947.299,55**		**$ 44.186.884,56**		**$ 48.134.184,11**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 8.177.594,34		$ 671.040,92		$ 7.511.770,38		$ 8.182.811,30
	IMPREVISTOS	3%						$ 1.443.104,88		$ 118.418,99		$ 1.325.606,55		$ 1.444.025,52
	UTIIDAD	5%						$ 2.405.174,81		$ 197.364,98		$ 2.209.344,23		$ 2.406.709,21
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 456.983,21		$ 37.499,35		$ 419.775,40		$ 457.274,75
A.	**TOTAL OBRA**							**$ 60.586.353,35**		**$ 4.971.623,78**		**$ 55.653.381,11**		**$ 60.625.004,89**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL																	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
									CANTIDAD	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP -17	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte,purga red secundaria,suministro e instalacion aspersor	UN		$ 123.414,84		+	9,00	$ 1.110.733,56		$ 0,00	9,00	$ 1.110.733,56	9,00	$ 1.110.733,56
NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.	ML		$ 15.500,00		+	25,05	$ 388.275,00	5,48	$ 84.940,00	19,57	$ 303.335,00	25,05	$ 388.275,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	280,00	$ 4.256.000,00		$ 0,00	280,00	$ 4.256.000,00	280,00	$ 4.256.000,00
NP- 45	Conector Biometálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	12,00	$ 323.532,00	12,00	$ 323.532,00		$ 0,00	12,00	$ 323.532,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 107.414,00		+	5,00	$ 537.070,00	1,00	$ 107.414,00	4,00	$ 429.656,00	5,00	$ 537.070,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	2,00	$ 203.294,00		$ 0,00	2,00	$ 203.294,00	2,00	$ 203.294,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	27,00	$ 2.627.829,00	1,00	$ 97.327,00	26,00	$ 2.530.502,00	27,00	$ 2.627.829,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	2,00	$ 249.616,00		$ 0,00	2,00	$ 249.616,00	2,00	$ 249.616,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	27,00	$ 2.864.673,00	4,00	$ 424.396,00	23,00	$ 2.440.277,00	27,00	$ 2.864.673,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 12.561.022,56**		**$ 1.037.609,00**		**$ 11.523.413,56**		**$ 12.561.022,56**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 2.135.373,84		$ 176.393,53		$ 1.958.980,31		$ 2.135.373,84
	IMPREVISTOS	3%						$ 376.830,68		$ 31.128,27		$ 345.702,42		$ 376.830,69
	UTIIDAD	5%						$ 628.051,13		$ 51.880,45		$ 576.170,68		$ 628.051,13
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 119.329,71		$ 9.857,29		$ 109.472,43		$ 119.329,71
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**							**$ 15.820.607,91**		**$ 1.306.868,54**		**$ 14.513.739,39**		**$ 15.820.607,92**
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6 A+B+C							**$ 76.406.961,26**		**$ 6.278.492,32**		**$ 70.167.120,50**		**$ 76.445.612,81**
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 19.137,00	$ 0,00	+	28,00	$ 535.836,00		$ 0,00	28,00	$ 535.836,00	28,00	$ 535.836,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	24,03	$ 311.332,68		$ 0,00	24,03	$ 311.332,68	24,03	$ 311.332,68
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	16,00	$ 255.264,00		$ 0,00	16,00	$ 255.264,00	16,00	$ 255.264,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 18.314,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios,	M2		$ 13.380,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.934,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	103,00	$ 833.270,00		$ 0,00	103,00	$ 833.270,00	103,00	$ 833.270,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00	+	3,23	$ 46.634,74		$ 0,00	3,23	$ 46.634,74	3,23	$ 46.634,74
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 21.828,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	100,00	$ 368.600,00		$ 0,00	100,00	$ 368.600,00	100,00	$ 368.600,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	137,59	$ 839.711,77		$ 0,00	137,59	$ 839.711,77	137,59	$ 839.711,77

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 2.749,00	$ 0,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		$ 19.537,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 289.093,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y	ML		$ 188.831,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 18.106,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego	M2		$ 4.053,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 37.009,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		$ 8.173,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 11.318,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.601,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 12.152,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 12.703,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		$ 12.053,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 6.487,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 40.606,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 72.398,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y disposición	UN		$ 35.237,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2		$ 59.197,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML		$ 23.322,00	$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición	M3		$ 336.257,00	$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 54.128,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 29.343,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 66.596,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 23.443,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 36.170,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 30.862,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	157,00	$ 1.726.529,00
+	5.760,00	$ 15.834.240,00
+	3,00	$ 315.414,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	496,15	$ 5.259.190,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	182,21	$ 1.004.523,73
-	0,00	$ 0,00
+	79,17	$ 1.523.309,97
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	51,42	$ 728.621,40
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 336.257,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	157,00	$ 1.726.529,00	157,00	$ 1.726.529,00
	$ 0,00	5.760,00	$ 15.834.240,00	5.760,00	$ 15.834.240,00
3,00	$ 315.414,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 315.414,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 48.952,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 82.887,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3		$ 213.385,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 129.405,00	$ 0,00	+	15,33	$ 1.983.778,65	15,33	$ 1.983.778,65	0,00	$ 0,00	15,33	$ 1.983.778,65
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN		$ 14.475,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN		$ 234.377,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 3.997,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 17.758,00	$ 0,00	+	300,52	$ 5.336.634,16	300,52	$ 5.336.634,16	0,00	$ 0,00	300,52	$ 5.336.634,16
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML		$ 12.297,00	$ 0,00	+	18,00	$ 221.346,00	18,00	$ 221.346,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 221.346,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00	+	70,40	$ 1.813.152,00	70,40	$ 1.813.152,00	0,00	$ 0,00	70,40	$ 1.813.152,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	5,00	$ 34.785,00	5,00	$ 34.785,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 34.785,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	59,00	$ 448.931,00	59,00	$ 448.931,00	0,00	$ 0,00	59,00	$ 448.931,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	2,00	$ 89.612,00	2,00	$ 89.612,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 89.612,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	1,00	$ 14.008,00	1,00	$ 14.008,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 14.008,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	2,00	$ 157.436,00	2,00	$ 157.436,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 157.436,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN		$ 13.363,00	$ 0,00	+	1,00	$ 13.363,00	1,00	$ 13.363,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.363,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 37.460.493,10**		**$ 10.810.008,84**		**$ 29.221.771,26**		**$ 40.031.780,10**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 6.368.283,83		$ 1.837.701,50		$ 4.967.701,11		$ 6.805.402,62
	IMPREVISTOS	3%						$ 1.123.814,79		$ 324.300,27		$ 876.653,14		$ 1.200.953,40
	UTIIDAD	5%						$ 1.873.024,66		$ 540.500,44		$ 1.461.088,56		$ 2.001.589,01
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 355.874,68		$ 102.695,08		$ 277.606,83		$ 380.301,91
A.	**TOTAL OBRA**							**$ 47.181.491,06**		**$ 13.615.206,13**		**$ 36.804.820,90**		**$ 50.420.027,04**
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP.- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	un		$ 58.007,93		+	391,47	$ 22.708.364,36		$ 0,00	391,47	$ 22.708.364,36	391,47	$ 22.708.364,36
NP.- 2	Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo	un		$ 74.953,07		+	41,00	$ 3.073.075,87		$ 0,00	41,00	$ 3.073.075,87	41,00	$ 3.073.075,87
NP -5	Mortero grouting (2500 psi) suministro + instalación	m3		$ 543.335,43		+	0,54	$ 293.401,13	0,54	$ 293.401,13	0,00	$ 0,00	0,54	$ 293.401,13
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	4,00	$ 424.396,00	4,00	$ 424.396,00		$ 0,00	4,00	$ 424.396,00
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00		+	487,09	$ 47.004.185,00	320,09	$ 30.888.685,00	167,00	$ 16.115.500,00	487,09	$ 47.004.185,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 73.503.422,36**		**$ 31.606.482,13**		**$ 41.896.940,23**		**$ 73.503.422,36**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 12.495.581,80		$ 5.373.101,96		$ 7.122.479,84		$ 12.495.581,80
	IMPREVISTOS	3%						$ 2.205.102,67		$ 948.194,46		$ 1.256.908,21		$ 2.205.102,67
	UTIIDAD	5%						$ 3.675.171,12		$ 1.580.324,11		$ 2.094.847,01		$ 3.675.171,12
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 698.282,51		$ 300.261,58		$ 398.020,93		$ 698.282,51

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**				
	TOTAL EDIFICIO BOLSA PISO 7 A+B				
	EDIFICIO CALLE 18				
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		$ 4.522,00	$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	M2		$ 13.171,00	$ 0,00
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 38.943,00	$ 0,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 16.392,00	$ 0,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2		$ 13.380,00	$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.686,00	$ 0,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 6.103,00	$ 0,00
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 2.749,00	$ 0,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 4.053,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML		$ 23.322,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		$ 89.843,00	$ 0,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano.	ML		$ 67.096,00	$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo	M2		$ 80.220,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		$ 92.577.560,46
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 38.943,00
+	120,34	$ 1.559.125,04
+	4,00	$ 65.568,00
+	15,00	$ 239.310,00
+	17,97	$ 240.438,60
+	204,00	$ 1.650.360,00
+	3,34	$ 48.222,92
+	548,65	$ 2.022.323,90
+	109,01	$ 665.288,03
+	128,00	$ 1.407.616,00
+	689,52	$ 1.895.490,48
+	13,00	$ 1.366.794,00
+	4,00	$ 56.580,00
+	718,40	$ 10.713.499,20
+	49,10	$ 1.477.026,20
+	289,51	$ 1.173.384,03
+	177,05	$ 976.076,65
+	192,72	$ 3.708.125,52
+	7,74	$ 116.618,58
+	287,71	$ 4.076.850,70
+	33,74	$ 823.087,30
+	3,28	$ 76.496,16
+	10,80	$ 309.819,60
+	25,71	$ 314.150,49
-	0,00	$ 0,00
+	519,06	$ 46.633.907,58
+	33,80	$ 2.267.844,80
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°5 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 39.808.364,25		$ 52.769.196,22		$ 92.577.560,46
	$ 53.423.570,38		$ 89.574.017,12		$ 142.997.587,50
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	1,00	$ 38.943,00	1,00	$ 38.943,00
70,14	$ 908.733,84	50,20	$ 650.391,20	120,34	$ 1.559.125,04
	$ 0,00	4,00	$ 65.568,00	4,00	$ 65.568,00
5,00	$ 79.770,00	10,00	$ 159.540,00	15,00	$ 239.310,00
	$ 0,00	17,97	$ 240.438,60	17,97	$ 240.438,60
	$ 0,00	204,00	$ 1.650.360,00	204,00	$ 1.650.360,00
	$ 0,00	3,34	$ 48.222,92	3,34	$ 48.222,92
239,96	$ 884.492,56	308,69	$ 1.137.831,34	548,65	$ 2.022.323,90
23,79	$ 145.190,37	85,22	$ 520.097,66	109,01	$ 665.288,03
128,00	$ 1.407.616,00	0,00	$ 0,00	128,00	$ 1.407.616,00
138,67	$ 381.203,83	550,85	$ 1.514.286,65	689,52	$ 1.895.490,48
7,00	$ 735.966,00	6,00	$ 630.828,00	13,00	$ 1.366.794,00
	$ 0,00	4,00	$ 56.580,00	4,00	$ 56.580,00
	$ 0,00	718,40	$ 10.713.499,20	718,40	$ 10.713.499,20
	$ 0,00	49,10	$ 1.477.026,20	49,10	$ 1.477.026,20
	$ 0,00	289,51	$ 1.173.384,03	289,51	$ 1.173.384,03
	$ 0,00	177,05	$ 976.076,65	177,05	$ 976.076,65
	$ 0,00	192,72	$ 3.708.125,52	192,72	$ 3.708.125,52
7,74	$ 116.618,58	0,00	$ 0,00	7,74	$ 116.618,58
99,46	$ 1.409.348,20	188,25	$ 2.667.502,50	287,71	$ 4.076.850,70
	$ 0,00	33,74	$ 823.087,30	33,74	$ 823.087,30
	$ 0,00	3,28	$ 76.496,16	3,28	$ 76.496,16
	$ 0,00	10,80	$ 309.819,60	10,80	$ 309.819,60
	$ 0,00	25,71	$ 314.150,49	25,71	$ 314.150,49
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,62	$ 235.388,66	516,44	$ 46.398.518,92	519,06	$ 46.633.907,58
	$ 0,00	33,80	$ 2.267.844,80	33,80	$ 2.267.844,80
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 25.035,00	$ 0,00
8.	**PAÑETES**				$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 85.805,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 8.447,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		$ 51.291,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**				$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2		$ 62.059,00	$ 0,00
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2		$ 101.422,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN		$ 51.499,00	$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN		$ 113.810,00	$ 0,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN		$ 199.573,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18.345,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 12.963,00	$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 160.047,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	0,00	$ 0,00
+	62,93	$ 2.127.537,44
+	285,25	$ 7.141.233,75
-	0,00	$ 0,00
+	19,94	$ 184.624,46
-	0,00	$ 0,00
+	519,28	$ 44.556.820,40
-	0,00	$ 0,00
+	730,87	$ 4.798.892,42
+	297,29	$ 3.165.543,92
+	3.259,00	$ 49.566.131,00
+	671,00	$ 7.305.177,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	382,06	$ 56.037.122,26
+	191,46	$ 3.935.651,76
+	117,96	$ 6.050.286,36
-	0,00	$ 0,00
+	398,85	$ 24.752.232,15
-	0,00	$ 0,00
+	76,00	$ 3.642.072,00
+	90,25	$ 9.153.335,50
-	0,00	$ 0,00
+	764,52	$ 2.334.079,56
+	41,00	$ 1.258.208,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 113.810,00
-	0,00	$ 0,00
+	13,97	$ 256.279,65
+	33,16	$ 698.813,84
+	1,00	$ 12.963,00
+	2,00	$ 107.014,00
+	2,00	$ 196.346,00
-	0,00	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	62,93	$ 2.127.537,44	62,93	$ 2.127.537,44
1,76	$ 44.061,60	283,49	$ 7.097.172,15	285,25	$ 7.141.233,75
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	19,94	$ 184.624,46	19,94	$ 184.624,46
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	519,28	$ 44.556.820,40	519,28	$ 44.556.820,40
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	730,87	$ 4.798.892,42	730,87	$ 4.798.892,42
	$ 0,00	297,29	$ 3.165.543,92	297,29	$ 3.165.543,92
1.289,86	$ 19.617.480,74	1.969,14	$ 29.948.650,26	3.259,00	$ 49.566.131,00
	$ 0,00	671,00	$ 7.305.177,00	671,00	$ 7.305.177,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	382,06	$ 56.037.122,26	382,06	$ 56.037.122,26
	$ 0,00	191,46	$ 3.935.651,76	191,46	$ 3.935.651,76
	$ 0,00	117,96	$ 6.050.286,36	117,96	$ 6.050.286,36
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	398,85	$ 24.752.232,15	398,85	$ 24.752.232,15
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	76,00	$ 3.642.072,00	76,00	$ 3.642.072,00
90,25	$ 9.153.335,50	0,00	$ 0,00	90,25	$ 9.153.335,50
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
164,52	$ 502.279,56	600,00	$ 1.831.800,00	764,52	$ 2.334.079,56
21,00	$ 644.448,00	20,00	$ 613.760,00	41,00	$ 1.258.208,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,00	$ 113.810,00		$ 0,00	1,00	$ 113.810,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,97	$ 256.279,65	0,00	$ 0,00	13,97	$ 256.279,65
33,16	$ 698.813,84	0,00	$ 0,00	33,16	$ 698.813,84
1,00	$ 12.963,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 12.963,00
2,00	$ 107.014,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 107.014,00
2,00	$ 196.346,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 196.346,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL																	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
									CANTIDAD	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	88,00	$ 24.939.112,00		$ 0,00	88,00	$ 24.939.112,00	88,00	$ 24.939.112,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	42,00	$ 5.962.068,00		$ 0,00	42,00	$ 5.962.068,00	42,00	$ 5.962.068,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML		$ 73.018,00	$ 0,00	+	110,21	$ 8.047.313,78	38,84	$ 2.836.019,12	71,37	$ 5.211.294,66	110,21	$ 8.047.313,78
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	54,00	$ 375.678,00	54,00	$ 375.678,00	0,00	$ 0,00	54,00	$ 375.678,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 775.982,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.551.964,00	2,00	$ 1.551.964,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	2.414,89	$ 18.374.898,01	584,89	$ 4.450.428,01	1.830,00	$ 13.924.470,00	2.414,89	$ 18.374.898,01
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	75,00	$ 3.360.450,00	75,00	$ 3.360.450,00	0,00	$ 0,00	75,00	$ 3.360.450,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	18,00	$ 806.508,00	18,00	$ 806.508,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 806.508,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	61,00	$ 854.488,00	61,00	$ 854.488,00	0,00	$ 0,00	61,00	$ 854.488,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	18,00	$ 272.754,00	18,00	$ 272.754,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 272.754,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	60,00	$ 1.840.320,00	60,00	$ 1.840.320,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 1.840.320,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	60,00	$ 4.723.080,00	60,00	$ 4.723.080,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 4.723.080,00
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML		$ 86.614,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	-36,00	$ 3.118.104,00	36,00	$ 3.118.104,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 382.425.755,04**		**$ 55.604.745,06**		**$ 326.821.009,98**		**$ 382.425.755,04**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 65.012.378,36		$ 9.452.806,66		$ 55.559.571,70		$ 65.012.378,36
	IMPREVISTOS	3%						$ 11.472.772,65		$ 1.668.142,35		$ 9.804.630,30		$ 11.472.772,65
	UTIIDAD	5%						$ 19.121.287,75		$ 2.780.237,25		$ 16.341.050,50		$ 19.121.287,75
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 3.633.044,67		$ 528.245,08		$ 3.104.799,59		$ 3.633.044,67
A.	**TOTAL OBRA DELCOP**				$ 0,00	-	0,00	**$ 481.665.238,47**		**$ 70.034.176,40**	0,00	**$ 411.631.062,07**	0,00	**$ 481.665.238,47**
NP	**NO PREVISTOS**													
NP.- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	M2		$ 58.007,93		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 2	Desarme, transportey ensamble de puestos de trabajo	UN		$ 74.953,07		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 3	Desmonte division en vidrio piso techo	M2		$ 44.471,58		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 6	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2		$ 6.800,00		+	147,39	$ 1.002.252,00		$ 0,00	147,39	$ 1.002.252,00	147,39	$ 1.002.252,00
NP- 7	Retiro pegante de alfombra en piso	M2		$ 8.191,00		+	15,76	$ 129.090,16		$ 0,00	15,76	$ 129.090,16	15,76	$ 129.090,16
NP- 8	Desmonte de piso en vinilo incluye trasciego y retiro	M2		$ 7.677,19		+	56,11	$ 430.767,13		$ 0,00	56,11	$ 430.767,13	56,11	$ 430.767,13
NP- 9	Desmonte de division de espacios modular en pvc, incluye trasiego y retiro	M2		$ 45.205,00		+	16,85	$ 761.704,25		$ 0,00	16,85	$ 761.704,25	16,85	$ 761.704,25
NP -11	Puerta deslizante sobre riel angulo y malla eslabonada	UN		$ 1.400.000,00		+	4,00	$ 5.600.000,00	4,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.600.000,00
NP -12	Desmonte, corte y montaje de puertas metálicas	UN		$ 144.596,10		+	1,00	$ 144.596,10		$ 0,00	1,00	$ 144.596,10	1,00	$ 144.596,10
NP- 39	Cable libre de halogenoscalibre 6 AWG , suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.500,00		+	51,19	$ 793.445,00	51,19	$ 793.445,00		$ 0,00	51,19	$ 793.445,00
NP- 40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	1.352,00	$ 20.550.400,00	352,00	$ 5.350.400,00	1.000,00	$ 15.200.000,00	1.352,00	$ 20.550.400,00
NP- 45	Conector Bimetálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	19,00	$ 512.259,00	19,00	$ 512.259,00		$ 0,00	19,00	$ 512.259,00
NP- 47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	3,00	$ 304.941,00		$ 0,00	3,00	$ 304.941,00	3,00	$ 304.941,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	86,00	$ 8.370.122,00	86,00	$ 8.370.122,00		$ 0,00	86,00	$ 8.370.122,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	7,00	$ 873.656,00		$ 0,00	7,00	$ 873.656,00	7,00	$ 873.656,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	77,00	$ 8.169.623,00	77,00	$ 8.169.623,00		$ 0,00	77,00	$ 8.169.623,00
NP -51	Salida iluminación, tubería SCH 40. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, accesorios	UN		$ 110.895,00		+	87,00	$ 9.647.865,00	11,00	$ 1.219.845,00	76,00	$ 8.428.020,00	87,00	$ 9.647.865,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS							**$ 57.290.720,64**		**$ 30.015.694,00**		**$ 27.275.026,64**		**$ 57.290.720,64**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL									**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**			**ACUMULADO ACTUAL**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**		
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 9.739.422,51		$ 5.102.667,98		$ 4.636.754,53			$ 9.739.422,51		
	IMPREVISTOS	3%						$ 1.718.721,62		$ 900.470,82		$ 818.250,80			$ 1.718.721,62		
	UTIIDAD	5%						$ 2.864.536,03		$ 1.500.784,70		$ 1.363.751,33			$ 2.864.536,03		
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 544.261,85		$ 285.149,09		$ 259.112,75			$ 544.261,85		
B.	**TOTAL NO PREVISTOS DELCOP**				$ 0,00	-	0,00	**$ 72.157.662,65**		**$ 37.804.766,59**	0,00	**$ 34.352.896,05**		0,00	**$ 72.157.662,65**		
	TOTAL DELCOP A+B							**$ 553.822.901,12**		**$ 107.838.943,00**		**$ 445.983.958,12**			**$ 553.822.901,12**		
ACIO	**PALACIO DE JUSTICIA**																
	SECRETARIA SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2																
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	143,94	$ 1.525.764,00		$ 0,00	143,94	$ 1.525.764,00		143,94	$ 1.525.764,00		
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	31,27	$ 172.391,51		$ 0,00	31,27	$ 172.391,51		31,27	$ 172.391,51		
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**					-	0,00	$ 0,00									
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00	+	143,94	$ 4.866.323,52		$ 0,00	143,94	$ 4.866.323,52		143,94	$ 4.866.323,52		
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	+	4,69	$ 43.424,71		$ 0,00	4,69	$ 43.424,71		4,69	$ 43.424,71		
10.	**ESTUCO Y PINTURA**					-	0,00	$ 0,00									
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	76,51	$ 502.364,66		$ 0,00	76,51	$ 502.364,66		76,51	$ 502.364,66		
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00		+	300,48	$ 4.570.000,32		$ 0,00	300,48	$ 4.570.000,32		300,48	$ 4.570.000,32		
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00	+	118,12	$ 1.285.972,44		$ 0,00	118,12	$ 1.285.972,44		118,12	$ 1.285.972,44		
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00	+	143,94	$ 21.111.823,74		$ 0,00	143,94	$ 21.111.823,74		143,94	$ 21.111.823,74		
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00	+	52,55	$ 1.080.217,80		$ 0,00	52,55	$ 1.080.217,80		52,55	$ 1.080.217,80		
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	143,94	$ 420.592,68		$ 0,00	143,94	$ 420.592,68		143,94	$ 420.592,68		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 0,00**			**$ 35.578.875,38**		**$ 0,00**		**$ 35.578.875,38**			**$ 35.578.875,38**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 6.048.408,81		$ 0,00		$ 6.048.408,81			$ 6.048.408,81		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 1.067.366,26		$ 0,00		$ 1.067.366,26			$ 1.067.366,26		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 1.778.943,77		$ 0,00		$ 1.778.943,77			$ 1.778.943,77		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 337.999,32		$ 0,00		$ 337.999,32			$ 337.999,32		
A.	**TOTAL OBRA CIVIL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2**				**$ 0,00**			**$ 44.811.593,54**		**$ 0,00**	0,00	**$ 44.811.593,54**		0,00	**$ 44.811.593,54**		
	TOTAL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2 A							**$ 44.811.593,54**		**$ 0,00**		**$ 44.811.593,54**			**$ 44.811.593,54**		
	SALA PLENA CORTE SUPREMA																
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	200,00	$ 584.400,00		$ 0,00	200,00	$ 584.400,00		200,00	$ 584.400,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL									**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**			
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 2.922,00**			**$ 584.400,00**		**$ 0,00**		**$ 584.400,00**		**$ 584.400,00**			
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 99.348,00		$ 0,00		$ 99.348,00		$ 99.348,00			
	IMPREVISTOS	3%						$ 17.532,00		$ 0,00		$ 17.532,00		$ 17.532,00			
	UTIIDAD	5%						$ 29.220,00		$ 0,00		$ 29.220,00		$ 29.220,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 5.551,80		$ 0,00		$ 5.551,80		$ 5.551,80			
A.	**TOTAL OBRA S.P. CORTE SUPREMA**							**$ 736.051,80**		**$ 0,00**		**$ 736.051,80**		**$ 736.051,80**			
NP	**NO PREVISTOS**																
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	18,00	$ 35.478.000,00		$ 0,00	18,00	$ 35.478.000,00	18,00	$ 35.478.000,00			
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	181,27	$ 87.009.600,00		$ 0,00	181,27	$ 87.009.600,00	181,27	$ 87.009.600,00			
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	48,42	$ 11.862.900,00		$ 0,00	48,42	$ 11.862.900,00	48,42	$ 11.862.900,00			
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	59,28	$ 14.523.600,00		$ 0,00	59,28	$ 14.523.600,00	59,28	$ 14.523.600,00			
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	10,00	$ 22.410.000,00		$ 0,00	10,00	$ 22.410.000,00	10,00	$ 22.410.000,00			
	TOTAL C. DIRECTO N.P. OBRA S.P. CORTE SUPREMA				**$ 0,00**			**$ 171.284.100,00**		**$ 0,00**		**$ 171.284.100,00**		**$ 171.284.100,00**			
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00	-	0,00	$ 29.118.297,00		$ 0,00		$ 29.118.297,00		$ 29.118.297,00			
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00	-	0,00	$ 5.138.523,00		$ 0,00		$ 5.138.523,00		$ 5.138.523,00			
	UTIIDAD	5%			$ 0,00	-	0,00	$ 8.564.205,00		$ 0,00		$ 8.564.205,00		$ 8.564.205,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00	-	0,00	$ 1.627.198,95		$ 0,00		$ 1.627.198,95		$ 1.627.198,95			
B.	**TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE SUPREMA**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 215.732.323,95**		**$ 0,00**	0,00	**$ 215.732.323,95**	0,00	**$ 215.732.323,95**			
	TOTAL SALA PLENA CORTE SUPREMA A+B							**$ 216.468.375,75**		**$ 0,00**		**$ 216.468.375,75**		**$ 216.468.375,75**			
SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO																	
10.	**ESTUCO Y PINTURA**																
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CONSEJO DE ESTADO				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			
A.	**TOTALOBRA S.P. CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**			
B	**NO PREVISTOS**																
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	16,00	$ 31.536.000,00	2,00	$ 3.942.000,00	14,00	$ 27.594.000,00	16,00	$ 31.536.000,00			
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	126,90	$ 60.912.000,00	25,38	$ 12.182.400,00	101,52	$ 48.729.600,00	126,90	$ 60.912.000,00			
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	53,76	$ 13.171.200,00	10,75	$ 2.633.750,00	43,01	$ 10.537.450,00	53,76	$ 13.171.200,00			
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	60,00	$ 14.700.000,00	12,00	$ 2.940.000,00	48,00	$ 11.760.000,00	60,00	$ 14.700.000,00			
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	8,00	$ 17.928.000,00	2,00	$ 4.482.000,00	6,00	$ 13.446.000,00	8,00	$ 17.928.000,00			
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	60,00	$ 3.660.000,00	12,00	$ 732.000,00	48,00	$ 2.928.000,00	60,00	$ 3.660.000,00			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL									**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**			**ACUMULADO ACTUAL**			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**		**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**		
NP -27	Mantenimiento ventana Balcón	M2		$ 180.000,00		+	15,82	$ 2.847.600,00	5,82	$ 1.047.600,00	10,00	$ 1.800.000,00		15,82	$ 2.847.600,00		
NP -28	Restauración piso en madera	M2		$ 116.000,00		+	200,00	$ 23.200.000,00	140,00	$ 16.240.000,00	60,00	$ 6.960.000,00		200,00	$ 23.200.000,00		
NP- 29	Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa	ML		$ 102.500,00		+	60,00	$ 6.150.000,00	30,00	$ 3.075.000,00	30,00	$ 3.075.000,00		60,00	$ 6.150.000,00		
NP -30	Mantenimiento de cielo raso en madera	M2		$ 61.800,00		+	129,36	$ 7.994.448,00	29,36	$ 1.814.448,00	100,00	$ 6.180.000,00		129,36	$ 7.994.448,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 182.099.248,00**		**$ 49.089.198,00**		**$ 133.010.050,00**			**$ 182.099.248,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 30.956.872,16		$ 8.345.163,66		$ 22.611.708,50			$ 30.956.872,16		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 5.462.977,44		$ 1.472.675,94		$ 3.990.301,50			$ 5.462.977,44		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 9.104.962,40		$ 2.454.459,90		$ 6.650.502,50			$ 9.104.962,40		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 1.729.942,86		$ 466.347,38		$ 1.263.595,48			$ 1.729.942,86		
B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 229.354.002,86**		**$ 61.827.844,88**	0,00	**$ 167.526.157,98**		0,00	**$ 229.354.002,86**		
	TOTAL SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO A+B							**229.354.003**		**$ 61.827.844,88**		**$ 167.526.157,98**			**$ 229.354.002,86**		
SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL																	
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		0,00	$ 0,00		
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
22.	**ASEO Y VARIOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
A.	**TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		
A.	**TOTALOBRA S.P. CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**		0,00	**$ 0,00**		
NP	**NO PREVISTOS**																
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	3,00	$ 5.913.000,00	3,00	$ 5.913.000,00	0,00	$ 0,00		3,00	$ 5.913.000,00		
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	14,15	$ 6.792.000,00	8,79	$ 4.219.200,00	5,36	$ 2.572.800,00		14,15	$ 6.792.000,00		
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	8,15	$ 1.996.750,00	8,15	$ 1.996.750,00	0,00	$ 0,00		8,15	$ 1.996.750,00		
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	11,22	$ 684.420,00	11,22	$ 684.420,00	0,00	$ 0,00		11,22	$ 684.420,00		
NP - 33	Restauración tarima (2,40 mx 1,22 mt)	un		$ 1.185.104,00		+	1,00	$ 1.185.104,00		$ 0,00	1,00	$ 1.185.104,00		1,00	$ 1.185.104,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 16.571.274,00**		**$ 12.813.370,00**		**$ 3.757.904,00**			**$ 16.571.274,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 2.817.116,58		$ 2.178.272,90		$ 638.843,68			$ 2.817.116,58		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 497.138,22		$ 384.401,10		$ 112.737,12			$ 497.138,22		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 828.563,70		$ 640.668,50		$ 187.895,20			$ 828.563,70		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 157.427,10		$ 121.727,02		$ 35.700,09			$ 157.427,10		
B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 20.871.519,60**		**$ 16.138.439,52**	0,00	**$ 4.733.080,09**		0,00	**$ 20.871.519,60**		
	TOTAL SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL A+B							**$ 20.871.519,60**		**$ 16.138.439,52**		**$ 4.733.080,09**			**$ 20.871.519,60**		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL									**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	NO PREVISTOS																
NP -32	Restauración sillas	UN		$ 717.300,00		+	4,00	$ 2.869.200,00		$ 0,00	4,00	$ 2.869.200,00	4,00	$ 2.869.200,00			
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 2.869.200,00**		**$ 0,00**		**$ 2.869.200,00**		**$ 2.869.200,00**			
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 487.764,00		$ 0,00		$ 487.764,00		$ 487.764,00			
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 86.076,00		$ 0,00		$ 86.076,00		$ 86.076,00			
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 143.460,00		$ 0,00		$ 143.460,00		$ 143.460,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 27.257,40		$ 0,00		$ 27.257,40		$ 27.257,40			
B.	**TOTALN.P. S.P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA**				**$ 0,00**			**$ 3.613.757,40**		**$ 0,00**	0,00	**$ 3.613.757,40**	0,00	**$ 3.613.757,40**			
	TOTAL S. P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA A+B							**3.613.757,40**		**0,00**		**3.613.757,40**		**3.613.757,40**			
COMISION DISCIPLINA JUDICIAL																	
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	3,00	$ 47.862,00	3,00	$ 47.862,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 47.862,00			
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	+	14,86	$ 223.895,62	14,86	$ 223.895,62	0,00	$ 0,00	14,86	$ 223.895,62			
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			
6,4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos,	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	14,86	$ 1.335.066,98	14,86	$ 1.335.066,98	0,00	$ 0,00	14,86	$ 1.335.066,98			
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			
10,2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	+	29,72	$ 316.458,56	29,72	$ 316.458,56		$ 0,00	29,72	$ 316.458,56			
A	**TOTAL DIRECTO COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 1.923.283,16**		**$ 1.923.283,16**		**$ 0,00**		**$ 1.923.283,16**			
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 326.958,14		$ 326.958,14		$ 0,00		$ 326.958,14			
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 57.698,49		$ 57.698,49		$ 0,00		$ 57.698,49			
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 96.164,16		$ 96.164,16		$ 0,00		$ 96.164,16			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			A		$ 18.271,19		$ 0,00		$ 18.271,19			
B.	**TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 2.404.103,95**		**$ 2.422.375,14**	0,00	**$ 0,00**	0,00	**$ 2.422.375,14**			
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	3,00	$ 5.913.000,00	3,00	$ 5.913.000,00		$ 0,00	3,00	$ 5.913.000,00			
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	8,50	$ 4.080.000,00	8,50	$ 4.080.000,00		$ 0,00	8,50	$ 4.080.000,00			
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00			
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 9.993.000,00**		**$ 9.993.000,00**		**$ 0,00**		**$ 9.993.000,00**			
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 1.698.810,00		$ 1.698.810,00		$ 0,00		$ 1.698.810,00			
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 299.790,00		$ 299.790,00		$ 0,00		$ 299.790,00			
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 499.650,00		$ 499.650,00		$ 0,00		$ 499.650,00			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 94.933,50		$ 94.933,50		$ 0,00		$ 94.933,50			
B.	**TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 12.586.183,50**		**$ 12.586.183,50**	0,00	**$ 0,00**	0,00	**$ 12.586.183,50**			
	TOTAL S. P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL A+B							**12.586.183,50**		**12.586.183,50**		**0,00**		**12.586.183,50**			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0
DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**								
OBRA CIVIL																	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PRESENTE ACTA N°5**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
									CANTIDAD	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
ASCENSORES DE PALACIO														
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 48.003,00	$ 0,00	+	5,04	$ 241.935,12	5,04	$ 241.935,12	0,00	$ 0,00	5,04	$ 241.935,12
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	5,76	$ 517.495,68		$ 0,00	5,76	$ 517.495,68	5,76	$ 517.495,68
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	+	32,00	$ 1.533.504,00	16,00	$ 766.752,00	16,00	$ 766.752,00	32,00	$ 1.533.504,00
19	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	30,00	$ 4.256.880,00	13,00	$ 1.844.648,00	17,00	$ 2.412.232,00	30,00	$ 4.256.880,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	18,00	$ 5.101.182,00	1,00	$ 283.399,00	17,00	$ 4.817.783,00	18,00	$ 5.101.182,00
A,	**COSTO DIRECTO ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 11.650.996,80**		**$ 3.136.734,12**		**$ 8.514.262,68**		**$ 11.650.996,80**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 1.980.669,46		$ 533.244,80		$ 1.447.424,66		$ 1.980.669,46
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 349.529,90		$ 94.102,02		$ 255.427,88		$ 349.529,90
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 582.549,84		$ 156.836,71		$ 425.713,13		$ 582.549,84
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 110.684,47		$ 29.798,97		$ 80.885,50		$ 110.684,47
A.	**TOTAL ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 14.674.430,47**		**$ 3.950.716,62**	0,00	**$ 10.723.713,85**	0,00	**$ 14.674.430,47**
	NO PREVISTOS													
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	2,00	$ 203.294,00	1,00	$ 101.647,00	1,00	$ 101.647,00	2,00	$ 203.294,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	8,00	$ 778.616,00	8,00	$ 778.616,00		$ 0,00	8,00	$ 778.616,00
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 203.294,00**		**$ 880.263,00**		**$ 101.647,00**		**$ 981.910,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 34.559,98		$ 149.644,71		$ 17.279,99		$ 166.924,70
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 6.098,82		$ 26.407,89		$ 3.049,41		$ 29.457,30
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 10.164,70		$ 44.013,15		$ 5.082,35		$ 49.095,50
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 1.931,29		$ 8.362,50		$ 965,65		$ 9.328,15
B.	**TOTALN.P. ASCENSORES**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 256.048,79**		**$ 1.108.691,25**	0,00	**$ 128.024,40**	0,00	**$ 1.236.715,65**
	TOTAL ASCENSORES							**14.930.479**		**5.059.407,87**		**10.851.738,24**		**15.911.146,11**
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 431.948.036,94**		**$ 77.931.478,73**		**$ 465.350.570,21**		**$ 543.282.048,94**
A. I. U.				**25%**										
ADMINISTRACIÓN				**17%**	$ 0,00			$ 73.431.166,28		$ 13.248.351,38		$ 79.109.596,94		$ 92.357.948,32
IMPREVISTOS				**3%**	$ 0,00			$ 12.958.441,11		$ 2.337.944,36		$ 13.960.517,11		$ 16.298.461,47
UTILIDAD				**5%**	$ 0,00			$ 21.597.401,85		$ 3.896.573,94		$ 23.267.528,51		$ 27.164.102,45
IVA				**19%**	$ 0,00			$ 4.103.506,35		$ 740.349,05		$ 4.420.830,42		$ 5.161.179,46
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 544.038.552,53**		**$ 98.154.697,46**		**$ 586.109.043,18**		**$ 684.263.740,64**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.5 | PERIODO MES / AÑO **feb-24** | **FECHA:** 26/02/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B-92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
PLAZO TOTAL	:	5 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/04/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL								PRESENTE ACTA N°5		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS					**$ 0,00**			**$ 542.576.331,56**		**$ 139.712.380,13**		**$ 403.642.567,43**		**$ 543.354.947,56**
A. I. U.				**25%**										
ADMINISTRACIÓN				**17%**	$ 0,00			$ 92.237.976,37		$ 23.751.104,62		$ 68.619.236,47		$ 92.370.341,10
IMPREVISTOS				**3%**	$ 0,00			$ 16.277.289,95		$ 4.191.371,40		$ 12.109.277,03		$ 16.300.648,44
UTILIDAD				**5%**	$ 0,00			$ 27.128.816,58		$ 6.985.619,01		$ 20.182.128,37		$ 27.167.747,38
IVA				**19%**	$ 0,00			$ 5.154.475,15		$ 1.327.267,61		$ 3.834.604,39		$ 5.161.872,00
B. TOTAL OBRAS NO PREVISTAS					**$ 0,00**			**$ 683.374.889,60**		**$ 175.967.742,78**		**$ 508.387.813,70**		**$ 684.355.556,47**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 91.132.065,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IVA				**19%**	$ 0,00			$ 17.315.092,35		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
C. TOTAL MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 108.447.157,35**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL				**$**	**0,00**			**$ 1.118.966.284,78**		**$ 274.122.440,24**		**$ 1.094.496.856,88**		**$ 1.368.619.297,11**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA										**$ 274.122.440,24**				

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 274.122.440,24 SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTI CUATRO CENTAVOS M/CTE

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

JHONY FERNEY DIAZ DAZA
Representante Legal
CONSORCIO LOCATIVO
CONTRATISTA

RESUMEN ACTA Nº5 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO DELCOP	SECRETARIA P2	S.P.C.S. JUSTICIA	S.P. C. ESTADO	S.P.C. CONSTITUCIONAL	S.P.C.S. JUDICATURA	S.P. COM. DISC JUDICIAL	ASCENSORES	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 2.509.408,00	$ 3.947.299,55	$ 10.810.008,84	$ 55.604.745,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.923.283,16	$ 3.136.734,12	**$ 77.931.478,73**
ADMINISTRACION 17%	$ 426.599,36	$ 671.040,92	$ 1.837.701,50	$ 9.452.806,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 326.958,14	$ 533.244,80	$ 13.248.351,38
IMPREVISTOS 3%	$ 75.282,24	$ 118.418,99	$ 324.300,27	$ 1.668.142,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 57.698,49	$ 94.102,02	$ 2.337.944,36
UTILIDAD 5%	$ 125.470,40	$ 197.364,98	$ 540.500,44	$ 2.780.237,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 96.164,16	$ 156.836,71	$ 3.896.573,94
IVA 19%	$ 23.839,38	$ 37.499,35	$ 102.695,08	$ 528.245,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 18.271,19	$ 29.798,97	$ 740.349,05
TOTAL	**$ 3.160.599,38**	**$ 4.971.623,78**	**$ 13.615.206,13**	**$ 70.034.176,40**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.422.375,14**	**$ 3.950.716,62**	**$ 98.154.697,46**
COSTO DIRECTO N.P	$ 4.276.764,00	$ 1.037.609,00	$ 31.606.482,13	$ 30.015.694,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.089.198,00	$ 12.813.370,00	$ 0,00	$ 9.993.000,00	$ 880.263,00	**$ 139.712.380,13**
ADMINISTRACION 17%	$ 727.049,88	$ 176.393,53	$ 5.373.101,96	$ 5.102.667,98		$ 0,00	$ 8.345.163,66	$ 2.178.272,90	$ 0,00	$ 1.698.810,00	$ 149.644,71	$ 23.751.104,62
IMPREVISTOS 3%	$ 128.302,92	$ 31.128,27	$ 948.194,46	$ 900.470,82		$ 0,00	$ 1.472.675,94	$ 384.401,10	$ 0,00	$ 299.790,00	$ 26.407,89	$ 4.191.371,40
UTILIDAD 5%	$ 213.838,20	$ 51.880,45	$ 1.580.324,11	$ 1.500.784,70		$ 0,00	$ 2.454.459,90	$ 640.668,50	$ 0,00	$ 499.650,00	$ 44.013,15	$ 6.985.619,01
IVA 19%	$ 40.629,26	$ 9.857,29	$ 300.261,58	$ 285.149,09		$ 0,00	$ 466.347,38	$ 121.727,02	$ 0,00	$ 94.933,50	$ 8.362,50	$ 1.327.267,61
TOTAL	**$ 5.386.584,26**	**$ 1.306.868,54**	**$ 39.808.364,25**	**$ 37.804.766,59**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 61.827.844,88**	**$ 16.138.439,52**	**$ 0,00**	**$ 12.586.183,50**	**$ 1.108.691,25**	**$ 175.967.742,78**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**
	$ 8.547.183,63	**$ 6.278.492,32**	**$ 53.423.570,38**	**$ 107.838.943,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 61.827.844,88**	**$ 16.138.439,52**	**$ 0,00**		**$ 5.059.407,87**	**$ 274.122.440,24**

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2024

Señor(es),
TOTALL INC SAS BIC
Consultor Interventoría
FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante legal
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: Contrato de Obra 088 de 2023 cuyo objeto es "*Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial*".

Asunto: Aclaratoria ítem 21.11 acta de cobro N°5

Respetado(s) Señor(es),
El suscrito, **JHONY FERNEY DIAZ DAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.013.632.556, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO LOCATIVO** se permite aclarar que:

En el acta de cobro N°4 se registró en el ***ITEM 21.11 Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al antepecho por platinas metálicas con acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, pernos de fijación)***, cuya unidad de medida es ML, para 36 ml a un valor unitario de $86.614 cobrándose un costo directo de $3.118104, esta actividad se debió registrar en el ***ítem 14.30 Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)*** cuya unidad es M2. Ya que la dimensión instalada corresponde a medidas que superan en su alto y ancho el metro.

Por esta razón en el ACTA DE COBRO N°6 se presenta el ítem 21.11 el valor 36 ml en negativo ya que no cumple con la unidad de medida correspondiente a lo instalado y en su reemplazo se cobra la actividad citada en el ítem 14.30 con 90.25 m2 de cerramiento en malla eslabonada.

A continuación, se presente cuadro explicativo de la incidencia presupuestal de la modificación.

I

ACTA	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNIT	CANT	VR TOTAL
4	21,11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al antepecho por platinas metálicas con acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, pernos de fijación)	ML	$ 86.614,00	-36	-$ 3.118.104,00
6	14,3	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	$ 101.422,00	90,25	$ 9.153.335,50
		VALOR FINAL A COBRAR PRESENTE ACTA				**$ 6.035.231,50**

Cordialmente,

JHONY FERNEY DIAZ DAZA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO LOCATIVO

Bogotá D.C, 26 de marzo de 2024

Señores
CONSORCIO LOCATIVO
Atn: Jhony Ferney Diaz Daza
Representante Legal
consorciolocativo@gmail.com
Cel. 3107586215
Bogotá D.C.


Referencia: Contrato de Interventoría 112-2023 cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE ITEM PARA COBRO ACTIVIDAD

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestro compromiso contractual y teniendo en cuenta que el cerramiento se acordó construirlo con tubos metálicos y malla eslabonada, no es viable realizar el cobro por el ítem contractual 21.11 "*Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al antepecho por platinas metálicas con acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, pernos de fijación)"* ya que su unidad de medida es ml y en su descripción no refiere a malla eslabonada, por tal razón se AVALA realizar el cobro por el Ítem *14.30 Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)* cuya unidad es M2.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT. 901.620.351-9
CRA 47ª # 93-41

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
PRORROGA 2 **:** Hasta el 24 de abril de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 24 de abril de 2024.
PERIODO DE CORTE : 26 de febrero de 2024 – 26 marzo de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

ACTA No. 01 de Obra	$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	$ 22.372.203,87
ACTA No. 03 de Obra	$ 358.366.837,83
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.	$ 34.023.212,80
ACTA No. 04 de Obra	$ 323.449.278,11
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA.	$ 30.708.152,82
ACTA No. 05 de Obra	$ 274.122.440,24
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA.	$ 26.025.081,39

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 222.158.720,00	
Valor adiciones	$ 111.079.360,00	
Valor total del Contrato	$ 333.238.080,00	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		$ 22.372.203,87
Acta Parcial No. 03 Interventoría		$ 34.023.212,80
Acta Parcial No. 04 Interventoría		$ 30.708.152,82
Acta Parcial No. 05 Interventoría		$ 26.025.081,39
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		**$ 129.936.201,34**

SALDO POR EJECUTAR		**$ 203.301.878,66**



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

7. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

8. FACTURA



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Detalle de producto
No. FEV 80

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha
2024-05-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE FEBRERO 2024 AL 26 MARZO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	21,869,816.29	26,025,081.39

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis millones veinticinco mil ochenta y un pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-07 por $ 26,025,081.39

Total Bruto	21,869,816.29
IVA 19%	4,155,265.10
Total a Pagar	26,025,081.39

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A # 93 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-12-29 / 01:13:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79553539 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TOTALL INC SAS BIC

997. Fecha formalización 2022-12-29/13:13:24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TOTALL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal .
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.jcdqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.101.836**

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1972**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 **0045**982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FDB8375091DB3464

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																							$90,580,000	$14,666,800			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000		$5,368,800		$0	$0		$27,138,000
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA										X								25-14	10	$1,800,000	$306,000	EPS005	10	$1,800,000	$0	CCF22	10	$1,800,000	$0	14-25	10	$1,800,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$306,000
4	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA																		25-14	20	$3,600,000	$612,000	EPS005	20	$3,600,000	$144,000	CCF22	20	$3,600,000	$144,000	14-25	20	$3,600,000	0.522%	$18,800	20	$0	$0	Si	$918,800
5	CC	1032455696	PUERTO BURBANO SAUL ANDRES																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$14,666,800	$12,800	$0	$14,679,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,854,000	$4,300	$0	$4,858,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,364,800	$5,500	$0	$6,370,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,240,000	$2,800	$0	$3,242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$3,551,200	$3,400	$0	$3,554,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$378,000	$400	$0	$378,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$384,000	$400	$0	$384,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$328,000	$300	$0	$328,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$596,000	$600	$0	$596,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$100	$0	$60,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,805,200	$1,600	$0	$1,806,800
TOTAL				**31**	**$27,138,000**	**$23,900**	**$0**	**$27,161,900**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	478973324	9463607272	I	2024/03/18	2024/02/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO							X											0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
TOTAL				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821
FECHA RADICADO:	16/02/2024 , 24/01/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTALL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA:"A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

13. AVAL DE INTERVENTORIA A PGAS-SST DE OBRA


Bogotá D.C, Marzo 31 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de marzo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

Bogotá D.C, marzo 31 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de marzo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, marzo 31 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de marzo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

14. INFORME DE INTERVENTORIA

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 130.517.496,67**	**39,17%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.368.619.297,11**	**39,17%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 202.720.583,33**	**60,83%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.125.747.959,89**	**60,83%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 2	24/02/2024

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	48,00%	59,00%	11,00%
Durante el periodo	34,00%	14,00%	-20,00%
Acumulado Actual	82,00%	73,00%	-9,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

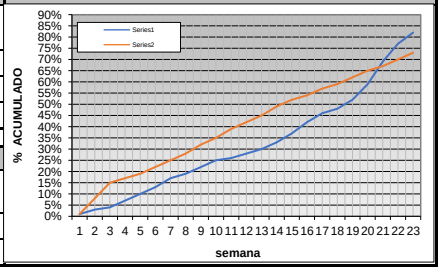

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	152	29	-16

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 5	Del 26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024	
	PERIODO: 6 meses y 1 dias		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
		FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
		No. DE RADICACION	
		VIGENCIA	

ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 19
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicacon de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades electricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifica que se realiza la instalación de lamparas y se protegen para que no les ingresen polvo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la instalación de muros de superboards para cubrir las ventanas en los ascensores del edificio Palacio.
Se verifico que se realiza la instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.
SEMANA 20
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicacion de pintura en los muros de Superbords en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el desmonte de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan regatas en piso para instalar dutos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
	PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifica que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el cuarto de maquinas de los ascensores del edificio Palacio.
SEMANA 21
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza vano para puerta en el muro de superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza vano para habilitar el acceso al traselevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 22
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 23
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

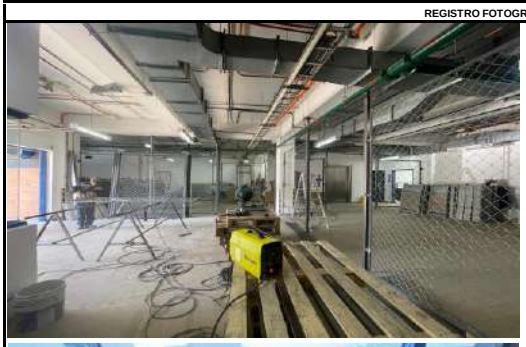







Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	









Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

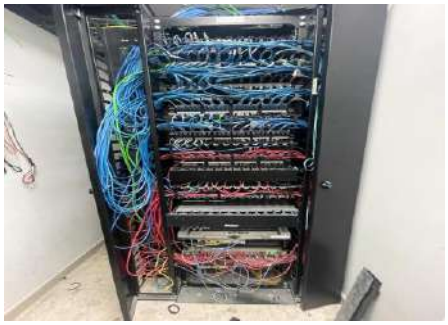

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	









Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

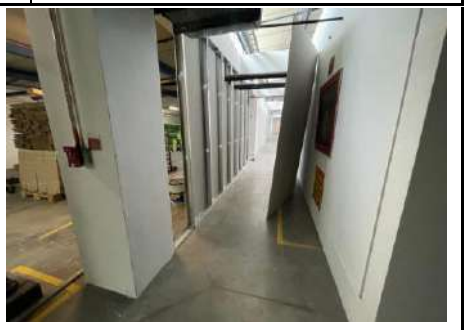



Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	












Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del PERIODO: 6 meses y 1 dias	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 200.000.613	$ 177.034.096	5,07%
2	$ 415.024.749	$ 412.680.741	11,81%
3	$ 639.924.485	$ 771.047.579	22,07%
4	$ 1.298.478.093	$ 1.094.496.857	31,32%
5	$ 2.093.537.188	$ 1.368.619.297	39,17%
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ 1.368.619.297,11**	**39,17%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA	SUPERVISION
FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORÍA	**DANIEL MERCHAN CEPEDA** Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26–FEB AL 26–MAR 2024



"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."

26/03/2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de febrero al 26 de marzo de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 26 de marzo de 2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de febrero al 26 de marzo de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de marzo 2024	**INFORME No.**	**5**

PERIODO No.	1	**DEL**:	**26 de febrero 2024**	**AL**:	**26 de marzo de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	181 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	150 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : $ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR: $ 1.154.367.257,00

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE 0CTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	181 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	150 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : $ 222.158.720,00
VALOR ADICIONES:	CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA VALOR: $ 111.079.360

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 19, del 26 de febrero al 03 de marzo de 2024

ACTIVIDADES

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la aplicación de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades eléctricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifica que se realiza la instalación de lámparas y se protegen para que no les ingresen polvo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la instalación de muros de Superboards para cubrir las ventanas en los ascensores del edificio Palacio.
Se verifico que se realiza la instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.

No. 20, del 04 de marzo al 10 de marzo de 2024

ACTIVIDADES

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la aplicación de pintura en los muros de Superboards en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lámparas en cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza el desmonte de cable eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan regatas en piso para instalar datos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza el resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de guarda escobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifica que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.
Se evidencio que se realiza la instalación de lámparas en el cuarto de máquinas de los ascensores del edificio Palacio.

No. 21, del 11 de marzo al 17 de marzo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza vano para puerta en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza vano para habilitar el acceso al transelevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de lámparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lámparas en cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metálica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de Superboards y mampostería en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza actividades de cable eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.

Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

No. 22, del 18 de marzo al 24 de marzo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cielo raso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de lámparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza actividades de cable eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

No. 23, del 18 de marzo al 24 de marzo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la instalación de cable eléctrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza actividades de cable eléctrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del sexto (6) mes, del proyecto "REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL", según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES ENERO– FEBRERO 2024	
No.19	del 26 de febrero de 2024 al 03 de marzo de 2024
No.20	del 04 de marzo de 2024 al 10 de marzo de 2024
No.21	del 11 de marzo de 2024 al 17 de marzo de 2024
No.22	del 18 de marzo de 2024 al 24 de marzo de 2024
N0.23	del 25 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de febrero de 2024 al 26 de marzo de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo a Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	80
Maestro de Obra	Robinson Villamil Rojas	Técnico	Mano de obra calificada/activo	100

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Inspector de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Juan Sebastián Torres Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 5.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	$ 177.034.095,76
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	$ 235.646.645,17
Corte de obra No 3	26 enero 2024	$ 358.366.837,82
Corte de obra No 4	26 febrero 2024	$ 323.449.278,11
Corte de obra No 5	26 marzo 2024	$ 274.122.440,24
TOTAL A CANCELAR		$ 274.122.440,24

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 24/10/2024	$524.155.088,55	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 24/04/2027	$524.155.088,55	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 1 día.	$873.591.814,25	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 1 día.	$873.591.814,25	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 24/08/2024	$ 44.431.744	29/01/2024	31/01/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 24/02/2027	$ 22.215.872	29/01/2024	31/01/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	24/02/2024 – 24/02/2029	$ 44.431.744	29/01/2024	31/01/2024

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
13/03/2024	Avance de ejecución de obra	ALMACEN CALLE 18	Presencial	8:30 am	11:45 am
19/03/2024	Avance de ejecución de obra	EDIFICIO BOLSA	Presencial	9:00 am	11:00 am

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2024 al 26 de marzo de 2024.

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/02/2024	TOTALL-112-CL-024	REITERACION LLAMADO DE ATENCION Y REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	27/02/2024	TOTALL-112-RJ-049	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
3	28/02/2024	TOTALL-112-CL-025	AVANCE DE OBRA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
4	28/02/2024	TOTALL-112-RJ-050	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
5	29/02/2024	TOTALL-112-RJ-051	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
6	29/02/2024	TOTALL-112-RJ-052	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
7	4/03/2024	TOTALL-112-RJ-053	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
8	5/03/2024	TOTALL-112-RJ-054	SOLICITUD INICIO PROCESO SANCIONATORIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.088 de 2023.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

Página 2

9	6/03/2024	TOTALL-112-RJ-055	Entrega Hojas de Vida de Interventoría 4.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
10	6/03/2024	TOTALL-112-RJ-056	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
11	6/03/2024	TOTALL-112-CL-026	NUEVA SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DEL DISEÑO ELECTRICO	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
12	6/03/2024	TOTALL-112-CL-027	ESTADO ACTUAL OBRA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
13	8/03/2024	TOTALL-112-CL-028	REPUESTA A OFICIO CONLOCATIVO-CE-117	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
14	12/03/2024	TOTALL-112-CL-029	ESTADO ACTUAL OBRA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
15	14/03/2024	TOTALL-112-RJ-057	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
16	18/03/2024	TOTALL-112-RJ-058	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
17	20/03/2024	TOTALL-112-RJ-059	REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 04	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
18	20/03/2024	TOTALL-112-RJ-060	REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 05	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
19	22/03/2024	TOTALL-112-CL-030	SOLICITUD DE BALANCE, IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA Y PROGRAMACIÓN POR CADA SEDE.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
20	26/03/2024	TOTALL-112-CL-031	SOLICITUD DE PENDIENTES.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal


12.2 RECIBIDA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	28/02/2024	CONLOCATIVO-CE-111	COTIZACION OBRAS PRELIMINARES PARA TRASLADO DE URNA CONLOCATIVO-CE	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
2	28/02/2024	59	Contratos 088 y 112-2023. Traslado sede Almacén Calle 18 y avance obras.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
3	29/02/2024	CONLOCATIVO-CE-112	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
4	29/02/2024	60	Contratos 088 y 112-2023. Opciones equipos Switch.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
5	1/03/2024	61	Contratos 088 y 112-2023. Control y seguimiento Interventoría.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
6	4/03/2024	CONLOCATIVO-CE-113	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
7	4/03/2024	63	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud información y adecuación traslado servidores piso 7 Bolsa	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
8	5/03/2024	CONLOCATIVO-CE-115	COTIZACION OBRAS PRELIMINARES PISO 4 PARA TRASLADO DE URNA	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
9	5/03/2024	CONLOCATIVO-CE-116	Reporte trabajo en ascensores edificio anexo y Palacio	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
10	7/03/2024	CONLOCATIVO-CE-117	GESTIONES ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y RADICACIÓN DE FACTURAS.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
11	7/03/2024	67	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud aclaración y soportes posible incumplimiento.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
12	7/03/2024	68	Contratos 088 y 112-2023. Equipo mínimo de trabajo.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
13	8/03/2024	CONLOCATIVO-CE-118	Entrega Cronograma de obra ajustado	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
14	8/03/2024	69	Contratos 088 y 112-2023. Entrega oficinas y áreas de archivo Calle 18.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
15	8/03/2024	70	Contratos 088 y 112-2023. Reiteración solicitud información ajuste memoria mobiliario piso 6 Bolsa	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 1

16	12/03/2024	CONLOCATIVO-CE-121	RESPUESTA SOLICITUD ENTREGA OFICINAS Y AREAS DE ARCHIVO CALLE 16.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
17	12/03/2024	CONLOCATIVO-CE-122	Solicitud autorización traslado switch	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
18	12/03/2024	CONLOCATIVO-CE-123	Solicitud autorización de ingreso de volqueta	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
19	13/03/2024	71	Contratos 088 y 112-2023. Reiteración cuidado, protección y plan de contingencia	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
20	15/03/2024	CONLOCATIVO-CE-125	Solicitud apertura de oficinas y cuartos técnicos piso 4 al 6 del edificio de la bolsa para obras preliminares al traslado de la urna 7 al 4.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
21	16/03/2024	CONLOCATIVO-CE-126	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
22	18/03/2024	CONLOCATIVO-CE-129	Autorización retiro material del edificio Bolsa para otros frentes de obra	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
23	18/03/2024	72	Contratos 088 y 112-2023. Actividades y balance contrato	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
24	19/03/2024	73	Contratos 088 y 112-2023. Alcance actividades adicionales y balance contrato	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
25	19/03/2024	74	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud programación y balance contrato	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
26	20/03/2024	CONLOCATIVO-CE-130	entrega parcial de apu para revisión y aprobación	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
27	22/03/2024	CONLOCATIVO-CE-131	Solicitud autorización de ingreso de material y herramientas	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
28	22/03/2024	CONLOCATIVO-CE-132	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
29	26/03/2024	CONLOCATIVO-CE-133	Solicitud autorización de ingreso de personal del 01 de abril al 30 de abril de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO

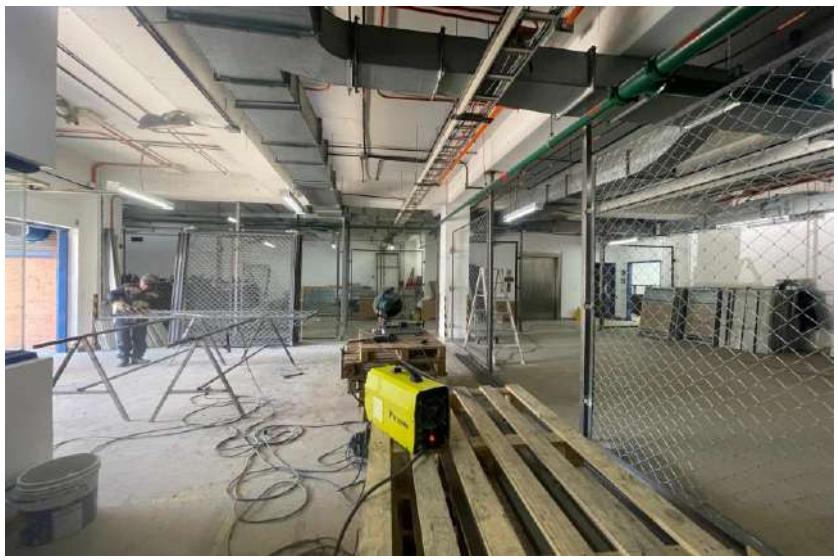






















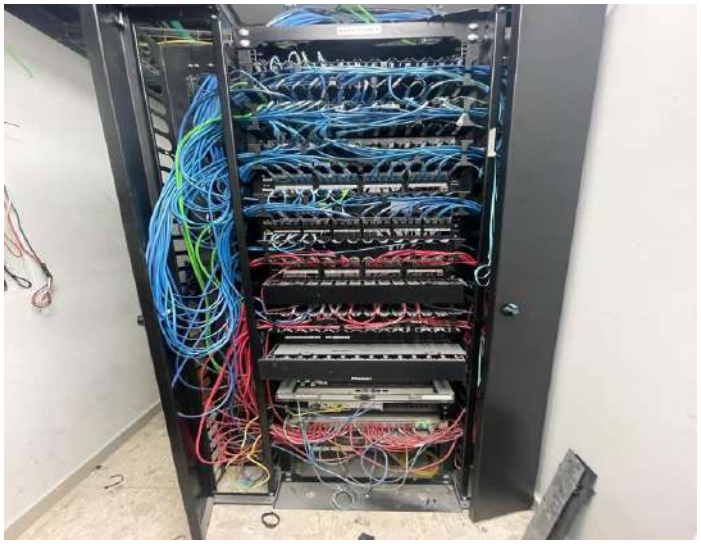


















































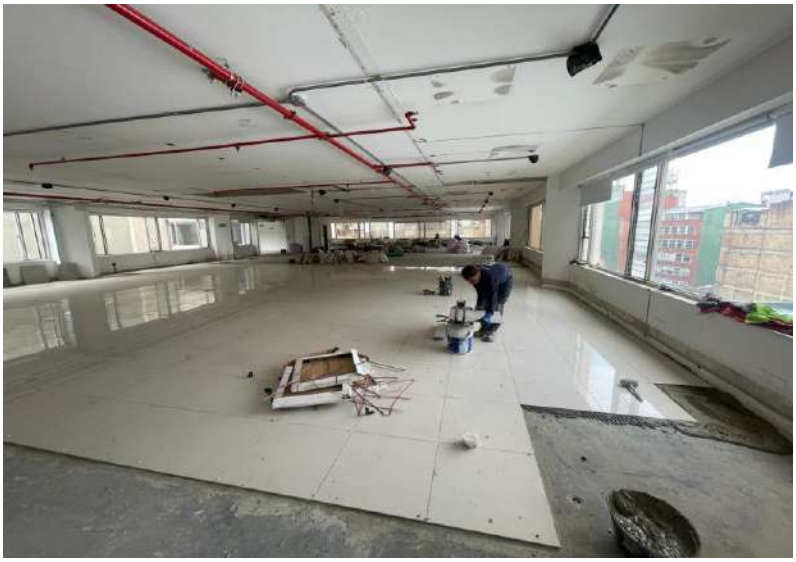
















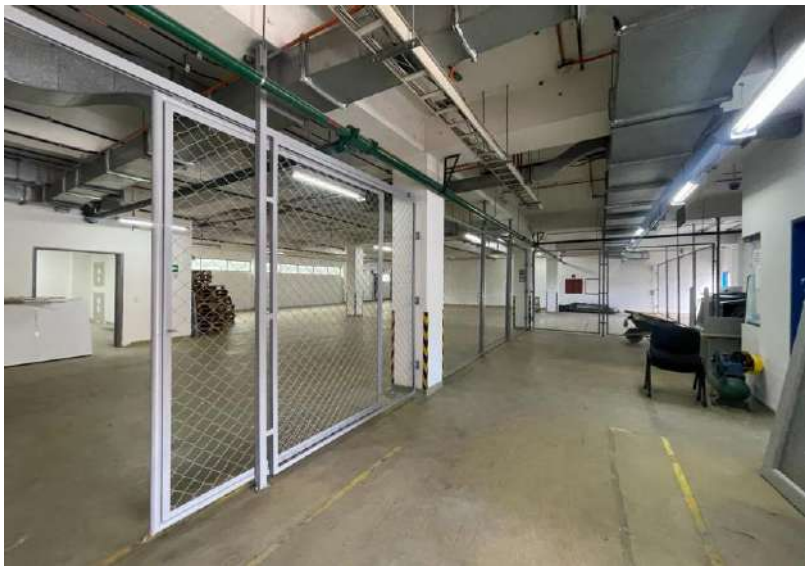






















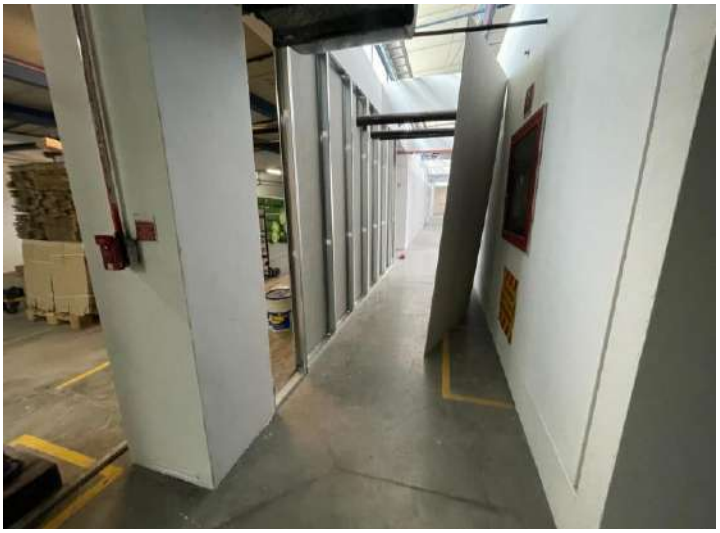




































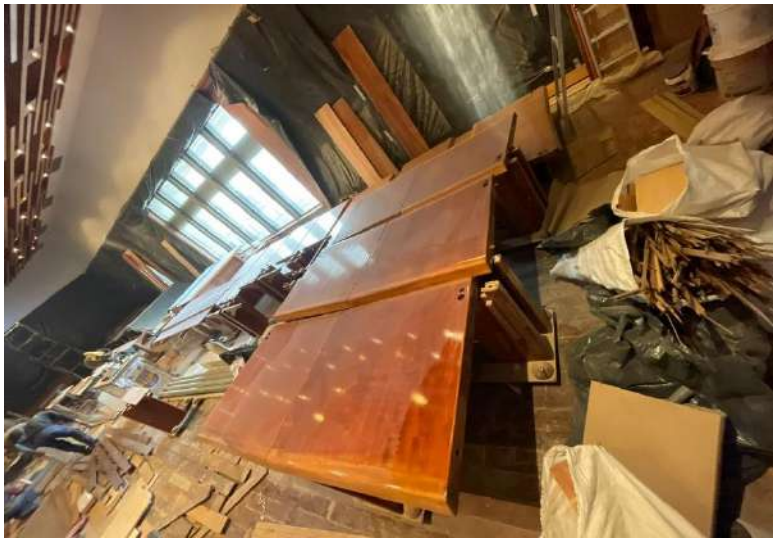












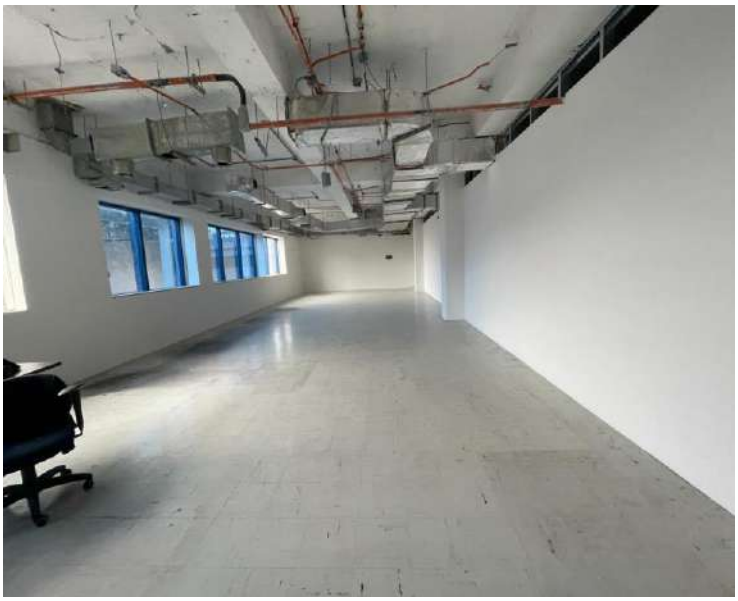










14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.



FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

ANEXOS:

1	ANEXO 1	Informes Semanales de Interventoría
2	ANEXO 2	Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
3	ANEXO 3	Control Aportes Legales y Seguridad Social
4	ANEXO 4	Comités del Periodo
5	ANEXO 5	Informes de Especialistas
6	ANEXO 6	Acreditación Paz y Salvo Parafiscales

ANEXO 1 Informes Semanales de Interventoría

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	19	PERIODO: Del	26 de febrero de 2024	Al	3 de marzo de 2024

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 110.214.292,00**	**33,07%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.155.717.895,95**	**33,07%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 223.023.788,00**	**66,93%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.338.649.361,05**	**66,93%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	48,00%	59,00%	11,00%
Ejecutado Presente Semana	4,00%	3,00%	-1,00%
Acumulado Actual	52,00%	62,00%	10,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	129	52,00	18,10

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

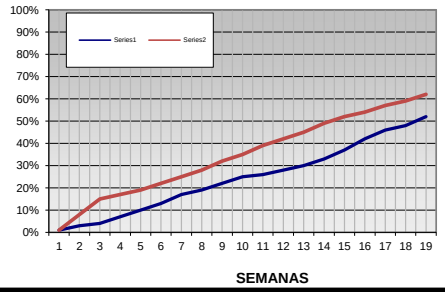

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que se realiza la aplicacon de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la aplicacon de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**	Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que se realizan actividades electricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se verifico que se realizan actividades electricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifica que se realiza la instalación de lamparas y se protegen para que no les ingresen polvo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifica que se realiza la instalación de lamparas y se protegen para que no les ingresen polvo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**70**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado.	**70**
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**70**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**70**
Se evidencio que se realiza la instalación de muros de superboards para cubrir las ventanas en los ascensores del edificio Palacio.	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de muros de superboards para cubrir las ventanas en los ascensores en el cuarto de maquinas del edificio Palacio.	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.	**100**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18




Instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Aplicación de lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



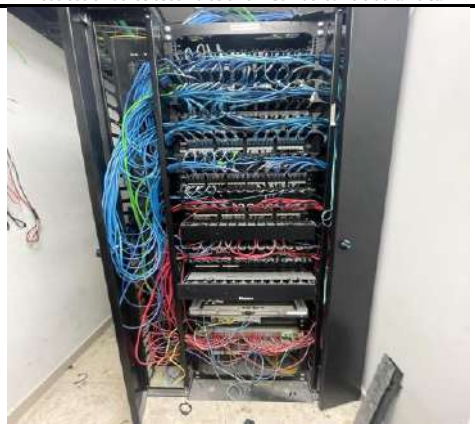

Instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	Aplicación de lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
	
Aplicación de lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	Recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Actividades electricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Protección de lamparas en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.



restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado



Instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.



Instalación de muros de superboards para cubrir las ventanas en los ascensores del edificio Palacio.

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 20 PERIODO: Del 4 de marzo de 2024 Al 10 de marzo de 2024

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 114.433.648,00**	**34,34%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.199.962.480,97**	**34,34%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 218.804.432,00**	**65,66%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.294.404.776,03**	**65,66%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	52,00%	62,00%	10,00%
Ejecutado Presente Semana	7,00%	3,00%	-4,00%
Acumulado Actual	59,00%	65,00%	6,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	136	45,00	10,86

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

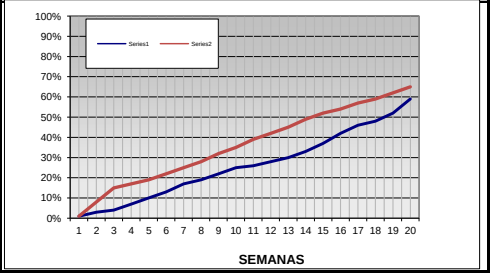

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la aplicacion de pintura en los muros de Superbords en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la aplicacion de pintura en los muros de Superbords en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**	Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**60**
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**95**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**80**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza el desmonte de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se realiza el desmonte de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que se realizan regatas en piso para instalar dutos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realizan regatas en piso para instalar dutos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza el resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se realiza el resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**
Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**

Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifica que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifica que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**75**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**75**
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**75**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**75**
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**60**	Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**60**
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el cuarto de maquinas de los ascensores del edificio Palacio.	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el cuarto de maquinas de los ascensores del edificio Palacio.	**100**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18

Aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18






Acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18

Aplicacion de pintura en los muros de Superbords en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



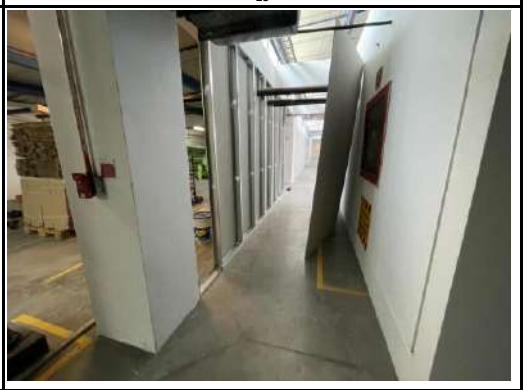

Instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	Instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Regatas en piso para instalar dutos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de guardaescobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa




Instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado

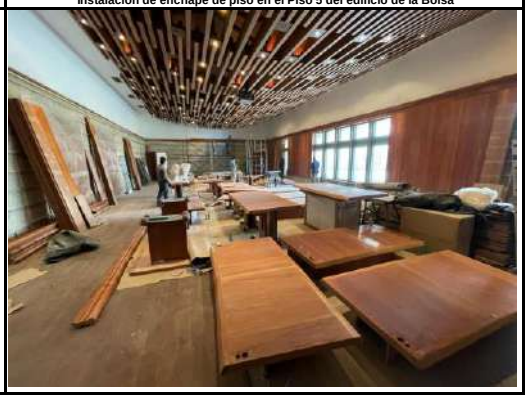

Instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.



Desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional



Instalación de lamparas en el cuarto de maquinas de los ascensores del edificio Palacio.

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 21 PERIODO: Del 11 de marzo de 2024 Al 17 de marzo de 2024

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 118.653.004,00**	**35,61%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.244.207.065,99**	**35,61%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 214.585.076,00**	**64,39%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.250.160.191,01**	**64,39%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	59,00%	65,00%	6,00%
Ejecutado Presente Semana	10,00%	2,00%	-8,00%
Acumulado Actual	69,00%	67,00%	-2,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	143	38,00	-3,62


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

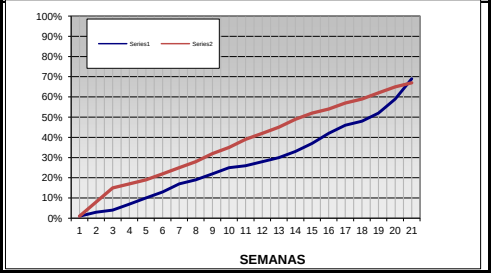

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza vano para puerta en el muro de superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza vano para puerta en el muro de superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza vano para habilitar el acceso al traselevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza vano para habilitar el acceso al traselevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**80**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**75**
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**80**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**75**
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**70**	Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**60**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

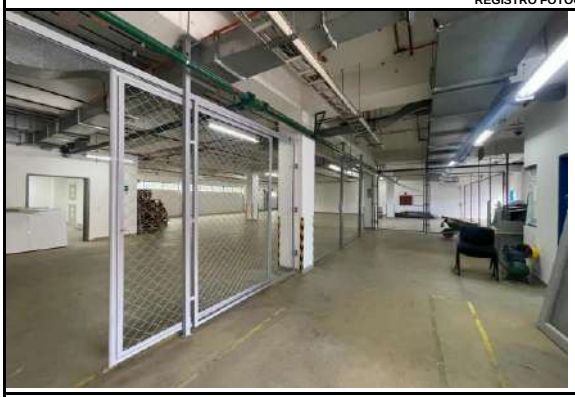



Aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18

Aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18





Vano para puerta en el muro de superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18

Vano para habilitar el acceso al traselevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18






Instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18

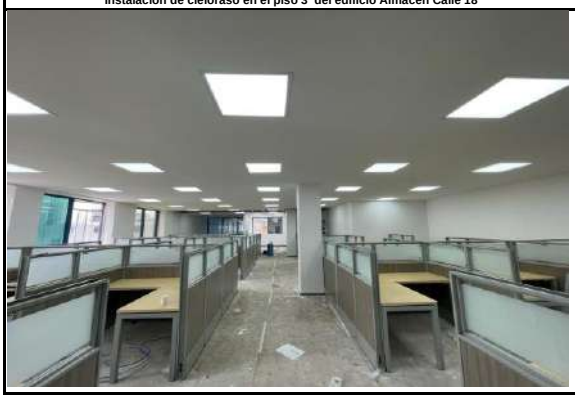

Lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18

Instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado

	
Instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**Desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 22 PERIODO: Del 18 de marzo de 2024 Al 24 de marzo de 2024

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 124.585.251,00**	**37,39%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.306.413.181,55**	**37,39%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 208.652.829,00**	**62,61%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.187.954.075,45**	**62,61%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	69,00%	67,00%	-2,00%
Ejecutado Presente Semana	8,00%	3,00%	-5,00%
Acumulado Actual	77,00%	70,00%	-7,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	150	31,00	-12,67

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

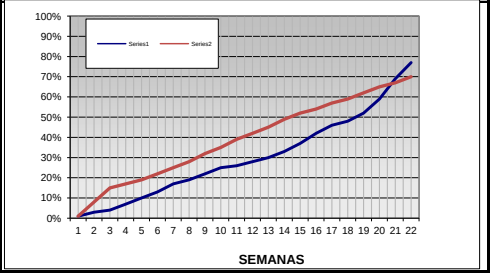

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**95**	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**95**
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**	Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**85**
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se evidencio que se realiza la demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se realiza la demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**90**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**90**
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.	**100**
Se evidencio que se realiza la restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado	**100**	Se evidencio que se realiza la restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado	**100**
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**80**	Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**80**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18







Instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



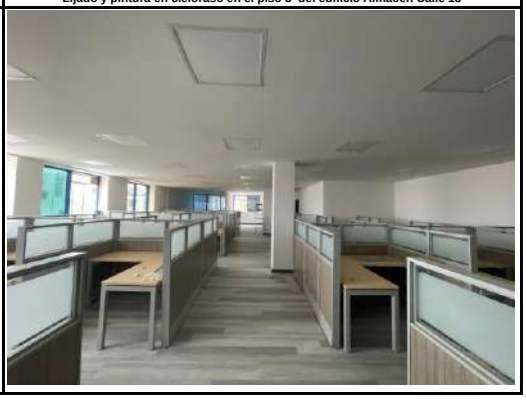

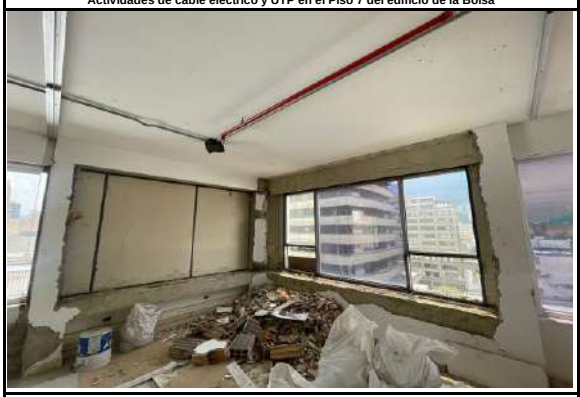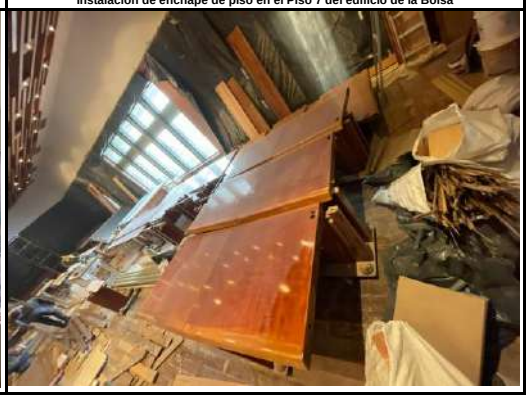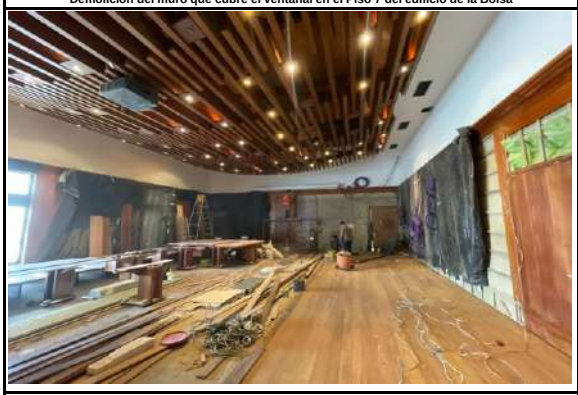Instalación de lamparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
	
Actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
	
Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	Instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.

	
Restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado	**Desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	23	Del	25 de marzo de 2024	Al	31 de marzo de 2024
PERIODO:	6 meses y 1 dias				

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 130.517.497,00**	**39,17%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.368.619.297,11**	**39,17%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 202.720.583,00**	**60,83%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.125.747.959,89**	**60,83%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	77,00%	70,00%	-7,00%
Ejecutado Presente Semana	5,00%	3,00%	-2,00%
Acumulado Actual	82,00%	73,00%	-9,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	157	24,00	-16,29

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

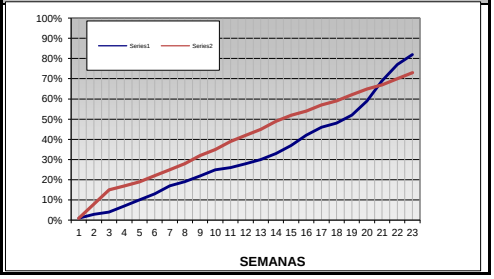

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**100**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	**100**
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**85**	Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**85**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
	
Actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado	Desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional

ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 129.936.201,34**	**39,17%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.368.619.297,11**	**39,17%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 203.301.878,66**	**61,01%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.125.747.959,89**	**60,83%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 2	24/02/2024

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	48,00%	59,00%	11,00%
Durante el periodo	34,00%	14,00%	-20,00%
Acumulado Actual	82,00%	73,00%	-9,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

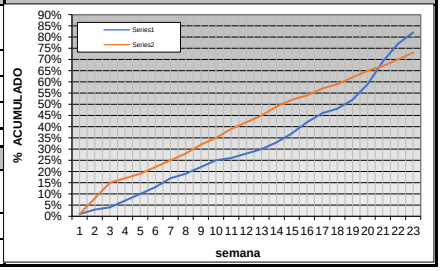

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	152	29	-16

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 5	Del 26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024	
	PERIODO: 6 meses y 1 dias		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
		FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
		No. DE RADICACION	
		VIGENCIA	

ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 19
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicacon de alistado de mortero en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la recolección de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el retiro de los escombros en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan actividades electricas en el RACK en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifica que se realiza la instalación de lamparas y se protegen para que no les ingresen polvo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la instalación de muros de superboards para cubrir las ventanas en los ascensores del edificio Palacio.
Se verifico que se realiza la instalación de bombillas en los fosos de los ascensores del edificio Palacio.
SEMANA 20
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes y anclajes de la estructura para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros y columnas en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la aplicacion de pintura en los muros de Superbords en el piso en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la demolición de enchape de piso en el hall en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el desmonte de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizan regatas en piso para instalar dutos de 1/2" para cableado de puestos de trabajo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el resane de placa para alistamiento de piso para iniciar la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
	PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

Se evidencio que se realiza la instalación de guardaescobas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifica que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el cuarto de maquinas de los ascensores del edificio Palacio.
SEMANA 21
Se evidencio que se realiza la aplicación de anticorrosivo gris para el cerramiento en malla eslabonada en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza aseo general en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza vano para puerta en el muro de superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza vano para habilitar el acceso al traselevador en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de marcos para lamparas en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de la estructura metalica para muros de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de placas de Superboard en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en los muros de super boards y mamposteria en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se aplica lijado y pintura en las vigas y las columnas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 22
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza lijado y pintura en cieloraso en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de lamparas en el hall en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de mobiliario en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la demolición del muro que cubre el ventanal en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se verifico que se realiza la instalación de los soportes de enchape de madera en la sala plena del consejo de estado.
Se evidencio que se realiza la restauración del piso en madera en la sala plena del consejo de estado
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 23
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza la instalación de cable electrico y cable UTP en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza acabados de pintura y dilataciones en muros en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realiza actividades de cable electrico y UTP en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena del consejo de estado
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional


Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

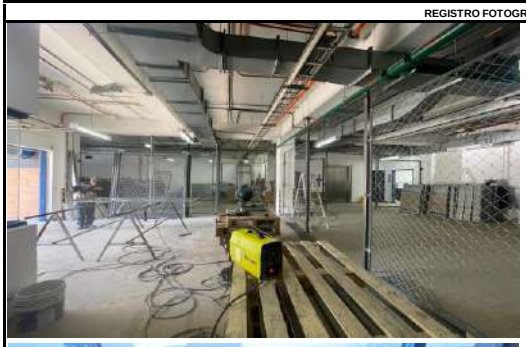







Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	









Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

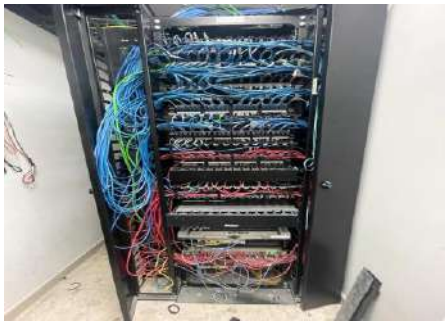

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	









Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

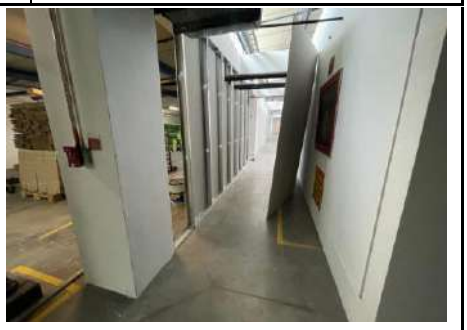



Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024 Al 26 de marzo de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	












Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del PERIODO: 6 meses y 1 dias	26 de febrero de 2024	Al 26 de marzo de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del 26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	








Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	5	Del	26 de febrero de 2024	Al	26 de marzo de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 200.000.613	$ 177.034.096	5,07%
2	$ 415.024.749	$ 412.680.741	11,81%
3	$ 639.924.485	$ 771.047.579	22,07%
4	$ 1.298.478.093	$ 1.094.496.857	31,32%
5	$ 2.093.537.188	$ 1.368.619.297	39,17%
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ 1.368.619.297,11**	**39,17%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA	SUPERVISION
FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORÍA	**DANIEL MERCHAN CEPEDA** Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN

ANEXO 3 Control Aportes Legales y Seguridad Social

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																							$90,580,000	$14,666,800			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000		$5,368,800		$0	$0		$27,138,000
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA										X								25-14	10	$1,800,000	$306,000	EPS005	10	$1,800,000	$0	CCF22	10	$1,800,000	$0	14-25	10	$1,800,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$306,000
4	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA																		25-14	20	$3,600,000	$612,000	EPS005	20	$3,600,000	$144,000	CCF22	20	$3,600,000	$144,000	14-25	20	$3,600,000	0.522%	$18,800	20	$0	$0	Si	$918,800
5	CC	1032455696	PUERTO BURBANO SAUL ANDRES																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$14,666,800	$12,800	$0	$14,679,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,854,000	$4,300	$0	$4,858,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,364,800	$5,500	$0	$6,370,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,240,000	$2,800	$0	$3,242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$3,551,200	$3,400	$0	$3,554,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$378,000	$400	$0	$378,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$384,000	$400	$0	$384,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$328,000	$300	$0	$328,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$596,000	$600	$0	$596,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$100	$0	$60,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,805,200	$1,600	$0	$1,806,800
TOTAL				**31**	**$27,138,000**	**$23,900**	**$0**	**$27,161,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO							X											0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
TOTAL				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	478973324	9463607272	I	2024/03/18	2024/02/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

ANEXO 4 Comités de Seguimiento

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	Código: GHFO-002 Versión: 2 Página 1 de 1 Fecha de emisión: 30/03/2022

Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

ACTA N° 10

Interna [X] Externa [ ]

1. INFORMACION GENERAL

FECHA: 13 marzo 2024 HORA INICIO: 8:30am HORA FINAL:

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO/TOTALL INC SAS BIC

PROYECTO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

CONTRATO 088 DE 2023

UBICACIÓN: Almacen Calle 18

TEMA A TRATAR: Avance de ejecución de obra

Reunión [ ] Comité [X]

2. ASISTENTES

Nombres	Empresa	Firmas
EOBALDO DIAZ R.	TOTALL - INTERVENTORIA	
Johanna Salcedo	Consorcio locativo	
Gustavo Fernandez	Consorcio locativo	
Jenny Dror Doza	Consorcio Locativo	
Claudia Contreras	Consorcio locativo	
Frank Gallrago	Consorcio locativo	
Daniel Merchan G.	DEAJ	
Jadaing Corsi Badillo	Totall - Interventoria	

3. ORDEN DEL DÍA

Presentación de los profesionales
Avance de obra
OTROS

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1- Se Realiza Recorrido en la Sede Almacen Calle 18.
2- Supervisión menciona que Se Debe Terminar Piso 5 y Piso 6 de Bolsa debido a que la ejecución se detuvo y se necesita terminar.
3- Supervisión Solicita que se instale las sillas en Piso 6 de Bolsa.
4- El Contratista menciona que en Piso 5 Falta la instalación de los modulares (13 Puestos de Trabajo), División Piso Techo, Sillas y la estructura de Cableado
5. El Contratista menciona que va a revisar con el Proveedor de los

Powered by CamScanner

mobiliario para dar la Fecha en la Cual va a llevar los mobiliarios en el Piso 5, a Través de un Correo.
6 – El Contratista menciona que en el Piso 6 de Bolsa Falta Todos los Sillas, divisiones Piso Techo y 3 muebles de oficina
7 - El Profesional electrico menciona que se debe desmontar los Tableros debido a que no dan abasto y se debe instalar uno mas amplio
8 – Supervisión menciona que se revise Balance de estas actividades
9 – Supervisión menciona que se Solicita 2 Puestos de Trabajo en 2 oficinas y donde estaban los impresoras se debe ubicar otro puesto de Trabajo, se enviara un esquema para dejar la dotación de los puestos adicionales y se Proyecte en el Balance.
10 - El Contratista menciona que en el Piso 7 Falta en demoler el muro que cubre las Ventanas, Falta Terminar la instalación del enchape de Piso, instalar mobiliarios, Sillas y Calleado electrico y UTP, la Red contra incendios, Vano de la escalera
11 - Supervisión menciona que se revise al detalle el balance para los actividades nuevas
12 - Supervisión menciona que se mitigue el Polvo que genera la dora en los Rack de Piso 7.
13 – El Contratista menciona que se Termino el Cerramiento de malla eslabonada, Falta la intervención de la puerta del parqueadero, instalación de voz de datos y la instalación de los switch
14 - Se define que el Switch 24 que quedo libre del Piso 7 de Bolsa Se instalará en el Rack de Piso 5 de Bolsa.
15 – Se instalará las Puertas de Bolsa en el Piso 1 de Calle 18
16 - El contratista menciona si puede Traer lamparas en Regular estado Para instaladas en los archivos del almacen calle 18.
17 – Supervisión aprobo que se reutilicen dichas lamparas.
18 - El Contratista menciona que en Piso 2 de Calle 18 va a realizar un afinado
19 – El Contratista menciona que en Piso 3 de Calle 18 Falta Red de iluminación en los archivadores, Falta instalación de Puertas, instalar mobiliarios, Calle electrico y UTP, Sillas
20 - Supervisión menciona que se instale las puertas con 2 Puertas Corredizas de a 1m en el Piso 3 de calle 18
21 – El Contratista menciona que en Piso 4 de Calle 18 Falta Reubicar Tomas de Red electrica.

Powered by CamScanner

22 - Supervisión menciona que se envía el Plan de Contingencia Re Parte del Contratista

23 - El Contratista menciona que en Piso 5 1 switch de 24 Para datos, (Reinstalación), Piso 7 van 2 de datos y 2 de voz de 48, en Calle 18 1 de 24 de voz y 1 de 48 Para datos y Piso 3 en Calle 18 va 1 de 24 de voz y 1 de 48 para datos

24 - El Contratista cotizó los Switch que recomendo Supervisión y Tiene un Costo aproximado de 3.900 Dolares, el switch es Similar a las caracteristicas Recomendadas.

25 - Supervisión solicita que se remita la cotización a Interventoria para ser revisada.

5. COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
Funcionalidad de Puntos de voz y datos con Switch provisional en Piso 1 y 3 en Calle 18	Consorcio Colectivo	14-Marzo-2024

6. CIERRE

ELABORADO POR: Ludwig Corea Bellido

CARGO: Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

	ACTAS DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	Código: GHFO-002 Versión: 2 Página 1 de 1 Fecha de emisión: 30/03/2022

Consejo Superior de la Judicatura · Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa

ACTA N° 11

Interna ☒ Externa ☐

1. INFORMACION GENERAL

FECHA: 19-03-2024 HORA INICIO: 8:30am HORA FINAL: 11:30 am

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO/TOTALL INC SAS BIC

PROYECTO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

CONTRATO 088 DE 2023

UBICACIÓN: Edificio la Bolsa

TEMA A TRATAR: Definición de Equipos Electricos

Reunión ☐ Comité ☒

2. ASISTENTES

Nombres	Empresa	Firma
Carlos Andres Duque	ETB - Mesa	
Camilo Andres Cordero	ETB	
Luis A. Cano	CSJ	
Daniel Merchan C	DEAJ	
EDGALDO DIAZ M	TOTALL	
CLAUDIA CONTRERAS	CONSORCIO LOCATIVO	
Katherine Garavito Ludwig Correa Baluz	TOTALL TOTALL	

3. ORDEN DEL DIA

Presentación de los Profesionales
Recorrido
Avance de obra
Otros

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se Realiza recorrido en el edificio la Bolsa entre Supervisión Interventoria, Contratista y Profesionales de la entidad.

Supervisión menciona que se deben apagar los equipos para organizados y se debe agregar un nuevo switch. en el Piso 5
Supervisión menciona que se debe abrir espacio Para Instalar 2 patch panel, Instalar 1 switch de 24 puestos en el Piso 5
Supervisión menciona que se evalue si es posible Cambiar 1 switch de

Powered by CamScanner

24 Puestos por 1 switch de 48 Puestos en el Piso 5

Supervisión menciona que se debe Cambiar 1 switch de 24 Puestos por 1 switch de 48 puestos en el Piso 7
El Contratista menciona que se va a ampliar el espacio en el Cuarto Tecnico del Piso 7.
Intervetoria menciona que se debe Coordinar Para el dia jueves el apagado de ambos RACK Para Poder Trasladarlos del Piso 7 al Piso 4.
Supervisión menciona que se debe limpiar el Cuarto Tecnico y el RACK Para Protegerlo en polisombra y mitigar el polvo en Piso 7.

Supervisión menciona que se debe abrir un espacio e instalar un Patch Panel en el Piso 6.
Supervisión menciona que se adicionan mas puestos de Trabajos y 3 o 4 Puntos de voz y datos en el Piso 6.
El Contratista menciona que se debe Cambiar los Tableros
Supervisión aprueba Para que se Cambien los Tableros en el Piso 6.
Supervisión menciona que se evalue con Intervetoria si se Puede Colocar un nuevo switch con 48 puestos en el Piso 6.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS		
Actividad	Responsable	Fecha

4. FIRMAS

ELABORADO POR: Ludwig Correa Bedoya

CARGO: Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 05

CONTRATO No. 112 de 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

TOTALL INC SAS BIC

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/03/2024 – 31/03/2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3

1.1 OBJETIVO GENERAL 4

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO) 5

2. INGRESO DE PERSONAL 6

2.1 REPORTE DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE LABORA EN OBRA 6

2.2 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO OCUPACIONALES 8

3. INDUCCION Y CAPACITACIONES 8

3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, INCLUIDO EN EL SGSST 8

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 9

4.1 REGISTRO DE USO DE EPP 9

5. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS 10

5.1 PERMISO DE TRABAJO PARA LABORES DE ALTO RIESGO 10

6. EMERGENCIAS 10

6.1 RECURSOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE EMERGENCIAS 10

7. DIVULGACION 10

7.1 POLITICA EN SST 10

8. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 10

9. CRONOGRAMA DE REUNIONES MENSUALES Y PLAN DE TRABAJO DE COPASST 11

10. INDICADORES DE SST 11

11. REPORTE Y ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD 14

12. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 14

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

1. INTRODUCCION

La seguridad y salud laboral tiene como objeto la aplicación de las medidas necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y promocionar la salud entre los trabajadores.

No obstante, la planificación, organización y control de la gestión en materia de seguridad laboral debe realizarse de forma consensuada entre el empleador y trabajadores, con la supervisión de las administraciones. Desafortunadamente, en determinadas actividades laborales no es posible llegar a un riesgo cero. Aunque siempre se puede reducir el número de accidentes y minimizar sus consecuencias mediante el empleo adecuado de equipos de protección individual (EPIs): cascos, botas de seguridad, arneses, etc. y con medidas de seguridad colectiva. Otra área de gran importancia en el campo de la prevención es la formación de los trabajadores y la concienciación de éstos de la necesidad de seguir al pie de la letra todos los protocolos y medidas de seguridad.

La función de la Interventoría consiste en supervisar y verificar el cumplimiento de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el Contratista de obra para el cumplimiento de las labores en SST detalladas en el Capítulo SST del Contrato.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta el periodo de tiempo de ejecución establecido entre 01 al 31 de marzo de 2024, donde se establece algunas variables en temas de seguridad y salud en el trabajo presentado por el contratista, de los cuales, ha ejecutado poco a poco según el plan de trabajo implementado por parte del contratista.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra para la ejecución del contrato, en cumplimiento de la legislación aplicable y las obligaciones contractuales.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de vinculación de personal establecidos por el contratista, de manera que se cumpla con la correcta vinculación a seguridad social del personal que ingresa a obra.

- Realizar inspecciones locativas en obra con el fin de verificar que implementen las medidas de control propuestas por el contratista en los diferentes niveles de intervención definidos.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en términos de seguridad y salud en el trabajo exigida por las autoridades nacionales y regionales aplicables, en las actividades realizadas en obra por el contratista y sus trabajadores.

- Realizar el acompañamiento y la verificación de las actividades del plan de trabajo de SST realizadas por el profesional designado por el contratista de obra, de manera que no incurra en desviaciones de la legislación aplicable.

- Identificar las posibles desviaciones y oportunidades de mejora en términos de gestión de SST en obra, así como los presuntos incumplimientos en los que pueda incurrir el contratista sobre los procedimientos y documentos aprobados.

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO)

La interventoría se desarrollará en la ciudad de Bogotá, D.C., ubicadas en las localidades de La Candelaria y Mártires, donde el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizará el mejoramiento locativo de DELCOP, BOLSA Y PALACIO DE JUSTICIA.



*Fuente tomada por Google Earth. Delcop***



*Fuente tomada por Google Earth. Bolsa***



*Fuente tomada por Google Earth. Palacio de Justicia***

2. INGRESO DE PERSONAL

2.1 REPORTE DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

La presente interventoría, realiza la supervisión y verificación de la afiliación del personal que cuenta el contratista CONSORCIO LOCATIVO, dando cumplimiento a la ley 100 de 1993, resolución 0312 de 2019 y decreto ley 1072 de 2015.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, entregó a la presente interventoría la documentación de 6 personas que incluía (afiliación a ARL, EPS Y AFP). *Ver tabla 1*

Por parte de la interventoría, en el periodo del presente informe, se presentaron el siguiente personal. *Ver tabla 2.*

Tabla 1.

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
ALEXANDER VALLEJOS CHACON	79.708.231	INSTALADOR MOBILIARIO	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES
ELIAS SILVA MARTINEZ	79.494.623	ORNAMENTADOR	SURA	CAPITAL SALUD	PROTECCIÓN
FREDY LADINO BOLIVAR	80.130.912	CARPINTERO	POSITIVA	FAMISANR	PORVENIR
LUIS MIGUEL LOPEZ	80.800.690	CARPINTERO	POSITIVA	COMPENSAR	COLFONDOS
DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ	1.128.199.756	CARPINTERO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
YEZID GAITAN MARTINEZ	79.654.255	CARPINTERO	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES

Tabla 3. Relación de personal antiguo

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1013632556	DIRECTOR DE OBRA	SURA	SANITAS	COLFONDOS
WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL	16941852	PROFESIONAL DE APOYO	SURA	SANITAS	PORVENIR
INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	1010218260	RESIDENTE SST Y AMBIENTAL	SURA	SURA	COLFONDOS
CLAUDIA YANETH CONTRERAS	52320873	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
ROBINSON VILLAMIL ROJAS	79048393	MAESTRO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES
OSCAR RENE MORENO BONILLA	91273651	MAESTRO	SURA	CAPITAL SALUD	COLFONDOS
CRISTIAN CAMILO SILVA MORENO	1077942426	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
JULIO CESAR ARARAT	1127048585	ORNAMENTADOR	POSITIVA	COMPENSAR	COLPENSIONES
CARLO LEON ARARAT ROJAS	13483989	ORNAMENTADOR	POSITIVA	SURA	PORVENIR
OTONIEL RODRIGUEZ OSPINA	7500840	AYUDANTE	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS
JOSE GREGORIO CERVERA RAMOS	1.079.913.554	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
COSTANTINO HERNANDEZ BEGA	79.406.026	ELECTRICO	SURA	SURA	PORVENIR
EDWARD STEVEN LA ROTTA FRANCO	1.023.870.132	AYUDANTE	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR
JHON EDUARD HERNANDEZ MATEUS	80.911.811	ELECTRICO	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES
JUAN SEBASTIAN ROJAS LEON	1.033.684.725	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
CARLOS ANDRES OROZCO TORRES	1.004.380.318	AYUDANTE	SURA	MUTUAL SER	PROTECCIÓN
EVER DARIO VILLA CERVERA	19.602.081	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN
JEISSON HUMBERTO PEREZ RUIZ	1.026.577.577	TÉCNICO ELÉCTRICO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
JUAN DAVID PUENTES MORENO	1.193.142.656	AUXILIAR ELÉCTRICO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

Tabla 2.

NOMBRE COMPLETO	*CEDULA*	*CARGO*
Fernando Jiménez Polo	79.542.174	Director de interventoría
Miryar Milena Prada Lozano	65.555.596	Residente de interventoría
Dalia Minerva Briceño Rodríguez	52.729.457	Residente ambiental
Katherine Guañarita Díaz	1.075.236.242	Residente SST
William Yovany Piamonte Pérez	7.126.904	Inspector de interventoría
Eobaldo Díaz Martínez	77.013.726	Apoyo a la dirección de interventoría
Ludwing Correa Bellido	1.033.778.496	Apoyo a la residencia de interventoría

Anexo 1. Soporte afiliaciones a seguridad social del contratista.

Anexo 2. Soporte a planillas de seguridad social de interventoría

2.2 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales facilitan el seguimiento de la salud de los colaboradores y la detección de enfermedades producidas como resultado de la actividad laboral. En ese sentido, permiten tomar decisiones e implementar mejoras en el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó exámenes médico ocupacionales (6) al personal operativo y administrativo, dando cumplimiento al decreto 2346 de 2007, artículo 2.

ANEXO 3. Soporte exámenes médico ocupacionales del contratista

3. INDUCCION Y CAPACITACIONES

3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, INCLUIDO EN EL SGSST

Las capacitaciones y/o charla preoperacional permite analizar y controlar los riesgos o situaciones que puedan llevar a un accidente. Además, demuestra el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los trabajadores.

También permite el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, donde garantizan el ejercicio laboral.

En el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó 6 inducciones al personal e hizo las siguientes charlas:

TEMA DE CAPACITACION	FECHA
Señalización	06/03/2024
Uso Obligatorio de EPPS y pausas activas y sus beneficios	11/03/2024
Capacitación manejo adecuado de cargas	21/03/2024
Capacitación riesgo eléctrico	26/03/2024

Anexo 4. Soporte inducciones contratista

Anexo 5. Soporte capacitaciones contratista

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

4.1 REGISTRO DE USO DE EPP

Para iniciar actividades, los trabajadores reciben los EPP, necesarios para realizar las actividades de obra que constan de un casco dieléctrico, gafas de seguridad oscuras y claras, protectores de oídos de inserción, guantes de vaqueta sencillos, guantes de poliuretano y botas de seguridad; en la medida que estos elementos se desgastan, se realiza el respectivo reemplazo, dejando como soporte un acta de entrega, que firman los trabajadores cada vez que reciben elementos nuevos.

Se realizan inspecciones visuales para verificar que los trabajadores utilicen constantemente los EPP entregados, en las capacitaciones se recuerda la importancia de utilizarlos de forma correcta, de igual manera, se anexa soporte de la entrega de dotación y elementos de protección entregadas por el contratista CONSORCIO LOCATIVO.

Anexo 6. Soporte registro y entrega EPP y dotación contratista

5. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS

5.1 PERMISO DE TRABAJO PARA LABORES DE ALTO RIESGO

Durante el tiempo estipulado en el presente informe, no se realizaron actividades de alto riesgo; por consiguiente, no se anexan soportes de los mismos.

6. EMERGENCIAS

6.1 RECURSOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE EMERGENCIAS

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, cuenta con los siguientes recursos técnicos:

* Extintores

* Camilla de emergencias

* Botiquín de primeros auxilios

* Señalización preventiva

7. DIVULGACION

7.1 POLITICA EN SST

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, cuenta con su política de seguridad y salud en el trabajo, el cual, ha sido divulgada al personal operativa por medio de la inducción realizada.

Anexo 7. Soporte política SST del contratista

8. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó reunión de COPASST el día 22 de marzo de 2024; del COCOLAB, realizaron reunión el día 21 de marzo de 2024.

Anexo 8. Soporte ACTA DE REUNION COPASST

Anexo 9. Soporte ACTA DE REUNION COCOLAB

9. CRONOGRAMA DE REUNIONES MENSUALES Y PLAN DE TRABAJO DE COPASST

En el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, dentro de su reunión de COPASST, trataron temas de orden y limpieza, uso de dotación y EPPS, indicadores de accidentalidad. Dando cumplimiento a los temas a tratar, realizaron inspección de las áreas directa de intervención y realizaron recomendaciones para mantener en óptimas condiciones las áreas. Realizaron entrega y reposición de EPPS faltantes a los colaboradores del consorcio. No presentaron índices de accidentalidad, incidentes ni enfermedad laboral.

10. INDICADORES DE SST

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, presentó a la presente interventoría, los indicadores correspondientes al tema de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se anexan a continuación.

Tabla 6. Indicador de frecuencia de accidentalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
No de Accidentes laborales en el mes	0	0	0	0	0								0
N° de trabajadores en el mes	14	11	16	23	25								18
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0									0,0

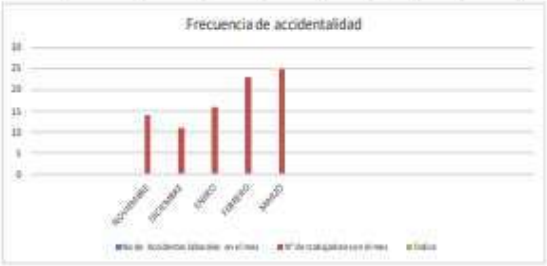


Tabla 7. Indicador de severidad de accidentalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo + numero de días cargados	0	0	0	0	0								0
Total accidentes que se presentaron en el año	0	0	0	0	0								0
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0



Tabla 8. Indicador de proporcionalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
Numero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el mes/	0	0	0	0	0								0
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0								0
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0



Tabla 9. Indicador prevalencia de enfermedad laboral

2. RESULTADOS													
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una Población en un periodo de tiempo	0	0	0	0	0								0
Promedio de trabajadores en el periodo ¨Z ¨*100.000	14	11	16	23	25								18




Tabla 10. Indicador de incidencia de enfermedad laboral

2. RESULTADOS													
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
(Numero de casos Nuevos de enfermedad laboral en el periodo ¨Z¨	0	0	0	0	0								0
Promedio de trabajadores en el periodo ¨Z¨) *100.000	14	11	16	23	25								18





Tabla 11. Indicador de ausentismo

2. RESULTADOS													
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO								AÑO
N° días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0	0	0	0								0
N° días de trabajo programado en el mes * 100	28	25	28	28	26								27



11. REPORTE Y ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, no tuvo reporte de accidentes ni incidente laboral en el tiempo del 01 al 31 de marzo de 2024. Se anexa soporte de certificación expedida por la ARL.

Anexo 10. Soporte certificación accidentalidad emitida por la ARL del contratista

12. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó inspecciones pre operacionales de elementos de emergencias e inspección de herramientas, de los cuales, no se hallaron novedades al respecto.


Anexo 11. Soporte inspecciones pre operacionales del contratista

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista, ha dado cumplimiento con el plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.

- Se recomienda al contratista, dar cumplimiento con el programa de capacitaciones implementado en la empresa, en el cual, debe presentar a la interventoría, los soportes de las capacitaciones realizadas.

- Se le recuerda al contratista, diligenciar los análisis de trabajo seguro y entregar soportes de los mismos



Ing. Katherine Guañarita Díaz
RESIDENTE SST

ANEXOS

ANEXO 1. SOPORTE AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.708.231**
VALLEJOS CHACON

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **13-JUN-1974**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | **A-** G.S. RH | **M** SEXO

30-JUN-1992 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVÁN DE JESÚS SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00439699-M-0079708231-20130613 0033410543A 2 1130337171

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa

DATOS A VERIFICAR POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTA

ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR

TOMA DE MEDIDAS

INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINAS

PISO 5, 6 Y 7

DESMONTALACION DE MOBILIARIO EXISTENTE

FECHA: _____

EMPRESA DONDE LABORA: MADERTEC LTDA.

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEXANDER VALLEJOS CHACON

DIRECCIÓN DE SU RESIDENCIA: CALLE 18 # 96 B. 76.

TELÉFONO FIJO: _____

TELÉFONO CELULAR: 3142983918

FIRMA: Alexander Vallejos

Powered by CamScanner

Medellín, 29 de February de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CACERES DURAN YAMILE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C79708231	VALLEJOS CHACON ALEXANDER	01/03/2024		9k242401	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/02/2024 12:06:34 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.13.42, 192.230.104.6, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ALEXANDER VALLEJOS CHACON**, identificada con **CC** número **79708231**, aportó por el empleado **ALEXANDER VALLEJOS CHACON** identificado(a) con **CC** número **79708231** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Febrero - 2024	74689465	28/02/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Febrero - 2024	74689465	28/02/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Febrero - 2024	74689465	28/02/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Marzo - 2024	75193322	04/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Marzo - 2024	75193322	04/03/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Marzo - 2024	75193322	04/03/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.128.199.756**

DE LA HOZ MUÑOZ

APELLIDOS

DARWIN ENRIQUE

NOMBRES

*Darwin de la Hoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1988**

CIENAGA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-JUL-2008 ZONA BANANERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2109500-00867717-M-1128199756-20161122 **00522**53329G 1 5021627640

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS	CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	881.600	0	0	0	0	0	0		881.600	4
231001	Colfondos	800227940-6	71.500	0	0	0	0	0	0		71.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	429.900	0	0	0	0	0	0		429.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	601.900				601.900	0	0	601.900			6.019	601.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	259.500	0	0	259.500	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	345.800	345.800
Pensión	3	1.383.000	1.383.000
Riesgos Laborales	1	601.900	601.900
CCF	1	259.500	259.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.590.200	2.590.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013675146	RUSSI JIMENEZ SEBASTIAN	1	0			S	X																231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
2	CC	1127048585	ARARAT RAMIREZ JULIO CESAR	1	0			S							X										25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
3	CC	13483989	ARARAT ROJAS CARLO LEON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
4	CC	79654255	GAITAN MARTINEZ YEZID	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
5	CC	80130912	LADINO BOLIVAR FREDY	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1104068596	GUARIN CAMACHO CESAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
7	CC	1110173453	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ABDENAGO	1	0			S	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
8	CC	1128199756	DE LA HOZ MUÑOZ DARWIN ENRIQUE	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF24	910.000	27.300	0	0	0	0	0
9	CC	80800690	LOPEZ PIEDRAHITA LUIS MIGUEL	1	0			S	X																231001	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS008	360.000	14.400	14-23	360.000	5	25.100	CCF24	360.000	10.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


FECHA DE NACIMIENTO
14-JUN-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
30-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00068222-M-0079494623-20080910
0003194443A 1
1370005901


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.494.623
NUMERO
SILVA MARTINEZ
APELLIDOS
ELIAS
NOMBRES
Elias Silva M.
FIRMA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Administrativa

DATOS A VERIFICAR POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTA

ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR

FECHA: 27 de Febrero del 2024

EMPRESA DONDE LABORA: Consorcio Locativo

NOMBRES Y APELLIDOS: Elias Silva Martinez

DIRECCIÓN DE SU RESIDENCIA: Calle 74 # 13b - 25 este sur

TELÉFONO FIJO: 383 76 87

TELÉFONO CELULAR: 322 344 26 68

FIRMA: Elias Silva M

Powered by CamScanner

Medellín, 26 de February de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO LOCATIVO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 LOCATIVO 2		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C79494623	SILVA MARTINEZ ELIAS	27/02/2024		39582292	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/02/2024 17:11:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.33.186, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud EPS-S
Te entiendo. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación:

Fecha de Radicación: 27/02/2024

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]; B. Colectiva [ ]; C. Institucional [ ]; D. De Oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: Silva	Segundo apellido: Martinez	Primer nombre: Elias	Segundo nombre:

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79.494.623	Femenino [ ] Masculino [X]	14/06/1969

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
Sura	Colpensiones	1.300.000

18. Residencia				
Dirección: Calle 74 # 136-25 Int 2 Apto 501	Teléfono:	Teléfono celular: 322 3442668	Correo electrónico: alvasM@gmail.com	
Municipio/Distrito: Bogota	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad/Comuna:	Departamento: Bogota	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres completos: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
A		
B		
C		
D		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador (a registrar por la EPS)
Consorcio Locativo	NIT	901 744 095-0	

39. Ubicación				
Dirección: Calle 51 # 71 A - 18	Teléfono: 601 3857687	Correo electrónico: consorciolocativo@gmail.com	Municipio/Distrito: Bogota	Departamento: Bogota

capitalsalud
Te entiendo. Te atiendo

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

1. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  - Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Silva	Martinez	Elias	

3. Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	79.494.623	Femenino [ ] Masculino [X]	1 4 0 6 1 9 6 9	2 7 0 2 2 0 2 4

43. Sector	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

C. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

D. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Elias Silva M	

E. ANEXOS

56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de invalidez permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

F. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Verificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

Datos del funcionario que realiza la validación

70. Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Cargo que desempeña: Aux. de Obra.

Nota: Nota que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Protección

Fondo de Cesantías Protección

NIT 800.170.494

Hace constar que:

El (La) Señor(a) **ELIAS SILVA MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **79.494.623** se encuentra afiliado(a) al FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN, desde el 27 de enero de 2020.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de febrero de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024013012394

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS	CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	881.600	0	0	0	0	0	0		881.600	4
231001	Colfondos	800227940-6	71.500	0	0	0	0	0	0		71.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	429.900	0	0	0	0	0	0		429.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	601.900				601.900	0	0	601.900			6.019	601.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	259.500	0	0	259.500	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	345.800	345.800
Pensión	3	1.383.000	1.383.000
Riesgos Laborales	1	601.900	601.900
CCF	1	259.500	259.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.590.200	2.590.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013675146	RUSSI JIMENEZ SEBASTIAN	1	0			S	X																231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
2	CC	1127048585	ARARAT RAMIREZ JULIO CESAR	1	0			S							X										25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
3	CC	13483989	ARARAT ROJAS CARLO LEON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
4	CC	79654255	GAITAN MARTINEZ YEZID	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
5	CC	80130912	LADINO BOLIVAR FREDY	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1104068596	GUARIN CAMACHO CESAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
7	CC	1110173453	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ABDENAGO	1	0			S	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
8	CC	1128199756	DE LA HOZ MUÑOZ DARWIN ENRIQUE	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF24	910.000	27.300	0	0	0	0	0
9	CC	80800690	LOPEZ PIEDRAHITA LUIS MIGUEL	1	0			S	X																231001	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS008	360.000	14.400	14-23	360.000	5	25.100	CCF24	360.000	10.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	536371941	9464902196	Y	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$363,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
1	CC	52320873	CONTRERAS CLAUDIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1013632556	DIAZ JHONY																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	16941852	MARTINEZ WALTHER																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
4	CC	1010218260	SALCEDO INGRID																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total	**Afiliados(4)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	536371941	9464902196	Y	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$363,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$1,300	$0	$363,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$1,300	$0	$363,300
TOTAL				**4**	**$362,000**	**$1,300**	**$0**	**$363,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52320873	CLAUDIA YANETH CONTRERAS CORTES	CALLE 20C N 105-27	6015516722	clacoco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75290089	$427.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.000	0	0	28.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.000	28.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	427.000	427.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52320873	CLAUDIA YANETH CONTRERAS CORTES		CALLE 20C N 105-27	6015516722	clacoco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75290089	$427.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52320873	CONTRERAS CORTES CLAUDIA YANETH	3	0			N																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	175.000		0		0	CCF24	1.400.000	28.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536365979	9464902056	E	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$2,499,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (9 Afiliados)																								**$8,060,002**	**$1,289,800**			**$8,060,002**	**$322,600**			**$7,920,002**	**$317,000**			**$8,060,002**		**$561,300**		**$0**	**$0**		**$2,490,700**
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (9 Afiliados)																								**$8,060,002**	**$1,289,800**			**$8,060,002**	**$322,600**			**$7,920,002**	**$317,000**			**$8,060,002**		**$561,300**		**$0**	**$0**		**$2,490,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																								**$8,060,002**	**$1,289,800**			**$8,060,002**	**$322,600**			**$7,920,002**	**$317,000**			**$8,060,002**		**$561,300**		**$0**	**$0**		**$2,490,700**
1	CC	1020836403	CASTRO OSCAR		X																	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC34	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	1079913554	CERVERA JOSE																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	91273651	MORENO OSCAR																			231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1004380318	OROZCO CARLOS																			230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1024492815	PEREZ JOHN		X																	231001	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
6	CC	75000840	RODRIGUEZ OTONIEL																			230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$396,900
7	CC	1077942426	SILVA CRISTIAN																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	79494623	SILVA ELIAS	X																		25-14	4	$173,334	$27,800	EPSC34	4	$173,334	$7,000	CCF24	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
9	CC	19602081	VILLA EVER																			230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(9)**																					$8,060,002	$1,289,800			$8,060,002	$322,600			$7,920,002	$317,000			$8,060,002		$561,300		$0	$0		$2,490,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536365979	9464902056	E	2024/03/22	2024/03/26	BANCO CAJA SOCIAL	4	$2,499,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,289,800	$4,600	$0	$1,294,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$215,000	$800	$0	$215,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$27,800	$100	$0	$27,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$423,000	$1,500	$0	$424,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$2,200	$0	$626,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$561,300	$2,000	$0	$563,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$561,300	$2,000	$0	$563,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$317,000	$1,100	$0	$318,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$317,000	$1,100	$0	$318,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$322,600	$1,300	$0	$323,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$60,800	$300	$0	$61,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$53,800	$200	$0	$54,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$400	$0	$104,400
TOTAL				**9**	**$2,490,700**	**$9,000**	**$0**	**$2,499,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79406026		HERNANDEZ VEGA CONSTANTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 122 b 128 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4661413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	30327341	9463244259	I	2024/04/05	2024/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	79406026	HERNANDEZ CONSTANTINO		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79406026		HERNANDEZ VEGA CONSTANTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 122 b 128 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4661413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	30327341	9463244259	I	2024/04/05	2024/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$461,000**	**$0**	**$0**	**$461,000**

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWARD STEVEN LA ROTTA FRANCO identificado(a) con CC 1023870132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: LA ROTTA FRANCO EDWARD STEVEN CC 1023870132																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9463339755	29291529	I	2024-03-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			
9463339755	29291529	I	2024-03-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			
9463339755	29291529	I	2024-03-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																			

Este certificado se expide el día 2024-03-22 a las 13:03.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901523270-5	DEKOINDUSTRIAL SAS		CARRERA 57 4A 28	3124677152	dekoindustrial20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	COSTANTINO HER	35	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75571015	$1.402.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	400	0	0	400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	208.000	208.000
Pensión	3	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	1	400	400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.402.400	1.402.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901523270-5	DEKOINDUSTRIAL SAS		CARRERA 57 4A 28	3124677152	dekoindustrial20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	COSTANTINO HER	35	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75571015	$1.402.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026577577	PEREZ RUIZ JEISSON HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
2	CC	1033684725	ROJAS LEON JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
3	CC	80911811	HERNANDEZ MATEUS JHON EDUARD	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
4	CC	1193142656	PUENTES MORENO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS	CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	881.600	0	0	0	0	0	0		881.600	4
231001	Colfondos	800227940-6	71.500	0	0	0	0	0	0		71.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	429.900	0	0	0	0	0	0		429.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	601.900				601.900	0	0	601.900			6.019	601.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	259.500	0	0	259.500	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	345.800	345.800
Pensión	3	1.383.000	1.383.000
Riesgos Laborales	1	601.900	601.900
CCF	1	259.500	259.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.590.200	2.590.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	14/03/2024	75582828	$2.590.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013675146	RUSSI JIMENEZ SEBASTIAN	1	0			S	X																231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
2	CC	1127048585	ARARAT RAMIREZ JULIO CESAR	1	0			S							X										25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
3	CC	13483989	ARARAT ROJAS CARLO LEON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
4	CC	79654255	GAITAN MARTINEZ YEZID	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
5	CC	80130912	LADINO BOLIVAR FREDY	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1104068596	GUARIN CAMACHO CESAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
7	CC	1110173453	GONZALEZ GONZALEZ JESUS ABDENAGO	1	0			S	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	2.700	0	0	0	0	0
8	CC	1128199756	DE LA HOZ MUÑOZ DARWIN ENRIQUE	1	0			S	X																230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-23	910.000	5	63.400	CCF24	910.000	27.300	0	0	0	0	0
9	CC	80800690	LOPEZ PIEDRAHITA LUIS MIGUEL	1	0			S	X																231001	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS008	360.000	14.400	14-23	360.000	5	25.100	CCF24	360.000	10.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010218260	INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	carrera 91 c n 2-55 sur	4585555	johanasalcedo68@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	18/03/2024	75152320	$533.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	225.000	0		0		0	4	800	0	225.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	4	1.000	0	289.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.800				18.800	4	100	18.900			188	18.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.800
Pensión	1	288.000	289.000
Riesgos Laborales	1	18.800	18.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	531.800	533.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010218260	INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	carrera 91 c n 2-55 sur	4585555	johanasalcedo68@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	18/03/2024	75152320	$533.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010218260	SALCEDO SIERRA INGRID JOHANNA	59	0			N																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	2	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-03-14, 07:15:08 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1062256635

Periodo Cotización 202402 **Periodo Servicio** 202403

PAGADA 2024-03-14 07:06:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROBINSON VILLAMIL ROJAS RVR SAS				
Documento	NI 901582165	**Dirección**	CR 99C #71 B - 68		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5255621		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	**Identificación**	CC 79048393		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79048393		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VILLAMIL ROJAS ROBINSON	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X									0	30	30	30	30			F	$ 1.968.194	25-14		16 %	$ 1.968.194	$ 315.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.968.194	$ 78.800	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.968.194	$ 137.000	CCF21	4 %	$ 1.968.194	$ 78.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 78.800	$ 137.000	$ 78.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16941852	WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL	CL 20C 105 27	2982945	INGWALTHER333@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75108566	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16941852	WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL		CL 20C 105 27	2982945	INGWALTHER333@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	12/03/2024	75108566	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16941852	MARTINEZ CARVAJAL WALTHER ANTONIO	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2. SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																							$90,580,000	$14,666,800			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000	$3,551,200			$90,580,000		$5,368,800		$0	$0		$27,138,000
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$14,400,000	$2,358,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000	$504,000			$14,400,000		$66,000		$0	$0		$3,432,000
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA										X								25-14	10	$1,800,000	$306,000	EPS005	10	$1,800,000	$0	CCF22	10	$1,800,000	$0	14-25	10	$1,800,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$306,000
4	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA																		25-14	20	$3,600,000	$612,000	EPS005	20	$3,600,000	$144,000	CCF22	20	$3,600,000	$144,000	14-25	20	$3,600,000	0.522%	$18,800	20	$0	$0	Si	$918,800
5	CC	1032455696	PUERTO BURBANO SAUL ANDRES																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	523858961	9464486118	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,161,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$14,666,800	$12,800	$0	$14,679,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,854,000	$4,300	$0	$4,858,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,364,800	$5,500	$0	$6,370,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,240,000	$2,800	$0	$3,242,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$5,368,800	$4,600	$0	$5,373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$3,551,200	$3,100	$0	$3,554,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$3,551,200	$3,400	$0	$3,554,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$378,000	$400	$0	$378,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$384,000	$400	$0	$384,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$328,000	$300	$0	$328,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$596,000	$600	$0	$596,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$100	$0	$60,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,805,200	$1,600	$0	$1,806,800
TOTAL				**31**	**$27,138,000**	**$23,900**	**$0**	**$27,161,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
1	CC	52729457	BRICEÑO RODRIGUEZ DALIA MINERVA																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1019048296	CAMARGO OSORNO YINETH LISETH																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	79542174	JIMENEZ POLO FERNANDO							X											0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000		$125,300		$0	$0		$125,300
4	CC	79648085	BELTRAN ORJUELA EDGAR LEANDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,665,000		$603,200		$0	$0		$603,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525148162	9464276732	Y	2024/03/18	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	2	$604,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$603,200	$1,100	$0	$604,300
TOTAL				4	$603,200	$1,100	$0	$604,300

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	478973324	9463607272	I	2024/03/18	2024/02/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

ANEXO 3. SOPORTE EXAMENES MEDICO OCUPACIONAL DEL CONTRATISTA

H.S.E.Q. Unidad Medica

Labor Vital

Su Salud en Buenas manos

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso Con Enfasis Osteomuscular



Fecha: 01/Mar/2024, **Hora:** 10:53:09 a.m.
Apellido: Vallejos Cahcon **Nombre:** Alexander
Tipo Doc: CC **Nro Identidad:** 79708231
Empresa: Madertec Ltda
Cargo: Armador
Direccion: Cll 88 Sur 88 C 90
Telefono: **Celular:** 3114802970 **Email:** **Estado Civil:** Union Libre
Ciudad: Bogota D.c
Peso: 77 Kg **Estatura:** 175 Cm **IMC:** 25.1 **Escolaridad:** Bachiller **Jornada Laboral:** Diurna
EPS: Compensar **ARL:** ::: Sin Definir ::: **AFP:** ::: Sin Definir :::

HC: # 71996
Edad: 49 años
Sexo: Masculino ♂
Nacim: 13/Jun/1974
Rh: A-

Examenes Realizados

☐ Audiometria Clinica	☐ Audiometria Ocupacional	☐ Coprologico
☐ Espirometria	☐ Glicemia	☐ Optometria
☐ Perfil Lipidico	☐ Vestibular	☐ Visiometria

Otros: Osteomuscular

Recomendaciones Especificas

M = Higiene Postural -pausas Activas - Control Periodico Ocupacional

Resumen Resultados

Examen	Resultado
Osteomuscular	Examen Osteomuscular Normal, Movimiento Y Fuerza Conservados Y Adecuados

Concepto

Apto Para El Cargo Asignado

Observaciones

El trabajador; cuyos datos firma y constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a dispocisión del personal sanitario encargado de la vigilancia de salud de su empres

Dr. Guillermo Chaves
Médico Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo
Res. 2000818 de 2023

Guillermo Chaves
Medico Ocupacional 2
Lic. de S.O #: 25- 00818 De 2023

Alexander Vallejos Cahcon
CC 79708231

Huella Digital

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR: 2024-02-26 **EXAMEN:** INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA
NOMBRE DEL PACIENTE: DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ
IDENTIFICACION: 1128199756 **RH:** O+ **EDAD:** 36 **GENERO:** M
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-12-05 **TELEFONO DE CONTACTO:** 3214567865

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION: EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS **NIT:** 901568362 - 8
ESCOLARIDAD: BACHICHER **CARGO A DESEMPEÑAR:** TECNICO

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	Trigliceridos	Colesterol	Otros:
X	X	X	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

	SI	NO	N/A
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	X		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	X		
Apto para el cargo	X		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

* Realizar control por optomeria en su EPS.
* Realizar pausas activas.
* Estilos de vida saludable
* Evitar posturas prolongadas.
* Ejercicio fisico.
* Uso de proteccion auditiva.
* Realizar valoracion por nutricion en su EPS.

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U. de Buenos Aires Arg NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	FIRMA: NOMBRE: DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ DOCUMENTO: 1128199756	HUELLA

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000466727

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO FECHA 26/02/2024 08:01:09

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: ELIAS SILVA MARTINEZ **C.C** 79494623

EDAD 55 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE LABORAR EN ALTURAS
CONTROL OTORRINOLARINGOLOGIA Y AUDIOMETRIA SEMESTRAL EPS/ USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA/ INGRESAR SVE AUDITIVO
CONTROL OPTOMETRIA EPS ANUAL/ USO DE LENTES PARA LABORAR
CONTROL MEDICO RUTINA EPS / NUTRICION
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Dr. Didier J. Rincon C.
Medico Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
Res.11294 C.C. 79.687.876

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2024-02-26**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**YEZID GAITAN MARTINEZ**		
IDENTIFICACION:	**79654255**	**RH:** **O+** **EDAD:** **51**	**GENERO:** **M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1973-07-11**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	**3234678965**

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS**	**NIT:**	**901568362 - 8**
ESCOLARIDAD:	**BACHICHER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**TECNICO**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	Triglicéridos	Colesterol	Otros:
X	X	X	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA				
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A

OBSERVACIONES


Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO 	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: YEZID GAITAN MARTINEZ** **DOCUMENTO: 79654255**	

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2024-02-26**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**LUIS MIGUEL LOPEZ**		
IDENTIFICACION:	**80800690**	**RH:** **A+** **EDAD:** **33**	**GENERO:** **M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1991-02-11**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	**3187652768**

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS**	**NIT:**	**901568362 - 8**
ESCOLARIDAD:	**BACHICHER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**TECNICO**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	Triglicéridos	Colesterol	Otros:
X	X	X	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA				
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U. de Buenos Aires Arg.	**NOMBRE:** **LUIS MIGUEL LOPEZ**	
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**DOCUMENTO: 80800690**	

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2024-02-26	**EXAMEN:**	INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA
NOMBRE DEL PACIENTE:	FREDY LADINO BOLIVIAR		
IDENTIFICACION:	80130912	**RH:** O+ **EDAD:** 35 **GENERO:** M	
FECHA DE NACIMIENTO:	1989-05-219	**TELEFONO DE CONTACTO:**	3169775218

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS	**NIT:**	901568362 - 8
ESCOLARIDAD:	BACHICHER	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	TECNICO

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Trigliceridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA				
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo U. de Buenos Aires Arg **NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR**	**FIRMA:** **NOMBRE: FREDY LADINO BOLIVAR** **DOCUMENTO: 80130912**	HUELLA

ANEXO 4. SOPORTE INDUCCIONES DEL CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088 de 2023.	**FECHA:** 27 / Febrero / 2024.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo.	**CARGO:** Residente SST.

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
79.708.231	Alexander Valbuena	Instalador	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Locativo FECHA: 27/02/24.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Alexander Vallejo

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 79.908.231

CARGO: Instalador mobiliario.

PROYECTO: Locativo

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

ARL Sura
rapido

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a)	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
b)	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	i)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	j)	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

machucon, caida, golpes.

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	9
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, Irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riego con sustancias quimicas	X	X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , tranaitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no rapetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alexander Vallejos.	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo.
CEDULA	99.100.231.		
CARGO			
FIRMA ACEPTANDO		FIRMA	
FECHA DE FIRMA	27/02/24.	Observaciones	
EMPRESA	Locativo		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Luisa		
NO. CEL O TEL	3106903142.		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI NO	CUAL?	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	CONSORCIO LOCATIVO	**CODIGO: CL-SST-F-001**
	FORMATO DE INDUCCIÓN	**Fecha: 12-11-2023**

PROYECTO: 088 de 2024.	**FECHA:** 07 de marzo de 2024.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST.

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1128199756	Darwin de la Hoz	Fijador	Darwin de la Hoz

FIRMA DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio locativo FECHA: 02 de Marzo de 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Darwin Ortiz

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 1128199756

CARGO: Lijador

PROYECTO: 088 D2023

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores X

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

Positiva y Reporta inmediatamente

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a) ✓	Proteccion auditiva	g)	Careta facial ✓
b) ✓	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho ✓
c) ✓	Guantes de carnaza	i)	Guantes de caucho —
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	j)	Gafas de seguridad ✓
e) ✓	Guantes de nitrilo —	k)	Dalantal de carnaza ✓
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados ✓

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

Cortadas golpes machucones

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

Darwin Ortiz
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1128199756

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.	X	
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase	X	
	Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro		
			Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro		
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente		X
	Proyeccion de particulas cortes heridas		Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion,		
	Contacto con superficies calientes		Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad		
	Exposicion a radiaciones, Irritacion		Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar		
	Posiciones incomodas, fatiga muscular		ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riego con sustancias quimicas		
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
	Asonadas , Atentados				
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	
	Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas				
	Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear				

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Dorcun de la Hz	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	1128197516		
CARGO	Jardinero		
FIRMA ACEPTANDO	Dorcun de la Hz	FIRMA	
FECHA DE FIRMA	09/09/24.	Observaciones	
EMPRESA	Consorcio Locat		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Maria Villegas		
NO. CEL O TEL	3015639429		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI	NO X	CUAL?

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio locativo FECHA: 29 / Febrero / 2024.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Elias Silva MARTINEZ.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 79.494.623 Bogotá

CARGO: Soldador.

PROYECTO: _____

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a)	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
b)	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	I)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	J)	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V.	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

Elias Silva M.
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 79.494.623.

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: Consorcio locativo	**FECHA:** 27 de Febrero 1 2024
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Laceda.	**CARGO:** Ornamentador.

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
79.494.623	Elias Silva. M.	Soldador.	Elias Silva.

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes		Conserve la calma, No corre Busque un lugar seguro y protejase	X	
			Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro		
	Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro		
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente	X	
	Proyeccion de particulas cortes heridas		Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion,		
	Contacto con superficies calientes		Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad		
	Exposicion a radiaciones, irritacion		Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar		
	Posiciones incomodas, fatiga muscular		ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
	Asonadas , Atentados				
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	
	Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas				
	Mal Uso de senderos peatonales . transitar por la via no usar andenes . No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear				

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retiredo de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Elias Silva M.	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo.
CEDULA	79.494.623		
CARGO	Soldador.		
FIRMA ACEPTANDO	Elias Silva. M.	FIRMA	
FECHA DE FIRMA	07/marzo/2024.	Observaciones	
EMPRESA			
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Rene Moreno		
NO. CEL O TEL	3004051182.		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI NO	CUAL?	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088 de 2023	**FECHA:** 27/ Marzo /2024.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
80.130912	Fredy Jadino Bolivar	Instalador	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio Locativo FECHA: 07/ marzo / 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: (Carlos Ararat) Freddy Julio Bolivar

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 80130912

CARGO: Instalador

PROYECTO: 2023 - 088

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d) Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

positiva, y reportar inmediato

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Proteccion auditiva	X	Careta facial
X	Botas de seguridad con puntera	X	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	X	Guantes de caucho
X	Arnes en X (cuatro argollas)	X	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	X	Dalantal de carnaza
X	Barbuquejo de 4 puntos	X	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

Cortadas, machucones, caidas,

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones


Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 80130912

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos.		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos . controles ambientales. control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacionantes equipos manomentros y mangueras.	X	
	manejo de gas propano-oriacetileno).				
RIESGO UNICO	Riesgos naturales:		Conserve la calma. No corra Busque un lugar seguro y protejase	X	
	avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes		Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro		
	Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bombas		DivuÁgar al plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro		
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente		X
	Proyeccion de particulas cortes heridas		Mantenimiento preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion.		
	Contacto con superficies calientes		Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad		
	Exposicion a radiaciones, Irritacion		Relajar musculos,pausas activas . contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar		
	Posiciones incomodas, fatiga muscular		ATS y control de chiapas inspeccion de areas para evaluar riego con sustancias quimicas		
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañia Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
	Asonadas , Atentados				
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco User el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo User reflectivos	X	
	Accidentes por conducir Motos ,carros - bicletas				
	Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar anderes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetartas señales de transito adelantar por la derecha ztregear				

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Fredy Julian Suarez	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	80138912		
CARGO	Instalador		
FIRMA ACEPTANDO	Fredy Julian S.	FIRMA	
FECHA DE FIRMA	02/ marzo/ 2024.		
EMPRESA	Consorcio Locativo	Observaciones	
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Madre		
NO. CEL O TEL	3123119645		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI NO	CUAL?	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088 de 2023	**FECHA:** 07/03/2024
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
80800690	Miguel Lopez	PINTOR	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: consorcio locativo FECHA: 07/03/24

NOMBRE DEL TRABAJADOR: miguel lopez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 80800690

CARGO: pintor y alistador

PROYECTO: 08802023

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X d) Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

positiva inmediato

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X a)	Proteccion auditiva	g)	Careta facial X
X b)	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	I)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	j)	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

cortadas machucones golpes

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones



Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

miguel lopez
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 80800690

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos,		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.	X	
	manejo de gas propeno-oxiacetileno).				
RIESGO UNICO	Riesgos naturales:		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase	X	
	avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes		Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro		
	Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bombe		Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro		
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente	/	X
	Proyeccion de particulas cortes heridas		Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion,		
	Contacto con superficies calientes		Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad		
	Exposicion a radiaciones, irritacion		Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar		
	Posiciones incomodas, fatiga muscular		ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
	Asonadas , Atentados				
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas		User lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Use el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	
	Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas				
	Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no user puentes peatonales , no usar las cebras no repetarias señales de transito adelantar por la derecha zizagear				

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	miguel · LOPEZ	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	80800690		
CARGO	Pintor y Alistador		
FIRMA ACEPTANDO	[illegible] LOPEZ	FIRMA	
FECHA DE FIRMA	04/03/24.	Observaciones	
EMPRESA	CONSORCIO		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Angelica Quintero		
NO. CEL O TEL	3219776424		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI	NO X	CUAL?

Powered by CamScanner

ANEXO 5. SOPORTE CAPACITACIONES DE CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	CONSORCIO LOCATIVO	**CODIGO: CL-SST-F-001**
	FORMATO DE INDUCCIÓN	**Fecha: 12-11-2023**

PROYECTO: 088 de 2023	**FECHA:** 07 / marzo / 2024.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST.

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
79'654255	IJEZID Gaitán Martinez.	Carpintero	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio Locativo FECHA: 07/ marzo /2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yezid Castro Martinez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 79'654.255.

CARGO: Carpintero

PROYECTO: 088 d 2023.

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

positiva - inmediato.

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Proteccion auditiva	X	Careta facial
X	Botas de seguridad con puntera	X	Respirador de doble cartucho
X	Guantes de carnaza	X	Guantes de caucho
X	Arnes en X (cuatro argollas)	X	Gafas de seguridad
X	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
X	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

cortes, golpes, Fracturas y caidas.

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 79'654255.

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, Intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la vía no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Bezia Gaitan M.	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	79654 255.		
CARGO	carpintero		
FIRMA ACEPTANDO		FIRMA	
FECHA DE FIRMA	07/03/24	Observaciones	
EMPRESA	Consorcio Locativo.		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Margoth Martinez.		
NO. CEL O TEL	310-338-59.10		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI	CUAL?	

Powered by CamScanner

ANEXO 6. SOPORTE REGISTRO Y ENTREGA EPP Y DOTACION CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO : F-RH-06
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION :0
	ENTREGA Y/O INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	FECHA :11/11/2023
		PAG 1 DE 1

OBJETIVO DEL FORMATO: Proporcionar la información suficiente a fin de analizar los principales aspectos relacionados con el equipo de protección personal (EPP), mas adecuado, en consideración al riesgo expuesto y necesidades de reposición y/o mantenimiento

PROYECTO : DSB de 2023

INSPECCIONADO POR : Johanna Salcedo

ACTIVIDAD REALIZADA : Entrega e inspección EPP's

FECHA DE INSPECCION:

APROBADO POR Claudia Contreras

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	CABEZA			PROTECCION FACIAL						PROTECCION AUDITIVA						MANOS Y BRAZOS			PROTECCION RESPIRATORIA						PROTECCION CORPORAL						PIES		
		CASCO			GAFAS			CARETA			INSERCION			COPA			GUANTES			MASCARILLA			RESPIRADOR			OVEROL Y/O PETO			IMPERMEABLE			BOTAS		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Edwin Lasso	Edwin	B			B						B									B											B		
Juan Puentes	Juan	B			B						B									B											B		
Carlos orozco	Carlos	B			B						B									B											B		
Rosa Moreno	Rosa M	B			B						B									B											B		
Cristian Silva		B			B						B									B											B		
Oswaldo		B			B						B									B											B		
Sebastian Ros		B			B						B									B											B		
Walter Mu		B			B						B									B											B		
Claudia Contreras		B			B						B									B											B		
Elias silva	Elias	B			B						B									B											B		
Alexander	Alexa	B			B						B									B											B		

B= BUENO / M= MALO / N/A = NO APLICA / C= CAMBIARLO / R = RETIRARLO N U = NO USA (EN CASO TAL DE PRESENTARSE HACER COMRPOMISO)

COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ESTADO

Powered by CamScanner

ANEXO 7. SOPORTE POLITICA SST CONTRATISTA

ANEXO 8. SOPORTE REUNION COPASST CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-051
ACTA DE REUNIONES DEL COPASST		Fecha: 15-11-2023

ACTA No. 4

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA : 22 de Marzo de 2024
HORA : Oficina Delcop
LUGAR : 8:30 am.
CIUDAD : Bogotá D.C.

DESARROLLO

1. TEMAS A TRATAR

1. Lectura acta anterior
2. Indicadores de accidentalidad
3. Orden y aseo
4. Uso de dotación y EPP's

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza lectura del acta anterior, evidenciando que no se tenían compromisos.
2. Durante el Periodo comprendido entre el 26 de febrero al 25 de enero, no se presentaron accidentes, incidentes o enfermedad laboral.
3. Se realizaron diariamente jornadas de orden y aseo en los frentes de obra activos
4. Se realiza capacitación y un llamado de atención al personal con el fin que utilicen de manera obligatoria los EPP's y dotación de manera permanente.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS, PROPOSICIONES Y VARIOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CLAUSURA

Siendo las 9:40 am y habiéndose desarrollado en su integridad el orden del día, se da por terminada la presente reunión y en constancia firman.

Presidente del Comité

Secretario del Comité

Powered by CamScanner

ANEXO 9. SOPORTE REUNION COCOLAB CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-043
ACTA DE REUNIONES DE COMITÉ DE CONVIVENCIA		Fecha: 14-11-2023

ACTA No.

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

FECHA : 21 de Marzo de 2024
HORA : Oficina Delcop
LUGAR : 2:00 pm
CIUDAD : Bogotá D.C.

DESARROLLO

1. TEMAS A TRATAR

1. Lechra acta anterior.
2. Quejas y reclamos

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realizo lechra del acta anterior, evidenciando que no se dieron compromisos pactados.

2. Durante el presente periodo, no se presentaron quejas, reclamos o peticiones por parte del personal que labora para el contrato de obra 088 de 2023.

Powered by CamScanner

3. COMPROMISOS, PROPOSICIONES Y VARIOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CLAUSURA

Siendo las 2:40 pm y habiéndose desarrollado en su integridad el orden del día, se da por terminada la presente reunión y en constancia firman.

Presidente del Comité

Powered by CamScanner

ANEXO 10. SOPORTE CERTIFICACION ACCIDENTALIDAD EMITIDO POR LA ARL DE CONTRATISTA

Medellín, 26 de marzo de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO LOCATIVO, NIT N901744095, no presenta accidentes de trabajo desde el 26 de febrero de 2024 hasta el 25 de marzo de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.154.209.74, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11. SOPORTE INSPECCIONES PREOPERACIONALES DEL CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO : F-RH-06
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION :0
	ENTREGA Y/O INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	FECHA :11/11/2023
		PAG 1 DE 1

OBJETIVO DEL FORMATO: Proporcionar la información suficiente a fin de analizar los principales aspectos relacionados con el equipo de protección personal (EPP), mas adecuado, en consideración al riesgo expuesto y necesidades de reposición y/o mantenimiento

PROYECTO : DSB de 2023

INSPECCIONADO POR : Johanna Salcedo

ACTIVIDAD REALIZADA : Entrega e inspección EPP's

FECHA DE INSPECCION:

APROBADO POR Claudia Contreras

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	CABEZA			PROTECCION FACIAL						PROTECCION AUDITIVA						MANOS Y BRAZOS			PROTECCION RESPIRATORIA						PROTECCION CORPORAL						PIES		
		CASCO			GAFAS			CARETA			INSERCION			COPA			GUANTES			MASCARILLA			RESPIRADOR			OVEROL Y/O PETO			IMPERMEABLE			BOTAS		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Edwin Lasso	Edwin	B			B						B									B											B		
Juan Puentes	Juan	B			B						B									B											B		
Carlos orozco	Carlos	B			B						B									B											B		
Rosa Moreno	Rosa M	B			B						B									B											B		
Cristian Silva		B			B						B									B											B		
Oswaldo		B			B						B									B											B		
Sebastian Ros		B			B						B									B											B		
Walter Mu		B			B						B									B											B		
Claudia Contreras		B			B						B									B											B		
Elias silva	Elias	B			B						B									B											B		
Alexander	Alexa	B			B						B									B											B		

B= BUENO / M= MALO / N/A = NO APLICA / C= CAMBIARLO / R = RETIRARLO N U = NO USA (EN CASO TAL DE PRESENTARSE HACER COMRPOMISO)

COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ESTADO

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-029
Formato Inspección Botiquín		Fecha: 12-11-2023

INSPECCIONADO POR: Johanna Salcedo		CARGO: Residente SST		
N° de CEDULA: 1010218260	FECHA: 19/03/2024.	LUGAR: Oficina Delcop.		
ELEMENTOS	CANTIDAD	CONDICION		OBSERVACIONES
		BUENA	MALA	
GASAS LIMPIAS	1	B		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2 X 5 YARDAS	1	B		
BAJALENGUAS	1	B		
TAPABOCAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	1	B		
CINTA ADHESIVA (MICROPORE)	1	B		
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1	B		
TIGERAS	1	B		
SOLUCIÓN SALINA 250 ml ó 500 ml	1	B		
CURAS / COPITOS	1	B		
ALCOHOL ANTISÉPTICO	1	B		
GUANTES DE LATEX	1	B		
JERINGA	1	B		
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS BASICO	1	B		
LINTERNA	1	B.		

NOTA: ESTOS ELEMENTOS (BOTIQUIN TIPO A) DE PRIMEROS AUXILIOS DEBEN ESTAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ENCARGADA Y NO DEBEN CONSTITUIRSE EN FUENTE DE AUTO MEDICACION, SE UTIZARAN CON EL UNICO OBJETIVO DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CODIGO: CI-SST-F-030 VERSION: 0 FECHA: 12/11/2023
	INSPECCION DE EXTINTORES	

EMPRESA / PROYECTO:	CONSORCIO LOCATIVO	FECHA INSPECCIÓN		
FRECUENCIA DE INSPECCION:	Delcop.	23	03	24.
INSPECCIONADO POR:	Johanna Salcedo.			

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO (agente extintor)	CLASE (Fuego)	CAPACIDAD LBS	MANOMETRO	MANGUERA/VALVULA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETA DE REVISADO	SEÑALIZACIÓN	MANIJA DE DESCARGA	MANIJA DE TRANSPORTE	ACCESIBILIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1.	Delcop	Multi Proposito	ABC	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	nov 2024	Buen Estado.
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		

OBSERVACIONES GENERALES:

CONVENCIONES					
N/A	NO APLICA	FS	FUERA DE SERVICIO	NOMBRE QUIEN INSPECCIONA	Johanna Salcedo.
B	BUENO	ER	EN RECARGA		
M	MALO	SSE	SITIO SIN EXTINTOR	FIRMA QUIEN INSPECCIONA	
NT	NO TIENE				

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio Locativo — FECHA: 06/03/2024.

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Oficina / Bodega.

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI	Se observan en buen estado	SI
Se encuentra en buen estado	SI	Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	SI	Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI	Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI	Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI	Estan limpias y lubricadas	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI	Tienen sus guardas	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI	El cable y enchufe no presentan daños	NO
HERRAMIENTAS DE CORTE		Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO	Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Los cinceles se encuentran afilados	SI	Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	SI	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
La segueta tiene un marco adecuado	SI	En los taladros se observa el mandril con golpes	NO
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	NO.
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI	**HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**	**S/NS/NA**
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**	Se trabaja a las presiones indicadas	NA
Se emplea el martillo adecuado según la labor	SI	La herramienta es descargada al terminar	NA
Sus caras y bordes estan en buen estado	SI	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**	**S/NS/NA**
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	SI	El personal es autorizado	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**	Emplean los elementos de protección	NA
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA	Se carga y es almacenado	NO
Se observa en la llave huella de palanca	NA	Su sistema de disparo es bajo presión	
Se dispone de llaves para	NA	**OTROS**	
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA		
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA		
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA		
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA		

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por:

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio locativo FECHA: 13/03/2024.

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Delcop - Bolsa

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI
Se encuentra en buen estado	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	SI
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO
Los cinceles se encuentran afilados	SI
Las terrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	SI
La segueta tiene un marco adecuado	SI
Terraja macho/hembra, en buen estado	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	NA
Sus caras y bordes estan en buen estado	NA
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA
Se dispone de llaves para	NA
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se observan en buen estado	SI
Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Estan limpias y lubricadas	SI
Tienen sus guardas	SI
El cable y enchufe no presentan daños	NO
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
En los taladros se observa el mandril con golpes	SI
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	NO
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**S/NS/NA**
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NO
Se trabaja a las presiones indicadas	NA
La herramienta es descargada al terminar	NA
HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN	**S/NS/NA**
El personal es autorizado	NA
Emplean los elementos de protección	NA
Se carga y es almacenado	NA
Su sistema de disparo es bajo presión	
OTROS	

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionado por:

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio locativo FECHA: 13/07/2024

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Delcop / Bolsa

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI
Se encuentra en buen estado	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	SI
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO
Los cinceles se encuentran afilados	SI
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	SI
La segueta tiene un marco adecuado	SI
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	NA
Sus caras y bordes estan en buen estado	NA
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA
Se dispone de llaves para	NA
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se observan en buen estado	SI
Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Estan limpias y lubricadas	SI
Tienen sus guardas	SI
El cable y enchufe no presentan daños	NO
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
En los taladros se observa el mandril con golpes	SI
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	NO
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**S/NS/NA**
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
Se trabaja a las presiones indicadas	NA
La herramienta es descargada al terminar	NA
HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN	**S/NS/NA**
El personal es autorizado	NA
Emplean los elementos de protección	NO
Se carga y es almacenado	NO
Su sistema de disparo es bajo presión	NO
OTROS	

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por:

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	VERSIÓN: 0
		FECHA: 12/11/2023

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio Locativo FECHA: 20/03/2024

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Delcop - Bolsa

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE Ggolpe	S/NS/NA	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI	Se observan en buen estado	SI
Se encuentra en buen estado	SI	Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	SI	Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI	Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI	Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI	Estan limpias y lubricadas	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI	Tienen sus guardas	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI	El cable y enchufe no presentan daños	NO
HERRAMIENTAS DE CORTE		Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO	Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Los cinceles se encuentran afilados	SI	Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	ND	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	SI	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
La segueta tiene un marco adecuado	SI	En los taladros se observa el mandril con golpes	SI
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	NO
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI	**HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**	**S/NS/NA**
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	ND
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**	Se trabaja a las presiones indicadas	NA
Se emplea el martillo adecuado según la labor	SI	La herramienta es descargada al terminar	ND
Sus caras y bordes estan en buen estado	SI	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**	**S/NS/NA**
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	SI	El personal es autorizado	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**	Emplean los elementos de protección	ND
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	ND	Se carga y es almacenado	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA	Su sistema de disparo es bajo presión	NA
Se dispone de llaves para	ND	**OTROS**	
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	ND		
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	ND		
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA		
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	ND		

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por:

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	INSPECCION DE PULIDORA	VERSION 01 14/11/2023

NOMBRE DEL INSPECTOR: Johanna Salcedo.
SEMANA DEL: 11 AL 17 DE marzo 20 24.

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
El cable de la conexión se encuentra sin corte y buen estado	SI		SI		SI		SI							
Cuenta con manija de soporte y agarre	SI		SI		SI		SI							
Cuenta con guarda metalica de proteccion	SI		SI		SI		SI							
El swich de encendido funciona correctamente	SI		SI		SI		SI							
El estado del disco es bueno	SI		SI		SI		SI							
La persona que ejecutara la actividad cuenta con los EPPS adecuados	SI		SI		SI		SI							
La maquina cuenta con certificado electrico vigente	SI		SI		SI		SI							
FIRMA DEL OPERARIO														
V° B° AREA HSE														

FECHA	HALLAZGO/DESCRIPCION	PLAZO	ACCION A TOMAR	SEGUIMIENTO	EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA ACCION					
					B		M		A	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	INSPECCION DE PULIDORA	VERSION 01
		14/11/2023

NOMBRE DEL INSPECTOR: Johanna Salcedo
SEMANA DEL: 04 AL 10 DE Marzo 20 24.

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
El cable de la conexiòn se encuentra sin corte y buen estado	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
Cuenta con manija de soporte y agarre	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
Cuenta con guarda metalica de proteccion	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
El swich de encendido funciona correctamente	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
El estado del disco es bueno	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
La persona que ejecutara la actividad cuenta con los EPPS adecuados	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
La maquina cuenta con certificado electrico vigente	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
FIRMA DEL OPERARIO														
V° B° AREA HSE														

FECHA	HALLAZGO/DESCRIPCION	PLAZO	ACCION A TOMAR	SEGUIMIENTO	EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA ACCION		
					B	M	A

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 05

CONTRATO No. 112 de 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

TOTALL INC SAS BIC

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/03/2024 – 31/03/2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3

1.1 OBJETIVO GENERAL 3

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO) 4

2. GESTION AMBIENTAL 5

2.1 CAPACITACION PERSONAL DE OBRA 5

2.2 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES 6

2.3 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS 6

2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 7

2.5 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD 7

2.5.1 RESIDUOS ORDINARIOS 7

2.5.2 RESPEL 7

2.5.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 7

2.5.4 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA 8

2.5.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 8

3. INDICADORES AMBIENTALES 9

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

1. INTRODUCCION

El informe ambiental es un documento que se desarrolla con el objetivo de reflejar en él todas las variables que hay que conocer sobre el estado ambiental en el momento de su realización.

La función de la Interventoría consiste en supervisar y verificar el cumplimiento ambiental, desarrollada por el Contratista de obra para el cumplimiento de las labores contractuales contractuales contemplados en el plan de manejo ambiental.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta el periodo de tiempo de ejecución establecido entre 01 al 31 de marzo de 2024, donde realizaron actividades ambientales según el plan de manejo ambiental presentado ante esta interventoría.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Supervisar el cumplimiento de los requisitos de plan de manejo ambiental del contratista de obra para la ejecución del contrato, en cumplimiento de la legislación aplicable y las obligaciones contractuales.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las medidas de manejo ambiental ejecutadas durante el periodo
- Reportar las cantidades de RCD dispuestas en sitio autorizado por la entidad ambiental.
- Verificar y reportar el cumplimiento a los indicadores establecidos en el plan de manejo ambiental presentado por el contratista.

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO)

La interventoría se desarrollará en la ciudad de Bogotá, D.C., ubicadas en las localidades de La Candelaria y Mártires, donde el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizará el mejoramiento locativo de DELCOP, BOLSA Y PALACIO DE JUSTICIA.



*Fuente tomada por Google Earth. Delcop***



*Fuente tomada por Google Earth. Bolsa***



*Fuente tomada por Google Earth. Palacio de Justicia***

2. GESTION AMBIENTAL

2.1 CAPACITACION PERSONAL DE OBRA

En el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó una charla de capacitación ambiental:

TEMA DE CAPACITACION	FECHA
Capacitación en manejo de acopios temporales, separación in situ	06/03/2024

Anexo 1. Soporte capacitación ambiental del contratista

2.2 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, se encuentra actualmente con los siguientes permisos ambientales para la ejecución del contrato.

ÁREA Y/O ESPECIALIDAD	NOMBRE DE LICENCIA O PERMISO	ENTIDAD QUE OTORGA	ESTADO
Ambiental	Gestionar ante la SED el Plan de Gestión RCD con el fin de solicitar el PIN Obra para el manejo de RCD durante el desarrollo de la obra.	SDA	24410
Ambiental	Se requerirán los permisos ambientales a proveedores de materiales de construcción. (Canteras, Concretos)	SDA-CAR	Etapa Constructiva
Ambiental	Se realizará la disposición final de residuos de construcción y demolición en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. (SDA, CAR)	SDA- CAR	Etapa Constructiva

2.3 CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó actividades de demolición de muros que generaron emisiones atmosféricas; para mitigar el impacto, el contratista realizó apertura de ventanas.

Adicional, realizaron la recolección de RCD en lonas y lo ubicaron en acopio temporal.

Por las actividades enunciadas, no se presentó reporte de quejas ni reclamos por parte de los funcionarios.

2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Durante el tiempo estipulado en el presente informe, no ingresó a los frentes de obra, materiales de construcción al contratista CONSORCIO LOCATIVO.

2.5 PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS, ESPECIALES Y RCD

2.5.1 RESIDUOS ORDINARIOS

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó la separación de residuos, según resolución 2184 de 2019, separando los residuos de la siguiente manera:

- Color blanco. Plástico, vidrio, cartón, papel
- Color verde: residuos orgánicos aprovechables
- Color negro: residuos no aprovechables

2.5.2 RESPEL

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, durante el periodo de 01 al 31 de marzo de 2024, se generó residuos peligrosos o especiales como luminarias, las cuales se encuentran acopiadas adecuadamente y protegidas, donde se dispondrá en sitio autorizado competente para el próximo mes de abril

2.5.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, entregó a la presente interventoría el programa de gestión de residuos de construcción y demolición PG-RCD.

La presente interventoría, realiza entrega de la documentación ambiental para apertura del PIN, mediante oficio TOTALL-112-RJ-017, el día 28 de noviembre a la entidad.

El contratista durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, genera 15 m3 (19,40 ton) de RCD.

El sitio donde realizan la disposición final es RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS.

Tabla 6. Relación de RCD dispuestos en marzo

FECHA	SITIO DISPOSICIÓN	MATERIAL	VOLUMEN M3	VOLUMEN TON	FRENTE DE OBRA
01/03/2024	RECICLADOS INDSUTRIALES	ESCOMBRO	15	24,73	DELCOP

Anexo 2. Soporte Certificación recolección RCD del contratista

Anexo 3. Soporte licencia ambiental del contratista

2.5.4 MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, durante la ejecución del contrato, reporta que no evidenció sumideros dentro del área de intervención directa. De igual manera, en la revisión que realizó el contratista y la interventoría, las redes de los baños, no presenta fugas ni escape alguna.

2.5.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, durante el periodo del presente informe, el contratista, entregó a la presente interventoría, la documentación de una volqueta, para retiro de RCD.

Tabla 7. Relación de volqueta

PLACA	PIN	SOAT	TECNOMECANICA	LICENCIA
JTX454	19433	11/12/2024	13/12/2024	10021829793

Anexo 4. Soporte documentos de volqueta del contratista

3. INDICADORES AMBIENTALES

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, presentó a la presente interventoría, los indicadores correspondientes al tema ambiental, los cuales se anexan a continuación.

Seguimiento y monitoreo al Cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	A/NA/ %	Observaciones
$\frac{No.\,de\ medidas\ de\ manejo\ implementadas}{No.\,de\ medidas\ de\ manejo\ propuestas}$ $\frac{3}{3}\ X\ 100 = 100\%$	100%	Se ejecutan las siguientes medidas de manejo: • Capacitaciones ambientales • Señalización de obra • Jornadas de orden y aseo.
$\frac{No.\,de\ permisos\ ambientales\ aprobados}{No.\,de\ permisos\ ambientales\ requeridos}$ $\frac{2}{2}\ X\ 100 = 100\%$	100 %	Para el periodo de reporte se continua con la vigencia los siguientes permisos: • Pin ambiental de obra • Disposición de RCD
$\frac{No.\,de\ Capacitaciones\ realizadas\ en\ el\ me}{No\ de\ capacitaciones\ programadas}$ $\frac{1}{1}\ X\ 100 = 100\%$	100%	Se realizó 1 capacitación conforme a lo establecido en el cronograma de capacitaciones, el soporte se encuentra adjunto en el anexo 1.
$\frac{No.\,de\ acopios\ o\ campamentos\ Aprobados\ e\ instalados}{No.\,de\ campamentos\ requeridos} X\ 100$ $\frac{3}{3}\ X\ 100 = 100\%$	100%	Los acopios aprobados e instalados fueron: Acopio de demolición Acopio de Drywall
$\frac{Volumen\ de\ material\ que\ ingresa\ a\ obra\ d\ fuente\ autorizadas}{Volumen\ total\ de\ material\ que\ ingresa\ a\ la\ obra}$ $\frac{0\ m3}{0\ m3} X\ 100$	100%	Durante el mes de reporte no ingreso material al frente de obra.

$\frac{Volumen\ de\ residuos\ peligrosos\ dispuest\ y\ certificados}{Volumen\ de\ residuos\ peligrosos\ generad}$ $\frac{NA\ Kg}{NA\ kg}\ X\ 100$	NA	Para el periodo no se realizó la disposición final de residuos peligrosos.
$\frac{Volumen\ de\ RCDs\ Certificado}{Volumen\ de\ RCDs\ Despachado}\ X\ 100$ $\frac{15\ m3}{15\ m3}\ X\ 100$	100%	Para el periodo reportado se realizó disposición final de RCD en el siguiente sitio: • 15 m3 de demolición dispuestos en RECICLADOS INDSUTRIALES
$\frac{Cantidad\ Humectaciones\ efectuadas}{Cantidad\ de\ humectaciones\ requeridas}\ X$ $\frac{NA}{NA}\ X\ 100$	NA	No se realizaron actividades que requirieran de la humectación del suelo.
$\frac{No.de\ volquetas\ utilizadas}{No.de\ volquetas\ que\ cuentan\ con\ PIN}\ X\ 1$ $\frac{1}{1}\ X\ 100$	100%	Se cuenta con 1 volqueta aprobadas por la interventoría y las cuales cuentan con PIN ambiental de transportadores vigente y otorgado por la SDA.
$\frac{Medidas\ de\ manejo\ Implementadas\ para\ control\ de\ ruido}{Medidas\ de\ manejo\ requeridas\ para\ control\ de\ ruido}\ X\ 10$ $\frac{NA}{NA}\ X\ 100 = 100\%$	NA	No aplica, para el periodo de reporte no se implementaron medidas para el control de ruido.

$\frac{No.\,de\,señales\,instaladas}{No.\,de\,señales\,requeridas}\,X\,100$ $\frac{10}{10}\,X\,100 = 100\%$	100%	Se realiza la instalación de señalización en el frente de obra y área administrativa de acuerdo con las necesidades del proyecto y el avance de actividades.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista, ha dado cumplimiento con el cronograma de actividades correspondiente al componente ambiental.

- Se recomienda al contratista, instalar el punto ecológico en los frentes.

- Durante el periodo del presente informe, el contratista no tuvo accidentes ni incidentes ambientales durante la ejecución de las actividades propias del objeto del contrato.

- Realizaron el retiro de RCD de las actividades de demolición, y lo entregaron al sitio autorizado por la entidad ambiental para su respectiva disposición final.

JUAN SEBASTIAN TORRES

Ing. JUAN SEBASTIAN TORRES LOZANO
RESIDENTE AMBIENTAL

ANEXOS

ANEXO 1. SOPORTE CAPACITACION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	CÓDIGO: CL-SST-F-0037 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	

FECHA: 06 de Marzo de 2024.

CONTRATO: 088 de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Johanna Salcedo.

CARGO	Residente Ambiental.	**FIRMA**	

TEMA: Capacitación en manejo de acopios temporales, Separación in sito.

TIPO			
INDUCCION		**CAPACITACION**	X
CHARLA INFORMATIVA		**ENTRENAMIENTO**	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Jose Gregorio Contreras	1.079913554	Oficios Varios	Jose Contreras
2	Ever Tello Cervera	1960281	Ayudante	Ever Tello
3	Carlos Andres Orozco	1004380318	Ayudante	Carlos Andres
4	Juan David Pirates	1193147656	Electrico	
5	Sebastian Rojas	1033684725	Aux	
6	Edwin Lanotta	1073870137	Electricista	
7	Oronel Rodriguez	4000846	OF	
8	RONG MORENO	91273651	OFICIAL	RONG
9	Constantino Hernandez.	79406026	Cod. Obra	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Powered by CamScanner

ANEXO 2. SOPORTE CERTIFICACION RECOLECCION RCD DEL CONTRATISTA

Código de Verificación: new_gSUYCBMeJczxyjEKqbAVPS

Cota, 11 de marzo de 2024

CERT-412-2024

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	(601)8759047
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*15,00*	*19,40*
Totales:	***15,00***	***19,40***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	CONSORCIO LOCATIVO
Número de identificación	901744095
Telefono	313837687
Origen / Dirección	PIN 24410 CLL 18 CR 34
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	CONTRATO 088 DE 2023. OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DE NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL PIN: 24410

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	19,40
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**19,40**
Fecha de Recepción RCD el día 01 de marzo de 2024 hasta el día 01 de marzo de 2024	

La presente certificación corresponde y cumple con el anexo II - FORMATO CONSTANCIA GESTORES de la resolución 1257 /2021,
Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

PP

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Fernando Ramirez Villamizar

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Facturación

Remisión N: RF-125687
Fecha: 2024-03-01 15:42:40
Cajero: Nicoll Placa: JTX454
Cliente: CONSORCIO LOCATIVO
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: PIN 24410 CLL 18 CR 34
Ubicación:
Material: ESCOMBRO
Unidad: Metro
Cantidad Mts: 15,00
Cantidad Ton: 19,40

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

ANEXO 3. SOPORTE LICENCIA AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

BOGOTÁ

DTINI
20222351590331
Informacion Publica
Al responder cite este número

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2022

Señor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
comercial.planta@recicladosindustriales.co
Cota - Cundinamarca

Referencia: Respuesta Radicado IDU No. 20225261621592.

Asunto: Renovación de vigencia Registro No. 511 - 2019 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro No. 511 - 2019, en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 12 de septiembre de 2022, con matricula mercantil a nombre de la empresa Reciclados Industriales de Colombia SAS, NIT: 900.360.954-1, representada legalmente por Fernando Ramírez Villamizar, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.146.573 de Bogotá, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 08/09/2022 con el No. 20222074277, suscrito por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20221059276: Respuesta radicado No. 20222049120

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo manifestado por usted en el comunicado con radicado Car 202210599276 del 19 de Julio de 2022, la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental - DESCA, a través del Grupo de RCD le informa que se realizó visita técnica de seguimiento y control el día jueves 11 de Agosto de 2022 a las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. identificada con No 21 en la Base de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Como resultado de la visita técnica realizada se generó Informe Técnico DESCA 1040 del 31 de Agosto de 2022, cuyo Concepto Técnico y Recomendaciones se describen a continuación:

- CONCEPTO TÉCNICO

Como resultado de la visita de seguimiento y control realizada el día 11 de Agosto del año 2022 al Gestor Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. con No 21 en modalidad de Planta de Aprovechamiento en la Base de Datos de Gestores RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, se conceptúa lo siguiente: - De acuerdo con la visita técnica realizada para evidenciar las condiciones actuales del terreno donde desarrolla sus actividades el Gestor RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. y de acuerdo con la documentación presentada y las actividades de gestión desarrolladas por la empresa, CUMPLE con los aspectos mínimos estipulados en la Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- Así mismo, conforme a la evidencia recolectada mediante visita técnica realizada el día 11 de Agosto de 2022, la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., realizó las acciones correctivas con respecto a la utilización del Lote No 9 del predio Las Juntas como lugar de acopio temporal de Residuos de Construcción y Demolición, y reestableció el mencionado lote a sus condiciones originales, quedando todas las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de RCD dentro de los linderos autorizados en el Lote 10 del Predio Las Juntas, de acuerdo a lo descrito en el registro con número 21 de la Base de Datos de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

- RECOMENDACIONES OBLIGACIONES

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V9

ISO 22301
LL-C (Certification)
571147

Instituto de Desarrollo Urbano

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe con respecto al Gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., ubicada en el predio con dirección Finca las Juntas Lote 10 - Vereda San José - Mosquera, representada legalmente por el Señor FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR, Identificada con NIT No. 900.360.954-1, se recomienda:

- A la Dirección de Seguimiento Evaluación y Control Ambiental DESCA, Activar el Registro No 021 de la Base de Datos de Gestores de RCD para la empresa RECICLADOS INDUSTRALES DE COLOMBIA S.A.S., toda vez que se verificó el cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos frente a la normatividad vigente por parte del gestor, subsanando todo lo concerniente a la ocupación del Lote No 9 localizado en el predio Las Juntas.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., mantener el cumplimiento de lo establecido en la normatividad ambiental vigente consecuente con su actividad; especialmente en lo estipulado en el Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S, allegar la certificación actualizada al año 2022 sobre la compatibilidad del proyecto (Actividades de gestión residuos de construcción y demolición) con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según sea el caso, para el Lote No 10 Predio Las Juntas. La certificación deberá ser allegada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Car en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha de notificación de las presentes recomendaciones.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS con registro No 21 en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, y conforme al control y seguimiento que realizará la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental DESCA, a través del grupo de RCD, garantizar el ingreso de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para la evaluación de los componentes ambientales con el fin de establecer su cumplimento y/o incumplimiento en los términos señalados en el marco legal ambiental."

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

3. Copia del pronunciamiento de la Dirección Regional Sabana Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 16/08/2022 con el No. 09222012287, suscrito por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20221066513: CAR ZIPAQUIRA SANCIONES Y MULTAS

   Cordial saludo Dr. Ramírez:

   Atendiendo su solicitud radicada bajo el número 20221066513, nos permitimos informar que se realizó consulta en el Sistema de Administración de Expedientes SAE a la fecha y no se evidencia ningún trámite sancionatorio a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS identificada con NIT 900360954-1.

   Si desea consultar las últimas actuaciones de los expedientes puede remitirse al siguiente link http://sae.car.gov.co/modulos/saepublico/busqueda.aspx o cualquier inquietud adicional se podrá atender en los teléfonos 3204888214 o al 5801111 Ext.3501 - 3502 (8:00 - 15:00)."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 511 - 2019, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de la empresa Reciclados Industriales de Colombia SAS, cuya planta se encuentra ubicada en el predio denominado lote 10, de la vereda San José, en el municipio de Mosquera – Cundinamarca.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*
- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Es de mencionar que la empresa Reciclados Industriales de Colombia SAS, deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, provenientes de las diferentes obras de los contratistas del IDU, se realice en área del predio donde se ubica la Planta en mención; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la siguiente gráfica:



Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica [2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.


2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,



Sully Magalis Rojas Bayona
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada en 27-09-2022 09:39 AM
Cc Corporacion Autonoma De Cundinamarca - -car Carlos Antonio Bello Quintero - Sau@car.gov.co Cp: (Bogota-D.C.)

Elaboró: Nelson Andres Romero Cardenas-Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación
Revisó: Stefania Olivera Ríos - Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

BOGOTÁ

DTINI
20222351590351
Informacion Publica
Al responder cite este número

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2022

Señor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
comercial.planta@recicladosindustriales.co
Cota - Cundinamarca

Referencia: Respuesta Radicado IDU No. 20225261620762.

Asunto: Renovación de vigencia Registro No. 510 - 2019 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro No. 510 - 2019, en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 12 de septiembre de 2022, con matricula mercantil a nombre de la empresa Reciclados Industriales de Colombia SAS, NIT: 900.360.954-1, representada legalmente por Fernando Ramírez Villamizar, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.146.573 de Bogotá, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 08/09/2022 con el No. 20222074277, suscrito por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20221059276: Respuesta radicado No. 20222049120

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo manifestado por usted en el comunicado con radicado Car 202210599276 del 19 de Julio de 2022, la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental - DESCA, a través del Grupo de RCD le informa que se realizó visita técnica de seguimiento y control el día jueves 11 de Agosto de 2022 a las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. identificada con No 21 en la Base de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Como resultado de la visita técnica realizada se generó Informe Técnico DESCA 1040 del 31 de Agosto de 2022, cuyo Concepto Técnico y Recomendaciones se describen a continuación:

- CONCEPTO TÉCNICO

Como resultado de la visita de seguimiento y control realizada el día 11 de Agosto del año 2022 al Gestor Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. con No 21 en modalidad de Planta de Aprovechamiento en la Base de Datos de Gestores RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, se conceptúa lo siguiente: - De acuerdo con la visita técnica realizada para evidenciar las condiciones actuales del terreno donde desarrolla sus actividades el Gestor RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. y de acuerdo con la documentación presentada y las actividades de gestión desarrolladas por la empresa, CUMPLE con los aspectos mínimos estipulados en la Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- Así mismo, conforme a la evidencia recolectada mediante visita técnica realizada el día 11 de Agosto de 2022, la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., realizó las acciones correctivas con respecto a la utilización del Lote No 9 del predio Las Juntas como lugar de acopio temporal de Residuos de Construcción y Demolición, y reestableció el mencionado lote a sus condiciones originales, quedando todas las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de RCD dentro de los linderos autorizados en el Lote 10 del Predio Las Juntas, de acuerdo a lo descrito en el registro con número 21 de la Base de Datos de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

- RECOMENDACIONES OBLIGACIONES

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V9

BUREAU VERITAS Certification
CMD
efr certificado en conciliación
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
50 años Instituto de Desarrollo Urbano

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe con respecto al Gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., ubicada en el predio con dirección Finca las Juntas Lote 10 - Vereda San José - Mosquera, representada legalmente por el Señor FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR, Identificada con NIT No. 900.360.954-1, se recomienda:

- A la Dirección de Seguimiento Evaluación y Control Ambiental DESCA, Activar el Registro No 021 de la Base de Datos de Gestores de RCD para la empresa RECICLADOS INDUSTRALES DE COLOMBIA S.A.S., toda vez que se verificó el cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos frente a la normatividad vigente por parte del gestor, subsanando todo lo concerniente a la ocupación del Lote No 9 localizado en el predio Las Juntas.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., mantener el cumplimiento de lo establecido en la normatividad ambiental vigente consecuente con su actividad; especialmente en lo estipulado en el Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S, allegar la certificación actualizada al año 2022 sobre la compatibilidad del proyecto (Actividades de gestión residuos de construcción y demolición) con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según sea el caso, para el Lote No 10 Predio Las Juntas. La certificación deberá ser allegada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Car en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha de notificación de las presentes recomendaciones.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS con registro No 21 en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, y conforme al control y seguimiento que realizará la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental DESCA, a través del grupo de RCD, garantizar el ingreso de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para la evaluación de los componentes ambientales con el fin de establecer su cumplimento y/o incumplimiento en los términos señalados en el marco legal ambiental."

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V9

ISO 22301
LL-C (Certification)
571147

Instituto de Desarrollo Urbano

3. Copia del pronunciamiento de la Dirección Regional Sabana Centro de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 16/08/2022 con el No. 09222012287, suscrito por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20221066513: CAR ZIPAQUIRA SANCIONES Y MULTAS

   Cordial saludo Dr. Ramírez:

   Atendiendo su solicitud radicada bajo el número 20221066513, nos permitimos informar que se realizó consulta en el Sistema de Administración de Expedientes SAE a la fecha y no se evidencia ningún trámite sancionatorio a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS identificada con NIT 900360954-1.

   Si desea consultar las últimas actuaciones de los expedientes puede remitirse al siguiente link http://sae.car.gov.co/modulos/saepublico/busqueda.aspx o cualquier inquietud adicional se podrá atender en los teléfonos 3204888214 o al 5801111 Ext.3501 - 3502 (8:00 - 15:00)."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 510 - 2019, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU"*, en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de la empresa Reciclados Industriales de Colombia SAS, cuya planta se encuentra ubicada en el predio denominado lote 10, de la vereda San José, en el municipio de Mosquera – Cundinamarca.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V9

ISO 22301
LL-C (Certification)
571147

Instituto de Desarrollo Urbano

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica [2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

Sully Magalis Rojas Bayona
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada en 27-09-2022 09:42 AM
Cc Corporacion Autonoma De Cundinamarca - -car Carlos Antonio Bello Quintero - Sau@car.gov.co Cp: (Bogota-D.C.)

Elaboró: Nelson Andres Romero Cardenas-Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación
Revisó: Stefania Olivera Ríos - Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E Innovación

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

CAR 08/09/2022 16:18
Al Contestar cite este No.: **20222074277**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOM
Anexos: Fol: 3

Bogotá,

Doctor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Representante Legal
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Tel: 7954806, Cel: 3102925151
Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia
produccion@recicladosindustriales.co
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221059276: Respuesta radicado No. 20222049120

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo manifestado por usted en el comunicado con radicado Car 202210599276 del 19 de Julio de 2022, la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental -DESCA, a través del Grupo de RCD le informa que se realizó visita técnica de seguimiento y control el día jueves 11 de Agosto de 2022 a las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. identificada con No 21 en la Base de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

Como resultado de la visita técnica realizada se generó Informe Técnico DESCA 1040 del 31 de Agosto de 2022, cuyo Concepto Técnico y Recomendaciones se describen a continuación:

- CONCEPTO TÉCNICO

Como resultado de la visita de seguimiento y control realizada el día 11 de Agosto del año 2022 al Gestor Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. con No 21 en modalidad de Planta de Aprovechamiento en la Base de Datos de Gestores RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, se conceptúa lo siguiente:

- De acuerdo con la visita técnica realizada para evidenciar las condiciones actuales del terreno donde desarrolla sus actividades el Gestor RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. y de acuerdo con la documentación presentada y las actividades de gestión desarrolladas por la empresa, CUMPLE con los aspectos mínimos estipulados en la Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral

de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- Así mismo, conforme a la evidencia recolectada mediante visita técnica realizada el día 11 de Agosto de 2022, la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., realizó las acciones correctivas con respecto a la utilización del Lote No 9 del predio Las Juntas como lugar de acopio temporal de Residuos de Construcción y Demolición, y reestableció el mencionado lote a sus condiciones originales, quedando todas las instalaciones de la Planta de Aprovechamiento de RCD dentro de los linderos autorizados en el Lote 10 del Predio Las Juntas, de acuerdo a lo descrito en el registro con número 21 de la Base de Datos de Gestores de RCD de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

- RECOMENDACIONES OBLIGACIONES

Teniendo en cuenta lo conceptuado en el presente informe con respecto al Gestor de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., ubicada en el predio con dirección Finca las Juntas Lote 10 - Vereda San José - Mosquera, representada legalmente por el Señor FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR, Identificada con NIT No. 900.360.954-1, se recomienda:

- A la Dirección de Seguimiento Evaluación y Control Ambiental DESCA, Activar el Registro No 021 de la Base de Datos de Gestores de RCD para la empresa RECICLADOS INDUSTRALES DE COLOMBIA S.A.S., toda vez que se verificó el cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos frente a la normatividad vigente por parte del gestor, subsanando todo lo concerniente a la ocupación del Lote No 9 localizado en el predio Las Juntas.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., mantener el cumplimiento de lo establecido en la normatividad ambiental vigente consecuente con su actividad; especialmente en lo estipulado en el Resolución 0472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", y a lo dispuesto para plantas de aprovechamiento de RCD en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones".

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S, allegar la certificación actualizada al año 2022 sobre la compatibilidad del proyecto (Actividades de gestión residuos de construcción y demolición) con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según sea el caso, para el Lote No 10 Predio

Las Juntas. La certificación deberá ser allegada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Car en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha de notificación de las presentes recomendaciones.

- A la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS con registro No 21 en la modalidad de Planta de Aprovechamiento de RCD, y conforme al control y seguimiento que realizará la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental DESCA, a través del grupo de RCD, garantizar el ingreso de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para la evaluación de los componentes ambientales con el fin de establecer su cumplimento y/o incumplimiento en los términos señalados en el marco legal ambiental.

Cordialmente,



CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Respuesta a: 20221059276 del 19/07/2022

Elaboró: Julián Dario Acuña Bermudez / DESCA
Revisó: Darwin Erney Duarte Castro / DESCA
Alberto Acero Aguirre / DESCA

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 2. **Anexos**: No.
Radicación: 2019EE260347 **Proc** 4574762 **Fecha**: 2019-11-06 16:17
Tercero: 900360954-1 - RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Bogotá DC

Señores:
RECICLADOS INDUSTRIALES S.A.S
Atn. Marco Tulio Urrego Cardenas
Director técnico
Avenida 19 No. 97 - 31 Oficina 506
Correo electrónico: info@recicladosindustriales.co
Teléfono: 0316234383
Ciudad.

Referencia: Radicados SDA No. **2019ER239843 - 2019ER212866** - Respuesta a oficios donde se solicita la publicación de la empresa Reciclados Industriales S.A.S en el directorio ambiental de la entidad.

Cordial saludo:

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP- de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*, en atención al radicado de la referencia mediante el cual el peticionario **Marco Tulio Urrego Cárdenas**, como Director Técnico de la empresa **Reciclados Industriales S.A.S**. solicita la publicación de dicha empresa en el directorio ambiental publicado en la página web de la entidad, y de acuerdo a ello se informa lo siguiente:

Respondiendo a su solicitud radicada bajo los números de procesos: 4605176 - 4574762 se informa que se realizó la verificación de dicha resolución (Registro CAR: 015 - 021) y se pudo constatar la veracidad de la misma; Por ende la entidad procede a realizar la publicación de dicha información

Se realizó la actualización en la página web de los sitios aprobados, incorporando los siguientes datos:

- Nombre: Reciclados industriales s.a.s
- Ubicación: - Cota / Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia y Mosquera / Vereda San José, predio las Juntas
- Registro CAR: 015 - 021

Podrá realizar la consulta en el siguiente enlace: http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/disposicion

Por último, es importante recordar que con el fin de evaluar el cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012 y de la Resolución 00932 de 2015, el Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la

Construcción; la Secretaría Distrital de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital, continuará realizando seguimiento y control a manejo eficiente de RCD, el cual incluye los centros de tratamiento y aprovechamiento de los mismos.

Atentamente,



JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Revisó y aprobó: Sergio Izquierdo Gelvis

Proyectó: MARIA ALEJANDRA AFANADOR ROJAS

ANEXO 4. SOPORTE DOCUMENTOS DE VOLQUETA DEL CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021829793

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JTX454	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.824	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35367274	N	3HTWYAHT9MN213519

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT9MN213519	N	3HTWYAHT9MN213519	N

PROPIETARIO(S) APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DIAZ DAZA JHONY FERNEY Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1013632556

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 375

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000445233

I/E: I

FECHA IMPORT.: 08/09/2020

PUERTAS: 2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/12/2020	14/12/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000479950



	SAS								CRISTIAN CAMILO		
19380	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS	CL 93 NO. 14 - 71	7450912	lquintero@hehcol.com	TSX231	FUNZA	2013	16.5	MEDINA MUÑOZ OSCAR ARMANDO	19/12/2020	ACTIVO
19381	CONSORCIO EL DORADO 2019	CL 93 NO. 14 - 71 OF 201	3107696485	ambienta_dorado2019@hehcol.com	GUU435	FUNZA	2020	9.4	PEREZ VARGAS HAWER DAVID	19/12/2020	ACTIVO
19390	WILLIAM GARZON SAS	CL 131B NO 101A - 04		willi.transmat@hotmail.com	UFP604	BOGOTA	1996	15	WILLIAM GARZON	22/12/2020	ACTIVO
19404	IVAN JOHANY HERNANDEZ PULIDO	CR 8 A NO. 163 B - 56	3222199851	pulidoivan469@gmail.com	SZZ798	COTA	2013	16,580	IVAN HERNANDEZ	17/11/2020	ACTIVO
19406	IVAN JOHANY HERNANDEZ PULIDO	CR 8 A NO. 163 B - 56	3222199851	pulidoivan469@gmail.com	OMK259	GUACARI	1998	18,000	IVAN HERNANDEZ	29/12/2020	ACTIVO
19415	S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S	CL 96 A NO. 61 - 22 OF 101	4705118	ssingenieriacivil@gmail.com	WPR926	CHIA-CUNDINAMARCA	2021	10.1	LUIS EDUARDO CASAS LOPEZ	30/12/2020	ACTIVO
19423	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	JRR702	MOSQUERA	2021	21.2	MAQUINAS AMARILLAS SAS	04/01/2021	ACTIVO
19424	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	JRR792	MOSQUERA	2021	21	MAQUINAS AMARILLAS SAS	04/01/2021	ACTIVO
19425	MAQUINAS AMARILLAS	CR 17 NO. 142 - 25	3114774693	hseq@maquiamarillas.com	JRR793	MOSQUERA	2021	21	MAQUINAS AMARILLAS SAS	04/01/2021	ACTIVO
19430	KIMBERLY JOHANA RUIZ GUTIERREZ	CL 31 F SUR NO. 12 D - 81	3142608709	johanagut91@hotmail.com	TRK087	BELLO	2013	18,000	ANTONIO GONZALEZ	06/01/2021	ACTIVO
19433	PROCIVING SAS	CL 48 A NO. 71 A - 28	3837687	procivingsas@gmail.com	JTX454	FUNZA	2021	16	PEDRO ANCIETO VANEGAS TORRES	08/01/2021	ACTIVO
19443	PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A	CR 16 NO. 96 - 64 OF 407	6210189	info@proinark.com	WFT650	FUNZA	2013	15.2	IVAN FELIPE CASTIBLANCO SANTAMARÍA	13/01/2021	ACTIVO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2023-12-12	2023-12-14	2024-12-13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308005532501000	JTX454	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10824	2021

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35367274	3HTWYAHT9MN213519	3HTWYAHT9MN213519	15.90

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANABRIA NUNZABA, JUAN CARLOS	3125242195	CC	79698876	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	99993303	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

PAOLA MERCADO

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

BITACORA DE OBRA

7 Oficiales 1 Res. Obra 1 Res. Instalaciones 1 SST

Calidad Dr.

Jueves 29/02/24 En Consejo de Estado se continua con la restauracion de la Capintera en Madera. Bolsa piso 5 se instalan lamparas y se dejan con la proteccion para evitar el polvo, se reciben 395 cajas de porcelanato con su respectivo pegante y Boquilla, En piso 7 se continua con el retiro de Escombros se desmonta division de oficina drywall y se almacena el porcelanato. Calle 18 Oficina piso 4 se continua con la Construccion de los muros en Super Board, se continua con el ligado y pintura de los mismos piso 3 se continua con los Acabados en pintura y Actividades Electricas se inicia con la instalacion de los laminas de Drywall para cielo raso en oficina cobro Cartera se instala iluminacion en Hall principal piso 3 y se continua con la Ornamentacion para el Cerramiento.

Jefe de Obra

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes

Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes

Calle 18 Oficina: 1 Maestro 1 Ornamentador 1 Oficial 3 Ayudantes

1 Res. Obra 1 Res. Instalaciones 1 Res SST

Calidad Dr.

Viernes 01/03/24 En el dia de hoy el personal de Obra ingreso a labores a las 11:45am debido a que la entidad no radico el permiso solicitado el 26 de febrero. dejando al personal sin poder entrar al Edificio Bolsa, Edificio Calle 18 y Palacio. en el resto del dia solo se realizo actividad de Ornamentacion en piso 1 Bodega Calle 18, pintura y resane de muros en piso 4. En Bolsa pisos 5 y 6 se continua con el organizacion del Rack y en piso 7 se retira Escombro En calle 18 tambien. Se retiro un Viaje de 15mts de Escombros.

"personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 5 y 6: 2 Electros
Bolsa piso 7: 2 Ayudantes
Calle 15 Delicop: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante 1 Ornamentador
3 Electricos
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST.

Interventoria

Sabado 2/03/24 Consejo de Estado se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera, Muebles Cornizas y enchape de techos En Bolsa piso 5 y 6 Se Continua con la adecuacion del BACK En Bolsa piso 7 se termina el personal para iniciar la instalacion el dia Lunes. y de Marco En Delicop calle 15 Se Continua con la instalacion de los marcos en super Boreal, se masillan y pintan del piso 4 en piso 3 se Continua con los acabados en pintura.

"personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5 y 6: 2 Electricos.
Bolsa piso 7: 2 Ayudantes
Calle 15 Delicop: 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante. 1 Ornamentador.
3 Electricos
1 Res. Obra 1 Res Interventora 1 Res SST

Interventoria

Domingo 3/03/24 Se Continua con la Ornamentacion del Cerramiento en Bodega. piso 1 Se Continua con los acabados en pintura del piso 3 y pintura del piso 4

"personal: 1 Ornamentador. 2 Oficiales.
1 Ayudante.

El día de hoy se realiza Conexion Electrica de los puestos de trabajo en la oficina de profesionales del piso 3 se realizo con 3 Electricos.

Intendencia

Lunes 4/03/24 Consejo de Estado Se Continua con la restauracion de la Carpinteria en Madera Bolsa piso 5 Se Continua con la adecuacion del Rack En la Mañana se inicio con la instalacion del porcelanato del piso 5 En Bolsa piso 7 se realizo la demolicion del Enchape del Hall y se retiro el Escombro sobrante se realizo la desconexion del Cableado electrico y UTP al Rack. En Calle 14 Dellop Se Continuo Con la pintura y Masillado de muros del piso 4 se termino con la pintura del punto fijo y Escaleras En Dellop calle 14 piso 3 Se Continuo con las Actividades Electricas conexion electrica y de Datos. Se Continuo con el armado de los puertos para el Cerramiento de la Bodega piso 1 Se Continua con la instalacion del cielo raso en Drywall de Obra Continuo

"Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 5 y 7: 2 Ayudantes 1 Oficial 1 Alarmista 1 Electricista

Calle 14 Dellop: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante. 1 Ornamentador

3 Electricos

1 Res Obra 1 Res Instrumentista 1 Res SST

Intendencia

Martes 5/03/24 Consejo de Estado se continua con la restauracion de la Carpinteria en Madera en Bolsa piso 5 Se Continua con la instalacion de porcelanato, se Continua con la Actividad de Adecuacion del Rack y Cableado Electrico y de datos En Calle 14 se Continua con la pintura y masillado de muros en piso 4 En piso 3 se Continua Con la instalacion de cielo raso en Drywall, masillado de juntas y pintura de muros. en general Se Continua en piso 3 con

la actividad de cableado electrico. y de datos para la oficina de Cobro coactivo y porcelanato. Se continua con la Ornamentación del Cerramiento, construccion de puertas y rieles de fijacion

Personal
Sala Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5 y 7: 3 Electricos 2 Ayudantes
Calle 18: 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante 1 Ornamentador
3 Electricos.
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

Interventoria

Miercoles 6/03/19 Se realizan stock Estado Se continua con la instalacion de la Madera dejando hoy Zocalos, Cinchaje de muros y techos listos y con primera mano de pintura. En Bolsa piso 5 se continua con la adecuacion del Rack, Se Continua con el instalacion de porcelanato en piso 5 En Bolsa piso 7 Se inicia con los registros en piso para instalar ductos de 1/2 para cableado de puestos de trabajo. Se inicia con el resane de pared para alistar el piso para iniciar a instalar porcelanato En Calle 18 piso 4 Se Continua con la construcción de muros en super Board. Se Continua con el Masillado, lijado y pintura. En piso 3 Se inicia con la instalacion de los soportes en drywall para el Hall principal. Se termina de Masillar juntas se inicia con el lijado y pintura de cielo raso en oficina Cobro Coactivo. Se termina de instalar puertas corredizas del Cerramiento en madera de la Bodega piso 1.

Personal
Sala Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5 y 7 3 Electricos 2 Ayudantes
2 Oficiales
Calle 18: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante.

Powered by CamScanner

3 Electricos 1 Ornamentador.
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

Paul Vol 8'

Interventoria

Jueves 7/03/24 En Sede Consejo de Estado se continua con la restauracion de la Carpinteria en Madera, se restauran los faldones de Escritorios, los tapas de los escritorios, los Cornizas. y se instala muestra de Iluminacion en mesas. En Bolsa piso 5 se continua con la instalacion de pavimento en piso y se Inicia con la adecuacion del Cuarto Electrico y RACC se Continua con la nivelacion del piso regatas e instalacion de Morenas para instalar pavimento en Calle 18 piso 4 se Continua con la Construccion, lijado y pintura de los muros en super Board. en piso 3 se Continua con la instalacion del Cielo raso en Drywall del pasillo se realiza modulacion del mismo, se realiza lijado del Cielo raso de la Oficina Cobro Coactivo se instalan puntos para lamparas y se realiza la Pegada de los Lineales para los lamparas se realiza pulido de soldaduras e instalacion de manijas. se instala primera capa de Anticancelho gris al Cerramiento.

"Personal"
Sede Consejo de Estado: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5: 2 Ayudantes 1 Oficial.
Bolsa piso 6: 2 Electricos 1 Ayudante 1 Oficial.
Calle 18: 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes 3 Electricos
1 Ornamentador.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

Paul Vol 8.

Interventoria

Viernes 8/03/24 El dia de hoy se inician actividades de desmonte de la Carpintera en madera de la sala plena Corte Constitucional. y se Continua con la restauracion de la sala plena Consejo de Estado. El dia de hoy se realiza entrega de los

lamparas desmontadas en piso 5, 6 y 7 del Edificio Bolsa al personal de Almacen para su uso interno de la Entidad. Se Continuan las actividades Electricas en los pisos 7 y 5 en piso 7 se inicia la instalacion de perfileria se realiza verificacion de Escuadras y niveles se realiza corte de la placa para los regotas. que llevan los redes de Energia y Datos a los puestos de trabajo. En Calle 18 Delcop se Continua con acabados de pintura en piso 1 y 3 se da remates de pintura en oficina primer piso 2 se termina de dar acabado en pintura gris al Cerramiento de malla en Bodega piso 1 Se Continua con la instalacion de marcos en aluminio para lamparas y se Continua con la instalacion de techos regulados y normales en puestos de trabajo del piso 3 en piso 4 se Continua con los acabados en pintura de muros en super Board y Existentes primerados. Se Continuan con la instalacion de Aparatos en oficina cobro coactivo. "personal."

Consejo de Estado: 1 Maestro. 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial. 2 Ayudantes.
Bolsa: Piso 7: 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Electricos
Bolsa piso 5: 1 Electrico.
Calle 18 Delcop: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial 3 Electricos
1 Ornamentacion
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 SST

Interventoria

Sabado 4/03/24 Se Continua con la actividad de instalacion de lamparas en los Cuartos de Mayordomos de los Ascensores de palacio, en la Sala plena del Consejo de Estado y Corte Constitucional se Continua con la restauracion de la Carpinteria en Madera. Bolsa piso 6 se instala guarda escoba en oficinas nuevas y se Cambian pisos deteriorados en piso 7 y 5 se Continuan Las actividades Electricas en los Rack en

piso 7 se continua con la instalacion de porcelanato en Calle 18 delcop piso 1 y 3 se continua con arabados de pintura en piso 4 y se realiza instalacion de difusores en columnas y acabado de pintura en muros. Se realiza acta general de Obra. En Bolsa piso 5 se entrega guardo escoba en porcelanato

"personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial. 2 Ayudantes.
Bolsa piso 7 y 6: 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Electricos.
Bolsa piso 5: 1 Oficial.
Calle 18 delcop: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial 3 Electricos
1 Res. Obra. 1 Res. SST

Interventoria

Lunes 1/03/19 Se continua con la instalacion de Muros en drywall y lamparas en los cuartos de Magistrados de los Ascensores en pedestal. en 5.el u piso de Consejo de Estado y Corte Constitucional. Se continua con la restauracion de la carpinteria en madera en Bolsa piso 5 y 6 se continua con actividades Electricas. en Rack en Bolsa piso 7 se continua con la instalacion de porcelanato en piso. En calle 18 Delcop se continua con las actividades Electricas instalacion de ramos normal y regulada en puntos de trabajo en piso 3 y 4 se continua con la pintura de muros en oficinas y Bodegas. Se instalan lamparas y marcos. en oficinas de piso 3. y se continua con la instalacion de Mobbles y puestos de trabajo. Obra colectiva.

"personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes
Bolsa Piso 5, 6 y 7 1 Oficial 2 Ayudantes 2 Electricos
Calle 18 delcop: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial 3 Electricos.
1 Res. Obra 1 Res Interventoria 1 Res. SST

Interventoria

Martes 12/03/24 Se Continua Con la restauracion de la Carpintería en Madera de la Sala plena Consejo de Estado y Corte Constitucional. Bolsa piso 7 Se Continua con las actividades Electricas e instalacion de porcelanato Bolsa piso 5 y 6 Se Continua Con actividades Electricos en el Duck Pa Calle 18 Del cop Se Continua con Actividades Electricos instalando Tomas reguladas normales y de datos Se realiza Conexion del Tablero Electrico de la red de Alimentacion y cableado VTD. En piso 3 y 4 Se Continua con acabados en pintura e instalacion muebles Cobro continuo

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante.
Corte Constitucional: 1 Oficial. 2 Ayudantes
Bolsa piso 5, 6 y 7: 1 Oficial. 2 Ayudantes 2 Electricos.
Calle 18 Del cop: 1 Maestro 2 Ayudantes. 1 Oficial. 2 Electricos.
1 Res Obra. 1 Res Interventoria 1 Res. SST

Calle 18

Interventoria

Miercoles 13/03/24 Se Continua Con la restauracion de la Carpintería en Madera de la Sala plena Consejo de Estado y Corte Constitucional en Bolsa piso 7 Se Continua con la instalacion del porcelanato y actividades Electricos. En calle 18 almacen Se realizo limpieza del Duck del piso 1 para realizar conexion de la Red provisional de datos Se realiza fijacion del anclaje para estructura del portin del parqueadero en piso 1 Se realiza desmonte de muros en drywall para Habilitar puerta del transformador. Se termina instalacion de muebles de las oficinas de Cobro coactivo Se informa que el ascensor queda puesto de Servicio.

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante.
Corte Constitucional: 1 Ofical 2 Ayudantes
Bolsa Piso 6 y 7 1 Ofical. 2 Ayudantes Electricos.
Calle 18 almacen.: 1 Maestro 2 Ayudantes. 1 Oficial

Powered by CamScanner

1 Ornamentador. 3 Electricos.
1 Res. Obra 1 Res Interventoria 1 SST.

Interventoria

Jueves 14/03/24. En calle 18 almacen se inicia con retoque para entrega del piso 1 debidamente con una muestra de pintura todos los Oficinas y Corredor principal piso 1 y se termina la actividad de pintura y se inicia retoque general para entrega en piso 3 Se continuan actividades Electricas en oficina de Cobro coactivo. y provisionales. Se retira Escombro. en Via de Ingreso. En Sala plena Consejo de Estado y Corte Constitucional. Se Continua con la instalacion de la Cortina metalica en madera. En Bolsa piso 7 Se Continua con la instalacion del panelamento y afinado de piso se realizan retoques en piso para instalacion de tuberia. Electricas se retiran Escombros del Sotano.

"Personal"
Calle 18 Almacen: 1 Maestro 2 ayudantes. 1 Oficial. 3 Electricos
1 Ornamentador
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes.
Bolsa Piso 7: 1 Oficial. 4 Ayudantes. 2 Electricos.
1 Res Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. SST

Interventoria

Viernes 15/03/24 En dia de hoy se realiza entrega del los Oficinas del piso 1 se instalan los puntos de red funcionando y en bandeja del mezz. Piso se da Servicio. en el Rack con Conexion Electrica y de datos la entidad realiza traslado de Equipos y Funcionarios En Sala del Consejo de Estado y Corte Constitucional. Se Continua con la instalacion de la Cortina metalica en Madera en Bolsa piso 7 Se Continua con la instalacion

del perelonamo y Actividades Electricos en calle 18
Se recibe visita del personal de auditoria de la Entidad. Se Continua con la adecuacion y empleo del porton del perimetro. dejandolo funcional. para la Entrada de Vehiculos. presentes Se instalan puestos oficinas 1 y 2 en calle 18

"personal"
Calle 18 Almacen: 1 Maestro. 2 Ayudantes 1 Oficial 1 ornamentador
2 Electricos.
Corte de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial. 2 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 1 Oficial. 4 Ayudantes 2 Electricos.
1 Res Obra 1 Res Interventoria. 1 Res. 558

Interventoria

Sabado 6/03/24. En Consejo. Estado y Corte Constitucional. Se Continua con la instalacion de la Carpinteria en Madera. En Bolsa piso 7 S e Continua con la instalacion del perelonamo y afinado de piso con mortero. Se Continua con las actividades. Generales. y Se retira Escombro del sotano en calle 18 Almacen Se inician actividades de detallado de muros. En piso 3 Se Continua con la instalacion de los puntos de red y Electricos de los puestos de trabajo. Se realiza retiro de Escombros. y se realiza aseo al piso 3.

"personal"
Sala Consejo de Estado: 1 Maestro. 2 Oficiales 1 Ayudante.
Sala Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 1 oficial. 4 Ayudantes 2 Electricos
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria. 1 Res. 558
Calle 18 Almacen: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial.
2 Electricos.

Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes 18/03/24 En Consejo de Estado y sala de la Corte Constitucional se continua con la Restauracion de la Carpintera en Madera En el Edificio Bolsa piso 7 Se continua con la instalacion del piso en Porcelanato se realiza regata en piso y se instalan 7 tubos de 1"1/2 para la Energia y DATOS de los puestos de trabajo Se realiza retiro de cableado UTP para el sotano se termina Con el afinado de piso. En Calle 18 Almacen se Continua con aseo de Areas intervenidas en Piso 1,3 y 4 se realizo Corte del Super Board para puerta Oficina Director piso 2.

Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes
Bolsa piso 7: 1 Oficial 4 Ayudantes 2 Electricos
1 Res Obra 1 Res Intervencion 1 Res SST
Calle 18 Almacen: 1 Maestro 1 Oficial 1 Ayudante

Martes 19/03/24 En salas de Consejo de Estado y Corte Constitucional se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera En el Edificio Bolsa piso 7 se Continua con la instalacion de piso en porcelanato se terminan de instalar tubos de 1"1/2" para Energizar Puntos de trabajo y cableado de UTP Se Continuan las actividades Electricos para Adelantar conexiones que se realizaron en jornada de las 17:00 horas en adelante para no perjudicar las actividades diarios del Edificio en Calle 18 almacen Se Continua con el aseo general de las areas intervenidas. El personal de Almacen solicito un punto Electrico Trifacico para instalar cargador del Montacargas.

Personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes
Bolsa piso 7: 1 Oficial 3 Ayudantes 2 Electricos

Powered by CamScanner

Calle 18 Almacen: 1 Maestro 2 Ayudantes 1 Oficial.
1 Res. Obra 1 Res Intervenida 1 Res. SST

S/calle/18

Intervención

Miercoles 27/03/24 En la Sala del Consejo de Estado y Corte Constitucional se Continua con la restauración de la Carpintería en Madera. arnado de muros o instalación zocalos y anclajes a muros. En Bolsa piso 7 se instala la Canaleta y se realizan Conexiones para Creación de 1 Punto. En Bolsa piso 6 se identifica la red de Agua potable para conectar en Baño. Dirección. En Bolsa Piso 7 se Continua con la instalación de pañetes y Alistado de Piso. En calle 18 se Continua con Uso en las areas intervenidas y se Continua con actividades Electricas en Piso 1, 2 y 3

"Personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante.
Corte Constitucional: 1 oficial. 2 Ayudantes.
Bolsa Piso 7 y 6. 1 Oficial. 1 Ayudante 2 Electricos.
Calle 18 Almacen: 1 Maestro 1 Oficial. 3 Electricos.
1 Res. Obra 1 Res. Intervenida 1 SST. 537.

S/calle/18.

Intervención

Jueves 21/03/24 En la Sala del Consejo de Estado y Corte Constitucional se Continua con la restauración de la Carpintería en Madera. En Bolsa piso 7 se Continua con la instalación de pañetes. Se Continua con las actividades Electricas. En calle 18 almacen se realizo identificación del problema del Aforador. para poder operarlo en funcionamiento. en Piso 1, 2 y 3 se Continua con las actividades Electricas se Coloca en funcionamiento la iluminación del pasillo piso 3 se instala canaleta en oficina Bodega piso 1. En palacio comision judicial. se realiza construcción muro en Sygn Board. y en el Edificio Sede antes palacio se

instala oficialmente un gran ascensor en Sugar Board.
"personal.
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 1 Oficial 2 Ayudantes 2 Electricos.
Calle 18 almacen: 1 Maestro 1 Oficial 3 Electricos.
1 Res. Obra 1 Res Intervalvia 1 SST.

Interventoria

Viernes 22/03/24 En sede del Consejo de Estado y Corte Constitucional se continua con la restauracion de la carpintera en madera en piso 5 de Comisiones disciplina judicial se continua con la construccion del M. en Sugar Board por orden del ing. nestor se desmonto 2 puertas en Madera y se debe cortar el muro para instalar una de las puertas y rechazar dintel para instalar otra puerta en el Hall. En Bolsa piso 7 se continua con la instalacion del pavimento y se continua con las actividades electricas. En Calle 18 almacen se inician actividades para mantenimiento ascensor en piso 2 y 3 se continuan las actividades electricas en oficina direccion piso 2 y puestos de trabajo. area Bodega. se dejan programadas actividades en Bolsa y palacio semana Santa
"personal"
Consejo de Estado: 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante
Corte Constitucional 1 Oficial 2 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 1 Oficial 2 Ayudantes 2 Electricos.
Calle 18 almacen 1 Maestro 1 Oficial 3 Electricos.
1 Res Obra 1 Res Intervalvia 1 Res SST

Interventoria

Sabado 23/03/24 El dia de hoy no nos permitieron el ingreso al Edificio Bolsa debido a una contingencia documental en el piso 6 no se pueden desarrollar las actividades programadas para el fin de Semana y Semana Santa. En sede del Consejo de Estado

y Corte Constitucional. Se Continua con la instalacion de la Carpintería en Madera se realiza aseo general en sala pleno del Consejo de Estado para iniciar entrega a la entidad. En Bolsa piso 7 Se Continua con la instalación del parcelamiento Se Continua con actividades Electricas en el Rack. En Calle 18 almacen se termina aseo general piso 3 y Se Continua con las actividades Electricas. Se Continua con el Mantenimiento del Ascensor

"personal"

Consejo de Estado: 1 Maestro. 2 oficiales 1 Ayudante.

Corte Constitucional: 1 Oficial 2 Ayudantes

Bolsa piso 7: 1 oficial. 2 Ayudantes 2 Electricos

Calle 18 Almacen: 1 Maestro. 1 oficial. 1 Ayudante 3 Electricos

1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res SST

Jaulcol's

Interventoria

Viernes 26/03/21 En sala del Consejo de Estado se realiza corrección de detalles y Se Continua con instalacion de Mesas y Aseo general en Corte Constitucional. Se Continua con la instalacion de la Carpintería en Madera. En Bolsa piso 7 se Continua con la instalacion del parcelamiento y se Continuan con las Actividades Electricas. En calle 18 Almacen se Continua con el Mantenimiento del Ascensor. Se Continua con las actividades electricos en piso 2 oficina almacen. Se terminan actividades en sala consejo de Estado. Listo para entrega.

"personal.

Sala Consejo de Estado: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante.

Corte Constitucional: 1 oficial. 2 Ayudantes.

Bolsa piso 7 1 oficial 2 Ayudantes 2 Electricos.

Calle 18 almacen: 1 Maestro. 1 oficial. 1 Ayudante. 3 Electricos.

1 Res. Obra 1 Res Interventor 1 Res. SST.

Jaulcol's

Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles 27/03/24 En la Sala plena del Consejo de Estado se realizan los ultimos toques de pintura y aseo general. en la Corte Constitucional se Continuo con la restauración de la Carpintería en Madera. En Bolsa piso 7 se Continuo con la instalación de porcelanato y Acometidas Electricas. en piso 7, 6 y 5 En Cadena 18 almacen se termino el dado circular y las cuatro Rosas de las oficinas de Cobro coactivo. y se realiza aseo de Obra Se dejan dimensiones piso techo del piso 6 Bolsa de Bogota para instalación. despues de semana Santa.

*personal.
Consejo de Estado 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante.
Corte Constitucional 1 Oficial 2 Ayudantes.
Bolsa. Piso 7 : 1 Oficial 2 Ayudantes 2 Electricos
Cadena 18 Almacen. 1 Maestro 1 Oficial 1 Ayudante 3 Electricos.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

Interventoria

Jueves 28/03/24 En la Sala de la Corte Constitucional y Consejo de Estado. Se Continuo con las actividades de Restauración de pintura En Corte Constitucional se realizo Matizado, y pintura cielo Raso yeso retomado, instalacion y pintura de piso en Madera, adecuacion de nuevos puntos Electricos y de Datos. Instalacion Zocalo: pintura e instalacion de Enchape Vertical Corte, pintura e instalacion de remate de Cornisa pintura de puertas, pintura e instalacion nuevos mugisnados en Sala plena policharo Mesa magistrados, pintura y instalacion de mesas presidente y Secretaria

*personal.
Sala Corte Constitucional y Consejo de Estado 2 oficiales 2 Ayudantes. iniciaron Bien y terminaron Bien del 27/02/24.

Interventoria

Viernes 29/03/24 En Corte de Estado y Corte Constitucional se continua con pintura ciclo ruso, pulichado de mesas y instalacion de focos y enchape vertical. Se continua con la instalacion electrica y de datos pintura de mesas magistrados

"personal
Corte Constitucional: 1 Maestro 2 oficiales 1 Ayudante
Consejo de Estado: 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Electrico

Sabado 30/03/24 En Consejo de Estado se continua con el pulichado de mesas. presidente y Secretaria en Corte Constitucional. Se Continua con las Acometidas Electricos, Montaje de Mesas y pintura ciclo ruso instalacion de Socalo pin metal.

"personal"
Corte Constitucional: 1 Maestro 2 Oficiales 1 Ayudante
Consejo de Estado: 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Electrico.

Domingo 31/03/24 En Corte Constitucional se continua con instalaciones Electricos, pintura de piso en Madera, instalacion de zocalo pintura e instalacion enchape Vertical. Consejo de Estado se realiza aseo general para entrega.

"personal"
Corte Constitucional: 1 Maestro 2 oficiales 2 Ayudantes 1 Electrico
Consejo Estado 1 Ayudante 2 oficiales
