ACTA DE COBRO N° 08

PERIODO: DEL 26 DE ABRIL DEL 2024 AL 26 DE MAYO DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

1. OFICIO DE RADICACION

Bogotá D.C, 11 de julio de 2024 TOTALL-112-RJ-097

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL
Arq. Daniel Merchán
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
Tel: 310 852 5132
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".


Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 08

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 08 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
    1. Plan de Calidad
    2. PGAS
    3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,



Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

2. LISTA DE CHEQUEO

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	8

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 8	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		
3*	**Balance Financiero del Contrato de Interventoría.** Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	**CUMPLE**		
4*	**Cumplido técnico contrato de Interventoría.** Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		**N/A**	
5*	**Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra** Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	**CUMPLE**		
6*	**Acta parcial de pago de Interventoría**	**CUMPLE**		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra $ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría $ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
8*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	**CUMPLE**		
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	**CUMPLE**		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	8

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 8	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
10*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	**CUMPLE**		
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		
12*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad		**N/A**	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		
14	**Informe de Interventoría.** Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	**CUMPLE**		
	Certificación entrada a almacén			
15	Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

CONSULTOR INTERVENTORIA : TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL : $222.158.720,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $111.079.360,00
ADICIONAL EN VALOR No. 2 $55.539.680,00
ADICIONAL EN VALOR No. 3 $55.539.680,00
VALOR TOTAL : $444.317.440,00
FECHA DE INICIO : 26-oct.-23
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Cincuenta y cinco (55) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : Sesenta (60) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 3 Treinta (30) dias calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 23-jun.-24
PERIODO DEL CORTE : 26 ABRIL AL 26 MAYO 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)					$0,00	$0,00	$444.317.440,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	$16.807.550,46	$0,00	$0,00	$16.807.550,46	$427.509.889,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. 36)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	$22.372.203,87	$0,00	$0,00	$22.372.203,87	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. 64)	28 diciembre - 26 enero 2024	OBRA	$34.023.212,80	$0,00	$0,00	$34.023.212,80	$371.114.472,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. 68)	26 enero 2024 - 26 febrero 2024	OBRA	$30.708.152,82	$0,00	$0,00	$30.708.152,82	$340.406.320,05
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. 84)	26 febrero 2024 - 26 marzo 2024	OBRA	$26.025.081,39	$0,00	$0,00	$26.025.081,39	$314.381.238,66
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No. 86)	26 marzo 2024 - 26 abril 2024	OBRA	$9.346.165,84	$0,00	$0,00	$9.346.165,84	$305.035.072,82
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No. 93)	26 marzo 2024 - 26 abril 2024	OBRA	$12.624.250,68	$0,00	$0,00	$12.624.250,68	$292.410.822,14
ACTA DE CORTE Nº 8 (Fact. No. 94)	26 abril 2024 - 26 mayo 2024	OBRA	$62.513.859,33	$0,00	$0,00	$62.513.859,33	$229.896.962,81
TOTALES			**$214.420.477,19**		**$0,00**	**$214.420.477,19**	**$229.896.962,81**

SALDO POR EJECUTAR	**$229.896.962,81**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR CORTE POR PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)	OBRA		$0,00		$0,00	$444.317.440,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	OBRA	18/01/2024	$16.807.550,46		$0,00	$427.509.889,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. 36)	OBRA	8/02/2024	$22.372.203,87		$0,00	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. 64)	OBRA		$0,00		$34.023.212,80	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. 68)	OBRA		$0,00		$30.708.152,82	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. 84)	OBRA		$0,00		$26.025.081,39	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No. 86)	OBRA		$0,00		$9.346.165,84	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No. 93)	OBRA		$0,00		$12.624.250,68	$405.137.685,67
ACTA DE CORTE Nº 8 (Fact. No. 94)	OBRA		$0,00		$62.513.859,33	$405.137.685,67
TOTALES			**$39.179.754,33**		**$175.240.722,86**	**$405.137.685,67**

SALDO POR PAGAR	**$405.137.685,67**

VALOR A LIBERAR	**$0,00**

FERNANDO JIMÉNEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

DANIEL MERCHÁN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

CUMPLIDO CONTRATO DE INTERVENTORIA 112 DE 2023

El suscrito, Arquitecto DANIEL MERCHAN CEPEDA, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura de la Unidad Administrativa, como supervisor del contrato de Interventoría No. 112 de 2023, del proceso de selección CM-03-2022 del SECOP II, hago constar que:

TOTALL INC SSA BIC, identificado con Nit. Nº 901.620.351-9, ha cumplido con los compromisos y responsabilidades contemplados en el contrato de interventoría suscrito con La Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."*., por lo cual se **AUTORIZA** el pago del Acta parcial de interventoría **No. 8** por valor de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C ($ 62.513.859,33),** con la **Factura Electrónica de Venta N° FEV 104** de fecha expedición 2 de agosto de 2024, la cual se detalla a continuación:

ACTA PARCIAL	FACTURA	RP	PERIODO	VALOR
Corte No. 8	FEV 104	285323-2023	26 abr – 26 may 2024	$ 62.513.859,33
TOTAL A PAGAR				**$ 62.513.859,33**

El presente cumplido se expide en Bogotá D.C. el día 5 del mes de agosto de 2024.

DANIEL MERCHAN CEPEDA
Profesional Universitario
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
Unidad Administrativa
Supervisor del Proyecto

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°8

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5													
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.956,00	$ 12.956,00	+	8,00	$ 103.648,00		$ 0,00	9,00	$ 116.604,00	9,00	$ 116.604,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN	1,00	$ 18.314,00	$ 18.314,00	+	2,00	$ 36.628,00		$ 0,00	3,00	$ 54.942,00	3,00	$ 54.942,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 8.090,00	$ 8.090,00	+	13,00	$ 105.170,00		$ 0,00	14,00	$ 113.260,00	14,00	$ 113.260,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML	1,00	$ 3.686,00	$ 3.686,00	+	46,12	$ 169.998,32		$ 0,00	47,12	$ 173.684,32	47,12	$ 173.684,32
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML	1,00	$ 6.103,00	$ 6.103,00	+	7,16	$ 43.697,48		$ 0,00	8,16	$ 49.800,48	8,16	$ 49.800,48
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 10.997,00	$ 10.997,00	+	17,00	$ 186.949,00		$ 0,00	18,00	$ 197.946,00	18,00	$ 197.946,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML	1,00	$ 2.749,00	$ 2.749,00	+	15,00	$ 41.235,00		$ 0,00	16,00	$ 43.984,00	16,00	$ 43.984,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN	1,00	$ 105.138,00	$ 105.138,00	-	-1,00	$ 105.138,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN	1,00	$ 14.145,00	$ 14.145,00	-	-1,00	$ 14.145,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML	1,00	$ 19.537,00	$ 19.537,00	-	-1,00	$ 19.537,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 14.913,00	$ 14.913,00	-	-1,00	$ 14.913,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	1,00	$ 289.093,00	$ 289.093,00	-	-1,00	$ 289.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML	1,00	$ 30.082,00	$ 30.082,00	-	-1,00	$ 30.082,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada	ML	1,00	$ 188.831,00	$ 188.831,00	-	-1,00	$ 188.831,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 18.106,00	$ 18.106,00	-	-1,00	$ 18.106,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 4.053,00	$ 4.053,00	-	-1,00	$ 4.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2	1,00	$ 37.009,00	$ 37.009,00	-	-1,00	$ 37.009,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML	1,00	$ 8.173,00	$ 8.173,00	-	-1,00	$ 8.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 11.318,00	$ 11.318,00	-	-1,00	$ 11.318,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 11.601,00	$ 11.601,00	-	-1,00	$ 11.601,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 5.669,00	$ 5.669,00	-	-1,00	$ 5.669,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 10.600,00	$ 10.600,00	+	84,29	$ 893.474,00		$ 0,00	85,29	$ 904.074,00	85,29	$ 904.074,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 12.152,00	$ 12.152,00	-	-1,00	$ 12.152,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 12.703,00	$ 12.703,00	-	-1,00	$ 12.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2	1,00	$ 12.053,00	$ 12.053,00	-	-1,00	$ 12.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 5.513,00	$ 5.513,00	+	44,35	$ 244.501,55		$ 0,00	45,35	$ 250.014,55	45,35	$ 250.014,55
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 6.487,00	$ 6.487,00	-	-1,00	$ 6.487,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 19.241,00	$ 19.241,00	-	-1,00	$ 19.241,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 40.606,00	$ 40.606,00	-	-1,00	$ 40.606,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2	1,00	$ 72.398,00	$ 72.398,00	-	-1,00	$ 72.398,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 15.067,00	$ 15.067,00	-	-1,00	$ 15.067,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2	1,00	$ 14.170,00	$ 14.170,00	+	42,73	$ 605.484,10		$ 0,00	43,73	$ 619.654,10	43,73	$ 619.654,10
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	1,00	$ 24.395,00	$ 24.395,00	-	-1,00	$ 24.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y	UN	1,00	$ 35.237,00	$ 35.237,00	-	-1,00	$ 35.237,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 59.197,00	$ 59.197,00	-	-1,00	$ 59.197,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML	1,00	$ 23.322,00	$ 23.322,00	-	-1,00	$ 23.322,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición	M3	1,00	$ 336.257,00	$ 336.257,00	-	-1,00	$ 336.257,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 54.128,00	$ 54.128,00	-	-1,00	$ 54.128,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 28.687,00	$ 28.687,00	-	-1,00	$ 28.687,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 29.343,00	$ 29.343,00	-	-1,00	$ 29.343,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 66.596,00	$ 66.596,00	-	-1,00	$ 66.596,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 23.443,00	$ 23.443,00	-	-1,00	$ 23.443,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 36.170,00	$ 36.170,00	-	-1,00	$ 36.170,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 30.862,00	$ 30.862,00	-	-1,00	$ 30.862,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 48.952,00	$ 48.952,00	-	-1,00	$ 48.952,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2	1,00	$ 82.887,00	$ 82.887,00	-	-1,00	$ 82.887,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 213.385,00	$ 213.385,00	-	-1,00	$ 213.385,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML	1,00	$ 129.405,00	$ 129.405,00	-	-1,00	$ 129.405,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN	1,00	$ 14.475,00	$ 14.475,00	-	-1,00	$ 14.475,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN	1,00	$ 234.377,00	$ 234.377,00	-	-1,00	$ 234.377,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 3.997,00	$ 3.997,00	-	-1,00	$ 3.997,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	1,00	$ 12.219,00	$ 12.219,00	-	-1,00	$ 12.219,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.1	Excavación manual. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	1,00	$ 30.023,00	$ 30.023,00	-	-1,00	$ 30.023,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	Relleno en recebo compactado a máquina e=0.20 m. (Incluye trasiego, equipos	M3	1,00	$ 68.696,00	$ 68.696,00	-	-1,00	$ 68.696,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.3	Relleno Recebo B200 - Base granular Tipo 1 , compactado. (Incluye trasiego,	M2	1,00	$ 96.509,00	$ 96.509,00	-	-1,00	$ 96.509,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.4	Relleno Recebo B400, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 111.831,00	$ 111.831,00	-	-1,00	$ 111.831,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.5	Relleno Recebo B600, compactado. (Incluye trasiego, equipos y compactación)	M3	1,00	$ 116.987,00	$ 116.987,00	-	-1,00	$ 116.987,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	1,00	$ 20.643,00	$ 20.643,00	-	-1,00	$ 20.643,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Concreto de limpieza 14 MPa (2000 psi) e=5cm	M2	1,00	$ 15.407,00	$ 15.407,00	-	-1,00	$ 15.407,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3	Concreto ciclópeo rajón 40% concreto 60%	M3	1,00	$ 442.051,00	$ 442.051,00	-	-1,00	$ 442.051,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	Zapatas en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M3	1,00	$ 721.408,00	$ 721.408,00	-	-1,00	$ 721.408,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5	Sobrecimiento en tolete	ML	1,00	$ 36.099,00	$ 36.099,00	-	-1,00	$ 36.099,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.6	Vigas de cimentación en concreto de 17,5MPa (2500 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 237.345,00	$ 237.345,00	-	-1,00	$ 237.345,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M3	1,00	$ 685.272,00	$ 685.272,00	-	-1,00	$ 685.272,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.8	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye	M3	1,00	$ 721.903,00	$ 721.903,00	-	-1,00	$ 721.903,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	Columnas en concreto 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida.	M3	1,00	$ 865.466,00	$ 865.466,00	-	-1,00	$ 865.466,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.10	Viga canal en concreto 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M3	1,00	$ 931.749,00	$ 931.749,00	-	-1,00	$ 931.749,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
3.11	Viga cinta en concreto h =0.05 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.083,00	$ 46.083,00	-	-1,00	$ 46.083,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta,	ML	1,00	$ 46.032,00	$ 46.032,00	-	-1,00	$ 46.032,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 81.230,00	$ 81.230,00	-	-1,00	$ 81.230,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.14	Placa contrapiso en concreto h= 10 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 95.266,00	$ 95.266,00	-	-1,00	$ 95.266,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 111.713,00	$ 111.713,00	-	-1,00	$ 111.713,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.16	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 186.508,00	$ 186.508,00	-	-1,00	$ 186.508,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.17	Placa maciza en concreto h= 20 cm - 24,5MPa (3500 psi). (Incluye equipos,	M2	1,00	$ 203.704,00	$ 203.704,00	-	-1,00	$ 203.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.18	Placa de entrepiso tipo corpalosa, metaldeck o similar, concreto 3000 PSI.	M2	1,00	$ 158.175,00	$ 158.175,00	-	-1,00	$ 158.175,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.19	Lamina metaldeck 2" calibre 20 colaborante. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 49.703,00	$ 49.703,00	-	-1,00	$ 49.703,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.20	Escalera en concreto de 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta,	M3	1,00	$ 953.125,00	$ 953.125,00	-	-1,00	$ 953.125,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.	**REFUERZOS Y ANCLAJES**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 3.677,00	$ 3.677,00	-	-1,00	$ 3.677,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 4.474,00	$ 4.474,00	-	-1,00	$ 4.474,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	Grafil de acero de refuerzo. (Suministro e intalaación)	KG	1,00	$ 2.903,00	$ 2.903,00	-	-1,00	$ 2.903,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1,00	$ 4.748,00	$ 4.748,00	-	-1,00	$ 4.748,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.053,00	$ 15.053,00	-	-1,00	$ 15.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 11.551,00	$ 11.551,00	-	-1,00	$ 11.551,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.7	Anclaje epóxico 3/4". Profundidad estándar 17cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 21.451,00	$ 21.451,00	-	-1,00	$ 21.451,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.8	Anclaje epóxico 5/8". Profundidad estándar 14cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 15.247,00	$ 15.247,00	-	-1,00	$ 15.247,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.9	Anclaje epóxico 1". Profundidad estándar 23cm. (Incluye perforación, epóxico,	UN	1,00	$ 31.613,00	$ 31.613,00	-	-1,00	$ 31.613,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.	**MAMPOSTERÍA**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 92.751,00	$ 92.751,00	-	-1,00	$ 92.751,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	Muro en ladrillo prensado liviano 24x12x6 cm, h<50cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 56.313,00	$ 56.313,00	-	-1,00	$ 56.313,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 43.848,00	$ 43.848,00	-	-1,00	$ 43.848,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 27.354,00	$ 27.354,00	-	-1,00	$ 27.354,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	1,00	$ 46.480,00	$ 46.480,00	-	-1,00	$ 46.480,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.6	Muro en bloque No.5. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de	ML	1,00	$ 28.304,00	$ 28.304,00	-	-1,00	$ 28.304,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.7	Muro en ladrillo portante prensado 26x12x6 tipo santafe o similar. (Suministro e	M2	1,00	$ 131.339,00	$ 131.339,00	-	-1,00	$ 131.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.8	Mesón en concreto ancho = 60cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 141.452,00	$ 141.452,00	-	-1,00	$ 141.452,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.9	Dinteles en bloque y acero de refuerzo. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 42.207,00	$ 42.207,00	-	-1,00	$ 42.207,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 49.136,00	$ 49.136,00	-	-1,00	$ 49.136,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.11	Dintel en concreto 3000 psi, 15x20 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 68.983,00	$ 68.983,00	-	-1,00	$ 68.983,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	Dintel en concreto de 20x20x40. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	1,00	$ 80.410,00	$ 80.410,00	-	-1,00	$ 80.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	Alfajía en ladrillo prensado. (Incluye materiales, instalación, anclajes	ML	1,00	$ 45.815,00	$ 45.815,00	-	-1,00	$ 45.815,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	Alfajía en concreto 2500 PSI. Ancho =15-20 cm (Incluye fundida, refuerzo,	ML	1,00	$ 49.403,00	$ 49.403,00	-	-1,00	$ 49.403,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.15	Poceta de aseo en mampostería, enchapada en ceramica. (Incluye fabricación,	UN	1,00	$ 335.619,00	$ 335.619,00	-	-1,00	$ 335.619,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.16	Corte ladrillo (Incluye equipos y herramientas)	UN	1,00	$ 316,00	$ 316,00	-	-1,00	$ 316,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2	1,00	$ 86.845,00	$ 86.845,00	+	7,06	$ 613.125,70		$ 0,00	8,06	$ 699.970,70	8,06	$ 699.970,70

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 56.445,00	$ 56.445,00	-	-1,00	$ 56.445,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	1,00	$ 48.003,00	$ 48.003,00	-	-1,00	$ 48.003,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	M2	1,00	$ 89.843,00	$ 89.843,00	-	-1,00	$ 89.843,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	ML	1,00	$ 67.096,00	$ 67.096,00	-	-1,00	$ 67.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel,	ML	1,00	$ 80.220,00	$ 80.220,00	-	-1,00	$ 80.220,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 14.539,00	$ 14.539,00	-	-1,00	$ 14.539,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 33.808,00	$ 33.808,00	+	86,33	$ 2.918.644,64		$ 0,00	87,33	$ 2.952.452,64	87,33	$ 2.952.452,64
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 17.758,00	$ 17.758,00	-	-1,00	$ 17.758,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.3	Alistado pisos en mortero 1:6, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 18.751,00	$ 18.751,00	-	-1,00	$ 18.751,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 25.035,00	$ 25.035,00	-	-1,00	$ 25.035,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.5	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 8cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 47.467,00	$ 47.467,00	-	-1,00	$ 47.467,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.6	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 65.462,00	$ 65.462,00	-	-1,00	$ 65.462,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.7	Piso en concreto endurecido 3000 psi e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 144.833,00	$ 144.833,00	-	-1,00	$ 144.833,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.8	Alistado pisos en Concreto escobeado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 78.260,00	$ 78.260,00	-	-1,00	$ 78.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.9	Alistado pisos rampas en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye estriado, dilataciones, fundida, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.094,00	$ 77.094,00	-	-1,00	$ 77.094,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.10	Nivelación de piso para instalación piso vinilo tipo Mástico (liquido + polvo) e= 3-8 mm (Suministro y aplicación. Incluye deshaste de superficie, reparación de	M2	1,00	$ 41.962,00	$ 41.962,00	-	-1,00	$ 41.962,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.11	Concreto base mueble h= 10cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	1,00	$ 77.301,00	$ 77.301,00	-	-1,00	$ 77.301,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.665,00	$ 23.665,00	-	-1,00	$ 23.665,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.519,00	$ 21.519,00	-	-1,00	$ 21.519,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.3	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 27.895,00	$ 27.895,00	-	-1,00	$ 27.895,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4	Pañete impermeabilizado 1:4 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 24.268,00	$ 24.268,00	-	-1,00	$ 24.268,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.5	Pañete rústico muros 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 14.824,00	$ 14.824,00	-	-1,00	$ 14.824,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6	Pañete bajo placa 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 23.016,00	$ 23.016,00	-	-1,00	$ 23.016,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7	Pañete bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 17.072,00	$ 17.072,00	-	-1,00	$ 17.072,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.8	Pañete rústico bajo placa 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.736,00	$ 22.736,00	-	-1,00	$ 22.736,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9	Pañete bajo malla 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.651,00	$ 22.651,00	-	-1,00	$ 22.651,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
8.10	Pañete bajo malla 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 22.284,00	$ 22.284,00
8.11	Pañete bajo malla 1:5 (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 21.198,00	$ 21.198,00
8.12	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo tipo Sika transparente o similar a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2	1,00	$ 22.656,00	$ 22.656,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 12.297,00	$ 12.297,00
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	1,00	$ 15.819,00	$ 15.819,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 9.259,00	$ 9.259,00
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	1,00	$ 85.805,00	$ 85.805,00
9.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 68.281,00	$ 68.281,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	1,00	$ 80.151,00	$ 80.151,00
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 13.148,00	$ 13.148,00
9.5	Rejilla para reventilacion en cielo raso de 60x60. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.557,00	$ 53.557,00
9.6	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	1,00	$ 231.570,00	$ 231.570,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 6.566,00	$ 6.566,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.648,00	$ 10.648,00
10.3	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.967,00	$ 15.967,00
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 15.209,00	$ 15.209,00
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 10.887,00	$ 10.887,00
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 26.291,00	$ 26.291,00
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 18.160,00	$ 18.160,00
10.8	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,00	$ 20.094,00	$ 20.094,00
10.9	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.859,00	$ 14.859,00
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.447,00	$ 8.447,00
10.11	Pintura anticorrosiva en lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 8.588,00	$ 8.588,00
10.12	Pintura anticorrosiva canal en lámina. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.402,00	$ 8.402,00
10.13	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	1,00	$ 14.430,00	$ 14.430,00
10.14	Pintura esmalte madera lineal. (Suministro y aplicación)	ML	1,00	$ 8.512,00	$ 8.512,00
10.15	Pintura en esmalte para estructura metálica por m2 de area cubierta. (Incluye equipo, pintura de todos los elementos metálicos a la vista)	M2	1,00	$ 20.409,00	$ 20.409,00
10.16	Pintura en esmalte, demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	ML	1,00	$ 17.917,00	$ 17.917,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 22.284,00
-	-1,00	$ 21.198,00
-	-1,00	$ 22.656,00
-	-1,00	$ 12.297,00
-	-1,00	$ 15.819,00
-	-1,00	$ 9.259,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 85.805,00
-	-1,00	$ 68.281,00
-	-1,00	$ 80.151,00
-	-1,00	$ 13.148,00
-	-1,00	$ 53.557,00
-	-1,00	$ 231.570,00
-	0,00	$ 0,00
+	59,06	$ 387.787,96
-	-1,00	$ 10.648,00
-	-1,00	$ 15.967,00
+	226,15	$ 3.439.515,35
+	85,62	$ 932.144,94
-	-1,00	$ 26.291,00
-	-1,00	$ 18.160,00
-	-1,00	$ 20.094,00
-	-1,00	$ 14.859,00
-	-1,00	$ 8.447,00
-	-1,00	$ 8.588,00
-	-1,00	$ 8.402,00
-	-1,00	$ 14.430,00
-	-1,00	$ 8.512,00
-	-1,00	$ 20.409,00
-	-1,00	$ 17.917,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
113,57	$ 1.727.286,13	113,58	$ 1.727.438,22	227,15	$ 3.454.724,35
	$ 0,00	86,62	$ 943.031,94	86,62	$ 943.031,94
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
10.17	Pintura de guardaescoba en esmalte negro.	ML	1,00	$ 11.264,00	$ 11.264,00	-	-1,00	$ 11.264,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.1	Piso en baldosa granito 33x33. (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 112.056,00	$ 112.056,00	-	-1,00	$ 112.056,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.2	Piso en granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	1,00	$ 126.851,00	$ 126.851,00	-	-1,00	$ 126.851,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.3	Piso en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida,cristalizada y brillada necesarios)	M2	1,00	$ 195.687,00	$ 195.687,00	-	-1,00	$ 195.687,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida,	M2	1,00	$ 20.733,00	$ 20.733,00	-	-1,00	$ 20.733,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.5	Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado,	ML	1,00	$ 43.663,00	$ 43.663,00	-	-1,00	$ 43.663,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.6	Cenefas en Granito Pulido franjas menores a 50 cm. (Incluye equipos,	ML	1,00	$ 46.157,00	$ 46.157,00	-	-1,00	$ 46.157,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 22.461,00	$ 22.461,00	-	-1,00	$ 22.461,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.8	Guardaescoba en Mármol. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 98.137,00	$ 98.137,00	-	-1,00	$ 98.137,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.9	Gravilla lavada para bocapuertas o cenefas. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 28.395,00	$ 28.395,00	-	-1,00	$ 28.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.10	Piso en ceramica baños. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 47.594,00	$ 47.594,00	-	-1,00	$ 47.594,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.11	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 70.916,00	$ 70.916,00	-	-1,00	$ 70.916,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.12	Piso en cerámica Duropiso 33,8x33,8 cms o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 71.823,00	$ 71.823,00	-	-1,00	$ 71.823,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.13	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 19.231,00	$ 19.231,00	-	-1,00	$ 19.231,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2	1,00	$ 97.561,00	$ 97.561,00	-	-1,00	$ 97.561,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 25.755,00	$ 25.755,00	+	44,23	$ 1.139.143,65		$ 0,00	45,23	$ 1.164.898,65	45,23	$ 1.164.898,65
11.16	Piso en madera laminada tráfico comercial. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 109.502,00	$ 109.502,00	-	-1,00	$ 109.502,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno,	M2	1,00	$ 133.911,00	$ 133.911,00	-	-1,00	$ 133.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	1,00	$ 146.671,00	$ 146.671,00	-	-1,00	$ 146.671,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.19	Piso en madera liston mh amarillo. (Suministro e instalación. Incluye jumbolón,	M2	1,00	$ 81.907,00	$ 81.907,00	-	-1,00	$ 81.907,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.20	Piso en madera liston mh guayacan. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 132.058,00	$ 132.058,00	-	-1,00	$ 132.058,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.21	Pulida y lacada pisos en madera natural. (Incluye equipos, pulido, sellado y	M2	1,00	$ 41.616,00	$ 41.616,00	-	-1,00	$ 41.616,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.556,00	$ 20.556,00	-	-1,00	$ 20.556,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.23	Guardaescoba en PVC. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 44.427,00	$ 44.427,00	-	-1,00	$ 44.427,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.24	Piso Vinilo tipo Vinisol 30x30. Tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 43.776,00	$ 43.776,00	-	-1,00	$ 43.776,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.25	Piso en Vinilo tráfico pesado. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 144.861,00	$ 144.861,00	-	-1,00	$ 144.861,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.26	Piso en Vinilo antiestático. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 207.511,00	$ 207.511,00	-	-1,00	$ 207.511,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.27	Guardaescoba en Vinilo. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes	ML	1,00	$ 10.273,00	$ 10.273,00	-	-1,00	$ 10.273,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.28	Piso en Tableta de Gres tipo Etrusca 7x25 cm. (Suministro e instalación.	M2	1,00	$ 41.583,00	$ 41.583,00	-	-1,00	$ 41.583,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.29	Piso en Tablón Gres Latino liso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 56.289,00	$ 56.289,00	-	-1,00	$ 56.289,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.30	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.576,00	$ 20.576,00	-	-1,00	$ 20.576,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.31	Guardaescoba en Mortero. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.314,00	$ 14.314,00	-	-1,00	$ 14.314,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.023,00	$ 14.023,00	-	-1,00	$ 14.023,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	1,00	$ 51.291,00	$ 51.291,00	-	-1,00	$ 51.291,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.34	Media caña en Granito fundido. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	ML	1,00	$ 62.452,00	$ 62.452,00	-	-1,00	$ 62.452,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.35	Enchape pared cerámica tipo Egeo 20,5x20,5 cm o similar. (Suministro e	ML	1,00	$ 60.812,00	$ 60.812,00	-	-1,00	$ 60.812,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.36	Enchape pared cerámica 20x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.854,00	$ 77.854,00	-	-1,00	$ 77.854,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
11.37	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 75.008,00	$ 75.008,00	-	-1,00	$ 75.008,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 77.214,00	$ 77.214,00	-	-1,00	$ 77.214,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.39	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y	ML	1,00	$ 87.172,00	$ 87.172,00	-	-1,00	$ 87.172,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 654.844,00	$ 654.844,00	-	-1,00	$ 654.844,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.41	Mesón en Mármol CAFÉ PINTA. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 374.655,00	$ 374.655,00	-	-1,00	$ 374.655,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 175.254,00	$ 175.254,00	-	-1,00	$ 175.254,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.43	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.259,00	$ 18.259,00	-	-1,00	$ 18.259,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.44	Suministro e instalación de piso tipo deck WPC clic aligerado (lámina 16cm de	M2	1,00	$ 276.673,00	$ 276.673,00	-	-1,00	$ 276.673,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.45	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la	ML	1,00	$ 12.333,00	$ 12.333,00	-	-1,00	$ 12.333,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.	**CUBIERTA**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2	1,00	$ 62.059,00	$ 62.059,00	-	-1,00	$ 62.059,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.2	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e	M2	1,00	$ 42.530,00	$ 42.530,00	-	-1,00	$ 42.530,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.3	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio, e=3,2mm.	M2	1,00	$ 85.987,00	$ 85.987,00	-	-1,00	$ 85.987,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.4	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y	M2	1,00	$ 252.809,00	$ 252.809,00	-	-1,00	$ 252.809,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.5	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío	M2	1,00	$ 272.567,00	$ 272.567,00	-	-1,00	$ 272.567,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.6	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=38mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 143.309,00	$ 143.309,00	-	-1,00	$ 143.309,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.7	Teja Tipo Sandwich prepintada, e=50mm Cal. 26, con aislamiento en	M2	1,00	$ 195.532,00	$ 195.532,00	-	-1,00	$ 195.532,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.8	Caminaderos Metálicos sobre teja Tipo Sandwich. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 194.542,00	$ 194.542,00	-	-1,00	$ 194.542,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.9	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos	M2	1,00	$ 111.182,00	$ 111.182,00	-	-1,00	$ 111.182,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 426.436,00	$ 426.436,00	-	-1,00	$ 426.436,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.11	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 249.808,00	$ 249.808,00	-	-1,00	$ 249.808,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.12	Cubierta en policarbonato macizo e= 6 mm, color cristal. (Suministro e	M2	1,00	$ 429.412,00	$ 429.412,00	-	-1,00	$ 429.412,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles,	M2	1,00	$ 80.616,00	$ 80.616,00	-	-1,00	$ 80.616,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 52.489,00	$ 52.489,00	-	-1,00	$ 52.489,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 48.265,00	$ 48.265,00	-	-1,00	$ 48.265,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e	ML	1,00	$ 135.858,00	$ 135.858,00	-	-1,00	$ 135.858,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=100 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 42.281,00	$ 42.281,00	-	-1,00	$ 42.281,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 22, desarrollo 0,80 m. (Suministro e	ML	1,00	$ 67.484,00	$ 67.484,00	-	-1,00	$ 67.484,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 26, desarrollo 0,90 m. (Suministro e	M2	1,00	$ 76.394,00	$ 76.394,00	-	-1,00	$ 76.394,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.20	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 41.114,00	$ 41.114,00	-	-1,00	$ 41.114,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.21	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.050,00	$ 33.050,00	-	-1,00	$ 33.050,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.22	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación	ML	1,00	$ 25.939,00	$ 25.939,00	-	-1,00	$ 25.939,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.23	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 20 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 33.944,00	$ 33.944,00	-	-1,00	$ 33.944,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.24	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 30 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 28.325,00	$ 28.325,00	-	-1,00	$ 28.325,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.25	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 50 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 48.094,00	$ 48.094,00	-	-1,00	$ 48.094,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.26	Flanche en lámina galvanizada cal.20, desarrollo 80 cm. (Suministro e	ML	1,00	$ 71.122,00	$ 71.122,00	-	-1,00	$ 71.122,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.27	Dilatación metálica entre estructuras edificaciones. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.159,00	$ 63.159,00	-	-1,00	$ 63.159,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.28	Gárgolas preefabricadas en concreto. (Suministro e instalación. Incluye equipos	UN	1,00	$ 51.307,00	$ 51.307,00	-	-1,00	$ 51.307,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de	UN	1,00	$ 353.056,00	$ 353.056,00	-	-1,00	$ 353.056,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 696.061,00	$ 696.061,00	-	-1,00	$ 696.061,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 835.729,00	$ 835.729,00	-	-1,00	$ 835.729,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.4	Puerta en madera entamborada 1.00 m. (Suministro e instalación. Altura hasta	UN	1,00	$ 993.161,00	$ 993.161,00	-	-1,00	$ 993.161,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
13.5	Puerta en madera entamborada doble hoja 1.60 m. (2x0.80 m) (Suministro e	UN	1,00	$ 1.321.586,00	$ 1.321.586,00
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m.	ML	1,00	$ 1.444.783,00	$ 1.444.783,00
13.7	Entrepaño en madera enchapada en formica color a definir. (Suministro e	ML	1,00	$ 148.777,00	$ 148.777,00
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00
14.1	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,80x2,00 m. (Suministro e	UN	1,00	$ 609.114,00	$ 609.114,00
14.2	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18. 0,90x2,20 m, con acabado	UN	1,00	$ 940.928,00	$ 940.928,00
14.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18 1.00x2.10 m. acabado en	UN	1,00	$ 949.032,00	$ 949.032,00
14.4	Puerta metálica tipo rejilla en lámina CR 1,00x2,10 m, con acabado en pintura	UN	1,00	$ 1.247.332,00	$ 1.247.332,00
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 658.565,00	$ 658.565,00
14.6	Puerta en Aluminio 5020 de 1,00x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 729.125,00	$ 729.125,00
14.7	Puerta en Aluminio 5020 de 1,10x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 811.447,00	$ 811.447,00
14.8	Puerta en Aluminio 5020 de 1,35x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 987.848,00	$ 987.848,00
14.9	Puerta en Aluminio 5020 de 2,80x2,65 m. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 4.863.090,00	$ 4.863.090,00
14.10	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,80x2,00 m.	UN	1,00	$ 1.135.298,00	$ 1.135.298,00
14.11	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado. 0,90x2,30 m.	UN	1,00	$ 1.268.846,00	$ 1.268.846,00
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m.	UN	1,00	$ 1.298.178,00	$ 1.298.178,00
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m.	UN	1,00	$ 1.422.703,00	$ 1.422.703,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN	1,00	$ 47.922,00	$ 47.922,00
14.15	Ventana corrediza 5020 con vidrio 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 382.740,00	$ 382.740,00
14.16	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 511.571,00	$ 511.571,00
14.17	Ventanería en aluminio proyectante con vidrio 5mm. (Suministro e instalación.	M2	1,00	$ 511.552,00	$ 511.552,00
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e	M2	1,00	$ 572.058,00	$ 572.058,00
14.19	Ventana fija con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 357.938,00	$ 357.938,00
14.20	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes,	M2	1,00	$ 619.359,00	$ 619.359,00
14.21	Persiana en aluminio h= <0,50 m. (Suministro e instalación. Incluye marco,	ML	1,00	$ 153.461,00	$ 153.461,00
14.22	Pasamanos metálico en tubular d=1 1/2", con acabado en pintura	ml	1,00	$ 39.461,00	$ 39.461,00
14.23	Pasamanos en acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 174.708,00	$ 174.708,00
14.24	Baranda y pasamanos en tubo d= 1/2 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 264.036,00	$ 264.036,00
14.25	Baranda en vidrio templado 8mm y pasamanos d= 2" en acero inoxidable.	ML	1,00	$ 354.638,00	$ 354.638,00
14.26	Baranda metálica en acero inoxidable h=1,00 m, pasamanos d=2", parales 1	ML	1,00	$ 653.204,00	$ 653.204,00
14.27	Reja metálica tipo banco en varilla cuadrada 9mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 67.991,00	$ 67.991,00
14.28	Rejilla piso 30cm. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 100.658,00	$ 100.658,00
14.29	Estructura basepara piso en Deck, en tubería cuadrada de 11/2x3/4 en Cal 14 .	M2	1,00	$ 68.517,00	$ 68.517,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 101.422,00	$ 101.422,00
15.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				$ 0,00
15.1	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 92.932,00	$ 92.932,00
15.2	Cerradura tipo alcoba tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.196,00	$ 74.196,00
15.3	Cerrojo de seguridad doble. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 97.229,00	$ 97.229,00
15.4	Cerradura tipo puerta principal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 255.594,00	$ 255.594,00
15.5	Cerradura acceso principal en puerta de vidrio templado. (Suministro e	UN	1,00	$ 394.999,00	$ 394.999,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 1.321.586,00
-	-1,00	$ 1.444.783,00
-	-1,00	$ 148.777,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 609.114,00
-	-1,00	$ 940.928,00
-	-1,00	$ 949.032,00
-	-1,00	$ 1.247.332,00
-	-1,00	$ 658.565,00
-	-1,00	$ 729.125,00
-	-1,00	$ 811.447,00
-	-1,00	$ 987.848,00
-	-1,00	$ 4.863.090,00
-	-1,00	$ 1.135.298,00
-	-1,00	$ 1.268.846,00
-	-1,00	$ 1.298.178,00
-	-1,00	$ 1.422.703,00
-	-1,00	$ 47.922,00
-	-1,00	$ 382.740,00
-	-1,00	$ 511.571,00
-	-1,00	$ 511.552,00
-	-1,00	$ 572.058,00
-	-1,00	$ 357.938,00
-	-1,00	$ 619.359,00
-	-1,00	$ 153.461,00
-	-1,00	$ 39.461,00
-	-1,00	$ 174.708,00
-	-1,00	$ 264.036,00
-	-1,00	$ 354.638,00
-	-1,00	$ 653.204,00
-	-1,00	$ 67.991,00
-	-1,00	$ 100.658,00
-	-1,00	$ 68.517,00
-	-1,00	$ 101.422,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 92.932,00
-	-1,00	$ 74.196,00
-	-1,00	$ 97.229,00
-	-1,00	$ 255.594,00
-	-1,00	$ 394.999,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
15.6	Puerta vidrio templado e=6 mm con marco en aluminio de 0,60x2,00 m.	UN	1,00	$ 1.182.980,00	$ 1.182.980,00	-	-1,00	$ 1.182.980,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.7	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 1.384.208,00	$ 1.384.208,00	-	-1,00	$ 1.384.208,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.8	Puerta acceso principal 1,00x3,10 en vidrio laminado 4+4 templado.	UN	1,00	$ 2.653.216,00	$ 2.653.216,00	-	-1,00	$ 2.653.216,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.9	Puerta vidrio de seguridad 4+4, de 1,00x2,20 m. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 3.419.634,00	$ 3.419.634,00	-	-1,00	$ 3.419.634,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.10	División en vidrio templado e=10mm y tubo estructural color natural.	M2	1,00	$ 638.011,00	$ 638.011,00	-	-1,00	$ 638.011,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.11	Divisiones piso techo en vidrio templado e=10 mm y perfil de aluminio.	M2	1,00	$ 572.051,00	$ 572.051,00	-	-1,00	$ 572.051,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.12	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes,	M2	1,00	$ 731.974,00	$ 731.974,00	-	-1,00	$ 731.974,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.729,00	$ 110.729,00	-	-1,00	$ 110.729,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 110.592,00	$ 110.592,00	-	-1,00	$ 110.592,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.15	Cristal crudo transparente e=5mm sobre fachada. (Suminstro e instalación.	M2	1,00	$ 173.033,00	$ 173.033,00	-	-1,00	$ 173.033,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.16	Marquesina de vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable.	M2	1,00	$ 675.164,00	$ 675.164,00	-	-1,00	$ 675.164,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.17	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	1,00	$ 57.773,00	$ 57.773,00	-	-1,00	$ 57.773,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	1,00	$ 59.800,00	$ 59.800,00	-	-1,00	$ 59.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	1,00	$ 29.589,00	$ 29.589,00	-	-1,00	$ 29.589,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.3	Reinstalación Orinal existente.	UN	1,00	$ 47.492,00	$ 47.492,00	-	-1,00	$ 47.492,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.4	Cambio acople sanitario. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.733,00	$ 9.733,00	-	-1,00	$ 9.733,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.5	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 565.137,00	$ 565.137,00	-	-1,00	$ 565.137,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.6	Sanitario de piso línea institucional con válvula antivandálica tipo push.	UN	1,00	$ 833.913,00	$ 833.913,00	-	-1,00	$ 833.913,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.7	Sanitario discapacitados con grifería antivandálica. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 823.422,00	$ 823.422,00	-	-1,00	$ 823.422,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	1,00	$ 1.063.970,00	$ 1.063.970,00	-	-1,00	$ 1.063.970,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.9	Lavamanos línea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 327.808,00	$ 327.808,00	-	-1,00	$ 327.808,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push.	UN	1,00	$ 541.473,00	$ 541.473,00	-	-1,00	$ 541.473,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.11	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 651.467,00	$ 651.467,00	-	-1,00	$ 651.467,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e	UN	1,00	$ 729.983,00	$ 729.983,00	-	-1,00	$ 729.983,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye	UN	1,00	$ 292.750,00	$ 292.750,00	-	-1,00	$ 292.750,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.14	Grifería ducha. (Suminstro e instalación. Incluye mezclador, regadera,	UN	1,00	$ 72.549,00	$ 72.549,00	-	-1,00	$ 72.549,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.15	Llave terminal de jardín, metálica 1/2"X3/4" para manguera. (Suministro e	UN	1,00	$ 48.377,00	$ 48.377,00	-	-1,00	$ 48.377,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.16	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 25.166,00	$ 25.166,00	-	-1,00	$ 25.166,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.17	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.239,00	$ 70.239,00	-	-1,00	$ 70.239,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 202.891,00	$ 202.891,00	-	-1,00	$ 202.891,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.19	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.593,00	$ 140.593,00	-	-1,00	$ 140.593,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.20	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 140.600,00	$ 140.600,00	-	-1,00	$ 140.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.21	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable.	UN	1,00	$ 785.075,00	$ 785.075,00	-	-1,00	$ 785.075,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.22	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable.	UN	1,00	$ 155.503,00	$ 155.503,00	-	-1,00	$ 155.503,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.23	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e	UN	1,00	$ 523.997,00	$ 523.997,00	-	-1,00	$ 523.997,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.24	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro	UN	1,00	$ 433.411,00	$ 433.411,00	-	-1,00	$ 433.411,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.25	Rejilla metálica con sosco 3x2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 16.101,00	$ 16.101,00	-	-1,00	$ 16.101,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.238,00	$ 32.238,00	-	-1,00	$ 32.238,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.27	Rejillas para piso 20x20. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 43.327,00	$ 43.327,00	-	-1,00	$ 43.327,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.28	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e	UN	1,00	$ 340.967,00	$ 340.967,00	-	-1,00	$ 340.967,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16.29	Grifería kit vpalvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 219.030,00	$ 219.030,00	-	-1,00	$ 219.030,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
17.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.1	Medidor de agua certificado 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 414.916,00	$ 414.916,00	-	-1,00	$ 414.916,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.2	Caja para medidor de 3/4". (Incluye válvula antifraude, registro, niples,	UN	1,00	$ 768.866,00	$ 768.866,00	-	-1,00	$ 768.866,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.3	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.926,00	$ 2.926,00	-	-1,00	$ 2.926,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.4	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 4.365,00	$ 4.365,00	-	-1,00	$ 4.365,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.5	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 6.744,00	$ 6.744,00	-	-1,00	$ 6.744,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.6	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.969,00	$ 7.969,00	-	-1,00	$ 7.969,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.7	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.688,00	$ 10.688,00	-	-1,00	$ 10.688,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.8	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.855,00	$ 14.855,00	-	-1,00	$ 14.855,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.9	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 32.381,00	$ 32.381,00	-	-1,00	$ 32.381,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.10	Accesorio CPVC Ø=1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.945,00	$ 3.945,00	-	-1,00	$ 3.945,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.11	Accesorio CPVC Ø=3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 5.449,00	$ 5.449,00	-	-1,00	$ 5.449,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.12	Accesorio HG Ø=1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.412,00	$ 14.412,00	-	-1,00	$ 14.412,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.13	Accesorio HG Ø=1 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00	-	-1,00	$ 26.858,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.14	Accesorio HG Ø=2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 33.740,00	$ 33.740,00	-	-1,00	$ 33.740,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.15	Accesorio HG Ø=3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 74.300,00	$ 74.300,00	-	-1,00	$ 74.300,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.16	Accesorio HG Ø=4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 119.297,00	$ 119.297,00	-	-1,00	$ 119.297,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 18.883,00	$ 18.883,00	-	-1,00	$ 18.883,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 22.450,00	$ 22.450,00	-	-1,00	$ 22.450,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.19	Red PVC-P RDE-21 Ø=1". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 25.215,00	$ 25.215,00	-	-1,00	$ 25.215,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.20	Red PVC-P RDE-21 Ø=1-1/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	ML	1,00	$ 23.568,00	$ 23.568,00	-	-1,00	$ 23.568,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.21	Tubería CPVC Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 14.392,00	$ 14.392,00	-	-1,00	$ 14.392,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.22	Tubería CPVC Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 19.917,00	$ 19.917,00	-	-1,00	$ 19.917,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.23	Tubería galvanizada 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 34.049,00	$ 34.049,00	-	-1,00	$ 34.049,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.24	Tubería galvanizada 3/4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 36.223,00	$ 36.223,00	-	-1,00	$ 36.223,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.25	Tubería galvanizada 1". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 44.503,00	$ 44.503,00	-	-1,00	$ 44.503,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.26	Tubería HG 1 ". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 55.733,00	$ 55.733,00	-	-1,00	$ 55.733,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.27	Tubería HG 1 1/2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 63.519,00	$ 63.519,00	-	-1,00	$ 63.519,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.28	Tubería HG 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 89.556,00	$ 89.556,00	-	-1,00	$ 89.556,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.29	Tubería HG 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 124.188,00	$ 124.188,00	-	-1,00	$ 124.188,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.30	Tubería HG 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 159.866,00	$ 159.866,00	-	-1,00	$ 159.866,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 37.481,00	$ 37.481,00	-	-1,00	$ 37.481,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.32	Punto Hidráulico CPVC 1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 47.636,00	$ 47.636,00	-	-1,00	$ 47.636,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.33	Punto hidráulico 1-1/4" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 51.130,00	$ 51.130,00	-	-1,00	$ 51.130,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica.	UN	1,00	$ 53.824,00	$ 53.824,00	-	-1,00	$ 53.824,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería	UN	1,00	$ 36.412,00	$ 36.412,00	-	-1,00	$ 36.412,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería	UN	1,00	$ 39.983,00	$ 39.983,00	-	-1,00	$ 39.983,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y	UN	1,00	$ 38.254,00	$ 38.254,00	-	-1,00	$ 38.254,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 40.622,00	$ 40.622,00	-	-1,00	$ 40.622,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.39	Accesorios HG 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 7.303,00	$ 7.303,00	-	-1,00	$ 7.303,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.40	Accesorios HG 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 13.392,00	$ 13.392,00	-	-1,00	$ 13.392,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.41	Accesorios HG 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 22.724,00	$ 22.724,00	-	-1,00	$ 22.724,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.42	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 50.397,00	$ 50.397,00	-	-1,00	$ 50.397,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.43	Registro metálico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.591,00	$ 55.591,00	-	-1,00	$ 55.591,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.44	Registro metálico de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 80.351,00	$ 80.351,00	-	-1,00	$ 80.351,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
17.45	Registro metálico de 1-1/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 121.856,00	$ 121.856,00	-	-1,00	$ 121.856,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.46	Registro metálico de 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 137.729,00	$ 137.729,00	-	-1,00	$ 137.729,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.47	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.638,00	$ 53.638,00	-	-1,00	$ 53.638,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.48	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 70.938,00	$ 70.938,00	-	-1,00	$ 70.938,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.49	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 105.084,00	$ 105.084,00	-	-1,00	$ 105.084,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.50	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 454.751,00	$ 454.751,00	-	-1,00	$ 454.751,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.51	Tanque de reserva 1000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 1.000.416,00	$ 1.000.416,00	-	-1,00	$ 1.000.416,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.52	Tanque de reserva 2000 lt. (Suministro e instalación. Incluye flotador, válvulas,	UN	1,00	$ 978.265,00	$ 978.265,00	-	-1,00	$ 978.265,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17.53	Válvulas y accesorios para tanque de reserva subterráneo en concreto.	UN	1,00	$ 469.640,00	$ 469.640,00	-	-1,00	$ 469.640,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.1	Caja de inspección 40x40 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 249.126,00	$ 249.126,00	-	-1,00	$ 249.126,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.2	Caja de inspección 60x60 cm en mampostería (Incluye afinado, pañete	UN	1,00	$ 494.687,00	$ 494.687,00	-	-1,00	$ 494.687,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 31.714,00	$ 31.714,00	-	-1,00	$ 31.714,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 50.008,00	$ 50.008,00	-	-1,00	$ 50.008,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 63.163,00	$ 63.163,00	-	-1,00	$ 63.163,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.6	Redes PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	ML	1,00	$ 103.338,00	$ 103.338,00	-	-1,00	$ 103.338,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.7	Redes PVC Sanitaria 3" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ML	1,00	$ 135.295,00	$ 135.295,00	-	-1,00	$ 135.295,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.8	Redes PVC Sanitaria 4" descolgada. (Suministro e instalación. Incluye tubería,	ml	1,00	$ 70.433,00	$ 70.433,00	-	-1,00	$ 70.433,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.067,00	$ 12.067,00	-	-1,00	$ 12.067,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.10	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 18.775,00	$ 18.775,00	-	-1,00	$ 18.775,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.11	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 81.455,00	$ 81.455,00	-	-1,00	$ 81.455,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.12	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 76.794,00	$ 76.794,00	-	-1,00	$ 76.794,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 57.886,00	$ 57.886,00	-	-1,00	$ 57.886,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.14	Punto desague PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 77.408,00	$ 77.408,00	-	-1,00	$ 77.408,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 94.453,00	$ 94.453,00	-	-1,00	$ 94.453,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	UN	1,00	$ 84.417,00	$ 84.417,00	-	-1,00	$ 84.417,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	UN	1,00	$ 84.447,00	$ 84.447,00	-	-1,00	$ 84.447,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.18	Sifón de piso PVC Sanitario 4"	UN	1,00	$ 73.140,00	$ 73.140,00	-	-1,00	$ 73.140,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.19	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 75.575,00	$ 75.575,00	-	-1,00	$ 75.575,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.20	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 65.987,00	$ 65.987,00	-	-1,00	$ 65.987,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.21	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 71.456,00	$ 71.456,00	-	-1,00	$ 71.456,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.22	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 85.906,00	$ 85.906,00	-	-1,00	$ 85.906,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 20.639,00	$ 20.639,00	-	-1,00	$ 20.639,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.24	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 18.388,00	$ 18.388,00	-	-1,00	$ 18.388,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.25	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 29.248,00	$ 29.248,00	-	-1,00	$ 29.248,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.26	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 69.405,00	$ 69.405,00	-	-1,00	$ 69.405,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.27	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.592,00	$ 12.592,00	-	-1,00	$ 12.592,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.28	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 10.339,00	$ 10.339,00	-	-1,00	$ 10.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.29	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00	-	-1,00	$ 19.388,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.30	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 19.388,00	$ 19.388,00	-	-1,00	$ 19.388,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.31	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 24.558,00	$ 24.558,00	-	-1,00	$ 24.558,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 3.053,00	$ 3.053,00	+	59,00	$ 180.127,00		$ 0,00	60,00	$ 183.180,00	60,00	$ 183.180,00
19.2	Cable calibre 6 AWG. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 5.604,00	$ 5.604,00	-	-1,00	$ 5.604,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.3	Cable Cu No. 8 THHN PE HF FR LS CT. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 4.334,00	$ 4.334,00	-	-1,00	$ 4.334,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.4	Cable desnudo de Cu No.2, Interconexión equipotencial en terreno. (Suministro e instalación. Incluye excavación, relleno, accesorios necesarios)	ML	1,00	$ 47.316,00	$ 47.316,00	-	-1,00	$ 47.316,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 16.833,00	$ 16.833,00	-	-1,00	$ 16.833,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.6	Cable eléctrico encauchetado 3x12. (Suministro e instalación)	ML	1,00	$ 17.646,00	$ 17.646,00	-	-1,00	$ 17.646,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 432.647,00	$ 432.647,00	-	-1,00	$ 432.647,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 504.034,00	$ 504.034,00	-	-1,00	$ 504.034,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 606.758,00	$ 606.758,00	-	-1,00	$ 606.758,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 714.490,00	$ 714.490,00	-	-1,00	$ 714.490,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.11	Tablero electrico Tipo Pesado 36 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 787.745,00	$ 787.745,00	-	-1,00	$ 787.745,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.12	Tablero electrico Tipo Pesado 42 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e	UN	1,00	$ 804.661,00	$ 804.661,00	-	-1,00	$ 804.661,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.13	Interruptor enchufable 1x15A hasta 50A, 10 KA a 240V. (Suministro e	UN	1,00	$ 16.100,00	$ 16.100,00	-	-1,00	$ 16.100,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.688,00	$ 30.688,00	+	7,00	$ 214.816,00	8,00	$ 245.504,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 245.504,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.499,00	$ 51.499,00	-	-1,00	$ 51.499,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.16	Interruptor enchufable 2x15 hasta 60A, 10 KA a 240V. (Suministro e	UN	1,00	$ 74.930,00	$ 74.930,00	-	-1,00	$ 74.930,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.17	Breaker enchufable de 2x20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.537,00	$ 44.537,00	-	-1,00	$ 44.537,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.18	Breaker enchufable de 3x30A /20A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 48.674,00	$ 48.674,00	-	-1,00	$ 48.674,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 113.810,00	$ 113.810,00	-	-1,00	$ 113.810,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 199.573,00	$ 199.573,00	-	-1,00	$ 199.573,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.21	Breaker enchufable de 3x100A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 215.331,00	$ 215.331,00	-	-1,00	$ 215.331,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 12.355,00	$ 12.355,00	-	-1,00	$ 12.355,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 18.345,00	$ 18.345,00	-	-1,00	$ 18.345,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.24	Tubería EMT 1 ". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 21.074,00	$ 21.074,00	-	-1,00	$ 21.074,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.25	Tubería EMT 1-1/4 ". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 25.735,00	$ 25.735,00	-	-1,00	$ 25.735,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.26	Tubería EMT 1-1/2 ". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 30.942,00	$ 30.942,00	-	-1,00	$ 30.942,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML	1,00	$ 33.734,00	$ 33.734,00	-	-1,00	$ 33.734,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.28	Tubería de 1/2", conduit de PVC. (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 8.539,00	$ 8.539,00	-	-1,00	$ 8.539,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.29	Tubo Conduit PVC 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	1,00	$ 10.542,00	$ 10.542,00	-	-1,00	$ 10.542,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.30	Tubería Conduit de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de	ML	1,00	$ 11.611,00	$ 11.611,00	-	-1,00	$ 11.611,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 17.642,00	$ 17.642,00	-	-1,00	$ 17.642,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.32	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/2" subterránea. (Suministro e instalación.	ML	1,00	$ 20.363,00	$ 20.363,00	-	-1,00	$ 20.363,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.33	Tubería Conduit PVC pesado 2" subterránea. (Suministro e instalación. Incluye	ML	1,00	$ 18.264,00	$ 18.264,00	-	-1,00	$ 18.264,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.34	Coraza Americana de 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios	ML	1,00	$ 141.470,00	$ 141.470,00	-	-1,00	$ 141.470,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 12.963,00	$ 12.963,00	-	-1,00	$ 12.963,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 53.507,00	$ 53.507,00	-	-1,00	$ 53.507,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 47.457,00	$ 47.457,00	-	-1,00	$ 47.457,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 65.668,00	$ 65.668,00	-	-1,00	$ 65.668,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 51.738,00	$ 51.738,00	-	-1,00	$ 51.738,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.40	Varilla de cobre 5/8"x 2.4 m con conector. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 120.037,00	$ 120.037,00	-	-1,00	$ 120.037,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.41	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m.	UN	1,00	$ 425.311,00	$ 425.311,00	-	-1,00	$ 425.311,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,	UN	1,00	$ 96.439,00	$ 96.439,00	-	-1,00	$ 96.439,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.43	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 58.363,00	$ 58.363,00	-	-1,00	$ 58.363,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.44	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 102.138,00	$ 102.138,00	-	-1,00	$ 102.138,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 98.173,00	$ 98.173,00	-	-1,00	$ 98.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 160.047,00	$ 160.047,00	-	-1,00	$ 160.047,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 96.817,00	$ 96.817,00	-	-1,00	$ 96.817,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.48	Salidas interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 291.419,00	$ 291.419,00	-	-1,00	$ 291.419,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.49	Salidas botón timbre. PVC (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,	UN	1,00	$ 116.813,00	$ 116.813,00	-	-1,00	$ 116.813,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.50	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 62.770,00	$ 62.770,00	-	-1,00	$ 62.770,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.51	Salida toma 240v 20A. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable,	UN	1,00	$ 97.692,00	$ 97.692,00	-	-1,00	$ 97.692,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN	1,00	$ 95.313,00	$ 95.313,00	-	-1,00	$ 95.313,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.53	Salida toma doble polo a tierra en tubería. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 79.470,00	$ 79.470,00	-	-1,00	$ 79.470,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 82.723,00	$ 82.723,00	-	-1,00	$ 82.723,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma,	UN	1,00	$ 98.631,00	$ 98.631,00	-	-1,00	$ 98.631,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.56	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 61.762,00	$ 61.762,00	-	-1,00	$ 61.762,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.57	Salida de toma monofásica doble Regulada empotrada en muro. (Suministro e	UN	1,00	$ 97.533,00	$ 97.533,00	-	-1,00	$ 97.533,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.58	Salida Toma doble regulada 5-15R, a la vista. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 129.308,00	$ 129.308,00	-	-1,00	$ 129.308,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 71.478,00	$ 71.478,00	-	-1,00	$ 71.478,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 141.896,00	$ 141.896,00	+	17,00	$ 2.412.232,00		$ 0,00	18,00	$ 2.554.128,00	18,00	$ 2.554.128,00
19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 77.518,00	$ 77.518,00	-	-1,00	$ 77.518,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.62	Salida secador de manos, 5-20R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 102.647,00	$ 102.647,00	-	-1,00	$ 102.647,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.63	Salida toma bifásico secadores. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 310.863,00	$ 310.863,00	-	-1,00	$ 310.863,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.64	Salida secador de manos, 5-15R. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN	1,00	$ 104.033,00	$ 104.033,00	-	-1,00	$ 104.033,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN	1,00	$ 111.951,00	$ 111.951,00	-	-1,00	$ 111.951,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.66	Salida para fotocelda control de iluminación. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 66.303,00	$ 66.303,00	-	-1,00	$ 66.303,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.67	Salida Punto de Audio, Tubería 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 61.246,00	$ 61.246,00	-	-1,00	$ 61.246,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.68	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 27.648,00	$ 27.648,00	-	-1,00	$ 27.648,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.69	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin alambrar.	UN	1,00	$ 48.073,00	$ 48.073,00	-	-1,00	$ 48.073,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.70	Salidas para audio / microfono en tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar.	UN	1,00	$ 87.049,00	$ 87.049,00	-	-1,00	$ 87.049,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.71	Salida de micrófono en tubería PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e	UN	1,00	$ 60.280,00	$ 60.280,00	-	-1,00	$ 60.280,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.72	Salida Teléfono Publico toma tipo americana. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00	-	-1,00	$ 59.183,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.73	Salida Televisión. (Suministro e instalación. Incluye cajas, toma, tubería,	UN	1,00	$ 78.456,00	$ 78.456,00	-	-1,00	$ 78.456,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.74	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado. (Suministro e	UN	1,00	$ 190.609,00	$ 190.609,00	-	-1,00	$ 190.609,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN	1,00	$ 35.039,00	$ 35.039,00	-	-1,00	$ 35.039,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 149.408,00	$ 149.408,00	-	-1,00	$ 149.408,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W),	UN	1,00	$ 216.990,00	$ 216.990,00	-	-1,00	$ 216.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.78	Lámpara panel LED 30x30 cm, 25 W. Durabilidad mín. 20.000 horas.	UN	1,00	$ 175.289,00	$ 175.289,00	-	-1,00	$ 175.289,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija	UN	1,00	$ 230.079,00	$ 230.079,00	-	-1,00	$ 230.079,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.80	Lámpara Panel LED 30x120 cm, 45 W. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 184.438,00	$ 184.438,00	-	-1,00	$ 184.438,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.81	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad	UN	1,00	$ 28.131,00	$ 28.131,00	-	-1,00	$ 28.131,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.82	Lámpara R1 LED 2x1.6W Universal emergencia. Durabilidad mayor a 20.000	UN	1,00	$ 84.016,00	$ 84.016,00	-	-1,00	$ 84.016,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.83	Lámpara LED hermética 2x18 W T8 PC Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado	UN	1,00	$ 122.471,00	$ 122.471,00	-	-1,00	$ 122.471,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.84	Lámpara LED emergencia aviso doble spot. Durabilidad mayor a 20.000 horas.	UN	1,00	$ 104.045,00	$ 104.045,00	-	-1,00	$ 104.045,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.85	Lámpara LED redonda 6" 12W. Durabilidad min 20.000 horas. (Suministro e	UN	1,00	$ 91.551,00	$ 91.551,00	-	-1,00	$ 91.551,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	1,00	$ 283.399,00	$ 283.399,00	+	17,00	$ 4.817.783,00		$ 0,00	18,00	$ 5.101.182,00	18,00	$ 5.101.182,00
19.87	Lámpara panel LED de 48 w 60x60 cm. Durabilidad Mínima 20.000 horas.	UN	1,00	$ 68.245,00	$ 68.245,00	-	-1,00	$ 68.245,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.88	Lámpara Panel LED EFLIGHT 48W, 300*1200mm cool white 6000k, 100-	UN	1,00	$ 49.415,00	$ 49.415,00	-	-1,00	$ 49.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.89	Bala tipo LED 18W master 120 V. (Suministro e instalación. Incluye clavija y	UN	1,00	$ 23.173,00	$ 23.173,00	-	-1,00	$ 23.173,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.90	Bala tipo LED de 21 w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 130.984,00	$ 130.984,00	-	-1,00	$ 130.984,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.91	Lámpara LED tipo aplique 15w 1080lm 6000k. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 132.344,00	$ 132.344,00	-	-1,00	$ 132.344,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.92	Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e	UN	1,00	$ 133.707,00	$ 133.707,00	-	-1,00	$ 133.707,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN	1,00	$ 201.889,00	$ 201.889,00	-	-1,00	$ 201.889,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.94	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero.	UN	1,00	$ 550.749,00	$ 550.749,00	-	-1,00	$ 550.749,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.95	Reflector exterior fachada. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable	UN	1,00	$ 2.520.919,00	$ 2.520.919,00	-	-1,00	$ 2.520.919,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 3.620,00	$ 3.620,00	-	-1,00	$ 3.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 490.548,00	$ 490.548,00	-	-1,00	$ 490.548,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.1	Bandeja Porta cable tipo escalera de 16x8 cm. Galvanizada en caliente.	ml	1,00	$ 70.263,00	$ 70.263,00	-	-1,00	$ 70.263,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 125.524,00	$ 125.524,00	-	-1,00	$ 125.524,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.3	Bandeja portacables metálica de triple compartimiento con tapa, de 20x8 cm, en	ML	1,00	$ 139.908,00	$ 139.908,00	-	-1,00	$ 139.908,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.4	Bandeja portacables metálica tipo escalera de triple compartimiento con tapa,	ML	1,00	$ 151.670,00	$ 151.670,00	-	-1,00	$ 151.670,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 141.954,00	$ 141.954,00	-	-1,00	$ 141.954,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.6	Canaleta plástica 6x4 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes,	ML	1,00	$ 24.420,00	$ 24.420,00	-	-1,00	$ 24.420,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.7	Canaleta plástica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 48.093,00	$ 48.093,00	-	-1,00	$ 48.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 73.018,00	$ 73.018,00	-	-1,00	$ 73.018,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML	1,00	$ 50.662,00	$ 50.662,00	-	-1,00	$ 50.662,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN	1,00	$ 6.957,00	$ 6.957,00	+	7,00	$ 48.699,00		$ 0,00	8,00	$ 55.656,00	8,00	$ 55.656,00
20.11	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 42.716,00	$ 42.716,00	-	-1,00	$ 42.716,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.043.051,00	$ 2.043.051,00	-	-1,00	$ 2.043.051,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.13	Multitoma cat 6A para Gabinete Metálica para Rack. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 186.225,00	$ 186.225,00	-	-1,00	$ 186.225,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.14	Multitoma vertical para rack 10 salidas, 20 a, 120v. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 459.671,00	$ 459.671,00	-	-1,00	$ 459.671,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.15	Switch de 24 Puertos Cat 6A tipo HP V1910-24G. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 2.003.820,00	$ 2.003.820,00	-	-1,00	$ 2.003.820,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.16	Switch administrable de 48 puertos con puertos MINI GIBI para fibra optica	UN	1,00	$ 4.175.789,00	$ 4.175.789,00	-	-1,00	$ 4.175.789,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 739.585,00	$ 739.585,00	-	-1,00	$ 739.585,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 775.982,00	$ 775.982,00	+	1,00	$ 775.982,00		$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00	2,00	$ 1.551.964,00
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.107.399,00	$ 1.107.399,00	-	-1,00	$ 1.107.399,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML	1,00	$ 7.609,00	$ 7.609,00	+	428,12	$ 3.257.565,08	139,12	$ 1.058.564,08	290,00	$ 2.206.610,00	429,12	$ 3.265.174,08
20.21	Tapa troquel metálica 15 cm. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 9.632,00	$ 9.632,00	-	-1,00	$ 9.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.22	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye	UN	1,00	$ 94.361,00	$ 94.361,00	-	-1,00	$ 94.361,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	7,00	$ 313.642,00		$ 0,00	8,00	$ 358.448,00	8,00	$ 358.448,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 44.806,00	$ 44.806,00	+	1,00	$ 44.806,00		$ 0,00	2,00	$ 89.612,00	2,00	$ 89.612,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 14.008,00	$ 14.008,00	+	9,00	$ 126.072,00	2,00	$ 28.016,00	8,00	$ 112.064,00	10,00	$ 140.080,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 15.153,00	$ 15.153,00	+	1,00	$ 15.153,00		$ 0,00	2,00	$ 30.306,00	2,00	$ 30.306,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 30.672,00	$ 30.672,00	+	8,00	$ 245.376,00	1,00	$ 30.672,00	8,00	$ 245.376,00	9,00	$ 276.048,00
20.28	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 55.294,00	$ 55.294,00	-	-1,00	$ 55.294,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023
OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 78.718,00	$ 78.718,00
20.30	Patch cord de 7 pies Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 68.704,00	$ 68.704,00
20.31	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 39.096,00	$ 39.096,00
20.32	Patch cord de 7 pies de Fibra Óptica. (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 163.107,00	$ 163.107,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN	1,00	$ 13.363,00	$ 13.363,00
20.34	Marquillas en Puntos Electricos y Datos tipo anillo plástico. (Suministro e	UN	1,00	$ 2.250,00	$ 2.250,00
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00
21.1	Adoquín de Concreto peatonal 20x10x6 cm (Suministro e instalación. Incluye	M2	1,00	$ 80.597,00	$ 80.597,00
21.2	Adoquín 20x12x6 cm (Suministro e instalación. Incluye capa de soporte y arena	M2	1,00	$ 99.192,00	$ 99.192,00
21.3	Andén en concreto escobeado e=12,5 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 94.514,00	$ 94.514,00
21.4	Andén en concreto escobeado e=10 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 87.776,00	$ 87.776,00
21.5	Andén en concreto escobeado e=15 cm. (Incluye formaleta, equipos)	M2	1,00	$ 183.605,00	$ 183.605,00
21.6	Loseta prefabricada 40x40 (Incluye suministro e Instalación. Incluye Base 4cm	M2	1,00	$ 82.943,00	$ 82.943,00
21.7	Sardinel fundido en sitio, en concreto 3000 psi, h=0.40 m, e=0.15m (Incluye	ML	1,00	$ 83.480,00	$ 83.480,00
21.8	Sardinel prefabricado en concreto A-10. 80 x 50 x 20. (Incluye trasiego,	ML	1,00	$ 68.344,00	$ 68.344,00
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	ML	1,00	$ 72.191,00	$ 72.191,00
21.10	Bordillo prefabricado en concreto A-50. (Incluye trasiego, suministro,	ML	1,00	$ 56.371,00	$ 56.371,00
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML	1,00	$ 86.614,00	$ 86.614,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1,00	$ 2.922,00	$ 2.922,00
	NO PREVISTOS				
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79	
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			**$ 108.732.037,00**	
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 18.484.446,29	
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11	
	UTIIDAD	5%		$ 5.436.601,85	
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 1.032.954,35	
A.	**TOTAL OBRA**			**$ 136.948.000,60**	
B.	**NO PREVISTOS**				
NP-4	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio	UN		$ 58.138,79	
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación,	ML		$ 15.200,00	
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 101.647,00	
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 97.327,00	
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 106.099,00	
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00	
NP -59	Desmonte Cableado Electrico, disposicion final	ML		$ 1.511,94	
NP-60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de drywall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo	ML		$ 20.649,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS			**$ 0,00**	

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	21,00	$ 1.653.078,00
-	-1,00	$ 68.704,00
-	-1,00	$ 39.096,00
-	-1,00	$ 163.107,00
-	-1,00	$ 13.363,00
-	-1,00	$ 2.250,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 80.597,00
-	-1,00	$ 99.192,00
-	-1,00	$ 94.514,00
-	-1,00	$ 87.776,00
-	-1,00	$ 183.605,00
-	-1,00	$ 82.943,00
-	-1,00	$ 83.480,00
-	-1,00	$ 68.344,00
-	-1,00	$ 72.191,00
-	-1,00	$ 56.371,00
-	-1,00	$ 86.614,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 2.922,00
-	0,00	$ 0,00
+	1,00	$ 58.138,79
		$ 80.957.424,44
		$ 13.762.762,15
		$ 2.428.722,73
		$ 4.047.871,22
		$ 769.095,53
		$ 101.965.876,08
+	304,00	$ 4.620.800,00
+	3,00	$ 304.941,00
+	17,00	$ 1.654.559,00
+	14,00	$ 1.485.386,00
+	87,33	$ 8.427.345,00
+	491,49	$ 743.103,39
+	5,34	$ 110.265,66
		$ 17.236.134,39

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
22,00	$ 1.731.796,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 1.731.796,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
	ADMINISTRACIÓN	17%		$ 0,00	
	IMPREVISTOS	3%		$ 3.261.961,11	
	UTIIDAD	5%		$ 0,00	
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 0,00	
B	**TOTAL NO PREVISTOS**			**$ 0,00**	

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		$ 2.930.142,85
		$ 517.084,03
		$ 861.806,72
		$ 163.743,28
		$ 21.708.911,26

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 194.709,51		$ 2.754.178,50		$ 2.948.888,01
	$ 34.360,50		$ 486.031,50		$ 520.392,00
	$ 57.267,50		$ 810.052,50		$ 867.320,00
	$ 10.880,83		$ 153.909,98		$ 164.790,80
	$ 1.442.568,39		**$ 20.405.222,48**		**$ 21.847.790,86**

C. MOBILIARIO															
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**														
1.	**OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES**														
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1,80x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.234.710,00	$ 1.234.710,00	-	-1,00	$ 1.234.710,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.274.371,00	$ 1.274.371,00	-	-1,00	$ 1.274.371,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	EXTENCIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN	1,00	$ 958.093,00	$ 958.093,00	-	-1,00	$ 958.093,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
M1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.072.970,00	$ 1.072.970,00	-	-1,00	$ 1.072.970,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 863.818,00	$ 863.818,00	-	-1,00	$ 863.818,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 841.791,00	$ 841.791,00	-	-1,00	$ 841.791,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos	UN	1,00	$ 571.617,00	$ 571.617,00	-	-1,00	$ 571.617,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	$ 376.330,00	$ 376.330,00	-	-1,00	$ 376.330,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	$ 215.869,00	$ 215.869,00	-	-1,00	$ 215.869,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS. asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 515.549,00	$ 515.549,00	-	-1,00	$ 515.549,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS.s, asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 712.191,00	$ 712.191,00	-	-1,00	$ 712.191,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLLICO. tipo pesado para resistir	UN	1,00	$ 1.041.121,00	$ 1.041.121,00	-	-1,00	$ 1.041.121,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de	UN	1,00	$ 891.382,00	$ 891.382,00	-	-1,00	$ 891.382,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (	UN	1,00	$ 1.383.339,00	$ 1.383.339,00	-	-1,00	$ 1.383.339,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2)	UN	1,00	$ 2.070.962,00	$ 2.070.962,00	-	-1,00	$ 2.070.962,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de	M2	1,00	$ 452.990,00	$ 452.990,00	-	-1,00	$ 452.990,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
M1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2	1,00	$ 664.586,00	$ 664.586,00	-	-1,00	$ 664.586,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media	M2	1,00	$ 848.192,00	$ 848.192,00	-	-1,00	$ 848.192,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de	UN	1,00	$ 467.415,00	$ 467.415,00	-	-1,00	$ 467.415,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa	UN	1,00	$ 555.688,00	$ 555.688,00	-	-1,00	$ 555.688,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de	UN	1,00	$ 2.493.065,00	$ 2.493.065,00	-	-1,00	$ 2.493.065,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta	UN	1,00	$ 870.060,00	$ 870.060,00	-	-1,00	$ 870.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en	UN	1,00	$ 457.222,00	$ 457.222,00	-	-1,00	$ 457.222,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	$ 4.405.126,00	$ 4.405.126,00	-	-1,00	$ 4.405.126,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.044.053,00	$ 1.044.053,00	-	-1,00	$ 1.044.053,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVILI archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.503.385,00	$ 1.503.385,00	-	-1,00	$ 1.503.385,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 498.537,00	$ 498.537,00	-	-1,00	$ 498.537,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 413.948,00	$ 413.948,00	-	-1,00	$ 413.948,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de	M2	1,00	$ 185.117,00	$ 185.117,00	-	-1,00	$ 185.117,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	$ 4.010.911,00	$ 4.010.911,00	-	-1,00	$ 4.010.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA		1,00		$ 0,00	-	-1,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2	1,00	$ 273.539,00	$ 273.539,00
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho	M2	1,00	$ 300.362,00	$ 300.362,00
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho	ML	1,00	$ 120.005,00	$ 120.005,00
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en	ML	1,00	$ 91.925,00	$ 91.925,00
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en	UN	1,00	$ 726.456,00	$ 726.456,00
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a	UN	1,00	$ 649.620,00	$ 649.620,00
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro	M2	1,00	$ 32.534,00	$ 32.534,00
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	$ 264.039,00	$ 264.039,00
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de	UN	1,00	$ 3.337.510,00	$ 3.337.510,00
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a	UN	1,00	$ 1.327.180,00	$ 1.327.180,00
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas	UN	1,00	$ 1.718.350,00	$ 1.718.350,00
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie	UN	1,00	$ 586.753,00	$ 586.753,00
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja	UN	1,00	$ 782.338,00	$ 782.338,00
M2.14	SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla	UN	1,00	$ 1.606.587,00	$ 1.606.587,00
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 2.347.014,00	$ 2.347.014,00
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauracion de	UN	1,00	$ 5.567.173,00	$ 5.567.173,00
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2	UN	1,00	$ 9.164.530,00	$ 9.164.530,00
3	**OTROS**				
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +-	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v,	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	$ 4.141.263,00	$ 4.141.263,00
3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN	1,00	$ 577.420,00	$ 577.420,00
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	$ 441.425,00	$ 441.425,00
	TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO			**$ 91.132.065,00**	
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 17.315.092,35	
C.	**TOTAL MOBILIARIO**			**$ 108.447.157,35**	
	TOTAL PISO 5			**$ 245.395.157,95**	
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6				
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		$ 4.522,00	$ 0,00
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 19.137,00	$ 0,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o	ML		$ 2.749,00	$ 0,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		$ 19.537,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 289.093,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 273.539,00
-	-1,00	$ 300.362,00
-	-1,00	$ 120.005,00
-	-1,00	$ 91.925,00
-	-1,00	$ 726.456,00
-	-1,00	$ 649.620,00
-	-1,00	$ 32.534,00
-	-1,00	$ 264.039,00
-	-1,00	$ 3.337.510,00
-	-1,00	$ 1.327.180,00
-	-1,00	$ 1.718.350,00
-	-1,00	$ 586.753,00
-	-1,00	$ 782.338,00
-	-1,00	$ 1.606.587,00
-	-1,00	$ 2.347.014,00
-	-1,00	$ 5.567.173,00
-	-1,00	$ 9.164.530,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 12.090.817,00
-	-1,00	$ 12.090.817,00
-	-1,00	$ 4.141.263,00
-	-1,00	$ 577.420,00
-	-1,00	$ 441.425,00
		$ 91.132.065,00
		$ 17.315.092,35
		$ 108.447.157,35
		$ 188.704.122,17
+	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	3,90	$ 50.528,40
+	25,00	$ 202.250,00
+	66,39	$ 244.713,54
+	22,26	$ 135.852,78
+	53,00	$ 582.841,00
+	212,20	$ 583.337,80
+	2,00	$ 210.276,00
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	10,24	$ 152.709,12
-	0,00	$ 0,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada	ML		$ 188.831,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 18.106,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos,	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 37.009,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		$ 8.173,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 11.318,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.601,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	8,19	$ 86.814,00		$ 0,00	8,19	$ 86.814,00	8,19	$ 86.814,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 12.152,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 12.703,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		$ 12.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 6.487,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 40.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 72.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	36,87	$ 522.447,90		$ 0,00	36,87	$ 522.447,90	36,87	$ 522.447,90
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**					-	0,00	$ 0,00						
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,	M2		$ 86.845,00	$ 0,00	+	21,87	$ 1.899.300,15		$ 0,00	21,87	$ 1.899.300,15	21,87	$ 1.899.300,15
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.3	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2		$ 80.151,00	$ 0,00	+	107,27	$ 8.597.797,77		$ 0,00	107,27	$ 8.597.797,77	107,27	$ 8.597.797,77
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	17,60	$ 115.561,60		$ 0,00	17,60	$ 115.561,60	17,60	$ 115.561,60
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	152,09	$ 2.313.136,81	54,64	$ 831.019,76	97,45	$ 1.482.117,05	152,09	$ 2.313.136,81
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.14	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial (PEI V).	M2		$ 97.561,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00	+	16,38	$ 421.866,90		$ 0,00	16,38	$ 421.866,90	16,38	$ 421.866,90
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	132,24	$ 403.728,72		$ 0,00	132,24	$ 403.728,72	132,24	$ 403.728,72
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 606.758,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.213.516,00	2,00	$ 1.213.516,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.213.516,00
19.10	Tablero electrico Tipo Pesado 30 Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN		$ 714.490,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.428.980,00		$ 0,00	2,00	$ 1.428.980,00	2,00	$ 1.428.980,00
19,14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00	+	30,00	$ 920.640,00		$ 0,00	30,00	$ 920.640,00	30,00	$ 920.640,00
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	47,70	$ 1.005.229,80	7,36	$ 155.104,64	40,34	$ 850.125,16	47,70	$ 1.005.229,80
19.25	Tubería EMT 1-1/4¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 25.735,00	$ 0,00	+	32,95	$ 847.968,25	32,95	$ 847.968,25	0,00	$ 0,00	32,95	$ 847.968,25
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00	+	2,00	$ 107.014,00	2,00	$ 107.014,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 107.014,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00	+	1,00	$ 98.173,00		$ 0,00	1,00	$ 98.173,00	1,00	$ 98.173,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	28,00	$ 3.973.088,00		$ 0,00	28,00	$ 3.973.088,00	28,00	$ 3.973.088,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	28,00	$ 7.935.172,00		$ 0,00	28,00	$ 7.935.172,00	28,00	$ 7.935.172,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00	+	1,00	$ 201.889,00	1,00	$ 201.889,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 201.889,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	19,57	$ 2.778.039,78		$ 0,00	19,57	$ 2.778.039,78	19,57	$ 2.778.039,78
20.9	Canaleta Metalica 15x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 50.662,00	$ 0,00	+	61,75	$ 3.128.378,50	24,31	$ 1.231.593,22	37,44	$ 1.896.785,28	61,75	$ 3.128.378,50
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	29,00	$ 201.753,00		$ 0,00	29,00	$ 201.753,00	29,00	$ 201.753,00
20.17	Patch panel de 12 puertos Cat 6A PANDUIT. (Suministro e instalación)	UN		$ 739.585,00	$ 0,00	+	1,00	$ 739.585,00		$ 0,00	1,00	$ 739.585,00	1,00	$ 739.585,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 775.982,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.551.964,00	2,00	$ 1.551.964,00		$ 0,00	2,00	$ 1.551.964,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	1.875,11	$ 14.267.711,99	650,11	$ 4.946.686,99	1.225,00	$ 9.321.025,00	1.875,11	$ 14.267.711,99
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	32,00	$ 1.433.792,00	6,00	$ 268.836,00	26,00	$ 1.164.956,00	32,00	$ 1.433.792,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	13,00	$ 582.478,00	5,00	$ 224.030,00	8,00	$ 358.448,00	13,00	$ 582.478,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	24,00	$ 336.192,00		$ 0,00	24,00	$ 336.192,00	24,00	$ 336.192,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	13,00	$ 196.989,00	5,00	$ 75.765,00	8,00	$ 121.224,00	13,00	$ 196.989,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	45,00	$ 1.380.240,00	45,00	$ 1.380.240,00		$ 0,00	45,00	$ 1.380.240,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	45,00	$ 3.542.310,00	45,00	$ 3.542.310,00		$ 0,00	45,00	$ 3.542.310,00
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00						
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	108,78	$ 317.855,16		$ 0,00	108,78	$ 317.855,16	108,78	$ 317.855,16
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 64.712.120,97**		**$ 16.577.936,86**		**$ 48.134.184,11**		**$ 64.712.120,97**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 11.001.060,56		$ 2.818.249,27		$ 8.182.811,30		$ 11.001.060,56
	IMPREVISTOS	3%						$ 1.941.363,63		$ 497.338,11		$ 1.444.025,53		$ 1.941.363,63
	UTIIDAD	5%						$ 3.235.606,05		$ 828.896,84		$ 2.406.709,21		$ 3.235.606,05
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 614.765,15		$ 157.490,40		$ 457.274,75		$ 614.765,15
A.	**TOTAL OBRA**							**$ 81.504.916,36**		**$ 20.879.911,48**		**$ 60.625.004,90**		**$ 81.504.916,36**
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP -17	Prolongación de altura de aspersores, incluye desmonte,purga red secundaria,suministro e instalacion aspersor	UN		$ 123.414,84		+	9,00	$ 1.110.733,56		$ 0,00	9,00	$ 1.110.733,56	9,00	$ 1.110.733,56
NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.	ML		$ 15.500,00		+	25,05	$ 388.275,00		$ 0,00	25,05	$ 388.275,00	25,05	$ 388.275,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	389,00	$ 5.912.800,00	109,00	$ 1.656.800,00	280,00	$ 4.256.000,00	389,00	$ 5.912.800,00
NP- 45	Conector Biometálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	12,00	$ 323.532,00		$ 0,00	12,00	$ 323.532,00	12,00	$ 323.532,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 107.414,00		+	5,00	$ 537.070,00		$ 0,00	5,00	$ 537.070,00	5,00	$ 537.070,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	5,00	$ 508.235,00	3,00	$ 304.941,00	2,00	$ 203.294,00	5,00	$ 508.235,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	33,00	$ 3.211.791,00	6,00	$ 583.962,00	27,00	$ 2.627.829,00	33,00	$ 3.211.791,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	2,00	$ 249.616,00		$ 0,00	2,00	$ 249.616,00	2,00	$ 249.616,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	34,00	$ 3.607.366,00	7,00	$ 742.693,00	27,00	$ 2.864.673,00	34,00	$ 3.607.366,00
NP -59	Desmonte Cableado Electrico, disposicion final	ML		$ 1.511,94		+	161,19	$ 243.709,61	161,19	$ 243.709,61		$ 0,00	161,19	$ 243.709,61
NP-60	Refuerzo de muros en madera para soportes de carteras y dinteles en muros de drywall y superboard en soporte de puertas y divisiones de piso techo	ML		$ 20.649,00		+	6,30	$ 130.088,70	6,30	$ 130.088,70		$ 0,00	6,30	$ 130.088,70
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 15.849.418,56**		**$ 3.662.194,31**		**$ 12.561.022,56**		**$ 16.223.216,87**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 2.694.401,16		$ 622.573,03		$ 2.135.373,84		$ 2.757.946,87
	IMPREVISTOS	3%						$ 475.482,56		$ 109.865,83		$ 376.830,69		$ 486.696,52
	UTIIDAD	5%						$ 792.470,93		$ 183.109,72		$ 628.051,13		$ 811.160,84
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 150.569,48		$ 34.790,85		$ 119.329,71		$ 154.120,56
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**							**$ 19.962.342,68**		**$ 4.612.533,73**		**$ 15.820.607,92**		**$ 20.433.141,66**
C. MOBILIARIO														
1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN		$ 1.072.970,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos	UN	1,00	$ 571.617,00	$ 571.617,00	-	-1,00	$ 571.617,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	$ 376.330,00	$ 376.330,00	-	-1,00	$ 376.330,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	$ 215.869,00	$ 215.869,00	-	-1,00	$ 215.869,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2		$ 664.586,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media	M2		$ 848.192,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO			**$ 1.163.816,00**				**-$ 1.163.816,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 221.125,04				$ 221.125,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
C.	**TOTAL MOBILIARIO**			**$ 1.384.941,04**				**$ 1.384.941,04**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6 A+B+C							**$ 100.082.318,00**		**$ 25.492.445,21**		**$ 76.445.612,82**		**$ 101.938.058,02**
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 7													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML		$ 19.137,00	$ 0,00	+	28,00	$ 535.836,00		$ 0,00	28,00	$ 535.836,00	28,00	$ 535.836,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	24,03	$ 311.332,68		$ 0,00	24,03	$ 311.332,68	24,03	$ 311.332,68
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	16,00	$ 255.264,00		$ 0,00	16,00	$ 255.264,00	16,00	$ 255.264,00
1.12	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes,	UN		$ 18.314,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes,	M2		$ 13.380,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.934,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	103,00	$ 833.270,00		$ 0,00	103,00	$ 833.270,00	103,00	$ 833.270,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00	+	3,23	$ 46.634,74		$ 0,00	3,23	$ 46.634,74	3,23	$ 46.634,74
1.17	Desmonte de pasamanos en madera. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 21.828,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	256,80	$ 946.564,80	156,80	$ 577.964,80	100,00	$ 368.600,00	256,80	$ 946.564,80
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	196,72	$ 1.200.582,16	59,13	$ 360.870,39	137,59	$ 839.711,77	196,72	$ 1.200.582,16
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	174,00	$ 1.913.478,00	17,00	$ 186.949,00	157,00	$ 1.726.529,00	174,00	$ 1.913.478,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	5.760,00	$ 15.834.240,00		$ 0,00	5.760,00	$ 15.834.240,00	5.760,00	$ 15.834.240,00
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	3,00	$ 315.414,00		$ 0,00	3,00	$ 315.414,00	3,00	$ 315.414,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros	ML		$ 19.537,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	Desmonte de extractores en cielo raso. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 289.093,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada	ML		$ 188.831,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 18.106,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos,	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición	M2		$ 37.009,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Desmonte de estructuras Metálicas. (Incluye equipos, trasiego y disposición	ML		$ 8.173,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	Demolición de pasamanos en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 11.318,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 11.601,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	496,15	$ 5.259.190,00		$ 0,00	496,15	$ 5.259.190,00	496,15	$ 5.259.190,00
1.37	Demolición de Pisos baldosa granito y plantilla. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 12.152,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	Demolición granito escaleras. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 12.703,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	m2		$ 12.053,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	182,21	$ 1.004.523,73		$ 0,00	182,21	$ 1.004.523,73	182,21	$ 1.004.523,73
1.41	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 6.487,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	+	80,38	$ 1.546.591,58	1,21	$ 23.281,61	79,17	$ 1.523.309,97	80,38	$ 1.546.591,58
1.43	Demolición muro mampostería ladrillo e=25 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 40.606,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.44	Demolición muro mampostería ladrillo e=40 cm. (Incluye trasiego y disposición	M2		$ 72.398,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	51,42	$ 728.621,40		$ 0,00	51,42	$ 728.621,40	51,42	$ 728.621,40
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.48	Demolición de Poceta aseo. (Incluye enchape, machones, trasiego y	UN		$ 35.237,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	M2		$ 59.197,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición	ML		$ 23.322,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.51	Demolición escaleras en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición	M3		$ 336.257,00	$ 0,00	+	1,00	$ 336.257,00		$ 0,00	1,00	$ 336.257,00	1,00	$ 336.257,00
1.52	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=25 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 54.128,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.54	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 29.343,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.55	Demolición de Placa aligerada de Concreto e=45 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 66.596,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.56	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=7 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 23.443,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.57	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 36.170,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.58	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=15 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 30.862,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.59	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=20 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 48.952,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
1.60	Demolición de Placa de Concreto reforzado e=30 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 82.887,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.61	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3		$ 213.385,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición	ML		$ 129.405,00	$ 0,00	+	22,13	$ 2.863.732,65	6,80	$ 879.954,00	15,33	$ 1.983.778,65	22,13	$ 2.863.732,65
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye	UN		$ 14.475,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.64	Perforación pasa cables/redes de 40x20 cm en muros y placas de entrepiso.	UN		$ 234.377,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.65	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 3.997,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2	Alistado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 17.758,00	$ 0,00	+	300,52	$ 5.336.634,16		$ 0,00	300,52	$ 5.336.634,16	300,52	$ 5.336.634,16
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.13	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML		$ 12.297,00	$ 0,00	+	18,00	$ 221.346,00		$ 0,00	18,00	$ 221.346,00	18,00	$ 221.346,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	531,27	$ 3.488.318,82	531,27	$ 3.488.318,82		$ 0,00	531,27	$ 3.488.318,82
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	184,71	$ 2.809.254,39	184,71	$ 2.809.254,39		$ 0,00	184,71	$ 2.809.254,39
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00	+	479,38	$ 5.219.010,06	479,38	$ 5.219.010,06		$ 0,00	479,38	$ 5.219.010,06
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.15	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye	ML		$ 25.755,00	$ 0,00	+	315,09	$ 8.115.142,95	244,69	$ 6.301.990,95	70,40	$ 1.813.152,00	315,09	$ 8.115.142,95
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	589,35	$ 1.799.285,55	589,35	$ 1.799.285,55		$ 0,00	589,35	$ 1.799.285,55
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación.	UN		$ 504.034,00	$ 0,00	+	1,00	$ 504.034,00	1,00	$ 504.034,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 504.034,00
19.9	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 24 circuitos. (Suministro e instalación.	UN		$ 606.758,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.213.516,00	2,00	$ 1.213.516,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.213.516,00
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00	+	44,00	$ 1.350.272,00	44,00	$ 1.350.272,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 1.350.272,00
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	210,00	$ 4.425.540,00	210,00	$ 4.425.540,00	0,00	$ 0,00	210,00	$ 4.425.540,00
19.31	Tubería Conduit PVC pesado 1 1/4" subterránea. (Suministro e instalación.	ML		$ 17.642,00	$ 0,00	+	210,00	$ 3.704.820,00	210,00	$ 3.704.820,00	0,00	$ 0,00	210,00	$ 3.704.820,00
19.38	Caja de paso metálica 30x30 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 65.668,00	$ 0,00	+	2,00	$ 131.336,00	2,00	$ 131.336,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 131.336,00
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 51.738,00	$ 0,00	+	1,00	$ 51.738,00	1,00	$ 51.738,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 51.738,00
19.47	Salida interruptor conmutable sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 96.817,00	$ 0,00	+	1,00	$ 96.817,00	1,00	$ 96.817,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 96.817,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	106,00	$ 15.040.976,00	106,00	$ 15.040.976,00		$ 0,00	106,00	$ 15.040.976,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	106,00	$ 30.040.294,00	106,00	$ 30.040.294,00		$ 0,00	106,00	$ 30.040.294,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00	+	5,00	$ 1.009.445,00	5,00	$ 1.009.445,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.009.445,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.2	Bandeja portacables de 20x6 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 125.524,00	$ 0,00	+	3,00	$ 376.572,00	3,00	$ 376.572,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 376.572,00
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	45,00	$ 6.387.930,00	45,00	$ 6.387.930,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 6.387.930,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 73.018,00	$ 0,00	+	142,00	$ 10.368.556,00	142,00	$ 10.368.556,00	0,00	$ 0,00	142,00	$ 10.368.556,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	101,00	$ 702.657,00	96,00	$ 667.872,00	5,00	$ 34.785,00	101,00	$ 702.657,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN		$ 1.107.399,00	$ 0,00	+	2,00	$ 2.214.798,00	2,00	$ 2.214.798,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.214.798,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	5.185,00	$ 39.452.665,00	5.126,00	$ 39.003.734,00	59,00	$ 448.931,00	5.185,00	$ 39.452.665,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	98,00	$ 4.390.988,00	96,00	$ 4.301.376,00	2,00	$ 89.612,00	98,00	$ 4.390.988,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	35,00	$ 1.568.210,00	35,00	$ 1.568.210,00		$ 0,00	35,00	$ 1.568.210,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	62,00	$ 868.496,00	61,00	$ 854.488,00	1,00	$ 14.008,00	62,00	$ 868.496,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	36,00	$ 545.508,00	36,00	$ 545.508,00		$ 0,00	36,00	$ 545.508,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	98,00	$ 3.005.856,00	98,00	$ 3.005.856,00		$ 0,00	98,00	$ 3.005.856,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	133,00	$ 10.469.494,00	131,00	$ 10.312.058,00	2,00	$ 157.436,00	133,00	$ 10.469.494,00
20.33	Certificacion de puntos de voz y datos.	UN		$ 13.363,00	$ 0,00	+	1,00	$ 13.363,00		$ 0,00	1,00	$ 13.363,00	1,00	$ 13.363,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 39.489.512,90**		**$ 158.822.625,57**		**$ 40.031.780,10**		**$ 198.854.405,67**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 6.713.217,19		$ 26.999.846,35		$ 6.805.402,62		$ 33.805.248,96
	IMPREVISTOS	3%						$ 1.184.685,39		$ 4.764.678,77		$ 1.200.953,40		$ 5.965.632,17
	UTIIDAD	5%						$ 1.974.475,65		$ 7.941.131,28		$ 2.001.589,01		$ 9.942.720,28
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 375.150,37		$ 1.508.814,94		$ 380.301,91		$ 1.889.116,85
A.	**TOTAL OBRA**							**$ 49.737.041,50**		**$ 200.037.096,91**		**$ 50.420.027,04**		**$ 250.457.123,94**
B. NO PREVISTOS														
	NO PREVISTOS													
NP.- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	un		$ 58.007,93		+	391,47	$ 22.708.364,36		$ 0,00	391,47	$ 22.708.364,36	391,47	$ 22.708.364,36
NP.- 2	Desarme, transporte y ensamble de puestos de trabajo	un		$ 74.953,07		+	41,00	$ 3.073.075,87		$ 0,00	41,00	$ 3.073.075,87	41,00	$ 3.073.075,87
NP -5	Mortero grouting (2500 psi) suministro + instalación	m3		$ 543.335,43		+	0,54	$ 293.401,13		$ 0,00	0,54	$ 293.401,13	0,54	$ 293.401,13
NP -18	18DiseñoeléctricoycableadoestructuradooficinaOSEGpiso5,archivopiso6,piso 7 y piso 8, EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA call 8 12b-82GLB	GLB		$ 9.000.000,00		+	1,00	$ 9.000.000,00	1,00	$ 9.000.000,00		$ 0,00	1,00	$ 9.000.000,00
NP-39	Cable libre de halogenos calibre 6 AWG SUM+INST cumplimiento retie, incluye suministro e instalación.	ML		$ 15.500,00		+	59,00	$ 914.500,00	59,00	$ 914.500,00		$ 0,00	59,00	$ 914.500,00
NP -40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	1.565,23	$ 23.791.496,00	1.565,23	$ 23.791.496,00		$ 0,00	1.565,23	$ 23.791.496,00
NP- 45	Conector Biométalico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	30,00	$ 808.830,00	30,00	$ 808.830,00		$ 0,00	30,00	$ 808.830,00
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	13,00	$ 1.321.411,00	13,00	$ 1.321.411,00		$ 0,00	13,00	$ 1.321.411,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	95,00	$ 9.246.065,00	95,00	$ 9.246.065,00		$ 0,00	95,00	$ 9.246.065,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	6,00	$ 748.848,00	6,00	$ 748.848,00		$ 0,00	6,00	$ 748.848,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	96,00	$ 10.185.504,00	92,00	$ 9.761.108,00	4,00	$ 424.396,00	96,00	$ 10.185.504,00
NP -53	Piso porcelanato doble carga 60X60, incluye suministro e instalación	M2		$ 96.500,00		+	500,86	$ 48.332.990,00	13,77	$ 1.328.805,00	487,09	$ 47.004.185,00	500,86	$ 48.332.990,00
NP -65	Tubería aceroNEGROROSCADOcarbon11/4"SCH40,incluyeaccesorios,	ML		$ 170.784,98		+	40,00	$ 6.831.399,20	40,00	$ 6.831.399,20		$ 0,00	40,00	$ 6.831.399,20
NP -67	Suministro de materiales e instalación de rociador colgante 3/4", incluye	UN		$ 366.488,00		+	22,00	$ 8.062.736,00	22,00	$ 8.062.736,00		$ 0,00	22,00	$ 8.062.736,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NP							**$ 145.318.620,56**		**$ 71.815.198,20**		**$ 73.503.422,36**		**$ 145.318.620,56**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 24.704.165,50		$ 12.208.583,69		$ 12.495.581,80		$ 24.704.165,50
	IMPREVISTOS	3%						$ 4.359.558,62		$ 2.154.455,95		$ 2.205.102,67		$ 4.359.558,62
	UTIIDAD	5%						$ 7.265.931,03		$ 3.590.759,91		$ 3.675.171,12		$ 7.265.931,03

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 1.380.526,90		$ 682.244,38		$ 698.282,51		$ 1.380.526,90
B.	**TOTAL NO PREVISTOS**							**$ 183.028.802,59**		**$ 90.451.242,13**		**$ 92.577.560,46**		**$ 183.028.802,59**
	TOTAL EDIFICIO BOLSA PISO 7 A+B									**$ 290.488.339,04**		**$ 142.997.587,50**		**$ 433.485.926,54**
	EDIFICIO CALLE 18													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	M2		$ 4.522,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon	M2		$ 13.171,00	$ 0,00	+	161,19	$ 2.123.033,49	161,19	$ 2.123.033,49	0,00	$ 0,00	161,19	$ 2.123.033,49
1.6	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 38.943,00	$ 0,00	+	1,00	$ 38.943,00		$ 0,00	1,00	$ 38.943,00	1,00	$ 38.943,00
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.956,00	$ 0,00	+	120,34	$ 1.559.125,04		$ 0,00	120,34	$ 1.559.125,04	120,34	$ 1.559.125,04
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 16.392,00	$ 0,00	+	4,00	$ 65.568,00		$ 0,00	4,00	$ 65.568,00	4,00	$ 65.568,00
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	15,00	$ 239.310,00		$ 0,00	15,00	$ 239.310,00	15,00	$ 239.310,00
1.13	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2		$ 13.380,00	$ 0,00	+	17,97	$ 240.438,60		$ 0,00	17,97	$ 240.438,60	17,97	$ 240.438,60
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 8.090,00	$ 0,00	+	204,00	$ 1.650.360,00		$ 0,00	204,00	$ 1.650.360,00	204,00	$ 1.650.360,00
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 14.438,00	$ 0,00	+	3,34	$ 48.222,92		$ 0,00	3,34	$ 48.222,92	3,34	$ 48.222,92
1.18	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 3.686,00	$ 0,00	+	548,65	$ 2.022.323,90		$ 0,00	548,65	$ 2.022.323,90	548,65	$ 2.022.323,90
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML		$ 6.103,00	$ 0,00	+	124,01	$ 756.833,03	15,00	$ 91.545,00	109,01	$ 665.288,03	124,01	$ 756.833,03
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN		$ 10.997,00	$ 0,00	+	128,00	$ 1.407.616,00		$ 0,00	128,00	$ 1.407.616,00	128,00	$ 1.407.616,00
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 2.749,00	$ 0,00	+	689,52	$ 1.895.490,48		$ 0,00	689,52	$ 1.895.490,48	689,52	$ 1.895.490,48
1.22	Desmonte de tableros eléctricos existentes. (Incluye demolición, desmonte,	UN		$ 105.138,00	$ 0,00	+	13,00	$ 1.366.794,00		$ 0,00	13,00	$ 1.366.794,00	13,00	$ 1.366.794,00
1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de	UN		$ 14.145,00	$ 0,00	+	4,00	$ 56.580,00		$ 0,00	4,00	$ 56.580,00	4,00	$ 56.580,00
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 14.913,00	$ 0,00	+	1.000,63	$ 14.922.395,19	282,23	$ 4.208.895,99	718,40	$ 10.713.499,20	1.000,63	$ 14.922.395,19
1.27	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección <= 0,70 X 0,35 Mt.	ML		$ 30.082,00	$ 0,00	+	49,10	$ 1.477.026,20		$ 0,00	49,10	$ 1.477.026,20	49,10	$ 1.477.026,20
1.30	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2		$ 4.053,00	$ 0,00	+	289,51	$ 1.173.384,03		$ 0,00	289,51	$ 1.173.384,03	289,51	$ 1.173.384,03
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 5.669,00	$ 0,00	+	19,77	$ 112.076,13	19,77	$ 112.076,13	0,00	$ 0,00	19,77	$ 112.076,13
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	177,05	$ 976.076,65		$ 0,00	177,05	$ 976.076,65	177,05	$ 976.076,65
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 19.241,00	$ 0,00	+	192,72	$ 3.708.125,52		$ 0,00	192,72	$ 3.708.125,52	192,72	$ 3.708.125,52
1.45	Demolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura,	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	+	7,74	$ 116.618,58		$ 0,00	7,74	$ 116.618,58	7,74	$ 116.618,58
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 14.170,00	$ 0,00	+	287,71	$ 4.076.850,70		$ 0,00	287,71	$ 4.076.850,70	287,71	$ 4.076.850,70
1.47	Demolición de Dinteles en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 24.395,00	$ 0,00	+	33,74	$ 823.087,30		$ 0,00	33,74	$ 823.087,30	33,74	$ 823.087,30
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	ML		$ 23.322,00	$ 0,00	+	3,28	$ 76.496,16		$ 0,00	3,28	$ 76.496,16	3,28	$ 76.496,16
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00	+	10,80	$ 309.819,60		$ 0,00	10,80	$ 309.819,60	10,80	$ 309.819,60
1.66	Escarificado de superficies en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 12.219,00	$ 0,00	+	25,71	$ 314.150,49		$ 0,00	25,71	$ 314.150,49	25,71	$ 314.150,49

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	519,06	$ 46.633.907,58		$ 0,00	519,06	$ 46.633.907,58	519,06	$ 46.633.907,58
6.5	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm,pintura Vinilo 1 mano.	ML		$ 67.096,00	$ 0,00	+	36,63	$ 2.457.726,48	2,83	$ 189.881,68	33,80	$ 2.267.844,80	36,63	$ 2.457.726,48
6.6	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm. Ancho <50 cm, pintura	M2		$ 80.220,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00	+	62,93	$ 2.127.537,44		$ 0,00	62,93	$ 2.127.537,44	62,93	$ 2.127.537,44
7.4	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 25.035,00	$ 0,00	+	285,25	$ 7.141.233,75		$ 0,00	285,25	$ 7.141.233,75	285,25	$ 7.141.233,75
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	+	19,94	$ 184.624,46		$ 0,00	19,94	$ 184.624,46	19,94	$ 184.624,46
9.	**CIELO RASOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2		$ 85.805,00	$ 0,00	+	519,28	$ 44.556.820,40		$ 0,00	519,28	$ 44.556.820,40	519,28	$ 44.556.820,40
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	823,44	$ 5.406.707,04	92,57	$ 607.814,62	730,87	$ 4.798.892,42	823,44	$ 5.406.707,04
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	+	336,41	$ 3.582.093,68	39,12	$ 416.549,76	297,29	$ 3.165.543,92	336,41	$ 3.582.093,68
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	+	3.577,39	$ 54.408.524,51	318,39	$ 4.842.393,51	3.259,00	$ 49.566.131,00	3.577,39	$ 54.408.524,51
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00	+	1.387,47	$ 15.105.385,89	716,47	$ 7.800.208,89	671,00	$ 7.305.177,00	1.387,47	$ 15.105.385,89
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML		$ 8.447,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00	+	413,98	$ 60.718.860,58	31,92	$ 4.681.738,32	382,06	$ 56.037.122,26	413,98	$ 60.718.860,58
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00	+	213,52	$ 4.389.117,12	22,06	$ 453.465,36	191,46	$ 3.935.651,76	213,52	$ 4.389.117,12
11.33	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML		$ 51.291,00	$ 0,00	+	117,96	$ 6.050.286,36		$ 0,00	117,96	$ 6.050.286,36	117,96	$ 6.050.286,36
12.	**CUBIERTA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.1	Impermeabilización con Manto asfáltico sin Foil de aluminio, con acabado en pintura Bituminosa. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes,	M2		$ 62.059,00	$ 0,00	+	398,85	$ 24.752.232,15		$ 0,00	398,85	$ 24.752.232,15	398,85	$ 24.752.232,15
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	+	87,00	$ 4.169.214,00	11,00	$ 527.142,00	76,00	$ 3.642.072,00	87,00	$ 4.169.214,00
14.30	Cerramiento tubo y malla eslabonada (Suministro e instalación)	M2		$ 101.422,00	$ 0,00	+	90,25	$ 9.153.335,50		$ 0,00	90,25	$ 9.153.335,50	90,25	$ 9.153.335,50
19.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.1	Alambre de Continuidad No. 12. (Suministro e instalación)	ML		$ 3.053,00	$ 0,00	+	764,52	$ 2.334.079,56		$ 0,00	764,52	$ 2.334.079,56	764,52	$ 2.334.079,56
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.688,00	$ 0,00	+	47,00	$ 1.442.336,00	6,00	$ 184.128,00	41,00	$ 1.258.208,00	47,00	$ 1.442.336,00
19.15	Breaker 1 polo 40A 15 Kva. (Suministro e instalación)	UN		$ 51.499,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.19	Breaker enchufable de 3x40A. (Suministro e instalación)	UN		$ 113.810,00	$ 0,00	+	1,00	$ 113.810,00		$ 0,00	1,00	$ 113.810,00	1,00	$ 113.810,00
19.20	Breaker enchufable de 3x80A. (Suministro e instalación)	UN		$ 199.573,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18.345,00	$ 0,00	+	83,97	$ 1.540.429,65	70,00	$ 1.284.150,00	13,97	$ 256.279,65	83,97	$ 1.540.429,65
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión,	ML		$ 21.074,00	$ 0,00	+	33,16	$ 698.813,84		$ 0,00	33,16	$ 698.813,84	33,16	$ 698.813,84
19.35	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 12.963,00	$ 0,00	+	1,00	$ 12.963,00		$ 0,00	1,00	$ 12.963,00	1,00	$ 12.963,00
19.36	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 53.507,00	$ 0,00	+	2,00	$ 107.014,00		$ 0,00	2,00	$ 107.014,00	2,00	$ 107.014,00
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UN		$ 98.173,00	$ 0,00	+	2,00	$ 196.346,00		$ 0,00	2,00	$ 196.346,00	2,00	$ 196.346,00
19.46	Salidas interruptor con sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 160.047,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.59	Salida iluminación, tubería PVC Conduit. (Suministro e instalación. Incluye	UN		$ 71.478,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	87,00	$ 12.344.952,00	87,00	$ 12.344.952,00		$ 0,00	87,00	$ 12.344.952,00
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja,	UN		$ 111.951,00	$ 0,00	+	3,00	$ 335.853,00	3,00	$ 335.853,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 335.853,00
19.75	Reinstalación lámparas. (Incluye accesorios necesarios)	UN		$ 35.039,00	$ 0,00	+	26,00	$ 911.014,00	26,00	$ 911.014,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 911.014,00
19.79	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija	UN												
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	159,00	$ 45.060.441,00	71,00	$ 20.121.329,00	88,00	$ 24.939.112,00	159,00	$ 45.060.441,00
19.93	Lámpara Aplique LED de Emergencia para pared. (Suministro e instalación.	UN		$ 201.889,00	$ 0,00	+	4,00	$ 807.556,00	4,00	$ 807.556,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 807.556,00
19.96	Tapa Ciega. (Suministro e instalación)	UN		$ 3.620,00	$ 0,00	+	87,00	$ 314.940,00	87,00	$ 314.940,00	0,00	$ 0,00	87,00	$ 314.940,00
19.97	Sensor de movimiento D-T. (Suministro e instalación)	UN		$ 490.548,00	$ 0,00	+	3,00	$ 1.471.644,00	3,00	$ 1.471.644,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.471.644,00
20.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00						
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 141.954,00	$ 0,00	+	42,00	$ 5.962.068,00		$ 0,00	42,00	$ 5.962.068,00	42,00	$ 5.962.068,00
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes,	ML		$ 73.018,00	$ 0,00	+	187,00	$ 13.654.366,00	76,79	$ 5.607.052,22	110,21	$ 8.047.313,78	187,00	$ 13.654.366,00
20.10	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN		$ 6.957,00	$ 0,00	+	61,00	$ 424.377,00	7,00	$ 48.699,00	54,00	$ 375.678,00	61,00	$ 424.377,00
20.18	Patch Panel 24 Puertos AMP. (Suministro e instalación)	UN		$ 775.982,00	$ 0,00	+	3,00	$ 2.327.946,00	1,00	$ 775.982,00	2,00	$ 1.551.964,00	3,00	$ 2.327.946,00
20.19	Patch Panel de 48 puertos Cat 6A. (Suministro e instalación)	UN		$ 1.107.399,00	$ 0,00	+	4,00	$ 4.429.596,00	4,00	$ 4.429.596,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.429.596,00
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e	ML		$ 7.609,00	$ 0,00	+	3.086,00	$ 23.481.374,00	671,11	$ 5.106.475,99	2.414,89	$ 18.374.898,01	3.086,00	$ 23.481.374,00
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	79,00	$ 3.539.674,00	4,00	$ 179.224,00	75,00	$ 3.360.450,00	79,00	$ 3.539.674,00
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN		$ 44.806,00	$ 0,00	+	18,00	$ 806.508,00		$ 0,00	18,00	$ 806.508,00	18,00	$ 806.508,00
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 14.008,00	$ 0,00	+	61,00	$ 854.488,00		$ 0,00	61,00	$ 854.488,00	61,00	$ 854.488,00
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN		$ 15.153,00	$ 0,00	+	18,00	$ 272.754,00		$ 0,00	18,00	$ 272.754,00	18,00	$ 272.754,00
20.27	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administración. (Suministro e instalación)	UN		$ 30.672,00	$ 0,00	+	97,00	$ 2.975.184,00	37,00	$ 1.134.864,00	60,00	$ 1.840.320,00	97,00	$ 2.975.184,00
20.29	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), Azul. (Suministro e instalación)	UN		$ 78.718,00	$ 0,00	+	60,00	$ 4.723.080,00		$ 0,00	60,00	$ 4.723.080,00	60,00	$ 4.723.080,00
21.	**OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.11	Cerramiento metálico h=2,00 m, en tubo agua negra de 2", anclado al	ML		$ 86.614,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							**$ 463.537.959,00**		**$ 81.112.203,96**		**$ 382.425.755,04**		**$ 463.537.959,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 78.801.453,03		$ 13.789.074,67		$ 65.012.378,36		$ 78.801.453,03
	IMPREVISTOS	3%						$ 13.906.138,77		$ 2.433.366,12		$ 11.472.772,65		$ 13.906.138,77
	UTIIDAD	5%						$ 23.176.897,95		$ 4.055.610,20		$ 19.121.287,75		$ 23.176.897,95
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 4.403.610,61		$ 770.565,94		$ 3.633.044,67		$ 4.403.610,61
A.	**TOTAL OBRA DELCOP**				$ 0,00	-	0,00	**$ 583.826.059,36**		**$ 102.160.820,89**	0,00	**$ 481.665.238,47**	0,00	**$ 583.826.059,36**
NP	**NO PREVISTOS**													
NP- 1	Traslado de division de oficina (desarme, transporte, ensamble)	M2		$ 58.007,93		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 2	Desarme, transportey ensamble de puestos de trabajo	UN		$ 74.953,07		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 3	Desmonte division en vidrio piso techo	M2		$ 44.471,58		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP- 6	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2		$ 6.800,00		+	147,39	$ 1.002.252,00		$ 0,00	147,39	$ 1.002.252,00	147,39	$ 1.002.252,00
NP- 7	Retiro pegante de alfombra en piso	M2		$ 8.191,00		+	15,76	$ 129.090,16		$ 0,00	15,76	$ 129.090,16	15,76	$ 129.090,16

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
NP- 8	Desmonte de piso en vinilo incluye trasciego y retiro	M2		$ 7.677,19		+	56,11	$ 430.767,13		$ 0,00	56,11	$ 430.767,13	56,11	$ 430.767,13
NP- 9	Desmonte de division de espacios modular en pvc, incluye trasiego y retiro	M2		$ 45.205,00		+	16,85	$ 761.704,25		$ 0,00	16,85	$ 761.704,25	16,85	$ 761.704,25
NP -11	Puerta deslizante sobre riel angulo y malla eslabonada	UN		$ 1.400.000,00		+	4,00	$ 5.600.000,00		$ 0,00	4,00	$ 5.600.000,00	4,00	$ 5.600.000,00
NP -12	Desmonte, corte y montaje de puertas metálicas	UN		$ 144.596,10		+	1,00	$ 144.596,10		$ 0,00	1,00	$ 144.596,10	1,00	$ 144.596,10
NP- 39	Cable libre de halogenoscalibre 6 AWG , suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.500,00		+	51,19	$ 793.445,00		$ 0,00	51,19	$ 793.445,00	51,19	$ 793.445,00
NP- 40	Cable libre de halogenos eléctrico 3x12 thhn, suministro e instalación, cumplimiento retie	ML		$ 15.200,00		+	1.760,00	$ 26.752.000,00	408,00	$ 6.201.600,00	1.352,00	$ 20.550.400,00	1.760,00	$ 26.752.000,00
NP- 45	Conector Bimetálico puesta tierrra #6 , incluye suminietro e instalación	UN		$ 26.961,00		+	19,00	$ 512.259,00		$ 0,00	19,00	$ 512.259,00	19,00	$ 512.259,00
NP -46	Salida interruptor sencillo. (PVC Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 107.414,00		+	4,00	$ 429.656,00	4,00	$ 429.656,00		$ 0,00	4,00	$ 429.656,00
NP- 47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	3,00	$ 304.941,00		$ 0,00	3,00	$ 304.941,00	3,00	$ 304.941,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	86,00	$ 8.370.122,00		$ 0,00	86,00	$ 8.370.122,00	86,00	$ 8.370.122,00
NP -49	Salida interruptor doble (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento retie	UN		$ 124.808,00		+	7,00	$ 873.656,00		$ 0,00	7,00	$ 873.656,00	7,00	$ 873.656,00
NP -50	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 106.099,00		+	82,00	$ 8.700.118,00	5,00	$ 530.495,00	77,00	$ 8.169.623,00	82,00	$ 8.700.118,00
NP -51	Salida iluminación, tubería SCH 40. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, accesorios	UN		$ 110.895,00		+	89,00	$ 9.869.655,00	2,00	$ 221.790,00	87,00	$ 9.647.865,00	89,00	$ 9.869.655,00
NP -62	Suministro de sistema de soporte de portón vehicular, reparación de rodachinas y hoja	GLB		$ 1.605.154,00		+	1,00	$ 1.605.154,00		$ 0,00	1,00	$ 1.605.154,00	1,00	$ 1.605.154,00
NP -89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYAS EN VIDIRO LAMINADO 3+3	UN		$ 483.000,00		+	3,00	$ 1.449.000,00	3,00	$ 1.449.000,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.449.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS							**$ 67.728.415,64**		**$ 8.832.541,00**		**$ 58.895.874,64**		**$ 67.728.415,64**
	ADMINISTRACIÓN	17%						$ 11.513.830,66		$ 1.501.531,97		$ 10.012.298,69		$ 11.513.830,66
	IMPREVISTOS	3%						$ 2.031.852,47		$ 264.976,23		$ 1.766.876,24		$ 2.031.852,47
	UTIIDAD	5%						$ 3.386.420,78		$ 441.627,05		$ 2.944.793,73		$ 3.386.420,78
	IVA (Sobre utilidad)	19%						$ 643.419,95		$ 83.909,14		$ 559.510,81		$ 643.419,95
B.	**TOTAL NO PREVISTOS DELCOP**				$ 0,00	-	0,00	**$ 85.303.939,50**		**$ 11.124.585,39**	0,00	**$ 74.179.354,11**	0,00	**$ 85.303.939,50**
	TOTAL DELCOP A+B							**$ 669.129.998,86**		**$ 113.285.406,28**		**$ 555.844.592,58**		**$ 669.129.998,86**
ACIO	**PALACIO DE JUSTICIA**													
	SECRETARIA SECCION TERCERA CONSEJO DE ESTADO, PISO 2													
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2		$ 10.600,00	$ 0,00	+	143,94	$ 1.525.764,00		$ 0,00	143,94	$ 1.525.764,00	143,94	$ 1.525.764,00
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML		$ 5.513,00	$ 0,00	+	31,27	$ 172.391,51		$ 0,00	31,27	$ 172.391,51	31,27	$ 172.391,51
7.	**ALISTADO DE PISOS, POYOS**					-	0,00	$ 0,00						
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2		$ 33.808,00	$ 0,00	+	143,94	$ 4.866.323,52		$ 0,00	143,94	$ 4.866.323,52	143,94	$ 4.866.323,52
8.	**PAÑETES**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.15	Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2		$ 9.259,00	$ 0,00	+	4,69	$ 43.424,71		$ 0,00	4,69	$ 43.424,71	4,69	$ 43.424,71
10.	**ESTUCO Y PINTURA**					-	0,00	$ 0,00						
10.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 6.566,00	$ 0,00	+	76,51	$ 502.364,66		$ 0,00	76,51	$ 502.364,66	76,51	$ 502.364,66

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO — OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.887,00	$ 0,00
11.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$ 0,00
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2		$ 146.671,00	$ 0,00
11.22	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML		$ 20.556,00	$ 0,00
22.	**ASEO Y VARIOS**				
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**$ 0,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00
	UTIIDAD	5%			$ 0,00
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00
A.	**TOTAL OBRA CIVIL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2**				**$ 0,00**
	TOTAL SECRETARIA TERCERA C.E., PISO 2 A				
	SALA PLENA CORTE SUPREMA				
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	
22.	**ASEO Y VARIOS**				
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA			**$ 2.922,00**	
	ADMINISTRACIÓN	17%			
	IMPREVISTOS	3%			
	UTIIDAD	5%			
	IVA (Sobre utilidad)	19%			
A.	**TOTAL OBRA S.P. CORTE SUPREMA**				
NP	**NO PREVISTOS**				
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00	
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00	
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00	
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00	
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00	
	TOTAL C. DIRECTO N.P. OBRA S.P. CORTE SUPREMA				**$ 0,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00
	UTIIDAD	5%			$ 0,00
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	300,48	$ 4.570.000,32
+	118,12	$ 1.285.972,44
-	0,00	$ 0,00
+	143,94	$ 21.111.823,74
+	52,55	$ 1.080.217,80
-	0,00	$ 0,00
+	143,94	$ 420.592,68
		$ 35.578.875,38
		$ 6.048.408,81
		$ 1.067.366,26
		$ 1.778.943,77
		$ 337.999,32
		$ 44.811.593,54
		$ 44.811.593,54
-	0,00	$ 0,00
-	0,00	$ 0,00
+	200,00	$ 584.400,00
		$ 584.400,00
		$ 99.348,00
		$ 17.532,00
		$ 29.220,00
		$ 5.551,80
		$ 736.051,80
+	18,00	$ 35.478.000,00
+	181,27	$ 87.009.600,00
+	48,42	$ 11.862.900,00
+	59,28	$ 14.523.600,00
+	10,00	$ 22.410.000,00
		$ 171.284.100,00
-	0,00	$ 29.118.297,00
-	0,00	$ 5.138.523,00
-	0,00	$ 8.564.205,00
-	0,00	$ 1.627.198,95

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°8 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°8 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	300,48	$ 4.570.000,32	300,48	$ 4.570.000,32
	$ 0,00	118,12	$ 1.285.972,44	118,12	$ 1.285.972,44
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	143,94	$ 21.111.823,74	143,94	$ 21.111.823,74
	$ 0,00	52,55	$ 1.080.217,80	52,55	$ 1.080.217,80
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	143,94	$ 420.592,68	143,94	$ 420.592,68
	$ 0,00		**$ 35.578.875,38**		**$ 35.578.875,38**
	$ 0,00		$ 6.048.408,81		$ 6.048.408,81
	$ 0,00		$ 1.067.366,26		$ 1.067.366,26
	$ 0,00		$ 1.778.943,77		$ 1.778.943,77
	$ 0,00		$ 337.999,32		$ 337.999,32
	$ 0,00	0,00	**$ 44.811.593,54**	0,00	**$ 44.811.593,54**
	$ 0,00		**$ 44.811.593,54**		**$ 44.811.593,54**
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	200,00	$ 584.400,00	200,00	$ 584.400,00
	$ 0,00		**$ 584.400,00**		**$ 584.400,00**
	$ 0,00		$ 99.348,00		$ 99.348,00
	$ 0,00		$ 17.532,00		$ 17.532,00
	$ 0,00		$ 29.220,00		$ 29.220,00
	$ 0,00		$ 5.551,80		$ 5.551,80
	$ 0,00		**$ 736.051,80**		**$ 736.051,80**
	$ 0,00	18,00	$ 35.478.000,00	18,00	$ 35.478.000,00
	$ 0,00	181,27	$ 87.009.600,00	181,27	$ 87.009.600,00
	$ 0,00	48,42	$ 11.862.900,00	48,42	$ 11.862.900,00
	$ 0,00	59,28	$ 14.523.600,00	59,28	$ 14.523.600,00
	$ 0,00	10,00	$ 22.410.000,00	10,00	$ 22.410.000,00
	$ 0,00		**$ 171.284.100,00**		**$ 171.284.100,00**
	$ 0,00		$ 29.118.297,00		$ 29.118.297,00
	$ 0,00		$ 5.138.523,00		$ 5.138.523,00
	$ 0,00		$ 8.564.205,00		$ 8.564.205,00
	$ 0,00		$ 1.627.198,95		$ 1.627.198,95

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**		
B.	**TOTAL N.P. SALA PLENA CORTE SUPREMA**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 215.732.323,95**	**$ 0,00**		0,00	**$ 215.732.323,95**	0,00	**$ 215.732.323,95**		
	TOTAL SALA PLENA CORTE SUPREMA A+B							**$ 216.468.375,75**	**$ 0,00**			**$ 216.468.375,75**		**$ 216.468.375,75**		
SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO																
10.	**ESTUCO Y PINTURA**															
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.	**ASEO Y VARIOS**					-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	200,00	$ 584.400,00		$ 0,00	200,00	$ 584.400,00	200,00	$ 584.400,00		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CONSEJO DE ESTADO				**$ 0,00**			**$ 584.400,00**	**$ 0,00**			**$ 584.400,00**		**$ 584.400,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 99.348,00		$ 0,00		$ 99.348,00		$ 99.348,00		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 17.532,00		$ 0,00		$ 17.532,00		$ 17.532,00		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 29.220,00		$ 0,00		$ 29.220,00		$ 29.220,00		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 5.551,80		$ 0,00		$ 5.551,80		$ 5.551,80		
A.	**TOTALOBRA S.P. CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 736.051,80**	**$ 0,00**		0,00	**$ 736.051,80**	0,00	**$ 736.051,80**		
B	**NO PREVISTOS**															
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	16,00	$ 31.536.000,00		$ 0,00	16,00	$ 31.536.000,00	16,00	$ 31.536.000,00		
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	126,90	$ 60.912.000,00		$ 0,00	126,90	$ 60.912.000,00	126,90	$ 60.912.000,00		
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	53,76	$ 13.171.200,00		$ 0,00	53,76	$ 13.171.200,00	53,76	$ 13.171.200,00		
NP -24	Mantenimiento de cornisa en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	60,00	$ 14.700.000,00		$ 0,00	60,00	$ 14.700.000,00	60,00	$ 14.700.000,00		
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	8,00	$ 17.928.000,00		$ 0,00	8,00	$ 17.928.000,00	8,00	$ 17.928.000,00		
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	60,00	$ 3.660.000,00		$ 0,00	60,00	$ 3.660.000,00	60,00	$ 3.660.000,00		
NP -27	Mantenimiento ventana Balcón	M2		$ 180.000,00		+	15,82	$ 2.847.600,00		$ 0,00	15,82	$ 2.847.600,00	15,82	$ 2.847.600,00		
NP -28	Restauración piso en madera	M2		$ 116.000,00		+	200,00	$ 23.200.000,00		$ 0,00	200,00	$ 23.200.000,00	200,00	$ 23.200.000,00		
NP- 29	Suministro e instalación faldón remate sobre cornisa	ML		$ 102.500,00		+	60,00	$ 6.150.000,00		$ 0,00	60,00	$ 6.150.000,00	60,00	$ 6.150.000,00		
NP -30	Mantenimiento de cielo raso en madera	M2		$ 61.800,00		+	129,36	$ 7.994.448,00		$ 0,00	129,36	$ 7.994.448,00	129,36	$ 7.994.448,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**			**$ 182.099.248,00**	**$ 0,00**			**$ 182.099.248,00**		**$ 182.099.248,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 30.956.872,16		$ 0,00		$ 30.956.872,16		$ 30.956.872,16		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 5.462.977,44		$ 0,00		$ 5.462.977,44		$ 5.462.977,44		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 9.104.962,40		$ 0,00		$ 9.104.962,40		$ 9.104.962,40		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 1.729.942,86		$ 0,00		$ 1.729.942,86		$ 1.729.942,86		
B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 229.354.002,86**	**$ 0,00**		0,00	**$ 229.354.002,86**	0,00	**$ 229.354.002,86**		
	TOTAL SALA PLENA CONSEJO DE ESTADO A+B							**230.090.055**		**$ 0,00**		**$ 230.090.054,66**		**$ 230.090.054,66**		
SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL																
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
6.7	Frescasa de 2 1/2" con foil de papel. (Suministro e instalación)	M2		$ 14.539,00	$ 0,00	+	46,39	$ 674.464,21		$ 0,00	46,39	$ 674.464,21	46,39	$ 674.464,21		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**		
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 15.209,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.	**ASEO Y VARIOS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
22.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2		$ 2.922,00	$ 0,00	+	94,86	$ 277.180,92		$ 0,00	94,86	$ 277.180,92	94,86	$ 277.180,92		
A.	**TOTAL COSTO DIRECTO OBRA S.P.CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 277.180,92**		**$ 0,00**		**$ 277.180,92**		**$ 277.180,92**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 47.120,76		$ 0,00		$ 47.120,76		$ 47.120,76		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 8.315,43		$ 0,00		$ 8.315,43		$ 8.315,43		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 13.859,05		$ 0,00		$ 13.859,05		$ 13.859,05		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 2.633,22		$ 0,00		$ 2.633,22		$ 2.633,22		
A.	**TOTALOBRA S.P. CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 349.109,37**		**$ 0,00**	0,00	**$ 349.109,37**	0,00	**$ 349.109,37**		
NP	**NO PREVISTOS**															
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	8,00	$ 15.768.000,00		$ 0,00	8,00	$ 15.768.000,00	8,00	$ 15.768.000,00		
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	32,07	$ 15.393.600,00		$ 0,00	32,07	$ 15.393.600,00	32,07	$ 15.393.600,00		
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	34,22	$ 8.383.900,00		$ 0,00	34,22	$ 8.383.900,00	34,22	$ 8.383.900,00		
NP -25	Restauración Puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	2,00	$ 4.482.000,00		$ 0,00	2,00	$ 4.482.000,00	2,00	$ 4.482.000,00		
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	38,96	$ 2.376.560,00		$ 0,00	38,96	$ 2.376.560,00	38,96	$ 2.376.560,00		
NP -28	Restauración piso en madera	M2		$ 116.000,00		+	94,86	$ 11.003.760,00		$ 0,00	94,86	$ 11.003.760,00	94,86	$ 11.003.760,00		
NP - 33	Restauración tarima (2,40 mx 1,22 mt)	un		$ 1.185.104,00		+	1,00	$ 1.185.104,00		$ 0,00	1,00	$ 1.185.104,00	1,00	$ 1.185.104,00		
NP - 68	Mantenimiento ventana Balcón	ML		$ 180.000,00		+	40,08	$ 7.214.400,00		$ 0,00	40,08	$ 7.214.400,00	40,08	$ 7.214.400,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 58.592.924,00**		**$ 0,00**		**$ 65.807.324,00**		**$ 65.807.324,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 9.960.797,08		$ 0,00		$ 11.187.245,08		$ 11.187.245,08		
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 1.757.787,72		$ 0,00		$ 1.974.219,72		$ 1.974.219,72		
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 2.929.646,20		$ 0,00		$ 3.290.366,20		$ 3.290.366,20		
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 556.632,78		$ 0,00		$ 625.169,58		$ 625.169,58		
B.	**TOTALN.P. SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 73.797.787,78**		**$ 0,00**	0,00	**$ 82.884.324,58**	0,00	**$ 82.884.324,58**		
	TOTAL SALA PLENA CORTE CONSTITUCIONAL A+B							**$ 74.146.897,15**		**$ 0,00**		**$ 83.233.433,95**		**$ 83.233.433,95**		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	NO PREVISTOS															
NP -32	Restauración sillas	UN		$ 717.300,00		+	4,00	$ 2.869.200,00		$ 0,00	4,00	$ 2.869.200,00	4,00	$ 2.869.200,00		
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP CORTE CONSTITUCIONAL**				**$ 0,00**			**$ 2.869.200,00**		**$ 0,00**		**$ 2.869.200,00**		**$ 2.869.200,00**		
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 487.764,00		$ 0,00		$ 487.764,00		$ 487.764,00		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
	OBRA CIVIL													
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 86.076,00		$ 0,00		$ 86.076,00		$ 86.076,00
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 143.460,00		$ 0,00		$ 143.460,00		$ 143.460,00
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 27.257,40		$ 0,00		$ 27.257,40		$ 27.257,40
B.	**TOTALN.P. S.P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA**				**$ 0,00**			**$ 3.613.757,40**		**$ 0,00**	0,00	**$ 3.613.757,40**	0,00	**$ 3.613.757,40**
	TOTAL S. P. CONS. SUP. DE LA JUDICATURA A+B							**3.613.757,40**		**0,00**		**3.613.757,40**		**3.613.757,40**
COMISION DISCIPLINA JUDICIAL														
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN		$ 15.954,00	$ 0,00	+	3,00	$ 47.862,00		$ 0,00	3,00	$ 47.862,00	3,00	$ 47.862,00
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2		$ 15.067,00	$ 0,00	+	31,44	$ 473.706,48	16,58	$ 249.810,86	14,86	$ 223.895,62	31,44	$ 473.706,48
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y	M2		$ 28.687,00	$ 0,00	+	7,70	$ 220.889,90	7,70	$ 220.889,90	0,00	$ 0,00	7,70	$ 220.889,90
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.15	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos,	M2		$ 111.713,00	$ 0,00	+	8,99	$ 1.004.299,87	8,99	$ 1.004.299,87	0,00	$ 0,00	8,99	$ 1.004.299,87
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	16,97	$ 1.524.635,71	2,11	$ 189.568,73	14,86	$ 1.335.066,98	16,97	$ 1.524.635,71
10.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.2	Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2		$ 10.648,00	$ 0,00	+	34,26	$ 364.800,48	4,54	$ 48.341,92	29,72	$ 316.458,56	34,26	$ 364.800,48
A	**TOTAL DIRECTO COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 3.636.194,44**		**$ 1.712.911,28**		**$ 1.923.283,16**		**$ 3.636.194,44**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 618.153,05		$ 291.194,92		$ 326.958,14		$ 618.153,05
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 109.085,83		$ 51.387,34		$ 57.698,49		$ 109.085,83
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 181.809,72		$ 85.645,56		$ 96.164,16		$ 181.809,72
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			A		$ 16.272,66		$ 18.271,19		$ 34.543,85
B.	**TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 4.545.243,05**		**$ 2.157.411,76**	0,00	**$ 2.422.375,14**	0,00	**$ 4.579.786,90**
NP -21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	UN		$ 1.971.000,00		+	8,00	$ 15.768.000,00	2,00	$ 3.942.000,00	6,00	$ 11.826.000,00	8,00	$ 15.768.000,00
NP -22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje)sala plena corte suprema de justicia	M2		$ 480.000,00		+	18,32	$ 8.793.600,00	9,82	$ 4.713.600,00	8,50	$ 4.080.000,00	18,32	$ 8.793.600,00
NP- 23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje	ML		$ 245.000,00		+	16,09	$ 3.942.050,00	9,60	$ 2.352.000,00	6,49	$ 1.590.050,00	16,09	$ 3.942.050,00
NP- 25	Restauración puertas sala plena	UN		$ 2.241.000,00		+	1,00	$ 2.241.000,00		$ 0,00	1,00	$ 2.241.000,00	1,00	$ 2.241.000,00
NP- 26	Restauración cenefa en madera	ML		$ 61.000,00		+	47,10	$ 2.873.100,00	47,10	$ 2.873.100,00		$ 0,00	47,10	$ 2.873.100,00
NP - 68	Mantenimiento ventana Balcón	ML		$ 180.000,00		+	64,80	$ 11.664.000,00	60,93	$ 10.967.400,00	3,87	$ 696.600,00	64,80	$ 11.664.000,00
NP - 70	Enchape de muros en madera	ML		$ 565.840,00		+	0,65	$ 367.796,00	0,65	$ 367.796,00		$ 0,00	0,65	$ 367.796,00
NP - 79	Mantenimiento de biblioteca sala plena	M		$ 450.651,00		+	18,04	$ 8.129.744,04	18,04	$ 8.129.744,04		$ 0,00	18,04	$ 8.129.744,04
NP -80	SUMINISTRO E INSTALACION MESA SIMILAR A LA EXISTENTE EN SALA PLENA, INCLUYE SUPERFICIE ANCHO 0,65mt, BASE Y ACABADO.	ML		$ 1.356.600,00		+	2,60	$ 3.527.160,00	2,60	$ 3.527.160,00		$ 0,00	2,60	$ 3.527.160,00
NP --83	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER+UNIDAD CONDENSADORA PARA SALA PLENA, AREAS HASTA 75M2	UN		$ 8.178.000,00		-	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 85	PINTURA TECHO CURVO EN GRIS BASALTO	m2		$ 24.000,00		+	103,62	$ 2.486.880,00	103,62	$ 2.486.880,00		$ 0,00	103,62	$ 2.486.880,00
NP -88	MURO EN SUPERBOARD AUTOPORTANTE E= 0,40M ESTRUCTURA ALUMINIO REFORZADA, LAMINA ADICIONAL DE MDF Y AISLAMIENTO INTERNO EN FRESCASA 3,20X2,00X0,40	UN		$ 3.410.000,00		+	0,50	$ 1.705.000,00	0,50	$ 1.705.000,00		$ 0,00	0,50	$ 1.705.000,00
NP -93	PUENTE DE ADHERENCIA CONCRETO	KG		$ 232.000,00		+	1,00	$ 232.000,00	1,00	$ 232.000,00		$ 0,00	1,00	$ 232.000,00
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 28.503.650,00**		**$ 41.296.680,04**		**$ 20.433.650,00**		**$ 61.730.330,04**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 4.845.620,50		$ 7.020.435,61		$ 3.473.720,50		$ 10.494.156,11
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 855.109,50		$ 1.238.900,40		$ 613.009,50		$ 1.851.909,90
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 1.425.182,50		$ 2.064.834,00		$ 1.021.682,50		$ 3.086.516,50
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 270.784,68		$ 392.318,46		$ 194.119,68		$ 586.438,14
B.	**TOTALN.P. S.P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL**				**$ 0,00**			**$ 35.900.347,18**		**$ 52.013.168,51**	0,00	**$ 25.736.182,18**	0,00	**$ 77.749.350,69**
	TOTAL S. P. COM. DISCIPLINA JUDICIAL A+B							**35.900.347,18**		**52.013.168,51**		**25.736.182,18**		**77.749.350,69**
	ASCENSORES DE PALACIO													
6.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2		$ 48.003,00	$ 0,00	+	5,04	$ 241.935,12		$ 0,00	5,04	$ 241.935,12	5,04	$ 241.935,12
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano.	M2		$ 89.843,00	$ 0,00	+	5,76	$ 517.495,68		$ 0,00	5,76	$ 517.495,68	5,76	$ 517.495,68
14.	**CARPINTERIA METÁLICA**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60	UN		$ 47.922,00	$ 0,00	+	32,00	$ 1.533.504,00		$ 0,00	32,00	$ 1.533.504,00	32,00	$ 1.533.504,00
19	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos,	UN		$ 141.896,00	$ 0,00	+	30,00	$ 4.256.880,00		$ 0,00	30,00	$ 4.256.880,00	30,00	$ 4.256.880,00
19.86	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100-240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN		$ 283.399,00	$ 0,00	+	18,00	$ 5.101.182,00		$ 0,00	18,00	$ 5.101.182,00	18,00	$ 5.101.182,00
A,	**COSTO DIRECTO ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 11.650.996,80**		**$ 0,00**		**$ 11.650.996,80**		**$ 11.650.996,80**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 1.980.669,46		$ 0,00		$ 1.980.669,46		$ 1.980.669,46
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 349.529,90		$ 0,00		$ 349.529,90		$ 349.529,90
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 582.549,84		$ 0,00		$ 582.549,84		$ 582.549,84
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 110.684,47		$ 0,00		$ 110.684,47		$ 110.684,47
A.	**TOTAL ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 14.674.430,47**		**$ 0,00**	0,00	**$ 14.674.430,47**	0,00	**$ 14.674.430,47**
	NO PREVISTOS													
NP -47	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería,CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m),	UN		$ 101.647,00		+	2,00	$ 203.294,00		$ 0,00	2,00	$ 203.294,00	2,00	$ 203.294,00
NP -48	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS,aparato, accesorios 3m), cumplimiento	UN		$ 97.327,00		+	8,00	$ 778.616,00		$ 0,00	8,00	$ 778.616,00	8,00	$ 778.616,00
NP -63	Suministro e instalación plataforma escaleras	UN		$ 630.000,00		+	2,00	$ 1.260.000,00		$ 0,00	2,00	$ 1.260.000,00	2,00	$ 1.260.000,00
NP -77	Revestimiento impermeable para concreto con max seal a 3 capas	UN		$ 3.092.973,00		+	1,00	$ 3.092.973,00		$ 0,00	1,00	$ 3.092.973,00	1,00	$ 3.092.973,00
NP -78	Manijas en acero	UN		$ 25.000,00		+	8,00	$ 200.000,00		$ 0,00	8,00	$ 200.000,00	8,00	$ 200.000,00
NP -87	Instalación mallas de proteccion para certificacion de ascensores	M2		$ 45.000,00		+	8,75	$ 393.750,00	8,75	$ 393.750,00		$ 0,00	8,75	$ 393.750,00
NP -95	Protección de tubos en foso ascensor con cinta impermeable pegado en frio	ML		$ 26.000,00		+	6,00	$ 156.000,00	6,00	$ 156.000,00		$ 0,00	6,00	$ 156.000,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No.8 | PERIODO MES / AÑO **may-24** | **FECHA:** 14/06/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30días
ADICIONAL EN PLAZO No. 4	:	30días
PLAZO TOTAL	:	7 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	23/06/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									PRESENTE ACTA N°8		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
B.	**TOTAL COSTO DIRECTO NP ASCENSORES**				**$ 0,00**			**$ 203.294,00**		**$ 549.750,00**		**$ 5.534.883,00**		**$ 6.084.633,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%			$ 0,00			$ 34.559,98		$ 93.457,50		$ 940.930,11		$ 1.034.387,61
	IMPREVISTOS	3%			$ 0,00			$ 6.098,82		$ 16.492,50		$ 166.046,49		$ 182.538,99
	UTIIDAD	5%			$ 0,00			$ 10.164,70		$ 27.487,50		$ 276.744,15		$ 304.231,65
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 1.931,29		$ 5.222,63		$ 52.581,39		$ 57.804,01
B.	**TOTALN.P. ASCENSORES**				**$ 0,00**	-	0,00	**$ 256.048,79**		**$ 692.410,13**	0,00	**$ 6.971.185,14**	0,00	**$ 7.663.595,26**
	TOTAL ASCENSORES							**14.930.479**		**692.410,13**		**21.645.615,61**		**22.338.025,73**
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 539.094.215,97**		**$ 263.047.515,88**		**$ 544.143.629,86**		**$ 807.191.145,74**
A. I. U.		**25%**												
ADMINISTRACIÓN		**17%**			$ 0,00			$ 91.646.016,71		$ 44.718.077,70		$ 92.504.417,08		$ 137.222.494,78
IMPREVISTOS		**3%**			$ 0,00			$ 16.172.826,48		$ 7.891.425,48		$ 16.324.308,90		$ 24.215.734,37
UTILIDAD		**5%**			$ 0,00			$ 26.954.710,80		$ 13.152.375,79		$ 27.207.181,49		$ 40.359.557,29
IVA		**19%**			$ 0,00			$ 5.121.395,05		$ 2.498.951,40		$ 5.169.364,48		$ 7.668.315,88
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 0,00**			**$ 678.989.165,01**		**$ 331.308.346,25**		**$ 685.348.901,81**		**$ 1.016.657.248,06**
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS					**$ 0,00**			**$ 689.685.005,15**		**$ 127.301.713,60**		**$ 609.189.774,56**		**$ 736.491.488,16**
A. I. U.		**25%**												
ADMINISTRACIÓN		**17%**			$ 0,00			$ 117.246.450,88		$ 21.641.291,31		$ 103.562.261,68		$ 125.203.552,99
IMPREVISTOS		**3%**			$ 0,00			$ 20.690.550,15		$ 3.819.051,40		$ 18.275.693,24		$ 22.094.744,64
UTILIDAD		**5%**			$ 0,00			$ 34.484.250,26		$ 6.365.085,68		$ 30.459.488,73		$ 36.824.574,41
IVA		**19%**			$ 0,00			$ 6.552.007,55		$ 1.209.366,28		$ 5.787.302,86		$ 6.996.669,14
B. TOTAL OBRAS NO PREVISTAS					**$ 0,00**			**$ 868.658.263,99**		**$ 160.336.508,27**		**$ 767.274.521,06**		**$ 927.611.029,34**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 92.295.881,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IVA		**19%**			$ 0,00			$ 17.536.217,39		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
C. TOTAL MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 109.832.098,39**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 0,00**			**$ 1.437.815.330,61**		**$ 491.644.854,52**		**$ 1.452.623.422,87**		**$ 1.944.268.277,40**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA										**$ 491.644.854,52**				

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 491.644.854,52 SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

JHONY FERNEY DIAZ DAZA
Representante Legal
CONSORCIO LOCATIVO
CONTRATISTA

CUADRO RESUMEN ACTA N°8 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO DELCOP	SECRETARIA P2	S.P.C.S. JUSTICIA	S.P. C. ESTADO	S.P.C. CONSTITUCIONAL	S.P.C.S. JUDICATURA	S.P. COM. DISC JUDICIAL	ASCENSORES	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 4.821.838,21	$ 16.577.936,86	$ 158.822.625,57	$ 81.112.203,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 1.712.911,28	$ 0,00	**$ 263.047.515,88**
ADMINISTRACION 17%	$ 819.712,50	$ 2.818.249,27	$ 26.999.846,35	$ 13.789.074,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 291.194,92	$ 0,00	$ 44.718.077,70
IMPREVISTOS 3%	$ 144.655,15	$ 497.338,11	$ 4.764.678,77	$ 2.433.366,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 51.387,34	$ 0,00	$ 7.891.425,48
UTILIDAD 5%	$ 241.091,91	$ 828.896,84	$ 7.941.131,28	$ 4.055.610,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 85.645,56	$ 0,00	$ 13.152.375,79
IVA 19%	$ 45.807,46	$ 157.490,40	$ 1.508.814,94	$ 770.565,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 16.272,66	$ 0,00	$ 2.498.951,40
TOTAL	**$ 6.073.105,23**	**$ 20.879.911,48**	**$ 200.037.096,91**	**$ 102.160.820,89**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.157.411,76**	**$ 0,00**	**$ 331.308.346,25**
COSTO DIRECTO N.P	$ 1.145.350,05	$ 3.662.194,31	$ 71.815.198,20	$ 8.832.541,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.296.680,04	$ 549.750,00	**$ 127.301.713,60**
ADMINISTRACION 17%	$ 194.709,51	$ 622.573,03	$ 12.208.583,69	$ 1.501.531,97		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.020.435,61	$ 93.457,50	$ 21.641.291,31
IMPREVISTOS 3%	$ 34.360,50	$ 109.865,83	$ 2.154.455,94	$ 264.976,23		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.238.900,40	$ 16.492,50	$ 3.819.051,40
UTILIDAD 5%	$ 57.267,50	$ 183.109,72	$ 3.590.759,91	$ 441.627,05		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.064.834,00	$ 27.487,50	$ 6.365.085,68
IVA 19%	$ 10.880,83	$ 34.790,85	$ 682.244,38	$ 83.909,14		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 392.318,46	$ 5.222,63	$ 1.209.366,28
TOTAL	**$ 1.442.568,39**	**$ 4.612.533,73**	**$ 90.451.242,12**	**$ 11.124.585,39**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 52.013.168,51**	**$ 692.410,13**	**$ 160.336.508,27**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00						**$ 0,00**
IVA 19%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00									$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**
	$ 7.515.673,61	**$ 25.492.445,21**	**$ 290.488.339,03**	**$ 113.285.406,28**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 692.410,13**	**$ 491.644.854,52**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 08 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
PRORROGA 2 **:** Hasta el 24 de abril de 2024.
PRORROGA 3 **:** Hasta el 24 de mayo de 2024.
PRORROGA 4 **:** Hasta el 23 de junio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 23 de junio de 2024.
PERIODO DE CORTE : 26 de abril de 2024 – 26 mayo de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Adicion N°1 de Obra	$ 1.154.367.257
Total Contrato de Obra	$ 3.494.367.257
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Valor Adicion N°1 Interventoria	$ 111.079.360
Valor Adicion N°2 Interventoria	$ 55.539.680
Total Contrato de Interventoria	$ 388.777.760
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	11,1258414301242 %

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Adicion N°1 de Obra	$ 1.154.367.257
Total Contrato de Obra	$ 3.494.367.257
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Valor Adicion N°1 Interventoria	$ 111.079.360
Valor Adicion N°2 Interventoria	$ 55.539.680
Valor Adicion N°3 Interventoria	$ 55.539.680
Total Contrato de Interventoria	$ 444.317.440
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	12,7152473487134 %

ACTA No. 01 de Obra	$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	$ 22.372.203,87
ACTA No. 03 de Obra	$ 358.366.837,83
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.	$ 34.023.212,80
ACTA No. 04 de Obra	$ 323.449.278,11
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA.	$ 30.708.152,82
ACTA No. 05 de Obra	$ 274.122.440,24
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA.	$ 26.025.081,39
ACTA No. 06 de Obra	$ 84.004.125,78
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06 DE INTERVENTORÍA.	$ 9.346.165,84
ACTA No. 07 de Obra	$ 113.467.828,54
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA.	$ 12.624.250,68
ACTA No. 08 de Obra	$ 491.644.854,52
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 08 DE INTERVENTORÍA.	$ 62.513.859,33

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 222.158.720,00	
Valor adición 1	$ 111.079.360,00	
Valor adición 2	$ 55.539.680,00	
Valor adición 3	$ 55.539.680,00	
Valor total del Contrato	$ 444.317.440	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		$ 22.372.203,87
Acta Parcial No. 03 Interventoría		$ 34.023.212,80
Acta Parcial No. 04 Interventoría		$ 30.708.152,82
Acta Parcial No. 05 Interventoría		$ 26.025.081,39
Acta Parcial No. 06 Interventoría		$ 9.346.165,84
Acta Parcial No. 07 Interventoría		$ 12.624.250,68
Acta Parcial No. 08 Interventoría		62.513.859,33
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		**$ 214.420.477,19**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 229.896.962,81**

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

7. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

8. FACTURA



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 104

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 16:10
Expedición	02/08/2024, 16:11
Vencimiento	01/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE ABRIL 2024 AL 26 MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	62,513,859.33

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones quinientos trece mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con treinta y tres cent.

Total Bruto	52,532,654.90
IVA 19%	9,981,204.43
Total a Pagar	62,513,859.33

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-01 por $ 62,513,859.33

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075490438 aprobado en 20240722 prefijo FEV desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: 2a77031a1abb815a6eecaab21c6556578bf050774d253e96461c8b5fd029e69a0fc444421f6341fd2eee3af4869d6b87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A # 93 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-12-29 / 01:13:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79553539 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TOTALL INC SAS BIC

997. Fecha formalización 2022-12-29/13:13:24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TOTALL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal .
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.jcdqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.101.836**

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1972**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 **0045**982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0024993893F6D2986

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	688871332	9468373390	I	2024/06/20	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79542174	JIMENEZ FERNANDO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$1,500,000		0	$0	$0	14-23	30	$12,000,000	$62,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000	$62,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	721580216	9468656542	E	2024/06/20	2024/06/21	BANCO DAVIVIENDA	1	$26,632,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GES INVERSIONES S A S (32 Afiliados)						$89,125,605	$14,434,100			$89,125,605	$3,565,100			$88,721,250	$3,548,900			$89,125,605	$5,062,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (7 Afiliados)						$16,560,000	$2,703,600			$16,560,000	$662,400			$15,710,000	$628,400			$16,560,000	$80,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$16,560,000	$2,703,600			$16,560,000	$662,400			$15,710,000	$628,400			$16,560,000	$80,300		$0	$0
1	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA	230301	17	$850,000	$136,000	EPS002	17	$850,000	$34,000	CCF22	0	$0	$0	14-8	17	$850,000	$0	0	$0	$0
2	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA	230301	5	$250,000	$40,000	EPS002	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$250,000	$10,000	14-8	5	$250,000	$1,400	5	$0	$0
3	CC	1015459022	ADAMES BERMUDEZ ERIKA DANIELA	230301	8	$400,000	$64,000	EPS002	8	$400,000	$16,000	CCF22	8	$400,000	$16,000	14-8	8	$400,000	$0	8	$0	$0
4	CC	1024479156	LOZANO RODRIGUEZ IVONNE MARCELA	230201	6	$560,000	$89,600	EPS008	6	$560,000	$22,400	CCF22	6	$560,000	$22,400	14-8	6	$560,000	$3,000	6	$0	$0
5	CC	1075675450	PADILLA CASTIBLANCO CAMILO ALEXANDER	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-8	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
6	CC	65555596	PRADA LOZANO MIRYAR MILENA	25-14	30	$5,400,000	$918,000	EPS005	30	$5,400,000	$216,000	CCF22	30	$5,400,000	$216,000	14-8	30	$5,400,000	$28,200	30	$0	$0
7	CC	1032455696	PUERTO BURBANO SAUL ANDRES	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
8	CC	1013036396	SALAZAR NOGUERA ISABELLA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
9	CC	1000150988	SALAZAR NOGUERA VALENTINA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESTO 5 TARIFA 6.960 (25 Afiliados)						$72,565,605	$11,730,500			$72,565,605	$2,902,700			$73,011,250	$2,920,500			$72,565,605	$4,982,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$72,565,605	$11,730,500			$72,565,605	$2,902,700			$73,011,250	$2,920,500			$72,565,605	$4,982,100		$0	$0
10	CC	1015423618	BAQUERO CORREDOR CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-8	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
11	CC	27602678	BECERRA BARRIOS CARLA MARIA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
12	CC	1069898787	BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-8	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1014218889	CASTILLO RAMIREZ LAURA CATALINA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
14	CC	1033778496	CORREA BELLIDO LUDWIG	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-8	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
15	CC	80844754	CORTES PERDOMO FREDDY ALEXANDER	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
16	CC	77013726	DIAZ MARTINEZ EOBALDO JOSE	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
17	CC	22618946	DIAZ CHARRIS MERLIN PAOLA	230301	24	$1,440,000	$230,400	EPS037	24	$1,440,000	$57,600	CCF22	24	$1,725,000	$69,000	14-8	24	$1,440,000	$100,300	24	$0	$0
18	CC	1090403332	DUARTE DIAZ EDISON RICARDO	230301	30	$4,580,000	$732,800	EPS005	30	$4,580,000	$183,200	CCF22	30	$4,580,000	$183,200	14-8	30	$4,580,000	$318,800	30	$0	$0
19	CC	22521379	DURANGO TIRADO PAULA TATIANA	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
20	CC	52227017	ESPINOSA VIRGUEZ MARIA PIEDAD	25-14	30	$5,150,000	$824,000	EPS005	30	$5,150,000	$206,000	CCF22	30	$5,150,000	$206,000	14-8	30	$5,150,000	$358,500	30	$0	$0
21	CC	1075236242	GUAÑARITA DIAZ KATHERINE	230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-8	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
22	CC	79658715	GUZMAN ORJUELA WILSON ANTONIO	230301	15	$1,400,000	$224,000	EPS037	15	$1,400,000	$56,000	CCF22	15	$1,400,000	$56,000	14-8	15	$1,400,000	$97,500	15	$0	$0
23	CC	79658715	GUZMAN ORJUELA WILSON ANTONIO	230301	15	$995,605	$159,300	EPS037	15	$995,605	$39,900	CCF22	0	$0	$0	14-8	15	$995,605	$0	0	$0	$0
24	CC	17345352	LOPEZ FORERO EFRAIN RICARDO	230301	15	$1,250,000	$200,000	EPS005	15	$1,250,000	$50,000	CCF22	15	$1,906,250	$76,300	14-8	15	$1,250,000	$87,000	15	$0	$0
25	CC	1103948825	MACARENO MERCADO MAURICIO MIGUEL	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1192746178	MARULANDA FONSECA ANA VICTORIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
27	CC	78747710	MONTERROZA CASSAS DIDIER ANTONIO	231001	17	$1,700,000	$272,000	EPS002	17	$1,700,000	$68,000	CCF22	17	$1,700,000	$68,000	14-8	17	$1,700,000	$118,400	17	$0	$0
28	CC	79955903	MORALES RIVERA JUAN CARLOS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
29	CC	1120574429	OSPINA LOPEZ MARILYN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
30	CC	1006997716	PERDOMO CAMPAÑA KEVIN DARIO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-8	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
31	CC	3759678	REDONDO PEÑA ALEXIS	230201	30	$5,150,000	$824,000	EPS008	30	$5,150,000	$206,000	CCF22	30	$5,150,000	$206,000	14-8	30	$5,150,000	$358,500	30	$0	$0
32	CC	79305476	RODRIGUEZ SASTRE JAIME ALBERTO	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-8	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
33	CC	79553539	SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS005	30	$12,000,000	$480,000	CCF22	30	$12,000,000	$480,000	14-8	30	$12,000,000	$835,200	30	$0	$0
34	CC	1004278785	SALAZAR CAPARROSO VALENTINA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
35	CC	1019083667	SILVA LOPEZ BRAYAN ALEXIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-8	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(32)**			**$89,125,605**	**$14,434,100**			**$89,125,605**	**$3,565,100**			**$88,721,250**	**$3,548,900**			**$89,125,605**	**$5,062,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	721580216	9468656542	E	2024/06/20	2024/06/21	BANCO DAVIVIENDA	1	$26,632,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$14,434,100	$11,500	$0	$14,445,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$480,000	$400	$0	$480,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,110,000	$4,100	$0	$5,114,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,802,500	$4,600	$0	$5,807,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,041,600	$2,400	$0	$3,044,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$5,062,400	$4,000	$0	$5,066,400
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	32	$5,062,400	$4,000	$0	$5,066,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,548,900	$2,800	$0	$3,551,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	$3,548,900	$2,800	$0	$3,551,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$3,565,100	$3,200	$0	$3,568,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$452,400	$400	$0	$452,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,000	$300	$0	$272,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$268,000	$300	$0	$268,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$565,500	$500	$0	$566,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$188,000	$200	$0	$188,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,819,200	$1,500	$0	$1,820,700
TOTAL				**32**	**$26,610,500**	**$21,500**	**$0**	**$26,632,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	726050862	9468666128	Y	2024/06/20	2024/06/24	BANCO DAVIVIENDA	4	$391,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,608,334		$390,500		$0	$0		$390,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,608,334		$390,500		$0	$0		$390,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,608,334		$390,500		$0	$0		$390,500
1	CC	52729457	BRICEÑO DALIA		X																0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-8	1	$43,334	6.960%	$3,100	0	$0	$0	No	$3,100
2	CC	1019048296	CAMARGO YINETH																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-8	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	79542174	JIMENEZ FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-8	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Total		**Afiliados(3)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,608,334		$390,500		$0	$0		$390,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	726050862	9468666128	Y	2024/06/20	2024/06/24	BANCO DAVIVIENDA	4	$391,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$390,500	$1,300	$0	$391,800
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	3	$390,500	$1,300	$0	$391,800
TOTAL				**3**	**$390,500**	**$1,300**	**$0**	**$391,800**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821
FECHA RADICADO:	16/02/2024 , 24/01/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTALL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA:"A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

13. AVAL DE INTERVENTORIA AL PGAS – SST OBRA


Bogotá D.C, Mayo 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de mayo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

Bogotá D.C, mayo 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de mayo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, mayo 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de mayo de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

14. INFORME DE INTERVENTORIA

Informe Ejecutivo Mensual

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	**8**	PERIODO:	Del 26 de abril de 2024	Al	26 de mayo de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO		
CONTRATO No.:	112 DE 2023			CONTRATO No.:	088 DE 2023		
VALOR INICIAL:	$	222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$	2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$	111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ADICIÓN 3:	$	55.539.680,00					
VALOR ADICIÓN 4:	$	55.539.680,00					
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$	3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días			PLAZO INICIAL:	66 días		
PLAZO ACTUALIZADO:	241 días			PLAZO ACTUALIZADO:	241 días		
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2024		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**214.420.477,19**	**48,26%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**2.057.736.105,94**	**58,89%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**229.896.962,81**	**51,74%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**1.436.631.151,06**	**41,11%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 4	24/05/2024

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	78,00%	85,00%	7,00%
Durante el periodo	10,00%	6,00%	-4,00%
Acumulado Actual	88,00%	91,00%	3,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
241	213	28	7

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

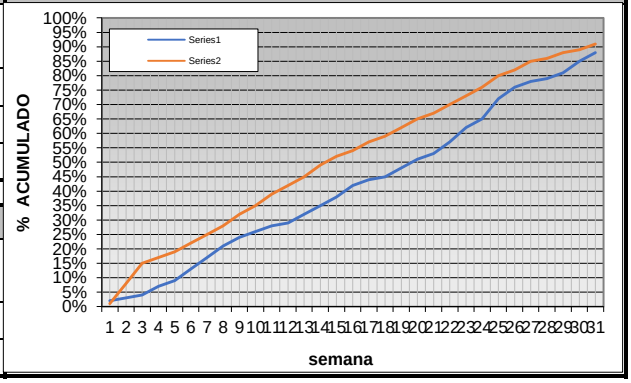

ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 28
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de división piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se finalizó la restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.
SEMANA 29
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se aplicó pintura en las oficinas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron las divisiones de media altura en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEMANA 30
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza resane y pintura en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEMANA 31
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
REGISTRO FOTOGRAFICO





















































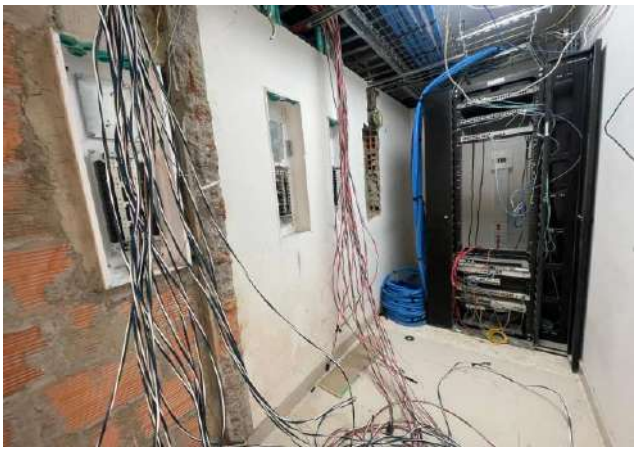





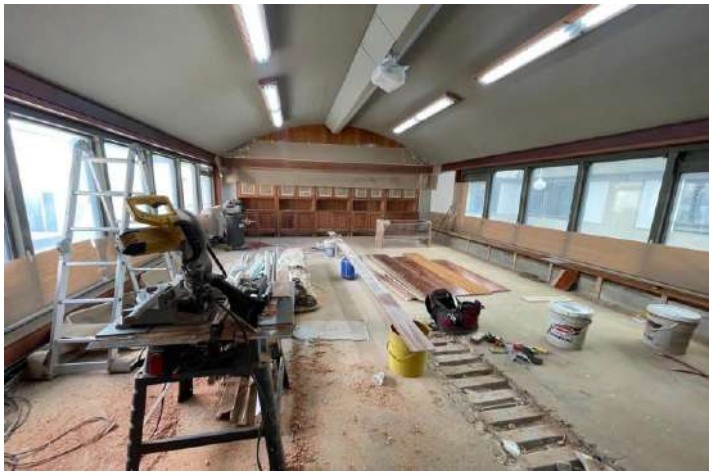




4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)			
MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 102.217.597	$ 177.034.096	5,07%
2	$ 319.900.771	$ 412.680.741	11,81%
3	$ 488.390.045	$ 771.047.579	22,07%
4	$ 683.606.580	$ 1.094.496.857	31,32%
5	$ 913.488.667	$ 1.368.619.297	39,17%
6	$ 1.686.726.069	$ 1.452.623.423	41,57%
7	$ 3.064.106.034	$ 1.566.091.251	44,82%
8	$ 3.494.367.259	$ 2.057.736.106	58,89%
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ 2.057.736.105,95**	**58,89%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

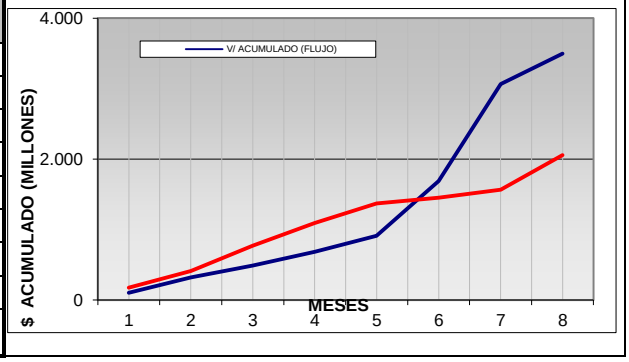

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

SUPERVISION

DANIEL MERCHAN CEPEDA
Representante Legal
RAMA JUDICIAL
SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26–ABR AL 26–MAY 2024



"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."

26/05/2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de abril al 26 de mayo de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de abril al 26 de mayo de 2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de abril al 26 de mayo de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de mayo 2024	**INFORME No.**	**8**

PERIODO No.	8	**DEL**:	**26 de abril 2024**	**AL**:	**26 de mayo de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	241 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	210 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : $ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR: $ 1.154.367.257,00

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE 0CTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	241 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	210 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : $ 222.158.720,00
VALOR ADICIONES:	CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA VALOR: $ 111.079.360
VALOR ADICIONES:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA VALOR: $ 55.539.680

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
VALOR ADICIONES:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA VALOR: $ 55.539.680

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 28, del 29 de abril al 5 de mayo 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de división piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se finalizó la restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

No. 29, del 06 de mayo al 12 de mayo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.

Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se aplicó pintura en las oficinas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron las divisiones de media altura en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 30, del 13 de mayo al 19 de mayo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza resane y pintura en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

No. 31, del 20 de mayo al 26 de mayo de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18

Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que realizan actividades eléctricas en el área de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realizan actividades en los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza actividades eléctricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del séptimo (7) mes, del proyecto "REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL", según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES ABRIL 2024	
No.28	del 29 de abril al 5 de mayo 2024
No.29	del 06 de mayo al 12 de mayo de 2024
No.30	del 13 de mayo al 19 de mayo de 2024
No.31	del 20 de mayo al 26 de mayo de 2024

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de abril de 2024 al 26 de mayo de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo a Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	80
Maestro de Obra	Robinson Villamil Rojas	Técnico	Mano de obra calificada/activo	100

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Inspector de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Juan Sebastián Torres Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 6.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	$ 177.034.095,76
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	$ 235.646.645,17
Corte de obra No 3	26 enero 2024	$ 358.366.837,82
Corte de obra No 4	26 febrero 2024	$ 323.449.278,11

Corte de obra No 5	26 marzo 2024	$ 274.122.440,24
Corte de obra No 6	26 abril 2024	$ 84.004.125,78
Corte de obra No 7	26 abril 2024	$ 113.467.828,54
Corte de obra No 8	26 mayo 2024	$ 491.644.854,52
TOTAL A CANCELAR		$ 491.644.854,52

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 23/12/2024	$524.155.088,55	27/05/2024	28/05/2024
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 23/06/2027	$524.155.088,55	27/05/2024	28/05/2024
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 0 día.	$873.591.814,25	27/05/2024	28/05/2024
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 día.	$873.591.814,25	27/05/2024	28/05/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 23/06/2024	$390.000.000,00	27/05/2024	28/05/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 23/06/2024	$390.000.000,00	27/05/2024	28/05/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 23/06/2024	$390.000.000,00	27/05/2024	28/05/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 23/06/2024	$390.000.000,00	27/05/2024	28/05/2024
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 23/06/2024	$390.000.000,00	27/05/2024	28/05/2024

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 24/08/2024	$ 44.431.744	29/04/2024	01/05/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 24/02/2027	$ 22.215.872	29/04/2024	01/05/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	24/02/2024 – 24/02/2029	$ 44.431.744	29/04/2024	01/05/2024

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
02/05/2024	Avance de ejecución de obra	CALLE 18, EDIFICIO LA BOLSA, PALACIO DE JUSTICIA	Presencial	8:30 am	12:45 pm
15/05/2024	Avance de ejecución de obra	CARRERA 7 #27-18	Presencial	8:30 am	10:30 am
22/05/2024	Avance de ejecución de obra	CALLE 18, EDIFICIO LA BOLSA, PALACIO DE JUSTICIA	Presencial	10:00 am	12:00 pm
24/05/2024	Avance de ejecución de obra	CALLE 18, EDIFICIO LA BOLSA, PALACIO DE JUSTICIA	Presencial	11:00 am	12:00 pm

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de abril de 2024 al 26 de mayo de 2024.

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	29/04/2024	TOTALL-112-CL-039	Solicitud de mobiliario completo en Bolsa piso 6.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	29/04/2024	TOTALL-112-RJ-067	RESPUESTA OFICIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
3	29/04/2024	TOTALL-112-RJ-068	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
4	30/04/2024	TOTALL-112-CL-040	ESTADO ACTUAL OBRA Y REITERACION DE PLAN DE CONTINGENCIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
5	30/04/2024	TOTALL-112-RJ-069	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
6	30/04/2024	TOTALL-112-RJ-070	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
7	30/04/2024	TOTALL-112-RJ-071	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
8	2/05/2024	TOTALL-112-CL-041	CITACION A REUNION EN OFICINA INTERVENTORIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
9	2/05/2024	TOTALL-112-RJ-072	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
10	3/05/2024	TOTALL-112-RJ-073	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
11	6/05/2024	TOTALL-112-RJ-074	CONTRATO DE OBRA 088-2023: SEGUROS DEL ESTADO 45-44-101151212	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
12	6/05/2024	TOTALL-112-RJ-075	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
12	6/05/2024	TOTALL-112-RJ-075	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
13	8/05/2024	TOTALL-112-CL-041	ATRASOS EN LA OBRA, NO CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA Y AJUSTE	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
14	10/05/2024	TOTALL-112-CL-042	Reiteración de la implementación de Contingencia y ajuste de cronograma	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
15	10/05/2024	TOTALL-112-RJ-076	REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 05	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
16	10/05/2024	TOTALL-112-RJ-077	REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 06	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
17	14/05/2024	TOTALL-112-CL-043	CITACION A REUNION EN OFICINA INTERVENTORIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
18	15/05/2024	TOTALL-112-RJ-078	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
19	15/05/2024	TOTALL-112-CL-044	REITERACION SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
20	21/05/2024	TOTALL-112-CL-045	Reiteración del plan de Contingencia y ajuste de cronograma.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
21	22/05/2024	TOTALL-112-RJ-079	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
22	24/05/2024	TOTALL-112-CL-047	Solicitud de documentos.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal

Página

12.2 RECIBIDA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	29/04/2024	CONLOCATIVO-CE-196	Solicitud autorización de ingreso de personal el 27 de abril de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
2	29/04/2024	CONLOCATIVO-CE-199	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
3	30/04/2024	CONLOCATIVO-CE-200	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
4	30/04/2024	CONLOCATIVO-CE-201	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
5	30/04/2024	CONLOCATIVO-CE-202	Intervención baño privado piso 6	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
6	30/04/2024	CONLOCATIVO-CE-203	INTERVENCIÓN RED CONTRA INCENDIOS PISO 7	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
7	30/04/2024	CONLOCATIVO-CE-204	Entrega certificación de puntos edificio bolsa pisos 5 y 6	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
8	2/05/2024	CONLOCATIVO-CE-205	Programación certificación puntos voz y datos Edificio Calle 18	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
9	2/05/2024	CONLOCATIVO-CE-205	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
10	2/05/2024	CONLOCATIVO-CE-206	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
11	3/05/2024	CONLOCATIVO-CE-208	Intervención adicionales piso 6	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
12	3/05/2024	CONLOCATIVO-CE-209	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
13	6/05/2024	CONLOCATIVO-CE-210	Solicitud autorización de ingreso de motocicleta	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
14	6/05/2024	CONLOCATIVO-CE-211	Jornada de certificación puntos de voz y datos edificio calle 18	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
15	7/05/2024	CONLOCATIVO-CE-212	Solicitud autorización de ingreso de vehículo para retiro de material	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
16	7/05/2024	CONLOCATIVO-CE-213	INSTALACIÓN LÁMPARAS EDIFICIO CALLE 18	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
17	7/05/2024	CONLOCATIVO-CE-214	Entrada de almacén Edificio Bolsa Piso 6	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 1

18	7/05/2024	CONLOCATIVO-CE-215	Solicitud autorización de ingreso de vehículos para retiro de material	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
19	10/05/2024	CONLOCATIVO-CE-216	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
20	10/05/2024	CONLOCATIVO-CE-217	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
21	14/05/2024	CONLOCATIVO-CE-220	AUTORIZACION RETRO DE ELEMENTOS EDIFICIO BOLSA	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
22	18/05/2024	CONLOCATIVO-CE-224	Entrega Solicitud de prórroga N°4	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
23	20/05/2024	CONLOCATIVO-CE-225	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES y PLAN DE CONTINGENCIA.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
24	20/05/2024	CONLOCATIVO-CE-226	Modificación Sala Plena de Disciplina Judicial.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
25	23/05/2024	CONLOCATIVO-CE-227	Solicitud autorización de ingreso de personal	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
26	23/05/2024	CONLOCATIVO-CE-228	Autorización de retiro de lámparas del edificio calle 18.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
27	24/05/2024	CONLOCATIVO-CE-229	Autorización desmonte de cielo raso sede calle 18.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
28	30/04/2024	101	Contratos 088 y 112-2023. Solicitud documentos.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
29	30/04/2024	103	Contratos 088 y 112 -2023. Observaciones avance obra	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
30	10/05/2024	106	Contrato 112 -2023. Solicitud informe interventoría.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
31	14/05/2024	108	Contrato 112 -2023. Solicitud informe interventoría.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

32	15/05/2024	109	Contratos 088 y 112 -2023. Definición Sala de Disciplina Judicial.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
33	20/05/2024	113	Contrato 112 -2023. Observaciones y avance obra Calle 18	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
34	20/05/2024	114	Contrato 112 -2023. Observaciones y avance obra Calle 18ª	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
35	23/05/2024	118	Contratos 088 y 112 -2023. Programación Sala de Disciplina Judicial.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Manetenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 2

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO
















































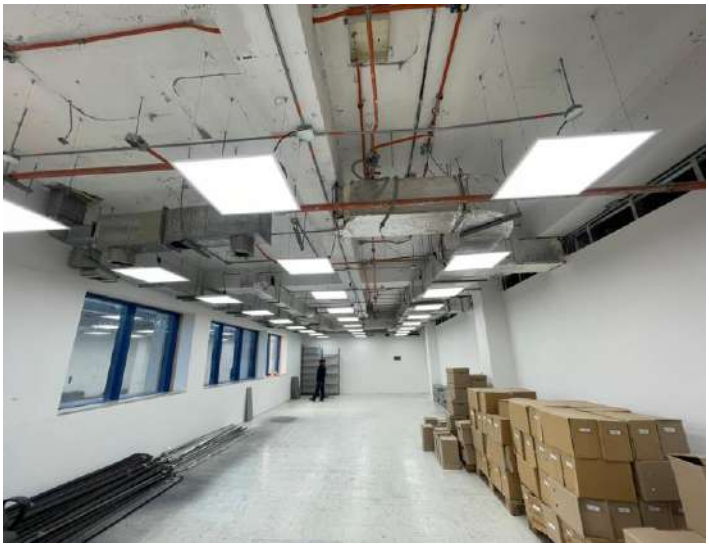




























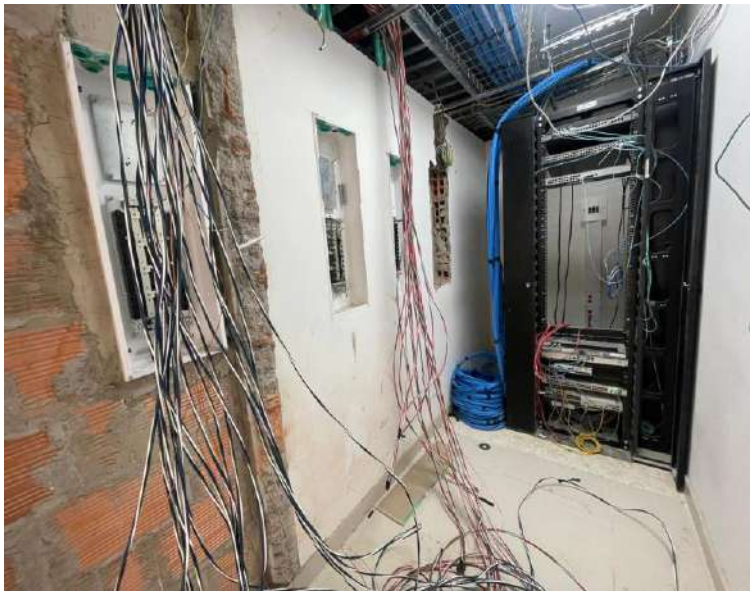










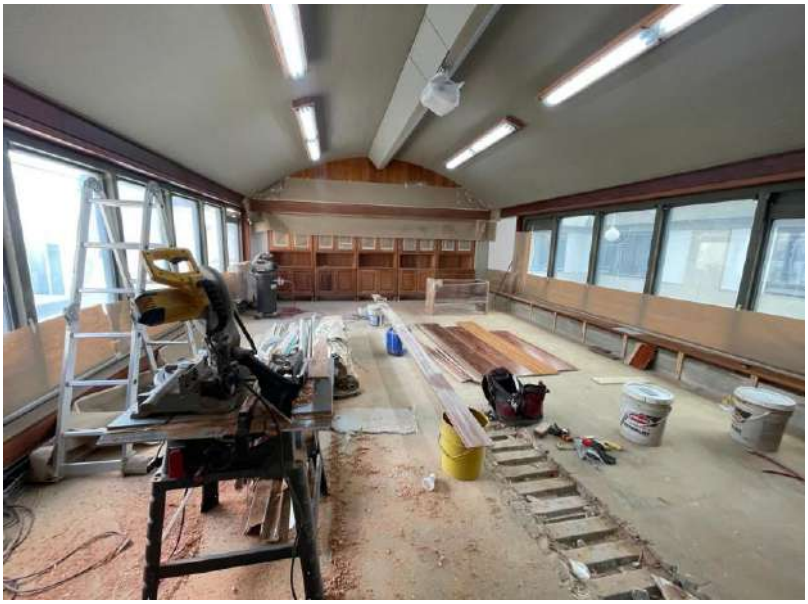




14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.



FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

ANEXOS:

1	ANEXO 1	Informes Semanales de Interventoría
2	ANEXO 2	Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
3	ANEXO 3	Control Aportes Legales y Seguridad Social
4	ANEXO 4	Comités del Periodo
5	ANEXO 5	Informes de Especialistas
6	ANEXO 6	Acreditación Paz y Salvo Parafiscales

ANEXO 1 Informes Semanales de Interventoría

ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría

ANEXO 3 Control Aportes Legales y Seguridad Social

ANEXO 4 Comités de Seguimiento

ANEXO 5 Informes de los Especialistas

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	28	PERIODO:	Del 29 de abril de 2024	Al	5 de mayo de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	211 días		PLAZO ACTUALIZADO:	211 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 163.314.201,00**	**49,01%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.712.528.765,23**	**49,01%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 169.923.879,00**	**50,99%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.781.838.491,77**	**50,99%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	86,00%	85,00%	-1,00%
Ejecutado Presente Semana	7,00%	1,00%	-6,00%
Acumulado Actual	93,00%	86,00%	-7,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

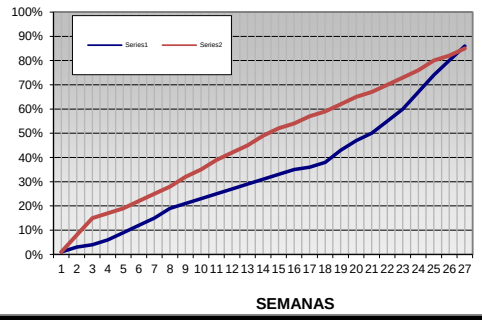

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
211	192	19,00	-14,77

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**

Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**30**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**30**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se realiza la instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se instaló division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**80**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**	Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**
Se evidencio que se finalizo la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**100**	Se evidencio que se finalizo la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**100**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa




Instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

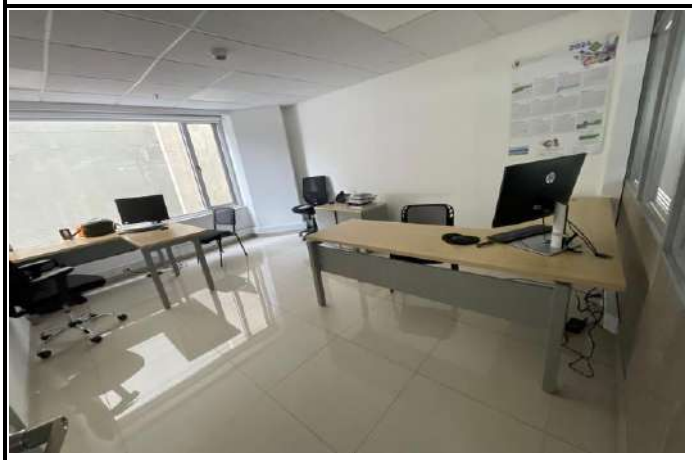

Instalación de los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa



Instalación los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa

Instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

	
Instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	29	PERIODO:	Del 6 de mayo de 2024	Al	12 de mayo de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	211 días		PLAZO ACTUALIZADO:	211 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 167.586.015,00**	**50,29%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.757.323.423,12**	**50,29%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 165.652.065,00**	**49,71%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.737.043.833,88**	**49,71%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	93,00%	86,00%	-7,00%
Ejecutado Presente Semana	4,00%	2,00%	-2,00%
Acumulado Actual	97,00%	88,00%	-9,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
211	199	12,00	-18,99

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

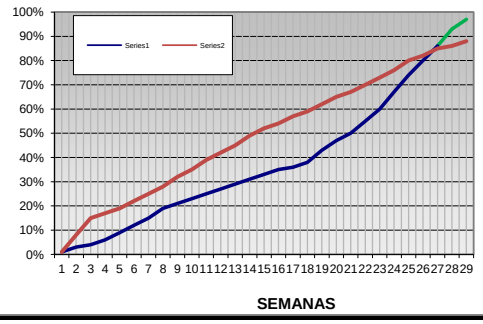


ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**


Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**50**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**
Se verifico que se aplico pintura en las oficinas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se aplico pintura en las oficinas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se instalaron las divisiones de media altura en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se instalaron las divisiones de media altura en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**70**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**70**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO

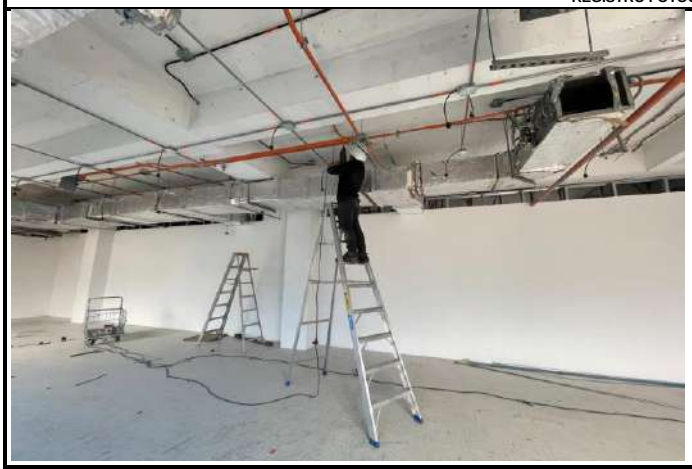

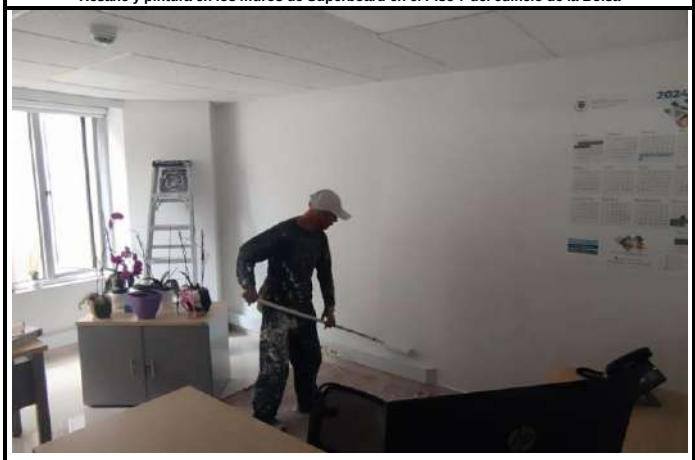

Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Pintura en las oficinas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	Divisiones de media altura en el Piso 6 del edificio de la Bolsa

	
Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.**

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	30	PERIODO:	Del 13 de mayo de 2024	Al	19 de mayo de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	211 días		PLAZO ACTUALIZADO:	211 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 173.222.918,00**	**51,98%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.816.432.542,68**	**51,98%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 160.015.162,00**	**48,02%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.677.934.714,32**	**48,02%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	97,00%	88,00%	-9,00%
Ejecutado Presente Semana	3,00%	1,00%	-2,00%
Acumulado Actual	100,00%	89,00%	-11,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
211	206	5,00	-23,21

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

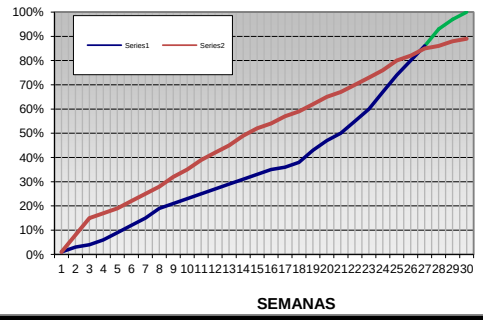

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que se realiza resane y pintura en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que se realiza resane y pintura en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 19	**100**
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**70**
Se evidencio que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**100**

Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**70**
BOLSA		**BOLSA**	
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**80**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Resane y pintura en el muro de Superboard en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18

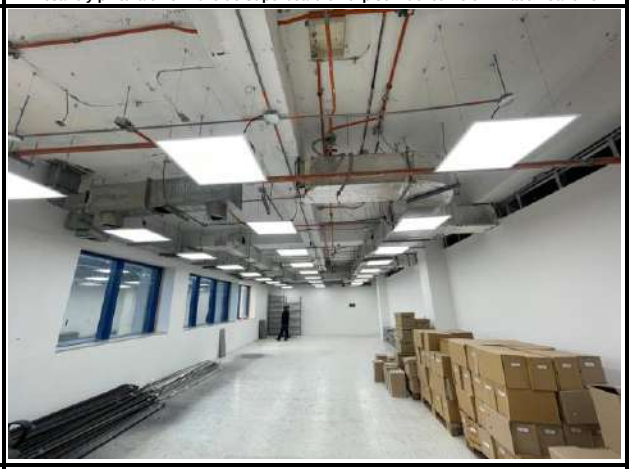

Aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18



Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de puertas corredizas en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18



Instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	31	PERIODO:	Del 20 de mayo de 2024	Al	26 de mayo de 2024
			6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ADICIÓN 3:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 3:	$ -	
VALOR ADICIÓN 4:	$ 55.539.680,00		VALOR ADICIÓN 4:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 444.317.440,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	241 días		PLAZO ACTUALIZADO:	241 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de junio de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de junio de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 214.420.477,19**	**48,26%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 2.057.736.105,94**	**58,89%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 229.896.962,81**	**51,74%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 1.436.631.151,06**	**41,11%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	85,00%	89,00%	4,00%
Ejecutado Presente Semana	3,00%	2,00%	-1,00%
Acumulado Actual	88,00%	91,00%	3,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
241	213	28,00	7,23

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

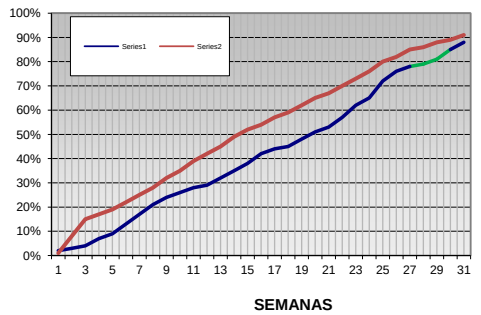

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se evidencio que se realizan demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**100**
Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**90**	Se evidencio que se realiza aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**90**
Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que realizan actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**	Se verifico que realiza instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**100**
BOLSA		**BOLSA**	


Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realizan actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se realiza la instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se realiza actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**	Se verifico que se realiza instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**50**
Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**	Se evidencio que se realizara la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**85**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO



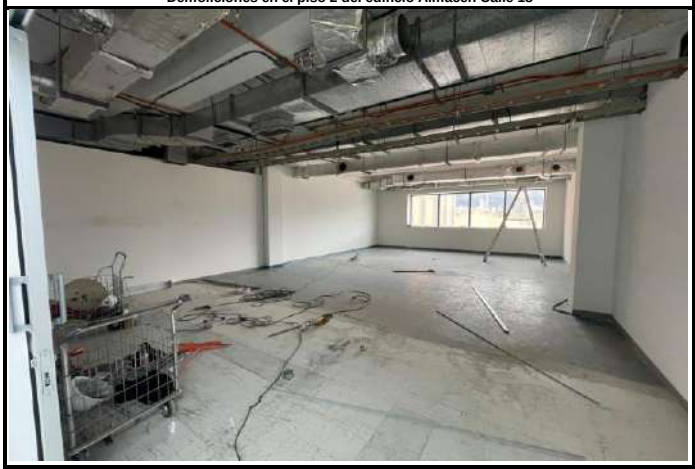


Demoliciones en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**Aplicación de pintura en muros en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18**
	
Actividades electricas en el area de archivos en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**Instalación de puertas corredizas en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18**
	
Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**Actividades en los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa**
	
Instalación de divisiones media altura en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**Resane y pintura en los muros de Superboard en el Piso 7 del edificio de la Bolsa**



Actividades electricas en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones piso techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa

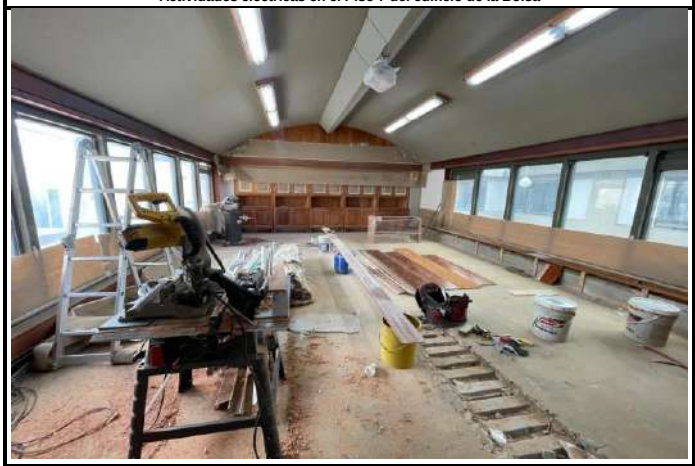

Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 08

CONTRATO No. 112 de 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

TOTALL INC SAS BIC

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/05/2024 – 31/05/2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3

1.1 OBJETIVO GENERAL 4

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO) 5

2. INGRESO DE PERSONAL 6

2.1 REPORTE DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE LABORA EN OBRA 6

2.2 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO OCUPACIONALES 8

3. INDUCCION Y CAPACITACIONES 8

3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, INCLUIDO EN EL SGSST 8

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 9

4.1 REGISTRO DE USO DE EPP 9

5. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS 9

5.1 PERMISO DE TRABAJO PARA LABORES DE ALTO RIESGO 9

6. EMERGENCIAS 10

6.1 RECURSOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE EMERGENCIAS 10

7. DIVULGACION 10

7.1 POLITICA EN SST 10

8. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 10

9. CRONOGRAMA DE REUNIONES MENSUALES Y PLAN DE TRABAJO DE COPASST 10

10. INDICADORES DE SST 11

11. REPORTE Y ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD 13

12. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 14

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

1. INTRODUCCION

La seguridad y salud laboral tiene como objeto la aplicación de las medidas necesarias para evitar, o al menos minimizar, los riesgos en el trabajo y promocionar la salud entre los trabajadores.

No obstante, la planificación, organización y control de la gestión en materia de seguridad laboral debe realizarse de forma consensuada entre el empleador y trabajadores, con la supervisión de las administraciones. Desafortunadamente, en determinadas actividades laborales no es posible llegar a un riesgo cero. Aunque siempre se puede reducir el número de accidentes y minimizar sus consecuencias mediante el empleo adecuado de equipos de protección individual (EPIs): cascos, botas de seguridad, arneses, etc. y con medidas de seguridad colectiva. Otra área de gran importancia en el campo de la prevención es la formación de los trabajadores y la concienciación de éstos de la necesidad de seguir al pie de la letra todos los protocolos y medidas de seguridad.

La función de la Interventoría consiste en supervisar y verificar el cumplimiento de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el Contratista de obra para el cumplimiento de las labores en SST detalladas en el Capítulo SST del Contrato.

El presente informe se realiza teniendo en cuenta el periodo de tiempo de ejecución establecido entre 01 al 31 de mayo de 2024, donde se establece algunas variables en temas de seguridad y salud en el trabajo presentado por el contratista, de los cuales, ha ejecutado poco a poco según el plan de trabajo implementado por parte del contratista.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra para la ejecución del contrato, en cumplimiento de la legislación aplicable y las obligaciones contractuales.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de vinculación de personal establecidos por el contratista, de manera que se cumpla con la correcta vinculación a seguridad social del personal que ingresa a obra.

- Realizar inspecciones locativas en obra con el fin de verificar que implementen las medidas de control propuestas por el contratista en los diferentes niveles de intervención definidos.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en términos de seguridad y salud en el trabajo exigida por las autoridades nacionales y regionales aplicables, en las actividades realizadas en obra por el contratista y sus trabajadores.

- Realizar el acompañamiento y la verificación de las actividades del plan de trabajo de SST realizadas por el profesional designado por el contratista de obra, de manera que no incurra en desviaciones de la legislación aplicable.

- Identificar las posibles desviaciones y oportunidades de mejora en términos de gestión de SST en obra, así como los presuntos incumplimientos en los que pueda incurrir el contratista sobre los procedimientos y documentos aprobados.

1.2 DESCRIPICION DEL PROYECTO (LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO)

La interventoría se desarrollará en la ciudad de Bogotá, D.C., ubicadas en las localidades de La Candelaria y Mártires, donde el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizará el mejoramiento locativo de DELCOP, BOLSA Y PALACIO DE JUSTICIA.



*Fuente tomada por Google Earth. Delcop***



*Fuente tomada por Google Earth. Bolsa***



*Fuente tomada por Google Earth. Palacio de Justicia***

2. INGRESO DE PERSONAL

2.1 REPORTE DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

La presente interventoría, realiza la supervisión y verificación de la afiliación del personal que cuenta el contratista CONSORCIO LOCATIVO, dando cumplimiento a la ley 100 de 1993, resolución 0312 de 2019 y decreto ley 1072 de 2015.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2024, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, entregó a la presente interventoría la documentación de 1 persona que incluía (afiliación a ARL, EPS Y AFP). *Ver tabla 1*

Por parte de la interventoría, en el periodo del presente informe, se presentaron el siguiente personal. *Ver tabla 2.*

Tabla 1.

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
YERSON PINTO MEDINA	1.010.049.627	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PROTECCIÓN
YOADI EDUARDO GONZALEZ	6.437.246	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
JUAN MIGUEL LLAMAS	1.118.856.371	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN
CESAR ANDRES RAMIREZ	1.015.41.067	AUXILIAR ELECTICO	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR
JOSE SERAFIN BARRERA	79.461.984	AUXILIAR ELECTRICO	SURA	FAMISANAR	PROTECCIÓN

NOMBRES	No CEDULA	CARGO	ARL	EPS	FP
INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	1010218260	RESIDENTE SST Y AMBIENTAL	SURA	SURA	COLFONDOS
CLAUDIA YANETH CONTRERAS	52320873	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
ROBINSON VILLAMIL ROJAS	79048393	MAESTRO	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES
OSCAR RENE MORENO BONILLA	91273651	MAESTRO	SURA	CAPITAL SALUD	COLFONDOS
CARLO LEON ARARAT ROJAS	13483989	ORNAMENTADOR	POSITIVA	SURA	PORVENIR
DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ	1.128.199.756	CARPINTERO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
LUIS MIGUEL LOPEZ	80.800.690	CARPINTERO	POSITIVA	COMPENSAR	COLFONDOS
YEZID GAITAN MARTINEZ	79.654.255	CARPINTERO	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES
COSTANTINO HERNANDEZ BEGA	79.406.026	ELECTRICO	SURA	SURA	PORVENIR
EDWARD STEVEN LA ROTTA FRANCO	1.023.870.132	AYUDANTE	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR
JHON EDUARD HERNANDEZ MATEUS	80.911.811	ELECTRICO	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES
JUAN SEBASTIAN ROJAS LEON	1.033.684.725	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
CARLOS ANDRES OROZCO TORRES	1.004.380.318	AYUDANTE	SURA	MUTUAL SER	PROTECCIÓN
JEISSON HUMBERTO PEREZ RUIZ	1.026.577.577	TÉCNICO ELÉCTRICO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
ALEXANDER VALLEJOS CHACON	79.708.231	INSTALADOR MOBILIARIO	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES
JUAN DAVID PUENTES MORENO	1.193.142.656	AUXILIAR ELÉCTRICO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

Tabla 2.

NOMBRE COMPLETO	*CEDULA*	*CARGO*
Fernando Jiménez Polo	79.542.174	Director de interventoría
Eobaldo Jose Díaz Martínez		Residente de interventoría
Juan Sebastián Torres Lozano	1.007.155.089	Residente ambiental
Katherine Guañarita Díaz	1.075.236.242	Residente SST
Ludwig Correa Bellido	7.126.904	Inspector de interventoría

Anexo 1. Soporte afiliaciones a seguridad social del contratista.

Anexo 2. Soporte a planillas de seguridad social de interventoría

2.2 REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales facilitan el seguimiento de la salud de los colaboradores y la detección de enfermedades producidas como resultado de la actividad laboral. En ese sentido, permiten tomar decisiones e implementar mejoras en el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó exámenes médico ocupacionales (5) al personal operativo y administrativo, dando cumplimiento al decreto 2346 de 2007, artículo 2.

ANEXO 3. Soporte exámenes médico ocupacionales del contratista

3. INDUCCION Y CAPACITACIONES

3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, INCLUIDO EN EL SGSST

Las capacitaciones y/o charla preoperacional permite analizar y controlar los riesgos o situaciones que puedan llevar a un accidente. Además, demuestra el grado de compromiso de la empresa con la seguridad y los trabajadores.

También permite el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, donde garantizan el ejercicio laboral.

En el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó 5 inducciones al personal e hizo las siguientes charlas:

TEMA DE CAPACITACION	FECHA
Identificación de peligros	02/05/2024
Uso de EPP y dotación, importancia de pausas activas	07/05/2024
Protección ocular, cuidado de la vista	15/05/2024
Tableros eléctricos, autocuidado	24/05/2024

Anexo 4. Soporte inducciones contratista

Anexo 5. Soporte capacitaciones contratista

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

4.1 REGISTRO DE USO DE EPP

Para iniciar actividades, los trabajadores reciben los EPP, necesarios para realizar las actividades de obra que constan de un casco dieléctrico, gafas de seguridad oscuras y claras, protectores de oídos de inserción, guantes de vaqueta sencillos, guantes de poliuretano y botas de seguridad; en la medida que estos elementos se desgastan, se realiza el respectivo reemplazo, dejando como soporte un acta de entrega, que firman los trabajadores cada vez que reciben elementos nuevos.

Se realizan inspecciones visuales para verificar que los trabajadores utilicen constantemente los EPP entregados, en las capacitaciones se recuerda la importancia de utilizarlos de forma correcta, de igual manera, se anexa soporte de la entrega de dotación y elementos de protección entregadas por el contratista CONSORCIO LOCATIVO.

Anexo 6. Soporte registro y entrega EPP y dotación contratista

5. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS

5.1 PERMISO DE TRABAJO PARA LABORES DE ALTO RIESGO

Durante el tiempo estipulado en el presente informe, se realizaron actividades de alto riesgo “TRABAJO EN ALTURAS”, los días 17 y 18 de mayo de 2024, en el cual, se encontraban realizando en DELCOP limpieza de canaleta. La altura aproximada fue de 12 metros, las personas que se encontraban realizando la actividad, contaban con el curso de trabajo en alturas, se realizó inspección de EPPCC, sin presentar novedad alguna.

Anexo 7. Soporte permiso de trabajo en alturas y ATS

6. EMERGENCIAS

6.1 RECURSOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE EMERGENCIAS

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, cuenta con los siguientes recursos técnicos:

* Extintores

* Camilla de emergencias

* Botiquín de primeros auxilios

* Señalización preventiva

7. DIVULGACION

7.1 POLITICA EN SST

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, cuenta con su política de seguridad y salud en el trabajo, el cual, ha sido divulgada al personal operativa por medio de la inducción realizada.

8. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó reunión de COPASST el día 23 de MAYO de 2024; del COCOLAB, realizaron reunión el día 23 de mayo de 2024.

Anexo 8. Soporte ACTA DE REUNION COPASST

Anexo 9. Soporte ACTA DE REUNION COCOLAB

9. CRONOGRAMA DE REUNIONES MENSUALES Y PLAN DE TRABAJO DE COPASST

En el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO LOCATIVO, dentro de su reunión de COPASST, trataron temas de orden y limpieza, uso de dotación y EPPS, indicadores de accidentalidad. Dando cumplimiento a los temas a tratar, realizaron inspección de las áreas directa de intervención y realizaron recomendaciones para mantener en óptimas condiciones las áreas. Realizaron entrega y reposición de EPPS faltantes a los colaboradores del consorcio. No presentaron índices de accidentalidad, incidentes ni enfermedad laboral.

10. INDICADORES DE SST

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, presentó a la presente interventoría, los indicadores correspondientes al tema de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se anexan a continuación.

Tabla 7. Indicador de frecuencia de accidentalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO						AÑO
No de Accidentes laborales en el mes	0	0	0	0	0	0	0						0
N° de trabajadores en el mes	14	11	16	23	25	20	23						19
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0




Tabla 8. Indicador de severidad de accidentalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO						AÑO
Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo + numero de días cargados	0	0	0	0	0	0	0						0
Total accidentes que se presentaron en el año	0	0	0	0	0	0	0						0
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0



Tabla 9. Indicador de proporcionalidad

2. RESULTADOS													
Resultados	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO						AÑO
Numero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el mes/	0	0	0	0	0	0	0						0
Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0						0
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0



Tabla 10. Indicador prevalencia de enfermedad laboral

2. RESULTADOS													
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO						AÑO
Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una Población en un periodo de tiempo	0	0	0	0	0	0	0						0
Promedio de trabajadores en el periodo * Z **100.000	14	11	16	23	25	20	23						19




Tabla 11. Indicador de incidencia de enfermedad laboral


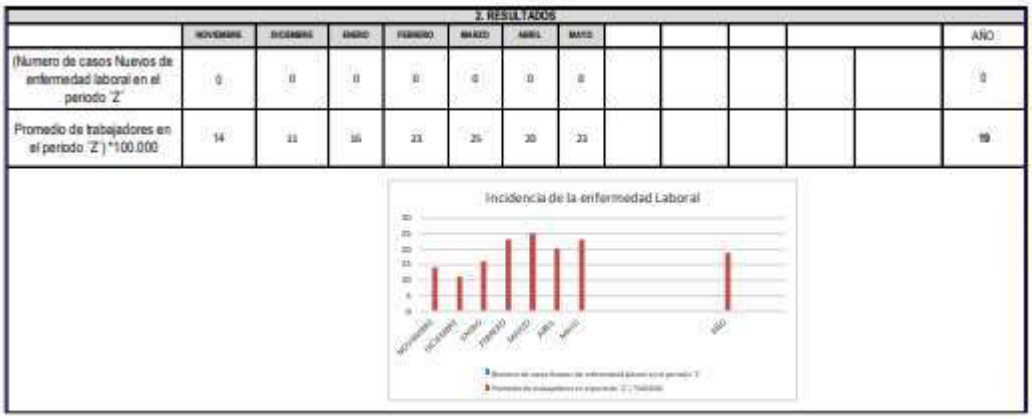


Tabla 12. Indicador de ausentismo

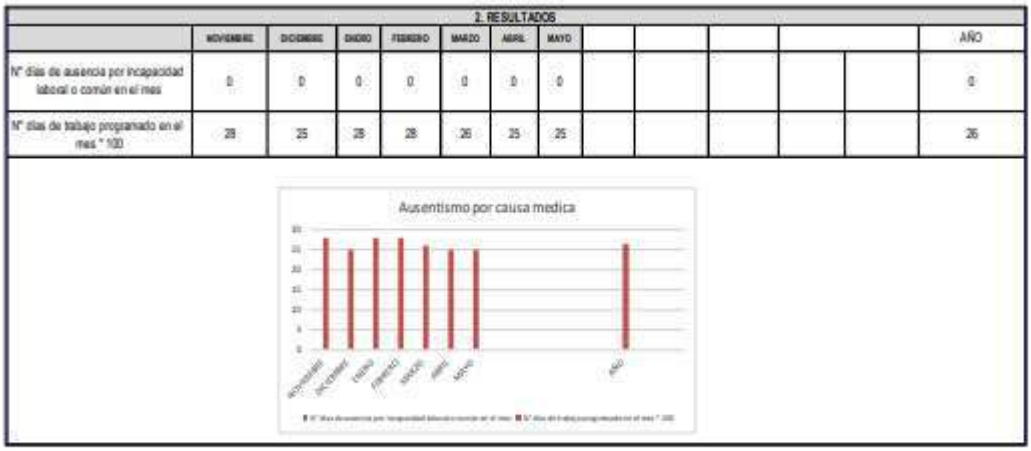

Anexo 12. Indicadores

11. REPORTE Y ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, no tuvo reporte de accidentes ni incidente laboral en el tiempo del 01 al 31 de mayo de 2024. Se anexa soporte de certificación expedida por la ARL.

Anexo 10. Soporte certificación accidentalidad emitida por la ARL del contratista

12. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

El contratista CONSORCIO LOCATIVO, realizó inspecciones pre operacionales de elementos de emergencias e inspección de herramientas, de los cuales, no se hallaron novedades al respecto.

Anexo 11. Soporte inspecciones pre operacionales del contratista


13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista, ha dado cumplimiento con el plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.

- Se recomienda al contratista, dar cumplimiento con el programa de capacitaciones implementado en la empresa, en el cual, debe presentar a la interventoría, los soportes de las capacitaciones realizadas.

- El contratista, da cumplimiento con las afiliaciones a seguridad social de todo el personal.

- El contratista, se le ha manifestado, la falta del uso de EPP del personal de obra; sin embargo, se le realiza observación de manera verbal al siso, en donde ha subsanado satisfactoriamente.



Ing. Katherine Guañarita Díaz
RESIDENTE SST

ANEXOS

ANEXO 1. SOPORTE AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.015.441.067
RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS
CESAR ANDRES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-SEP-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1500150-01077691-M-1015441067-20190628
0065635547A 1
9908513240

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/04/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900473669	**Cédula Usuario:**	CC 79406026
Nombre:	TECNIREDES E Y D SAS				
Dirección:	KR 122 B 128 16				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	TECNIREDESEYD@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	3114642216		**Tarifa:**	4.350	
Actividad Económica:	4432101 INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACION, ALARMA, ALUMBRADO DE CALLES Y SENALES ELECTRICAS, ALUMBRADO DE PISTAS DE AEROPUERTOS, TRASFORMADORES TRABAJOS DE CENTRALES DE ENERGIA.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79406026	CONSTANTINO HERNANDEZ VEGA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	3	01/05/2024	CC 1015441067	RAMIREZ VASQUEZ CESAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

18CCCC313942F6E8D702E95BD3D2BD78 Certificado impreso el día 4/30/2024 8:04:49 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CESAR ANDRES
RAMIREZ VASQUEZ
1015441067

TECNIREDES E Y D SAS
900473669

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011065384
9011065384

No. de Radicación: 27788933

Fecha de Radicación: 01 05 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: RAMIREZ	Segundo Apellido: VASQUEZ	Primer Nombre: CESAR	Segundo Nombre: ANDRES

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1015441067	Femenino [ ] Masculino [X]	D D: 14 M M: 08 A A A A: 1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.300.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna / Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia

	31. Discapacidad					32. Datos de residencia				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
TECNIREDES EYD SAS	NT	900473669	

39. Ubicación				
CL 132 103A 22 Dirección	3729025 Teléfono	Correo electrónico	BOGOTA Municipio / Distrito	DISTRITO CAPITAL Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	01 05 2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AUXILIAR DE SUMINISTROS
71. Firma del funcionario		

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CESAR ANDRES RAMIREZ VASQUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.015.441.067**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Mayo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 03 de May de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO LOCATIVO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 LOCATIVO 2		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1118856371	LLAMAS MEZA JUAN MANUEL	04/05/2024		0I²154N3	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/05/2024 15:07:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.32.9, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Cesantías Protección

NIT 800.170.494

Hace constar que:

El (La) Señor(a) **JUAN MIGUEL LLAMAS MEZA** identificado(a) con **CC** número **1.118.856.371** se encuentra afiliado(a) al FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN, se encuentra en estado Inactivo en el FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de mayo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.461.984

BARRERA CARDENAS
APELLIDOS

JOSE SERAFIN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1968
GACHETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

30-OCT-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500105-47155192-M-0079461984-20070129 02950 07029A 02 214936746

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT

Fecha de Radicación: 16 05 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
BARRERA (Primer Apellido)	CARDENAS (Segundo Apellido)	JOSE (Primer Nombre)	SERAFIN (Segundo Nombre)

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79461984	Femenino [ ] Masculino [X]	16 05 2024

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SURA - CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS	PROVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$ 1.300.000	CALLE 77A SUR 2 59 ESTE (Dirección)		Teléfono fijo	3144830801 (Teléfono celular)
CAFETERITO.077@GMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA D.C. (Municipio / Distrito)	Zona Urbana [X] Rural [ ]	BOGOTA (Localidad / Comuna)	BOGOTA D.C. (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	30. Etnia
B1					D D M M A A A A		
B2					D D M M A A A A		
B3					D D M M A A A A		
B4					D D M M A A A A		
B5					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
DEKO INDUSTRIAL	NIT	901523270	

39. Ubicación				
CARRERA 57 # 4 A 28 (Dirección)	3219799025 (Teléfono)	DEKOINDUSTRIAL20@GMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA D.C. (Municipio / Distrito)	BOGOTA D.C. (Departamento)

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [X] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	16 05 2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	[ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	[ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	[ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	[ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	[X]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	[X]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	[X]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	[X]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Jose Serafin Barrera	Andrea Guzman

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:									

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

cadena s.a. 05/04/2019 32325

- ORIGINAL ÚNICA -

Medellín, 16 de May de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DEKOINDUSTRIAL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000DI5 5 RIESGO 5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C79461984	BARRERA CARDENAS JOSE SERAFIN	17/05/2024		20022220	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/05/2024 14:53:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.121.176, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **BARRERA CARDENAS JOSE SERAFIN** identificado(a) con **CC** número **79.461.984** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2003 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de mayo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024051614525

Medellín, 03 de May de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO LOCATIVO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 LOCATIVO 2		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1010049627	PINTO MEDINA YERSON	04/05/2024		12812323	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/05/2024 15:12:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.32.9, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Cesantías Protección

NIT 800.170.494

Hace constar que:

El (La) Señor(a) **YERSON PINTO MEDINA** identificado(a) con **CC** número **1.010.049.627** se encuentra afiliado(a) al FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN, se encuentra en estado Inactivo en el FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de mayo de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

Medellín, 03 de May de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO LOCATIVO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 LOCATIVO 2		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
X6437246	GONZALEZ GONZALEZ YOADY EDUARDO	04/05/2024		26140199	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/05/2024 15:15:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.29.32.9, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

YOADI EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **6.437.246**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Mayo del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	664501806	9467779115	Y	2024/05/24	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	3	$362,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000
1	CC	52320873	CONTRERAS CLAUDIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1013632556	DIAZ JHONY																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	16941852	MARTINEZ WALTHER																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
4	CC	1010218260	SALCEDO INGRID																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total	**Afiliados(4)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$362,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	664501806	9467779115	Y	2024/05/24	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	3	$362,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$900	$0	$362,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$900	$0	$362,900
TOTAL				**4**	**$362,000**	**$900**	**$0**	**$362,900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS	CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	16/05/2024	76994144	$2.310.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	62.400	0		0		0	0	0	0	62.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	30.000	0		0		0	0	0	0	30.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	776.000	0	0	0	0	0	0		776.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	536.700				536.700	0	0	536.700			5.367	536.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	231.300	0	0	231.300	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	16/05/2024	76994144	$2.310.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	308.400	308.400
Pensión	3	1.233.600	1.233.600
Riesgos Laborales	1	536.700	536.700
CCF	1	231.300	231.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.310.000	2.310.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901568362-8	EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS		CL 166 8F 41	3153598877	emlgerenciabogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	16/05/2024	76994144	$2.310.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13483989	ARARAT ROJAS CARLO LEON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
2	CC	79654255	GAITAN MARTINEZ YEZID	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
3	CC	1128199756	DE LA HOZ MUÑOZ DARWIN ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
4	CC	80800690	LOPEZ PIEDRAHITA LUIS MIGUEL	1	0			S	X																231001	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS008	1.560.000	62.400	14-23	1.560.000	5	108.600	CCF24	1.560.000	46.800	0	0	0	0	0
5	CC	1000123794	RONDON QUINTERO ERIXZON DAVID	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
6	CC	80125474	ARENAS LOPEZ EDWIN REINEL	1	0			S		X															230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS037	750.000	30.000	14-23	750.000	5	52.200	CCF24	750.000	22.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ALEXANDER VALLEJOS CHACON**, identificada con **CC** número **79708231**, aportó por el empleado **ALEXANDER VALLEJOS CHACON** identificado(a) con **CC** número **79708231** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2024 y 05 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Mayo- 2024	76282427	30/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Mayo- 2024	76282427	30/04/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Mayo -2024	76282427	30/04/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Abril 2024	75193322	04/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Abril 2024	75193322	04/03/2024	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Abril 2024	75193322	04/03/2024	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Mayo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52320873	CLAUDIA YANETH CONTRERAS CORTES	CALLE 20C N 105-27	6015516722	clacoco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	76853355	$429.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	7	1.000	0	176.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	7	1.300	0	225.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.000	7	200	28.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	176.000
Pensión	1	224.000	225.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.000	28.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	427.000	429.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52320873	CLAUDIA YANETH CONTRERAS CORTES		CALLE 20C N 105-27	6015516722	clacoco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	76853355	$429.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52320873	CONTRERAS CORTES CLAUDIA YANETH	3	0			N																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	175.000		0		0	CCF24	1.400.000	28.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	663780570	9467778498	E	2024/05/24	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,211,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
1	CC	91273651	MORENO OSCAR																	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1004380318	OROZCO CARLOS																	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1077942426	SILVA CRISTIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total		**Afiliados(3)**																				$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901744095	0	CONSORCIO LOCATIVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 51 NO 71A 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3837687	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	663780570	9467778498	E	2024/05/24	2024/05/27	BANCO CAJA SOCIAL	3	$1,211,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$624,000	$1,800	$0	$625,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$700	$0	$272,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$271,500	$700	$0	$272,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$400	$0	$156,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$156,000	$400	$0	$156,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$156,000	$600	$0	$156,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$200	$0	$52,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				**3**	**$1,207,500**	**$3,500**	**$0**	**$1,211,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79406026		HERNANDEZ VEGA CONSTANTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 122 b 128 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4661413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	30327341	9463244259	I	2024/05/06	2024/05/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC 79406026	HERNANDEZ CONSTANTINO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

2024/05/20 04:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79406026		HERNANDEZ VEGA CONSTANTINO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 122 b 128 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4661413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	30327341	9463244259	I	2024/05/06	2024/05/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWARD STEVEN LA ROTTA FRANCO identificado(a) con CC 1023870132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: LA ROTTA FRANCO EDWARD STEVEN CC 1023870132																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9463339755	29291529	I	2024-04-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																				
9463339755	29291529	I	2024-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																				
9463339755	29291529	I	2024-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																				

Este certificado se expide el día 2024-04-22 a las 16:12.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901523270-5	DEKOINDUSTRIAL SAS		CARRERA 57 4A 28	3124677152	dekoindustrial20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	COSTANTINO HER	35	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	14/05/2024	77096837	$1.402.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	400	0	0	400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	208.000	208.000
Pensión	3	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	1	400	400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.402.400	1.402.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901523270-5	DEKOINDUSTRIAL SAS		CARRERA 57 4A 28	3124677152	dekoindustrial20@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	COSTANTINO HER	35	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	14/05/2024	77096837	$1.402.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026577577	PEREZ RUIZ JEISSON HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
2	CC	1033684725	ROJAS LEON JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
3	CC	1193142656	PUENTES MORENO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0
4	CC	80911811	HERNANDEZ MATEUS JHON EDUARD	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF26	100	100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013632556	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	CALLE 89 86A 12	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	28/05/2024	77383762	$1.075.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	13	4.000	0	379.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	13	5.100	0	485.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.800				208.800	13	2.200	211.000			2.088	211.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	379.000
Pensión	1	480.000	485.100
Riesgos Laborales	1	208.800	211.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.075.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013632556	JHONY FERNEY DIAZ DAZA		CALLE 89 86A 12	3837687	recursoshumanos.prociving@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	28/05/2024	77383762	$1.075.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013632556	DIAZ DAZA JHONY FERNEY	57	0			N																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	375.000	14-11	3.000.000	5	208.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010218260	INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA	carrera 91 c n 2-55 sur	4585555	johanasalcedo68@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	20/05/2024	76723782	$533.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	225.000	0		0		0	4	800	0	225.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	4	1.000	0	289.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.800				18.800	4	100	18.900			188	18.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.800
Pensión	1	288.000	289.000
Riesgos Laborales	1	18.800	18.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	531.800	533.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010218260	INGRID JOHANNA SALCEDO SIERRA		carrera 91 c n 2-55 sur	4585555	johanasalcedo68@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	20/05/2024	76723782	$533.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010218260	SALCEDO SIERRA INGRID JOHANNA	59	0			N																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	2	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-04-15, 09:29:51 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1062256635

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202404

PAGADA 2024-04-15 07:06:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROBINSON VILLAMIL ROJAS RVR SAS				
Documento	NI 901582165	**Dirección**	CR 99C #71 B - 68		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5255621		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIL ROJAS ROBINSON	**Identificación**	CC 79048393		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79048393		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VILLAMIL ROJAS ROBINSON	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X									0	30	30	30	30					F	$ 1.968.194	25-14		16 %	$ 1.968.194	$ 315.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.968.194	$ 78.800	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 1.968.194	$ 137.000	CCF21	4 %	$ 1.968.194	$ 78.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 78.800	$ 137.000	$ 78.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16941852	WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL	CL 20C 105 27	2982945	INGWALTHER333@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	76692021	$374.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	12	1.600	0	164.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	12	2.100	0	210.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.100
Pensión	1	208.000	210.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	374.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16941852	WALTHER ANTONIO MARTINEZ CARVAJAL		CL 20C 105 27	2982945	INGWALTHER333@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	27/05/2024	76692021	$374.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16941852	MARTINEZ CARVAJAL WALTHER ANTONIO	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2. SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

ANEXO 3. SOPORTE EXAMENES MEDICO OCUPACIONAL DEL CONTRATISTA

BIOMEDICAL COLOMBIA SAS
LICENCIA SST Res N° 10942/2016 según Res N°2346 MPS
3167835660
info@biomedicalcolombia.com
www.biomedicalcolombia.com

BIO MEDICAL
CENTRO MEDICO LABORAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
02/05/2024			**BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.)**	**PREOCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR CON ENFASIS EN ALTURAS**
Dia	**Mes**	**Año**	Ciudad	

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE	
Nombre de la empresa	Orden medica N°
TECNIREDES E Y D SAS	**30289**

Nombres y Apellidos	Genero	Edad	**Documento de Identificación**	
CESAR ANDRES RAMIREZ VASQUEZ	MASCULINO	30 AÑOS	CC	1015441067

Cargo a desempeñar:	AUXILIAR ELECTRICISTA

CONCEPTO DE APTITUD	**APTO PARA EL CARGO, PUEDE LABORAR EN ALTURAS**
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	**SI**

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL	✓	PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA	✓
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS	✓	PSICOTEST DE ALTURAS	✓
OPTOMETRIA	✓	AUDIOMETRIA	✓

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
USO DE EPP	HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES
PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	HACER DEPORTE
	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES IDENTIFICADAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 2020

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretaci ón, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realizaci ón de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Jim Roger Sánchez Benavidez Medico ocupacional R.M 79762200 S.S.B BIO MEDICAL CENTRO MEDICO LABORAL	Cesar Ramirez CESAR ANDRES RAMIREZ VASQUEZ	
FIRMA MEDICO OCUPACIONAL LICENCIA S.O 9211 10/04/16	**D.I:** **1015441067**	**HUELLA**

BIOMEDICAL COLOMBIA SAS
LICENCIA SST Res N° 10942/2016 según Res N°2346 MPS
3167835660
info@biomedicalcolombia.com
www.biomedicalcolombia.com

BIO MEDICAL
CENTRO MEDICO LABORAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
16/05/2024			**BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.)**	**PREOCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR**
Dia	**Mes**	**Año**	Ciudad	

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE	
Nombre de la empresa	Orden medica N°
TÉCNIREDES E Y D SAS	**31794**

Nombres y Apellidos	Genero	Edad	**Documento de Identificación**	
JOSE SERAFIN BARRERA CARDENAS	MASCULINO	55 AÑOS	CC	79461984

Cargo a desempeñar:	AUXILIAR ELECTRICISTA

CONCEPTO DE APTITUD	**APTO PARA EL CARGO**
APTO PARA EL CARGO	**SI**

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓	AUDIOMETRIA	✓
OPTOMETRIA	✓		

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
USO DE EPP	HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES
PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN	HACER DEPORTE
	DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES IDENTIFICADAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGÚN CIRCULAR 030 DE 2020

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realizaci ón de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y ver ídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Jim Roger Sánchez Benavidez Medico ocupacional R.M 79762200 S.S.B BIO MEDICAL CENTRO MEDICO LABORAL	JOSE SERAFIN BARRERA CARDENAS	
FIRMA MEDICO OCUPACIONAL LICENCIA S.O 9211 10/04/16	**D.I:** **79461984**	**HUELLA**

Clinisur IPS Ltda
Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000485478

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO FECHA 03/05/2024 08:54:50

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: JUAN MIGUEL LLAMAS MEZA **C.C** 1118856371

EDAD 29 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRIA EPS / USO DE LENTES
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ HIGIENE POSTURAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Juan llamas

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Pablo E. Salinas E.
Pablo E. Salinas
Médico Especialista
Salud Laboral
C.C 1073.677.274
I.S.O 3395-2020

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

Clinisur IPS Ltda Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000485541

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO FECHA 03/05/2024 10:43:01

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: YERSON PINTO MEDINA **C.C** 1010049627

EDAD 25 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE



Pablo E. Salinas
Médico Especialista
Salud Laboral
C.C 1073.677.274
I.S.O 3395-2020

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

Clinisur IPS Ltda Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000485558

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO LOCATIVO FECHA 03/05/2024 11:06:24

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: YOADI EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ **C.C** 6437246

EDAD 32 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☑	Glic ☑ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☑	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL - NUTRICION EPS
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Pablo E. Salinas
Médico Especialista
Salud Laboral
C.C 1073.677.274
I.S.O 3395-2020

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

ANEXO 4. SOPORTE INDUCCIONES DEL CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088 de 2024.	**FECHA:** 07/Mayo 2024
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Auxiliar Electrico

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1085441067	Cesar Andres Ramirez	Aux. Electrico	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio Locativo FECHA: 07/ Mayo 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cesar Andres Ramirez Vasquez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C 1015441057

CARGO: Axiliar Electrico.

PROYECTO: 088 de 2023.

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

ARL. - Positiva De Inmediato se reporta a SISO o encargado.

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a)	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
b)	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	i)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	j)	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

machucones, electrocucion, ruptura, daño fisico y golpes.

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones



Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1015441057

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torreciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policía cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión.
Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Cesar Ramirez.	NOMBRE SG SST	Johanna Isaza
CEDULA	1015441067		
CARGO	Aux. Electrico		
FIRMA ACEPTANDO		FIRMA	
FECHA DE FIRMA	07/mayo/2029	Observaciones	
EMPRESA	consorcio locativo		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Martha Vasquez.		
NO. CEL O TEL	3054043026		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI	NO X	CUAL?

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 089 de 2023	**FECHA:** 24/05/2024.
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
79461984	José S. Barrera	Técnico	

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio Locativo FECHA: 22/05/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Serafin Barrera Cardenas

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 79461984 Btá

CARGO: Tecnico Electricista

PROYECTO: 088-2023.

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d) X Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

ARL Sura se reporta de inmediato

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a) X	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
b) X	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c) X	Guantes de carnaza	I)	Guantes de caucho
d) X	Arnes en X (cuatro argollas)	j) X	Gafas de seguridad
e) X	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

Caída de escalera - Choque eléctrico Golpes
Tecnicos X Tuberias o Cable latas.

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V X	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 79461984.

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jose S Barrera	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	79461984 Btá		
CARGO	TECNICO	FIRMA	
FIRMA ACEPTANDO		Observaciones	
FECHA DE FIRMA	consorcio locativo		
EMPRESA			
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Amparo Barrera		
NO. CEL O TEL	3112149530		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI NO	CUAL?	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO: CL-SST-F-001
	FORMATO DE INDUCCIÓN	Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088 2024	**FECHA:** mar 07/05
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Residente SST

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)	
2. Políticas SSTA y Calidad.	
3. Organigrama General de la Empresa	
4. Reglamento interno de trabajo	
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo	
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)	
8. Responsabilidades del COPASST	
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo	
10. Reporte de Actos Inseguros y Condiciones Inseguras	
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo	
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)	
13. Notificación de riesgos	
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea	✓
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias	
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto	
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo	
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo	✓
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales	
20. Procedimientos Ambientales.	

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1118856371	Juan migue llamas	ayudante	Juan llamas

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: concersio locativo FECHA: 07/07/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan miguel llamas meza

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 1118856371

CARGO: ayudante

PROYECTO: 088 20 24

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b) Proteger y promover la salud
c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
~~d)~~ Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

Sura, de inmediato.

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

~~a)~~	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
~~b)~~	Botas de seguridad con puntera	~~h)~~	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	I)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	~~j)~~	Gafas de seguridad
~~e)~~	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
~~f)~~	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

caidas, golpes, fracturas, lesiones, cortaduras

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa




Juan miguellamas

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.	•	X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torrenciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en caliente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Juan miguel llamas	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	1118356371		
CARGO	ayudante		
FIRMA ACEPTANDO	Juan miguel llamas	FIRMA	
FECHA DE FIRMA	marzo 7/05	Observaciones	
EMPRESA	consercio locativo		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	Juan llamas		
NO. CEL O TEL	3143504476		
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI NO X	CUAL?	

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-001
FORMATO DE INDUCCIÓN		Fecha: 12-11-2023

PROYECTO: 088.D2024	**FECHA:** Mar-07-Mar
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Johanna Salcedo	**CARGO:** Ayudante de obra

Certifico que he recibido y comprendido el siguiente temario de inducción en **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**, para garantizar la aplicación de la reglamentación interna de la compañía y la observación de las normas legales vigentes. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes en mi puesto de trabajo.

El proceso de inducción contempló los siguientes aspectos:

1. Generalidades de la Empresa (Objeto, Misión, Visión, Proyectos en Curso)
2. Políticas SSTA y Calidad.
3. Organigrama General de la Empresa
4. Reglamento interno de trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
6. Responsabilidades y Competencias en SST requeridas para el cargo
7. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.(Salud y Seguridad en el trabajo)
8. Responsabilidades del COPASST
9. Funciones y representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
10. Reporte de Actos *Inseguros y Condiciones Inseguras*
11. Reporte de Accidentes e Incidentes de Trabajo
12. Divulgación Matriz de peligros (Riesgos del puesto de trabajo y métodos de prevención)
13. Notificación de riesgos
14. Procedimientos Seguros de trabajo requeridos para el desarrollo de la tarea
15. Conformación y funciones de la Brigada de Emergencias
16. Plan de Emergencias de la compañía y/o del proyecto
17. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal requeridos para el cargo
18. Manejo de Hojas de Seguridad de Productos Químicos de acuerdo al cargo
19. Divulgación de Aspectos e Impactos Ambientales
20. Procedimientos Ambientales.

Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
1065849624	Yerson Ramos M	Ayudante	Yerson R.

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CL-SST-F-036 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	EVALUACION DE INDUCCION	

EMPRESA: Consorcio Locativo **FECHA:** Mar-07-Mar40

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yerson Pinto Medina

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 1010401627

CARGO: Ayudante de obra

PROYECTO: 088D2024

Reflexione lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las siguientes opciones es la definición de seguridad y salud en el trabajo

- a) Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- b) Proteger y promover la salud
- c) Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
- d) Todas las anteriores

2. Indique a que entidad se reporta el Accidente de Trabajo y en que tiempo se debe generar el reporte

Salud total

3. Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a)	Proteccion auditiva	g)	Careta facial
b)	Botas de seguridad con puntera	h)	Respirador de doble cartucho
c)	Guantes de carnaza	I)	Guantes de caucho
d)	Arnes en X (cuatro argollas)	j)	Gafas de seguridad
e)	Guantes de nitrilo	k)	Dalantal de carnaza
f)	Barbuquejo de 4 puntos	L)	Equipo para trabajo ene spacios confinados

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores/actividades

Cortaduras, golpes Etc

3. Responda con una V si es verdadero o F si es Falso a las siguientes oraciones

V	Toda lesión que sufra un trabajador debe ser informada dentro de la jornada de trabajo
F	Puedo usar cualquier herramienta sin las guardas de seguridad
F	Sólo la Brigada de emergencia puede dar la alarma en caso de una emergencia
F	No debo utilizar elementos de proteccion personal (EPP) para manipular o guardar cualquier sustancia, dispositivo o material desconocido
V	Antes de manipular herramientas y equipos eléctricos se debe revisar su enchufe y extensiones

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la Empresa



Yerson P. Pinto M.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1010401627

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO	F-SST-37
		VERSION	0
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	FECHA	11/11/2023
	NOTIFICACION DE RIESGOS	PAG	1

FACTOR DEL RIESGO	AGENTE		CONTROL	APLICA SI	APLICA NO
TRABAJO SUTANCIAS PELIGROSAS	Explosion (manejo de explosivos, manejo de gas propano-oxiacetileno).		Garantizar personal calificado para el manejo de explosivos , controles ambientales, control de personal no autorizado y areas delimitadas y despejadas comunicación constante personal calificado en manejo de sustancias peligrosas y uso de epe adecuados a cada tipo de sustancia personalcertificado en temas de trabajos con caliente , equipos de chispas , preoperacioanles equipos manomentros y mangueras.		X
RIESGO UNICO	Riesgos naturales: avalanchas, sismos, terremotos, Lluvias torreciales, Vientos fuertes Terrorismo, Asonadas,hurto-robo-atraco, amenaza de bomba		Conserve la calma, No corra Busque un lugar seguro y protejase Siga las recomendaciones de los brigadistas Ubique el punto de encuentro Divulgar el plan de emergencias - Medevac - Brigadas - Puntos de encuentro	X	
TRABAJO EN CALIENTE CORTE Y SOLDADURA	Inhalacion de humos, intoxicacion, asfixia Proyeccion de particulas cortes heridas Contacto con superficies calientes Exposicion a radiaciones, irritacion Posiciones incomodas, fatiga muscular		Uso de EPP apropiados para su labor y actividad personal certificado en trabajo en callente Mantenimieto preventivo herramientas equipos Trabajar a intervalos Concentracion, Supervisión continua, areas despejadas delimitadas y control de chispas y materiales inflamables cerca ala actividad Relajar musculos,pausas activas , contar con extintor , examens medicos control riesgos alteracion vision y pulmonar ATS y control de chispas inspeccion de areas para evaluar riesgo con sustancias quimicas		X
RIESGO PUBLICO	atracos , secuestro Asonadas , Atentados		No andar solo a altas horas No usar celulares en la calle Salir en compañía Evaluar areas sin poca iluminacion No llevar tanto dinero numeros de atencion (policia cuadrantes del area)	X	
RIESGO VIAL	Choques Accidentes de transito Por carros- motos- bicicletas Accidentes por conducir Motos .carros - bicletas Mal Uso de senderos peatonales , transitar por la via no usar andenes , No respetar semaforos no usar puentes peatonales , no usar las cebras no repetarlas señales de transito adelantar por la derecha zizagear		Usar lospuentes Transitar por la cebra Hacer tecnomecanicas y soat al dia Respetar las señales de transito Respetar al peaton No adelantar Manetener equipos primeros auxilios en buenas condiciones Usar las cebras y esquinas Hacer rvision a vehiculos motos bicletas Usa el cascoy el chaleco Usar el cinturon de seguridad Portar documentos personales y del vehiculo Usar reflectivos	X	

NOTIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no esta obligado a realizarse el examen de egreso.

YO, EL AQUÍ FIRMANTE MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LOS FACTORES DE RIESGO ALOS CUALES ESTOY EXPUESTO , LA MANERA DE CONTROLARLOS PARA REALIZAR MI TRABAJO , AL INGRESAR A LA EMPRESA ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES ASIGNAS EN MI CARGO EN EL CONSORCIO LOCATIVO Y TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE REALIZE MI TRABAJO .

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Yuser Pinto	NOMBRE SG SST	Johanna Salcedo
CEDULA	1010045697		
CARGO	Auxiliar		
FIRMA ACEPTANDO	Yuser Pinto	FIRMA	Yuser Pinto
FECHA DE FIRMA	Mar-07-2024	Observaciones	
EMPRESA	Consorcio Locativo		
FAMILIAR EN CASO DE EMERGENCIA	3163801915		
NO. CEL O TEL			
ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO	SI X NO	CUAL?	

Powered by CamScanner

ANEXO 5. SOPORTE CAPACITACIONES DE CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	CÓDIGO: CL-SST-F-0037 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	

FECHA: 02 de Mayo de 2024

CONTRATO: 088 de 2024

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Johanna Salcedo

CARGO	Residente SST.	FIRMA	

TEMA: Identificación de peligros.

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

ASISTENTES

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Fandon Quintero Erixon D.	1000123794	auxiliar	
2	Dercy Lopez Muñoz	1128199756	Liñador	
3	Yezid Carlos M.	79654255	Cop.ntero	
4	Carlos Andres Orozco Torres	1.004380318	Ayudante	Carlos
5	yadir Eduardo Gonzalez	6'12 72'16	Ayudante	Eduardo
6	Juan miguel Illanal meza	1118 856 311	ayudante	Juan Illanas
7	Yerson Pinto medina	1010099627	Ayudante	Yerson Pinto
8	Oscar Raul Moreno	91773651	MAESTRO	OSCAR R MORENO
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	CÓDIGO: CL-SST-F-0037
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023

FECHA: 07 de Mayo de 2024.

CONTRATO: 088 de 2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Johanna Suleda

CARGO	Residente SST	**FIRMA**	

TEMA: Uso de EPP's y dotación, Importancia de Pausa activas.

INDUCCION		**CAPACITACION**	X
CHARLA INFORMATIVA		**ENTRENAMIENTO**	

TIPO

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Edwin Carreño	1023°7L32	Tecn.co	
2	Sebastian Lopez	1033684775	Aux	
3	RENE MORENO	91273651	MAESTRO	RENE M.
4	Carlos Orozco	1004380318	ayudante	Carlos.
5	Darwin De la Mayor	1128194756	Lijador	
6	YEZID Caitan M.	79654255	Carpintero	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	CÓDIGO: CL-SST-F-0037
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023

FECHA: 15 de Mayo de 2024.

CONTRATO: 088 de 2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Johanna Salcedo.

CARGO	Residente SST.	**FIRMA**	

TEMA: Protección ocular, cuidado de la vista

TIPO

INDUCCION		**CAPACITACION**	X
CHARLA INFORMATIVA		**ENTRENAMIENTO**	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Carlos ANDRES OVOZCO TORRES	1004 380318	ayudante	Carlos
2	Daryenddy Ha Muñoz	1122199756	Ejecutor	
3	yodi Eduardo Gonzalez	6437246	Ayudante	Eduardo G
4	Pedro Guisseppe Espinosa D	1000123794	ayudar	
5	Saez Gabriel M.	79654255.	Carpintero	
6	Juan miguel llamas meza	1118856371	ayudante	juan llamas
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	CÓDIGO: CL-SST-F-0037 VERSION: 0 FECHA: 14/11/2023
	REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	

FECHA: 24 de Mayo de 2024

CONTRATO: 088 de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Johanna Salcedo

CARGO	Residente SST	**FIRMA**	

TEMA: Tableros Eléctricos Autocuidado.

TIPO

INDUCCION		CAPACITACION	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Edwin Carrillo	1023970132	Tecnico	Edwin
2	Sebastian Reyes	1033684725	Aux	
3	Jose S Barrera	79461984	Tecnico	
4	RENE MORENO	91273651	MAESTRO	RENE M.
5	Carlos Andres orozco	1004380318	ayudante	carlos
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Powered by CamScanner

ANEXO 6. SOPORTE REGISTRO Y ENTREGA EPP Y DOTACION CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	CODIGO : F-RH-06
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION :0
		FECHA :11/11/2023
	ENTREGA Y/O INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	PAG 1 DE 1

OBJETIVO DEL FORMATO: Proporcionar la información suficiente a fin de analizar los principales aspectos relacionados con el equipo de protección personal (EPP), mas adecuado, en consideración al riesgo expuesto y necesidades de reposición y/o mantenimiento

PROYECTO : 288 de 2023 — ACTIVIDAD REALIZADA : Jo Entrega de EPP's. y dotacion

INSPECCIONADO POR : Johanna Salcedo. — APROBADO POR Claudia Contreras — Mayo 2024.

FECHA DE INSPECCION:		CABEZA			PROTECCION FACIAL						PROTECCION AUDITIVA						MANOS Y BRAZOS			PROTECCION RESPIRATORIA						PROTECCION CORPORAL						PIES		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	CASCO			GAFAS			CARETA			INSERCION			COPA			GUANTES			MASCARILLA			RESPIRADOR			OVEROL Y/O PETO			IMPERMEABLE			BOTAS		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Cesar Ramirez V.		B			B						B						B									B						B		
Eduel Landa		B			B						B						B									B						B		
Sebastian R.		B			B						B						B									B						B		
Jose J. Ba		B			B						B						B									B						B		
Rene Moreno	Rene M.	B			B						B						B									B						B		
Carlos D	Carlos	B			B						B						B									B						B		
Yezid Gartan		B			B						B						B									B						B		
Juan miguel	Juan Ilam	B			B						B						B									B						B		
Joadi Gonzalez	Eduardo G	B			B						B						B									B						B		
Darwin de la Hoz		B			B						B						B									B						B		
Yerson Pinto M.		B			B						B						B									B						B		
Ronsen Quintero Er		B			B						B						B									B						B		

B= BUENO / M= MALO / N/A = NO APLICA / C= CAMBIARLO / R = RETIRARLO N U = NO USA (EN CASO TAL DE PRESENTARSE HACER COMRPOMISO)

COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ESTADO

ANEXO 7. SOPORTE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y ATS

CONSORCIO LOCATIVO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

18/11/2023

Versión: 01

Número de consecutivo del permiso de trabajo: 01

Proyecto: consorcio locativo.

Actividad/(es) a Realizar: Limpieza canaletas edificio Deloop. calle 18.

Fecha de elaboración: 17 de Mayo de 2024.

Valido hasta: 18 de Mayo de 2024.

N. de personas ejecutantes: 1

SEÑALE EL TRABAJO DE ALTO RIESGO A REALIZAR

1. Trabajo en Alturas	☒	4. Trabajo eléctrico	☐
2. Trabajo en Caliente	☐	No aplica	☐
3. Espacio confinados	☐	Otro, Cuál?:	☐

DESCRIBA EL TRABAJO A REALIZAR (paso a paso)

No	PASOS DE LA TAREA	PELIGRO / RIESGOS / CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
1	Ingreso a la cubierta Inspección escalera de Ingreso	Caído, golpes. Fractura, caidas a distinto nivel y a mismo nivel.	Uso de ámes, uso de epp's y dotación.
2.	Limpieza de canaletas Cubierta edificio calle 18.	Caidas a distinto nivel, caidas a mismo nivel, golpes, Fracturas, cortes.	Uso de arnes, eslinga de restricción, uso de epp's y dotación.
3.	Retiro de residuos Procedente de la limpieza.	Caídas a distinto nivel, caídas a mismo nivel, golpes, Fracturas, lesiones.	Uso de arnes, uso de eslinga de restricción, uso de Epp's y dotación.
4.	Finalización de la actividad.	Caídas a distinto nivel, caídas a un mismo nivel, golpes, Fracturas lesiones.	Uso de Epp's y dotación.

Powered by CamScanner

PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR EL TRABAJO

(Certifico que estoy en adecuadas condiciones de salud, cuento con las herramientas, conozco los riesgos y normas de seguridad y me comprometo a cumplirlas durante todo el desarrollo de la labor).

NOMBRES Y APELIIDOS	CÉDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FIRMA
Eduar Larrotta.	1023070132	Tecnico	EdeL

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA VERIFICACÍON

SUPERVISOR Y/O TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE: Johanna Salcedo

FIRMA:

CARGO: Residente SST

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO	VERSION 01
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	18/11/2023

GENERALIDADES

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 17 | 05 | 2024

HORA INICIO 12:30 pm HORA FINAL 5:00 pm.

PLANTA O LUGAR: Edificio calle 18

NOMBRE EJECUTANTE Edward la rotta.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Limpieza canaleta

HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, comeca, trapo.

ALTURA APROX REALIZAR LA LABOR: 12 metros

INFORMACION DE EJECUTOR

Como ejecutor del persmiso de trabajo manifiesto que:	1, Me siento en optimas condiones de salud
	2. No he sentido vertigo o mareos las ultimas horas
	3. Reconozco que al momento de sentir algun malestar por minimo que sea debo dar aviso a mis compañeros
	4. El personal que participará en el trabajo sabe cómo actuar en caso de emergencia.
	5. He realizado inspección de lo equipos antes de iniciar

De acuerdo a los requisitos anteriormente nombrados se autoriza al siguiente personal a realizar trabajo en alturas

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Eduart Larrotta	1023901312	Tecnico	Edl.
2				
3				
4				

LISTA DE VERIFICACION

N°	ITEM	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Las personas encargadas de ejecutar la labor han recibido las instrucciones y precauciones a seguir en la ejecucion de la tarea	SI		
2	Las personas que diligencian el permiso y ejecutan la labor conocen los procedimientos contemplados para solicitar un permiso	SI		
3	Se han verificado los pagos de seguridad social	SI		
4	Las personas a trabajar cuentan con el certificado de aptitud para trabajar en alturas	SI		

EQUIPOS O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD

Botas de seguridad	X	Gafas de seguridad	X	Señalizacion	X
Overol	X	Tapabocas	X	Botiquin	X
Casco de seguridad	X	Tapaoidos	X	Extintor	X
Barbuquejo	X	Careta			
Guantes	X	Otros			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje		Mosquetones		Descendedor ocho		Escaleras tipo tijera	
Puntos de anclaje		Eslinga para restricciòn		Descendedor Jumar	X	Esacalera extensibles	
Lineas de vida horizontal cabl		Eslinga para posicionamiento		Troll (frenos)		Escaleras fijas	
Lineas de vida horizontal cue	X	Eslinga para detenciòn	X	Poleas		Elevadores	
Lineas de vida vertical cable		Arnes integral de seguridad	X	Tripode		Andamios	
Lineas de vida vertical cuerda		Cuerda		Otros		Gruas con canasta	
						Otros	

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL SAS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL SAS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
17 de Mayo 2024	17 al 18 de Mayo 2024.	

CIERRE (Coloque "Si" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: PERSONALMENTE DECLARO QUE:

- [X] EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- [ ] EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- [X] ENTREGO EL ÁREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

EMISOR: PERSONALMENTE HE VERIFICADO

- EL ÁREA QUEDA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES [X]
- SE HAN REALIZADO Y ACEPTADO TODAS LAS PRUEBAS DE RECIBO [X]
- EL PERMISO DE TRABAJO HA SIDO SUSPENDIDO DEFINITIVAMENTE [X]

Powered by CamScanner

ANEXO 8. SOPORTE CONFORMACION COPASST CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-051
ACTA DE REUNIONES DEL COPASST		Fecha: 15-11-2023

ACTA No. 6.

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA : 23 de Mayo de 2024
HORA : 8:00 am.
LUGAR : Bolsa
CIUDAD : Bogotá D.C.

DESARROLLO

1. TEMAS A TRATAR

1. Lectura del acta anterior.
2. Indicadores de accidentalidad.
3. Orden y aseo
4. Uso de dotación y EPP's
5. Retiros de Material sobrante.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura del acta anterior: Se evidencia que para el presente periodo no se presentan compromisos.
2. Indicadores de accidentalidad: Durante el presente periodo no se presentarón accidentes de trabajo, enfermedad laboral o ausentismo.
3 Orden y aseo: Durante el presente periodo se realizan jornadas de orden y aseo en los frentes de trabajo.
4. Se realiza entrega y reposición de EPPIS, durante el presente periodo.
5 Se realizan retiros parciales de residuos del Frente de obra, con el Fin de ver avances de obra.

CLAUSURA

Siendo las 8:45 am. y habiéndose desarrollado en su integridad el orden del día, se da por terminada la presente reunión y en constancia firman.

Presidente del Comité

Secretario del Comité

Principal

Principal

Powered by CamScanner

ANEXO 9. SOPORTE CONFORMACION COCOLAB CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-043
ACTA DE REUNIONES DE COMITÉ DE CONVIVENCIA		Fecha: 14-11-2023

ACTA No. 6.

REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

FECHA : 23 de Mayo de 2024
HORA : 8:30 am.
LUGAR : Bolsa
CIUDAD : Bogotá D.C.

DESARROLLO

1. TEMAS A TRATAR

1- Lectura del acta anterior
2. Quejas y reclamos
3. Capacitaciones

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza lectura del acta anterior, evidenciando que no se dejaron compromisos pactados.
2. Durante el presente Periodo no se Presentaron quejas o reclamos y/o sugerencias por parte de los colaboradores.
3. Se da cumplimiento a las Capacitaciones proyectadas para el Presente periodo.
4. Se realizan jornada de orden y aseo en el palacio de justicia y edificio bolsa.

3. COMPROMISOS, PROPOSICIONES Y VARIOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CLAUSURA

Siendo las 9:20 am *y habiéndose desarrollado en su integridad el orden del día, se da por terminada la presente reunión y en constancia firman.*

Presidente del Comité

Powered by CamScanner

ANEXO 10. SOPORTE CERTIFICACION ACCIDENTALIDAD EMITIDO POR LA ARL DE CONTRATISTA

Medellín, 27 de mayo de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO LOCATIVO, NIT N901744095, no presenta accidentes de trabajo desde el 26 de abril de 2024 hasta el 26 de mayo de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.154.209.74, 192.230.104.4, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11. SOPORTE INSPECCIONES PREOPERACIONALES DEL CONTRATISTA

CONSORCIO LOCATIVO	CONSORCIO LOCATIVO SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	Version: 01 Fecha: 18/11/2023

FECHA: 17 de Mayo 2024 LUGAR: Calle 18 (Decor) CARGO: Técnico

MARCA: INSAFE TRABAJADOR: Edward La rotta TIPO DE ARNES: Cuerpo completo

SI NO N/A ESTADO

El objetivo de estas inspecciones valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral.

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	SI			
Hebillas y correas en buen estado	SI			
Partes plasticas en buen estado	SI			
Ausencia de quemaduras	SI			
Equipo limpio	SI			
Las etiquetas estan en buen estado	SI			
Las etiquetas estan son legibles	SI			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	SI			
Estado de la cuerda	SI			
Ausencia de quemaduras	SI			
Ausencia de tintas o aceites	SI			
Equipo limpio	SI			
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes			NA	
Ausencia de rupturas			NA	
Facil apertura			NA	
Ausencia de tintas o aceites			NA	
Cierre seguro			NA	
Equipo limpio			NA	

FIRMA DEL TRABAJADOR: Edel la rotta.	PLAN DE ACCION
FIRMA DEL TRABAJADOR: Edwl La rotta.	
FIRMA DEL TRABAJO:	
FIRMA DE SST:	
Firma responsable de area	Edwl La rotta Firma responsable del equipo

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
CONSORCIO LOCATIVO		CODIGO: CL-SST-F-029
Formato inspección Botiquin		Fecha: 12-11-2023

INSPECCIONADO POR: Johanna Salcedo **CARGO:** Residente SST

N° de CEDULA: 1000218260 **FECHA:** 22 / MAYO / 24 **LUGAR:** Bolsa

ELEMENTOS	CANTIDAD	CONDICION		OBSERVACIONES
		BUENA	MALA	
GASAS LIMPIAS	1	B		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2 X 5 YARDAS	1	B		
BAJALENGUAS	1	B		
TAPABOCAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	B		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	1	B		
CINTA ADHESIVA (MICROPORE)	1	B		
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1	B		
TIGERAS	1	B		
SOLUCIÓN SALINA 250 ml ó 500 ml	1	B		
CURAS / COPITOS	1	B		
ALCOHOL ANTISÉPTICO	1	B		
GUANTES DE LATEX	1	B		
JERINGA	1	B		
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS BASICO	1	B		
LINTERNA	1	B		

NOTA: ESTOS ELEMENTOS (BOTIQUIN TIPO A) DE PRIMEROS AUXILIOS DEBEN ESTAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ENCARGADA Y NO DEBEN CONSTITUIRSE EN FUENTE DE AUTO MEDICACION, SE UTIZARAN CON EL UNICO OBJETIVO DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS.

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CODIGO: CI-SST-F-030 VERSION: 0 FECHA: 12/11/2023
	INSPECCION DE EXTINTORES	

EMPRESA / PROYECTO:	Consorcio locativo	FECHA INSPECCIÓN		
FRECUENCIA DE INSPECCION:	Mensual	22	05	2024
INSPECCIONADO POR:	Johanna Salcedo			

ESTADO GENERAL DEL EXTINTOR

ITEM	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO (agente extintor)	CLASE (Fuego)	CAPACIDAD LBS	MANOMETRO	MANGUERA/VALVULA	BOQUILLA	PINTURA	PASADOR	INSTRUCCIONES DE USO	TARJETA DE REVISADO	SEÑALIZACIÓN	MANIJA DE DESCARGA	MANIJA DE TRANSPORTE	ACCESIBILIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1	Bolsa	ABC	ABC	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2025	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		

OBSERVACIONES GENERALES:

CONVENCIONES

N/A	NO APLICA	FS	FUERA DE SERVICIO
B	BUENO	ER	EN RECARGA
M	MALO	SSE	SITIO SIN EXTINTOR
NT	NOTIENE		

NOMBRE QUIEN INSPECCIONA	Johanna Salcedo
FIRMA QUIEN INSPECCIONA	

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio locativo. FECHA: 29 de abril al 05 de mayo.

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Bolsa.

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI
Se encuentra en buen estado	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	NO
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO
Los cinceles se encuentran afilados	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	NO
La segueta tiene un marco adecuado	SI
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	SI
Sus caras y bordes estan en buen estado	SI
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NO
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA
Se dispone de llaves para	NA
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NO
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se observan en buen estado	SI
Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Estan limpias y lubricadas	SI
Tienen sus guardas	SI
El cable y enchufe no presentan daños	SI
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
En los taladros se observa el mandril con golpes	NO
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	SI
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**S/NS/NA**
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
Se trabaja a las presiones indicadas	NA
La herramienta es descargada al terminar	NA
HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN	**S/NS/NA**
El personal es autorizado	NA
Emplean los elementos de protección	NA
Se carga y es almacenado	NA
Su sistema de disparo es bajo presión	NA
OTROS	

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por: Johanna Salcedo

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

EMPRESA/PROYECTO Consorcio Locativo **FECHA:** 06 - 12 Mayo 2024

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Bolsa.

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI	Se observan en buen estado	SI
Se encuentra en buen estado	SI	Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	NO	Tiene doble aislamiento o línea a tierra	(1)
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI	Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
La parte metálica esta bien asegurada el mango	SI	Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI	Estan limpias y lubricadas	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI	Tienen sus guardas	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI	El cable y enchufe no presentan daños	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE		Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO	Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Los cinceles se encuentran afilados	NO	Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	NO	Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
La segueta tiene un marco adecuado	SI	En los taladros se observa el mandril con golpes	NO
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI	**HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**	**S/NS/NA**
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**	Se trabaja a las presiones indicadas	NA
Se emplea el martillo adecuado según la labor	SI	La herramienta es descargada al terminar	NA
Sus caras y bordes estan en buen estado	SI	**HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN**	**S/NS/NA**
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NO	El personal es autorizado	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**	Emplean los elementos de protección	NA
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA	Se carga y es almacenado	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA	Su sistema de disparo es bajo presión	NA
Se dispone de llaves para	NA	**OTROS**	
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA		
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA		
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA		
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA		

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por: Jehanna Salcedo

Firma

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

EMPRESA/PROYECTO Consorcio locativo FECHA: 13 al 19 de Mayo 2024.

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO: Bolsa.

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI
Se encuentra en buen estado	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	NO
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO
Los cinceles se encuentran afilados	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	NO
La segueta tiene un marco adecuado	SI
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	NA
Sus caras y bordes estan en buen estado	NA
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NA
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA
Se dispone de llaves para	NA
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se observan en buen estado	SI
Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Estan limpias y lubricadas	SI
Tienen sus guardas	SI
El cable y enchufe no presentan daños	SI
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
En los taladros se observa el mandril con golpes	NO
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	SI
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**S/NS/NA**
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
Se trabaja a las presiones indicadas	NA
La herramienta es descargada al terminar	NA
HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN	**S/NS/NA**
El personal es autorizado	NA
Emplean los elementos de protección	NA
Se carga y es almacenado	NA
Su sistema de disparo es bajo presión	NA
OTROS	

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por: Johanna Salcedo

Firma

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	GESTIÓN DE SST Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO: CL-SST-F-031 VERSIÓN: 0 FECHA: 12/11/2023
	LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

EMPRESA/PROYECTO: Consorcio Locativo Bolsa

FECHA: 20 al 26 Mayo 2024.

AREA A INSPECCIONAR / TRABAJO:

(S) SATISFACTORIO (NS) NO SATISFACTORIO (NA) NO APLICA

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE GOLPE	S/NS/NA
Se usa adecuada al trabajo	SI
Se encuentra en buen estado	SI
Los mangos de madera presentan fisuras o astillas	NO
El mango esta bien colocado a raz con la parte metálica	SI
La parte metálica esta bien asegurada al mango	SI
Se emplea la herramienta de impacto apropiada	SI
Se portan y guarda adecuadamente	SI
Estan guardadas adecuadamente, limpias	SI
Se usan prensas de banco para sujetar	SI
HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presenta su cabeza tipo hongo	NO
Los cinceles se encuentran afilados	NO
Las tarrajas macho o hembra no presentan roturas de sus dientes	NO
La seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos	NO
La segueta tiene un marco adecuado	SI
Tarraja macho/hembra, en buen estado	SI
La limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias	SI
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes estan completos.	SI
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	SI
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**S/NS/NA**
Se emplea el martillo adecuado según la labor	SI
Sus caras y bordes estan en buen estado	SI
Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo	NO
HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	**S/NS/NA**
Cuentan con llave de pulgada y milimétrica	NA
Se observa en la llave huella de palanca	NA
Se dispone de llaves para	NA
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	NA
Las herramientas para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente	NA
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	NA
Se dispone de herramienta que no produzcan chispas	NA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	S/NS/NA
Se observan en buen estado	SI
Se utiliza la herramienta adecuada a la labor	SI
Tiene doble aislamiento o línea a tierra	SI
Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	SI
Sus conexiones (clavijas) son apropiadas	SI
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	SI
Estan limpias y lubricadas	SI
Tienen sus guardas	SI
El cable y enchufe no presentan daños	SI
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos	SI
Los collarines coinciden con el diámetro, y estan instalados según el relieve	SI
Se observa deterioro en las roscas o tornillos en las ruedas abrasivas	NO
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	SI
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo	SI
En los taladros se observa el mandril con golpes	NO
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	SI
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	**S/NS/NA**
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	NA
Se trabaja a las presiones indicadas	NA
La herramienta es descargada al terminar	NA
HERRAMIENTAS POR DETONACIÓN	**S/NS/NA**
El personal es autorizado	NA
Emplean los elementos de protección	NA
Se carga y es almacenado	NA
Su sistema de disparo es bajo presión	NA
OTROS	

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

Inspeccionada por: Johanna Salcedo

Firma:

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	INSPECCION DE PULIDORA	VERSION 01
		14/11/2023

NOMBRE DEL INSPECTOR: Johanna Salcedo

SEMANA DEL: 06 AL 11 DE Mayo 20 24.

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
El cable de la conexión se encuentra sin corte y buen estado	SI		SI				SI		SI		SI			
Cuenta con manija de soporte y agarre	SI		SI				SI		SI		SI			
Cuenta con guarda metalica de proteccion	SI		SI				SI		SI		SI			
El swich de encendido funciona correctamente	SI		SI				SI		SI		SI			
El estado del disco es bueno	SI		SI				SI		SI		SI			
La persona que ejecutara la actividad cuenta con los EPPS adecuados	SI		SI				SI		SI		SI			
La maquina cuenta con certificado electrico vigente	SI		SI				SI		SI		SI			
FIRMA DEL OPERARIO														
V° B° AREA HSE														

FECHA	HALLAZGO/DESCRIPCION	PLAZO	ACCION A TOMAR	SEGUIMIENTO	EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA ACCION					
					B		M		A	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOCATIVO	INSPECCION DE PULIDORA	VERSION 01
		14/11/2023

NOMBRE DEL INSPECTOR Johanna Salcedo

SEMANA DEL 20 **AL** 26 **DE** Mayo 20 24

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
El cable de la conexión se encuentra sin corte y buen estado	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
Cuenta con manija de soporte y agarre	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
Cuenta con guarda metalica de proteccion	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
El swich de encendido funciona correctamente	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
El estado del disco es bueno	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
La persona que ejecutara la actividad cuenta con los EPPS adecuados	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
La maquina cuenta con certificado electrico vigente	SI		SI		SI		SI		SI		SI			
FIRMA DEL OPERARIO	Cesar		Cesar		Cesar		Cesar		Cesar		Cesar			
V° B° AREA HSE														

FECHA	HALLAZGO/DESCRIPCION	PLAZO	ACCION A TOMAR	SEGUIMIENTO	EVALUACION DEL RIESGO ANTES DE LA ACCION					
					B		M		A	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

Calle 18: 3 Electricos.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST.

Jueves 2/5/24 Se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera de la Sala plena Comisión de disciplina En Calle 18 se Continua con la instalacion de la red de iluminacion para los Bodegas piso 3 en visita realizada con el Arq. daniel Marchan se definio que en el piso 4 se instalaran lamparas que se desmontaron del piso 5, 6 y 7 de Bolsa. Solicito instalar tuyos en Sopar board en salidas de ventilacion. piso 4. Se indico. que se reinstalaran lamparas desmontadas en una sola area de piso 3 y las otras que faltan se instalaran nuevas. En Bolsa piso 7 Se Continua con la instalacion de Porcelanato Liquido y pintura de muros y cielo raso.

"personal"
Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 7: 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Calle 18: 3 electricos.
1 Res Obra 1 Res Interventoria. 1 Res SST.

Viernes 3/5/24 En sala Comision de disciplina Se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera. En Bolsa piso 7 Se Continua Con la instalacion de porcelanato y Guarda Escoba. Se Continua con el Liquido y pintura de muros y Cielo raso. Se retiran Escombros del Aeopico. Se realiza Taponamiento a la red de Suministro de Agua dejando Evidencia donde queda para futuros arreglos En Calle 18 Se Continua con la instalacion de la Red Electrico para la iluminacion de los Bodegas de Archivo del piso 3.

Powered by CamScanner

"personal"
Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 7 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Calle 18 3 Electricos.
1 Res Obra 1 Res Instalaciones. 1 Res SST

Calidad

Sabado 4/5/24. En sede Comision de disciplina se continua con la restauración de la Carpintería en Madera. En Bolsa piso 6. se realiza reinstalacion de divisiones desmontadas para adicionar 2 puestos de trabajo a isla se realiza pintura en muros de oficinas. En Bolsa piso 7 se continua con la pintura de Cielo raso finalizando esta actividad el dia de hoy. En calle 18 se continua con la instalacion de la red para la iluminacion de las Bodegas en piso 3.

"personal"
Comision disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 7: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes
Calle 18: 3 Electricos
Bolsa piso 6: 2 instaladores Mobiliario.
1 Res Obra 1 Res Instalaciones 1 Res SST

Calidad

Lunes. 6/5/24 (529) En sede Comision de disciplina se continua con la restauracion de la Carpintería en Madera lijado de las puertas, Madera de muro. y borde escoba. En Bolsa piso 7 se inicia con la Modificacion de la red contra incendio. realizando prolongaciones y reubicacion. de rociadores se continua con el liquido de muros Existentes y de Drywall. se realiza orden y aseo para inicar instalacion de divisiones a media altura piso 7 Bolsa en calle 18

Powered by CamScanner

Se Continua con la instalacion de la red de iluminacion para los Bodegos de piso 3 en Este mismo piso se realizan los Conexiones de Cuerda Escoba y se instalan Bocales de remate en Oficinas. Se inicia instalacion. Bandeja Cablo fill Se Continua instalacion Cuerda escoba en porcelanato

"personal"

Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 7: 2 instaladores RCI. 2 Electricos 1 Maestro.

3 Oficiales 3 Ayudantes.

Calle 18: 3 Electricos.

Bolsa piso 7: 2 instaladores Mobiliario.

1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 SST.

Jueves 7/5/24 En sitio pleno Comision de disciplina se Continua con la instalacion de la Malla en Bolsa piso 7 Se Continua con prolongacion y Cambio de puntos RCI, Se Continua con la instalacion de la Bandeja Cablo fill, Se Continua con la instalacion de Cuerda Escoba en porcelanato. Se Continua con la pintura de muros. Se Continua con la instalacion de divisiones a media altura Se resanan muros de Cuarto Electrico. y Se realiza Cambio de tableros. En piso 6 se instalan Zaldosas a puestos de trabajo. en Calle 18 Se Continua con la instalacion de la red para iluminacion de Bodegas piso 3.

"personal"

Comision disciplina: 1 Maestro. 3 oficiales 3 Ayudantes

Bolsa piso 7: 2 instaladores RCI 2 Electricos 1 Maestro

3 Oficiales 3 Ayudantes 2 instaladores Mobiliario.

Bolsa piso 6: 1 instalador Mobiliario.

Calle 18: 3 tecnicos

1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

Miercoles 8/5/24 En sede Comision de disciplina Se Continua. Con el Montamiento y restauracion de la Carpintera en Madera Se realizo la Visita del personal de aire acondicionado para definir la ruta de la red y ubicacion de los Equipos. En Bolsa piso 7 Se Continuo con la instalacion de diviciones a media altura, instalacion Bandeja cable fill y Tuberia MT se realizo Cargue del Sistema de la red Contra incendio Se Continua con aseo general y pintura de muros. se Continue con la red de iluminacion calle 18.

"personal.

Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 7: 2 instaladores Mobiliarios 2 instaladores RCI 2 Electricos. 1 Maestro. 3 Oficiales 2 Ayudantes

Calle 18: Se realiza Certificacion de los puntos de voz y datos 3 Electricos 1 Certificador.

Cal/co/VB

Jueves 9/5/24. En Comision de disciplina Se Continua con la restauracion de la Carpintria en Madera Calle 18 Se Continua con la Certificacion de puntos de red voz y datos. En Bolsa piso 7 Se realiza retiro de Escombros. aseo general de Obra Se Continua con la pintura de muros y se Continua con la Construccion de muro en Bloque y columnetas. Se Continua Con la instalacion de cableado. y Tuberia MT, se Continua Con de instalacion de diviciones a media altura

"personal"

Comision de disciplina 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes.

Bolsa piso 7: 2 instaladores Mobiliario. 2 Oficiales 2 Ayudantes 2 Arcaldores. oficios. 2 Electricos 1 Maestro.

1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SSI

Cal/co/VB

Powered by CamScanner

Viernes 10/5/24 Sala Comision de disciplina se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera Zocalos, marcos; Enchape muros y piso En Calle 18 Se Continua con la instalacion de la red para la iluminacion de los Bodegas del piso 3 Bolsa piso 7 Se hace prueba de presion a la RCI quedando en. operacion optimo. dando por terminada esta actividad. En la instalacion de los Aspersores. Se Continua con la instalacion de diseciones a media altura Se Continua en la instalacion del la Bandeja cable fibl y tuberia MT Se Continua con la pintura de muros

Y personal"
Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Calle 18: 3 Electricos.
Bolsa piso 7: 2 instaladores RCI 2 instaladores Mobiliarios.
2 Electricos 1 Maestro 3 Ayudantes 2 Oficiales.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

Sabado 11/5/24 En sala plena Comision de disciplina Se Continua con la restauracion de la Carpintera en Madera. En Calle 18 Se Continua con la instalacion de la red para la iluminacion de los Bodegas del piso 3 En el piso 2 Se inicia demolicion de muros en Drywall y desmonte de cielo raso. En Bolsa piso 7 Se Continua con la instalacion de diseciones media altura. instalacion Bandeja Cable fibl y tuberia MT.

Y personal"
Comision de disciplina: 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Calle 18: 3 Electricos 1 Maestro. 3 Ayudantes 2 Oficiales
Bolsa Piso 7: 2 Electricos 2 instalador Mobiliario.

Powered by CamScanner

Lunes 13-05-24 festivo

Martes 14-05-24 Sala Plena Comision disciplina Judicial: Continua trabajo a Medio marcha porque no se ha depurado el diseño. final; se adelanta izado de enchapes en madera y Mesa de Centro; Se reinstala la puerta de acceso ppal. Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes

Edificio Bolsa Piso 7: Continua la instalacion de duto y cableado en techo hasta el rack, Avanzan resanes en muros y Armado de acero para Columnetas y dintel de cuarto de rack, Formaleta. Bolsa Piso 6: Se iniciaa Marquillado de puntos de datos y Corriente.

Personal: 2 electricos, 2 ayudantes. cad.

Calle 18 8: Continua desmonte de cielo raso, desmonte piso laminado, corte y demolicion sobrante de piso desprendido en piso 2. Avanza instalacion de lamparas en archivo izquierdo junto a Provisionales P3; Se realiza revision de lamparas en P2 reacomodando los bombillos faltantes; el cielo raso que quedo instalado se va a resanar los aparte y Mejorar dintales existentes;

En Piso 3 cobro coactivo se presento una filtracion de agua ocasionada por la el rebose de los Canales de Cubierta colmatados y el agua se filtro entre el marco de la Ventana y dano cielo raso, Muros, los Muebles de este Puesto de trabajo y Piso SPC; se informo a Inventario; se inspecciona la canal para identificar el estado de esta y se evidencia inundacion en toda la canal.

Personal: 3 electricos, 3 ayudantes cad, 1 oficial cad, 1 Maestro de obra; 1 residente Obra, 1 SST. 1 res. Inst. Sanitario. Cristhell.

Viernes.
25-05-24 SALA PENAL SECCION DISCIPLINA JUDICIAL:
Se avanza en Mantenimiento de los superficies de Yeso control, se instala enclapes de Yeso sobre viga; Pasa a Verificar area el Contratista del Aire Acondicionado Para identificar el equipo a Instalar, Continuamos a espera de la definición del diseño final.
Personal: 1 maestro, 4 oficiales carpintería
Edificio Bdoo. piso 7: Avanza Instalacion de Coblagrill y Tabonia de en EMT para Iluminación; Se realiza encofrado de Columneta en cuarto de rock.
Piso 6 y 5: Se realiza masillado de solidos electricos y datos en Puestos de trabajo.
D. CALLE 18: Avanza retiro de piso laminado, Perforacion de ductos y adosado, Acomodación de lamparas existentes, Condicion y retiro de cielo falso. Amarillo. Se evidencia empozamiento en Piso 2 Junto a oficina de director.
Se inicia Instalacion de puertas de 1,80 x 2,00 en archivo de Piso 3 y 4, Continua instalacion lamparas.
Personal: 1 maestro, 4 ayudantes varios, 3 electricos, 2 instaladores puertas aluminio. 1 residente civil, 1 SST, 1 Res. inventario.
Cali 01/08.

Jueves 16-05-24

Comisión Disciplina Judicial: Continúa en el mantenimiento de la misma de Juntos, se recibe indicaciones de diseño final, donde se debe demoler muros en superboard, adicionar uno divisor. Para esto se continúa en el romple del enchape de muros en madera.

Personal: 1 maestro, 4 ayudas carpintería.

Edificio Bolsa piso 7: Se realiza el replanteo de lámparas para instalación de tablón ERT en techo, Continúa inst. Cablefill, se instalan tableros eléctricos en cuarto de rack.

Piso 5 se termina resanillado de puntos de trabajo.

Personal: 2 ayudas eléctricos, 1 ayudante de obra civil. Inicia cableado de cable UTP piso 7.

(Delicias). Ed. Calle 18: Se inspeccione la cond encontrándolo colmatada; se destapa el sifón para que bajo el agua para se necesario la limpieza de los canales;

En piso 3 y 4 continúa instalación de puntos de archivos; desmonte piso terminado, se termina la instalación de lámparas en archivo tanto a provisionales y se pasa al siguiente archivo para instalar tablón, cableado y lámparas nuevos.

Personal: 1 maestro, 4 obreros civiles, 3 eléctricos, 1 residente de Obra, 1 SST.

Viernes. Comisión Disciplinario Judicial.: Avanza el
17-05-24 mantenimiento de encofrado, mantenimiento de
sobrecimientos e inicio de Consecusión de la
madera para las mesas nuevas solicitadas
mientras se aprueban precios.. Personal:
1 maestro, 4 ayudas de carpintería.
Edificio Bolsa. Piso 7: Se funde la columna
nata de la puesta del cuarto de rock, y el
dintel; se resanan los laterales de los
tableros electricos, ya instalados y se
resanan los puntos de pañete exterior afec-
tados por el cambio de tableros; Avanza
la instalacion de cableado UTP y eléctrico en
tomacorrientes y llegada a cajas de media
altura.
Piso 6 y 5: (Fachaleta marquillada) se realiza
marquillado de muebles cajas solidas de
datos y electrico.
Personal: 3 ayudas electricos, 2 obreros
aseo.
Calle 18: Se realiza traslado de escombros
del piso 2 al acopio; retiro de elementos
desmontados. Avanza pintura de muros en
piso 2.
A causa de la filtracion de agua que deteriora
los muebles y Piso; se procedió a limpiar
la canal y limpieza de canastilla, quedando
completamente limpia de barro y animales muertos.
Avanza instalación de lámparas en cielo raso
Personal: 1 residente obra, 1 SST, 1 maestro aux,
1 oficial y 1 ayudante aux; 6 ayudas electricos,
2 ayudas Mobiliario.

Cordialmente

Sabado 18-05-24

PALACIO COMISION DISCIPLINA JUDICIAL S
Se instalan enchapes de muro ya intervenido, se reinstala Mueble de biblioteca una vez pintado el muro que se había curado la humedad y se Pintó para cubrir afectaciones ya curado. Se realizó el Mantenimiento a Bibliotecas, Se sello y mejoró la el marco de las Ventanas, Se intervienen los cenefas y Puertas con lijado y Sellado.
EDIFICIO BOLSA PISO 7
Se realizaron trabajos de instalacion Cable electrico en Divisiones 1/2 altura y cableado UTP en estas divisiones; se trabajó Jornada larga hasta 6pm; 6 oficiales electricos Se instalaron divisiones medio altura.
2 ayudantes Mañana.
Ed. Palacio Com. Disciplinaria Judicial:
Se realiza Pintura de Enchapes en Madera y el Suministro del enchape de madera en Muro alto sobre Viga.
1 maestro, 3 oficiales,
Calle 18: Se realiza demolicion capa Superficial de piso 2 pro. Calle 18

Domingo 19-05-24

Bolsa Piso 7° Ingresan 6 oficiales electricos Para realizar alambrado de Puestos de trabajo con Cableado electrico y UTP: 6 oficiales electricos.
PALACIO COMISION DISCIPLINA JUDICIAL S
Avanza Resane de Pintura en enchape Nuevo y Sellado de el enchape antiguo.
Personal: 1 maestro aux, 1 oficial aux, 6 oficiales electricos, 2 Mañanas / 1 residente obra. Calle 18

Lunes Calle 18.
20-01-24 Se realizo reparación de humedades
S31 ocasionados por filtracion de agua por
Canales rebosados. Se repara Muro, Cielo
raso.
Se inicia instalacion de guardaescobas en
PVC en Piso 3.; Avanza instalacion bomperas,
Jefe de Obra., 2 electricos
Bobo Piso 7°
Continua alambrado de Puntos electricos y de
datos en Puestos de trabajo, Superficies de
medio-altura; Inicia instalacion tuberia EMT
entechado para Red de iluminacion, se
instalan Luminarias Normal y regulada en
Puestos de trabajo, Avanza instalacion paneles Pisoblock
6 oficinas, electricos, 2 oficinas Modulares.

PALACIO. S.P. CONDON DESPACHOS JUDICIALES
Continua Revestimiento endupe, Pintado y
Cor Sellado de Yeso Cartono, Cenefa y
endupe de muro; se realiza demolicion
de muro en dry wall por parte de la entidad
En reunion con el Arq Daniel Melchor; el
Arq Cejudo, el encargado Carlo Arard, se
informo la decision de Modificar la especi-
ficacion del muro divisor planteado en el
diseño, donde se acordo que No va de
Piso a techo sino a 2:30 aprox y
de 3.19 Centrado en el espacio.
Jefe de obra, 3 oficiales.
Ayudante de obra, Jefe SST.
Cordoba

MARTES 21-05-24

Edificio Bolsa Piso 7°: Continúa la instalación de tubería EMT en techo para la red de iluminación; avanza alambrado de cable eléctrico; se instalan divisiones Piso techo en Salo de Juntas y en oficinas Personal: 6 oficiales eléctricos, 2 Mobiliario.

Calle 18°: Continúa instalación de gab. de cobre en piso 3; retiro de cielo raso en piso 3; traslado de elementos al punto de acopio de los demoler.; Avanza instalación de bandejas nuevas en archivo piso 3

Piso 10. 5° P. COMISION DISCIPLINA JUDICIAL: Continúa instalación en duplo Nuevo, Pintura en duplo existente y Muros y Cielos. y Escritorios.

Personal: 1 maestro civil, 1 oficial civil, 1 maestro y 3 oficiales capintería 2 oficiales Mobiliario 6 oficiales eléctricos. 1 coordinador Obra 1 coordinador SST.

Viernes 22-03-24 Ed. Bolsa Piso 7: Continua instalacion tuberia EMT Para conexion de alambrado. inicia alambrado de red electrico de iluminacion, se descarbo Viga y Columna en cuarto Rack y se da acabado en Muro exterior. Continua instalacion de divisiones Pladur techo y se suministran los troqueles para instalar tomas en las divisiones 1/2 altura.

Personal: 1 ayudante oficial, 4 oficiales electricos, 2 Mobiliario.

Calle 18: instalacion guardacables, remate de muros, Personal: 1 maestro 1 ayudante. Continuan instalando lamparas en archivo piso 3.

Bolo Plaza Comision disciplina Judicial: Continua instalacion de enchapes y sellado de separaciones de Cerca y enchapes Muros. Contado Sur de Sala.

Personal: 1 maestro, 3 carpinteros, 4 oficiales, 1 residente de obra 1 SST., 2 ayudantes oficial, 2 Mobiliario.

Jueves 23-01-24 Palcos / Sede Edificio Anexo: Ascensores.
Se realizó la instalación de malla de manos de 4mm x 4mm de hueco sobre la malla galvanizada ya y se cubrió tarimbora con manto para protegerlo y cumplir con los requerimientos de Shinaltor.
Personal: Jefe 1, Ayudante, SST, Residente.

Edificio Base 3 Piso.
Continua Alambrado de la red de iluminación y tubería EMT. de techo.
Avanza instalación de Ponchos piso-techo en efectivos. Llegan diversos media altura Portonks.
Personal: 4 oficiales electricos, 2 Habilitados.
Calle 18.
Se realiza ajuste de tubos de los lámparas para dejar funcionando con los tubos recibidos de los desmontado.
Se aseguran los lámparas al techo.
Se limpia el piso del 2° piso para dejar y dejar listo para el vaciado.
Continua resane de agujeros.
Continua instalación lámparas.

Personal: 1 maestro civil, 1 maestro carpintero.
6 oficiales electricos.
2 civil
2 Habilitados
1 residente Obra
SST

Viernes. Edificio Bajo piso 3: Termina el
24-05-24. alambrado de la red de iluminacion
y se reciben los lámparas a instalar,
se inicia instalación lámparas; Avanza
instalacion Pasillo Medio altura.
Se realiza Comite de avance en intervención.
Calle 18: Se aprueba demonte de
cielo raso preformado asegurados los
lámparas en piso 2; se traslada
Material demontado a Acopio.
En Piso 4 se retira el tubo eléctrico
que estorbaba, solicitud interventoría.

Edif. Palacio. S.P. Comisión disciplina Judicial:

Se avanza en la zona sur de la sala
con el remate del enchape de muros.
Se recibe detalle Constructivo del alero
Para iniciar Compra de insumos.

Personal: 1 oficial aux 1 maestro aux,
8 ayudes electricos, 2 Mobiliario
1 maestro carpintero, 3 ayudes carpintería,
1 residente, 1 SST, 1 interv. residente, 1 coordina-
dor interventoría.

Sábado 25-05-24

Edificio Palacio: S.P Corazón Disciplina Judicial:

Avanza el mantenimiento de enchapes costado sur. con la aplicación de pellador en la superficie de Muros, Hall, Vestier, Cenefa, etc.

Edificio Bolsa de Bogotá piso 7-8

Continua Instalaciones eléctricas, Instalación de Red de iluminación; armado de tomas de Suministros para instalarlos; Se realiza instalación Ductos metal duro.

Edificio Calle 18.

Se realiza Instalación de gradosarcos en Sinfo en el P003, zona contigua a los ascensores, corredor y archivos; también avanza desmonte de cielo raso en P02 y retiros selectivos por exposición Hasta P00 SPC y gradosarcos para P002.

Personal: 1 residente Obra, 1 residente SST, 1 maestro aire, 1 maestro carpintero, 8 ayudantes eléctricos, 2 obreros aseo, 2 ayudantes mobiliario, 3 carpinteros.

Se está trabajando Jornada extendida hasta 7pm.

Powered by CamScanner

Jueves 23-05-24

Edificio Bebo piso 7: Continua protección de cableado de iluminación, Armado de cajas de tomacorrientes, Armado instalación media altura, Instalación de tomacorriente en puestos media altura. Tarrajeo y Regleado.

Edificio Palacio: S.P. comisión disciplina Fiscal:

Continua Montaje de Enchape en madera, Superficies de madera, Cenefa y Zócalo en el costado sur de la sala.

Edificio Calle 18.

Continua Instalación de cuadros eléctricos en PCE en zona de archivo piso 4, y corredores del mismo piso, Se instala tapa registro de 20 x 20 y 25 x 25 en salida de llaves monofasicas en corredor; Retiro de cableado modulado piso 2. En piso 3 Se realiza instalación de puntos de 50 x 200 en oficinas y archivo y Se instala salida puesta de 180 x 2,00 en el piso 4. Pendiente. Se realiza afinado de piso 2; para instalación de laminado tipo SPC, Piso vinilo pegado de placa Gyplac.

Contes | Cll 183

28-08-24 Continua pintura Muros y Cielorraso en drywall que no se desmontó. PSUSCO. S.P CONTROL DISCIPLINARIO.
Se realiza Replanteo del esquema recibido por supervisión, se realiza demolición de la placa de concreto para dar paso a la nueva placa. Previamente cortado con Pulidora.
Avanza instalación de enchapes Muro oriental y Viga. Se retiran Punto de agua y Salida desagües.
Se Avanza con lijado de Resto Parapol de acceso a la sala y Pintura de enchapes.

Bajo Post:
Se realiza la Conexión de los circuitos de alumbrado a los interruptores, Avanza instalación de lámparas y alambrado de Cat 6.
Continua con el ensamble y Pintura de los muebles de oficina y divisiones de oficina Fortanks.

Personal: 1 maestro civil; 1 maestro carpintero, 3 carpinteros, 8 oficiales eléctricos, 1 ayudante civil, 1 residente obra, 1 SST.

Cordialmente,

Miércoles 29-05-24 SALA PLENA COMISION DISCIPLINA JUDICIAL:

Se realizó reunión con técnicos del Aire Acondicionado quienes verificaron la ubicación del equipo según diseño; ellos aclararon que esa ubicación no es la idónea y puede generar incomodidad a quienes quedan en frente y el resto de sala no gozaría del flujo de aire. Por tanto presentaron otra sugerencia ubicando sobre lo vigo central 2 equipos direccionados a c/extremo de la sala; esta observación se transmitió a la supervisión para aprobación; continua pintura de las superficies en modera.

Calle 18.8 Se realizo (encontrado) desmonte de alfombra en último tramo de Piso 2, para instalar zoclado de piso tipo SPC, y se instala el piso comunicando por el vano de la puerta con la oficina. (Se deja) Se desmonta Cielorraso en este mismo tramo, encontrando gotera por roto techo; Se inicia reacomodación de lámparas.

Se instalaron topes en superboard en Salida de ductos de aire en corredor de Salida de emergencia del piso 4; también se retiraron y resana piso y muro donde estaban puntos de agua y desagüe de piso 4. corredor de salida emergencia.

Se instalan lámparas de emergencia y Sensores de presencia en piso 3

Jueves 30-05-24

Bolso piso 7
Continua instalacion de lámparas en 2do oficina abierta; instalacion de interruptores, instalacion de guayas soporte de lamparas en 40%; el cableado de puestos de trabajo se finaliza en 100%; llego cable UTP faltante para iniciar instalación. Se solicita reunión con Ingeniero de sistemas para definir que Puntos requieren dentro de la urna.
Se realiza Jornada de retiro de EPP en deposito.

Collo 18. Se realiza instalación de 4 cuadros en area de piso spc; se realiza Retiro de Material de desmonte.
Se continua con instalacion guardescobos en pvc en zonas empotradas. de oficinas.
Se realiza acomodación de lámparas del piso 2 y Cambio de lamparas dañadas por las desmontadas; se acuerda que en el piso 2 no se va a suministrar tubería ni cableado, Solo se reinstala la lámpara trasladada de Bolso, es decir que no se garantiza esta iluminación.

BAJA PUEBLA CONTRATOS DISCIPLINA JUDICIALES

Continua Pintura de enchapes.
Se esta ensamblando Mesa nueva de prolongación; se esta lijando y Sellando Mesa de Piedra.
Hoy reunion con el contratista de la red electrica a las 4pm.
