Prado Tolima, 04 de agosto de 2024

Ingeniero:
MIGUEL ANGEL BERMUDEZ BAHAMON
GERENTE DE EMSERPRADO
La Ciudad.

REF.
Informe de actividades correspondientes a los días del 04 de julio 2024 hasta el 04 de agosto de 2024.

Respetado Ing. Bermúdez:

Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del Por concepto de: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA LA COODINACION TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO – TOLIMA EMSERPRADO S.A E.S.P.** durante los días del 04 de julio 2024 hasta el 04 de agosto de 2024.

Cordialmente,




GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
Ing. Civil MP. 70202-343012 TLM
C.C. 1.105.305.933 De Prado – Tolima

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
ARREGLOS DE ACOMETRIDAS	se hacen arreglos locativos en las diferentes acometidas de los usuarios en el casco urbano y rural	21
ARREGLOS DE ACOMETIDAS FRAUDULENTAS	se hace cortes en dos acometidas que se encontraban fraudulenta	2
INSTALACION DE MICROMEDIDORES	se hacen instalaciones en el barrio las palmas para así dar cumplimiento con la micro medición en el municipio	2
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		7
MTO PREVENTIVO A LAS BOCATOMAS DE CORINTO	se realizó el mantenimiento a la bocatoma del acueducto principal, donde se realizó limpieza del tanque desarenador de la quebrada de chonto, se raliza limpieza de la bocatoma de mojaco.	2
MTO PREVENTIVO A LA BOCATOMA DE PEÑON ALTO	se realizó el mantenimiento a la bocatoma del acueducto de peñón alto, donde se realizó el retiro de material vegetal y limpieza de la rejilla. Se le hace revisión a la línea del acueducto para verificar si les estaba llegando agua a las casas.	2
MTO PREVENTIVO A LA BOCATOMA DE PAPAYAL	se realizó el mantenimiento a la bocatoma de papayal donde se hace mantenimiento a la rejilla de la bocatoma, retiro de material vegetal en la quebrada y al tanque desarenador retirandole material vegetal.	3
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS		4
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO PRINCIPAL	se realizó el arreglo en la línea de aducción en el acueducto principal donde se facturo un tubo de 10" se procede con el equipo operativo hacer el arreglo colocando una unión de reparación de 10"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizo el arreglo de la linea de aduccion del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 4" de asbesto cemento, se reemplaza 3,20 metros de tubo de 4" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 4"	1

MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizo el arreglo de la linea de aduccion del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 6" de asbesto cemento, se reemplazan 11 metros de tubo de 6" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 6"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizo el arreglo de la linea de aduccion del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 4" de asbesto cemento, se reemplaza 4,50 metros de tubo de 4" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 4"	1
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		14
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA LUNES	se realiza el recorrido por los siguientes sitios del municipio: por las veredas El Puerto, Las Brisas, sigue por el barrio Villa del Prado, se hace recorrido a la plaza de mercado y despues empieza con la carrera 7, carrera 6, carrera 5, carrara 4 donde se llena el carrocompactador	5
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA MIERCOLES	se realiza el recorrido por los siguientes sitios del municipio: se empieza el carrara 4 donde quedo el corte del dia lunes, se sigue por la carrera 3 se entra a los barios las palmas, porvenir, prado campestre, sigue en por todas las calles del municipio desde la 1 hasta la calle 13, se va a los barrios villa luz, puerto el medio y prados de santa ana si alcanza la capacidad del carro compactador	5
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA VIERNES	Se empieza el recorrido dependiendo si el dia vienes se alcanzo de recoger los barrios villa luz, puero el medio y prados De Santa Ana, para asi repetir el recorrido del lunes, El Puerto, Las Brisas, barrio Villa del Prado, se hace recorrido a la plaza de mercado y despues empieza con la carrera 7, carrera 6, carrera 5, carrara 4 donde se llena el carrocompactador	4
RECOLECCION DE RESIDOS SOLIDOS EL DIA SABADO	El dia sabado se hace la recoleccion en la vereda el puerto con el motocarro.	5

LIMPIEZA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO	Se realiza la limpieza por las diferentes calles y escenarios del municipio de prado. Los lunes se barre la Avenida, los martes el alrededor de la plaza de mercado, los miércoles todos los escenarios deportivos, los jueves por toda la carrera 5 desde la escuela juan Ortiz Orjuela hasta la avenida la plaza de mercado y el viernes se hace la avenida. Esta actividad se hace todos los día en la jornada de la mañana con dos operarios.	30
ORNATO POR TRES SECTORES DEL MUNICIPIO	se realizó la limpieza de ornato desde la escuela juan Ortiz Orjuela hasta la asociación de ganaderos, en esta actividad se realizó con dos guadañeros	20

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA.

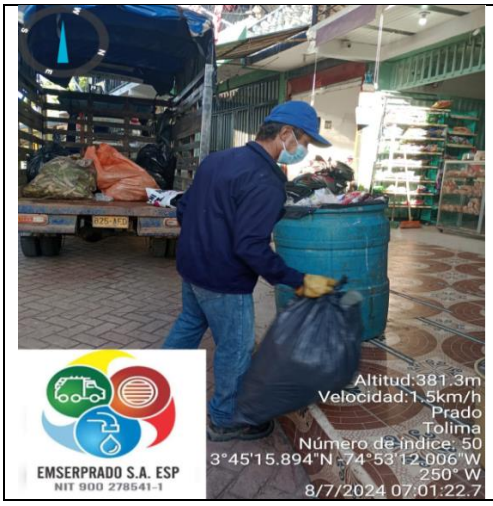












EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
8 jul. 2024 8:37:28 a. m.


EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
8 jul. 2024 11:37:56 a. m.


EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
Altitud:312.7m
Velocidad:5.4km/h
Número de índice: 46
161° S
8/7/2024 06:49:40.4


EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
Altitud:382.4m
Velocidad:0.3km/h
A Hidroprado
Prado
Tolima
Número de índice: 47
3°45'9.48"N -74°53'13.656"W
356° N
8/7/2024 06:49:56.6




EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
Altitud:333.6m
Velocidad:0.0km/h
8-38 Carrera 5
Prado
Tolima
Número de índice: 62
3°44'59.91"N -74°55'47.172"W
355° N
10/7/2024 17:00:19.4






EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
Altitud:473.7m
Velocidad:0.0km/h
Saldaña
Tolima
Número de índice: 106
3°46'32.274"N -74°54'9.912"W
2° N
20/7/2024 08:10:47.3


EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
Altitud:420.8m
Velocidad:2.4km/h
Prado
Tolima
Número de índice: 103
3°46'32.994"N -74°54'15.6"W
256° W
20/7/2024 07:36:59.5




EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 278541-1
25/07/2024 4:30:15 p. m.
350° N
Número de índice: 26









Elaboro

GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
Ing. Civil MP. 70202-343012 TLM
C.C. 1.105.305.933 De Prado – Tolima
