CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-1769

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos de expansión y mantenimiento del sistema de Semaforización de Bogotá D.C."

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

CONTRATO 2023-1356
POSTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad


FICHA TECNICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	2023-1356
OBJETO:	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.034.108-4
INTERVENTOR	CONSORCIO SEMAFORIZACIÒN ACO (Hasta el 15 de abril de 2023) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (A partir del 16 de abril de 2023)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($3.831.187.901) TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE.
VALOR ADICIÓN No. 1	($1.915.539.782) MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($5.746.727.683) CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO:	09 DE MARZO DE 2023
FECHA DE LA ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	09 DE FEBRERO 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DE LA SDM, LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y DEMÁS REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES Y SIETE (7) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE AGOSTO DE 2024
CDP INICIAL	194 del 06/01/2023
VALOR CDP INICIAL	($4.074.000.000) CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES PESOS M/CTE. Rubro 023011604490000007578
CDP ADICIÓN No. 1	60 del 19/01/2024
VALOR CDP ADICIÓN No. 1	($1.915.539.782) MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. Rubro 023011604490000007578
CRP INICIAL	1309 del 28/02/2023
VALOR CRP	($3.831.187.901) TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVEVIENTOS UN PESOS M/CTE. Rubro 023011604490000007578
CRP ADICIÓN No. 1	319 del 7/2/2024
VALOR ADICIÓN No. 1	(1.915.539.782) MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE
RUBRO	023011604490000007578
NO. PÓLIZAS	Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101407367 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-10-1207010
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES:	Cumplimiento No. 21-44-101407367 Aprobación: 7 de marzo de 2023 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-10-1207010 Aprobación: 7 de marzo de 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS AJUSTADAS CON ACTA DE INICIO	Cumplimiento No. 21-44-101407367 Aprobación: 4 de abril de 2023 Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-10-1207010 Aprobación: 14 de abril de 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS, DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1	Póliza de cumplimiento No. 21-44-101407367. Aprobación 9 de febrero de 2024 Póliza RCE No. 21-40-101207010 Aprobación: 9 de febrero de 2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A., Nit 860.009.578-6
PROCESO DE SELECCIÓN N.º	SDM-LP-170-2022

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad


ACTIVIDADES COMPONENTE POSTES


ORDEN DE TRABAJO No. 24- LOCALIDAD DE FONTIBÓN		
TERCER RECORRIDO		
INTERSECCIONES INSPECCIONADAS	14	INTERS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	88	POSTES
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	17	POSTES
CAMBIO DE TAPAS	11	TAPAS

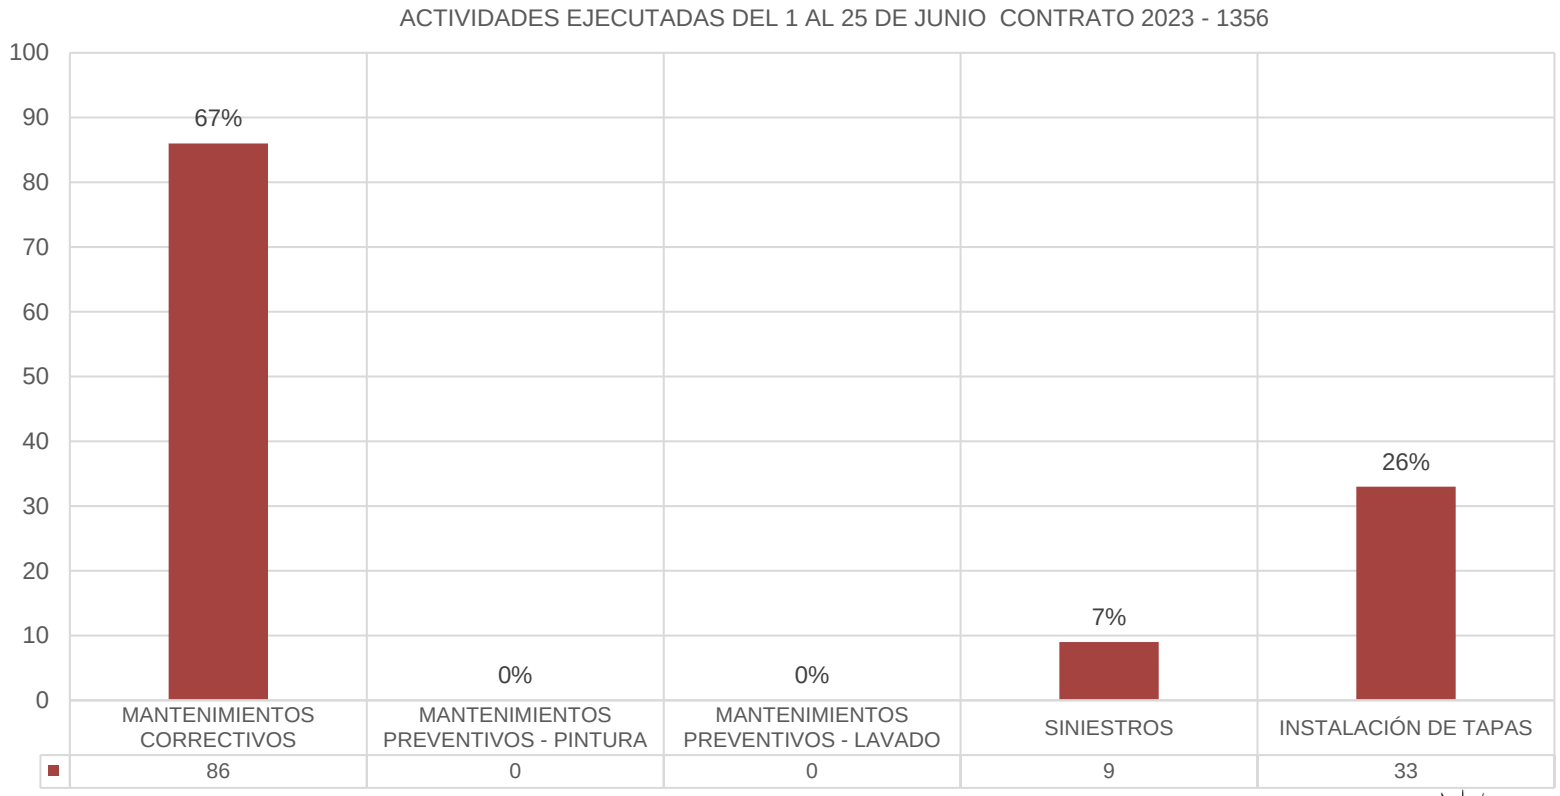

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
COMPONENTE POSTES

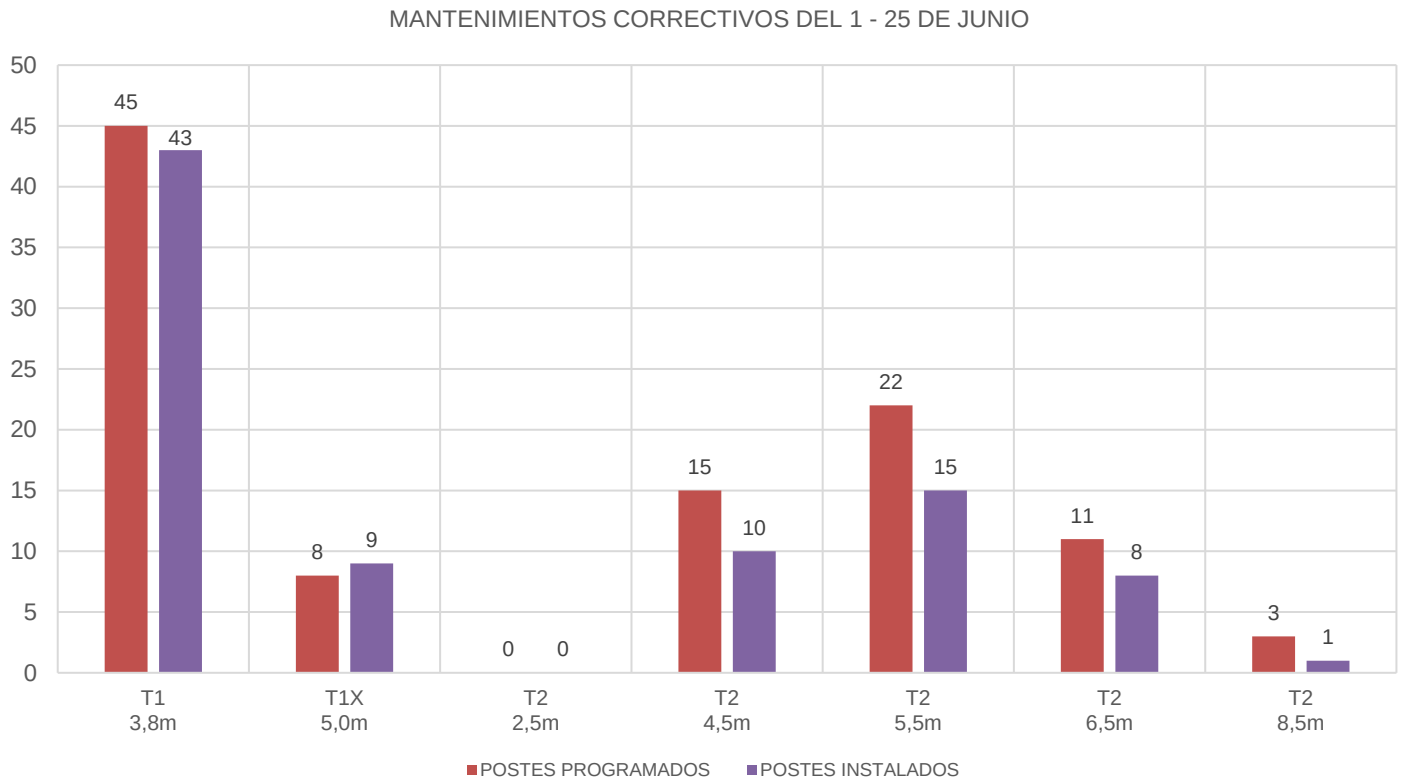

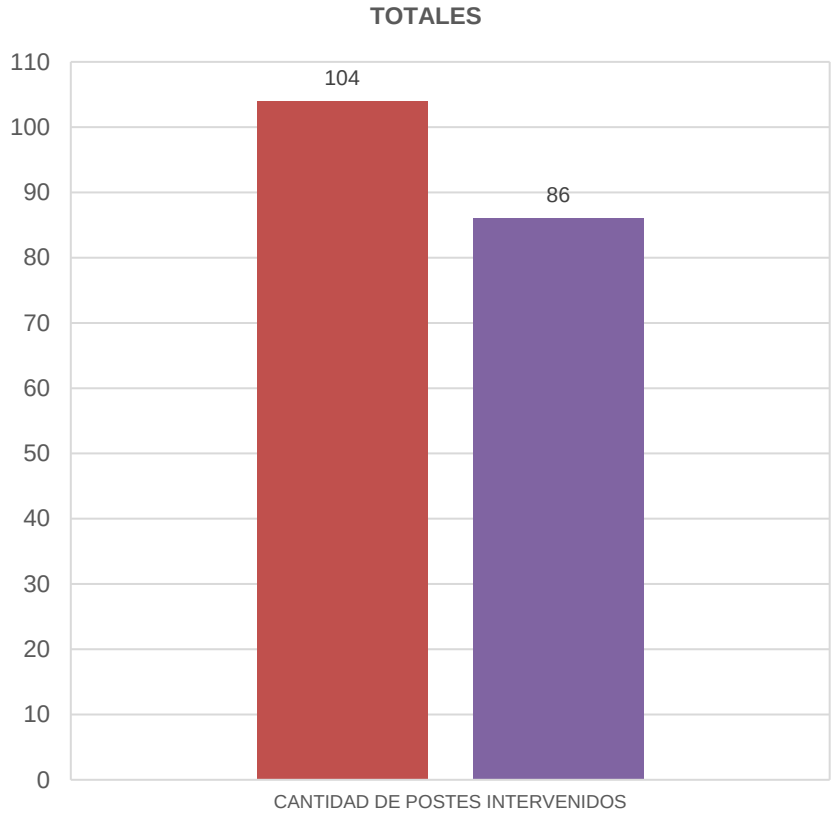

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

SINIESTROS
COMPONENTE POSTES




CANTIDAD DE POSTES DE SINIESTROS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 25 DE JUNIO							
T1	**T1X**	**T2 2,5**	**T2 4,5**	**T2 5,5**	**T2 6,5**	**T2 8,5**	**TOTAL**
5	1	0	1	1	1	0	9


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

SINIESTROS
COMPONENTE POSTES

PORCENTAJES DE POSTES AFECTADOS EN
SINIESTROS DURANTE EL TRANSCURSO DEL CONTRATO 2023 -1356

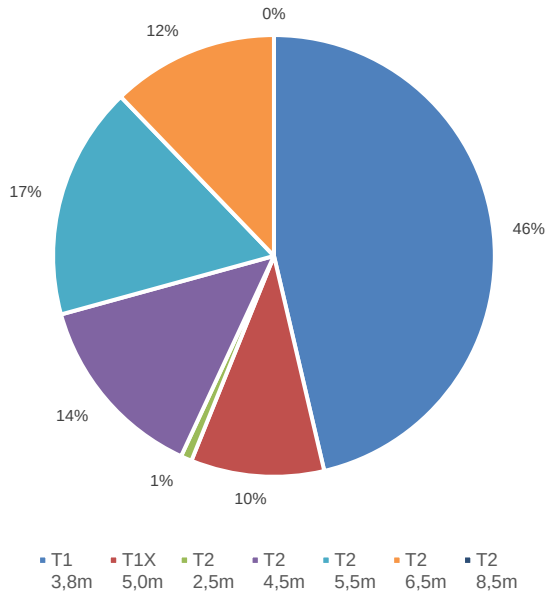


CANTIDAD DE POSTES POR TIPOLOGÍA
SINIESTRADOS EN EL TRANSCURSO DEL CONTRATO

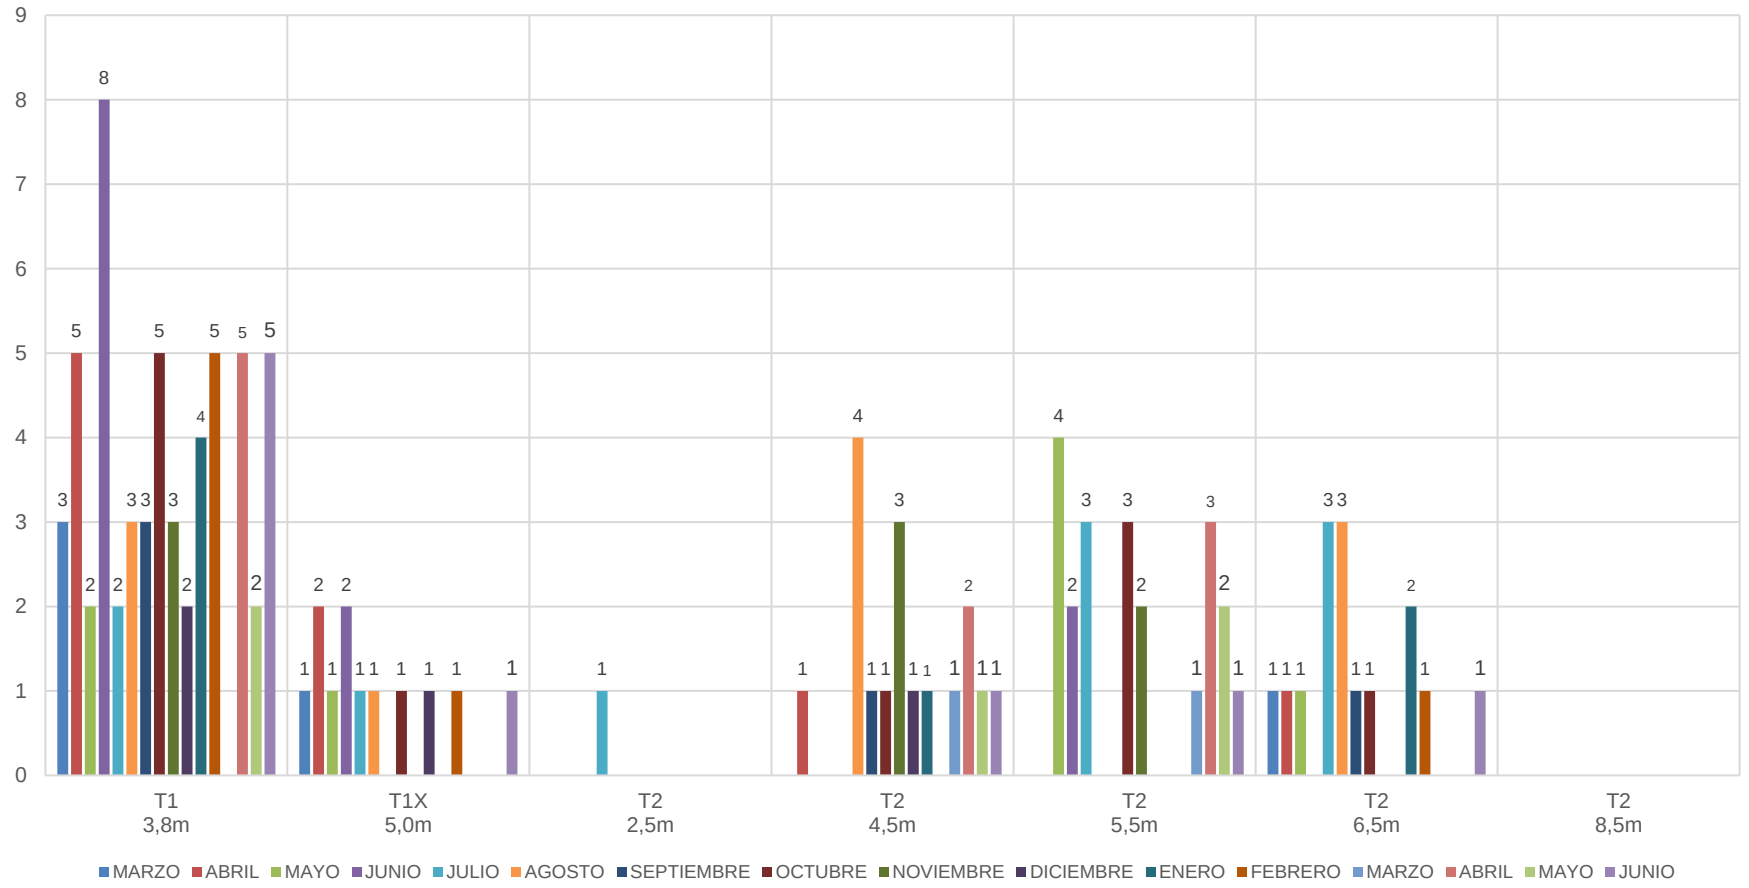

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

SUMINISTRO DE TAPAS
COMPONENTE POSTES

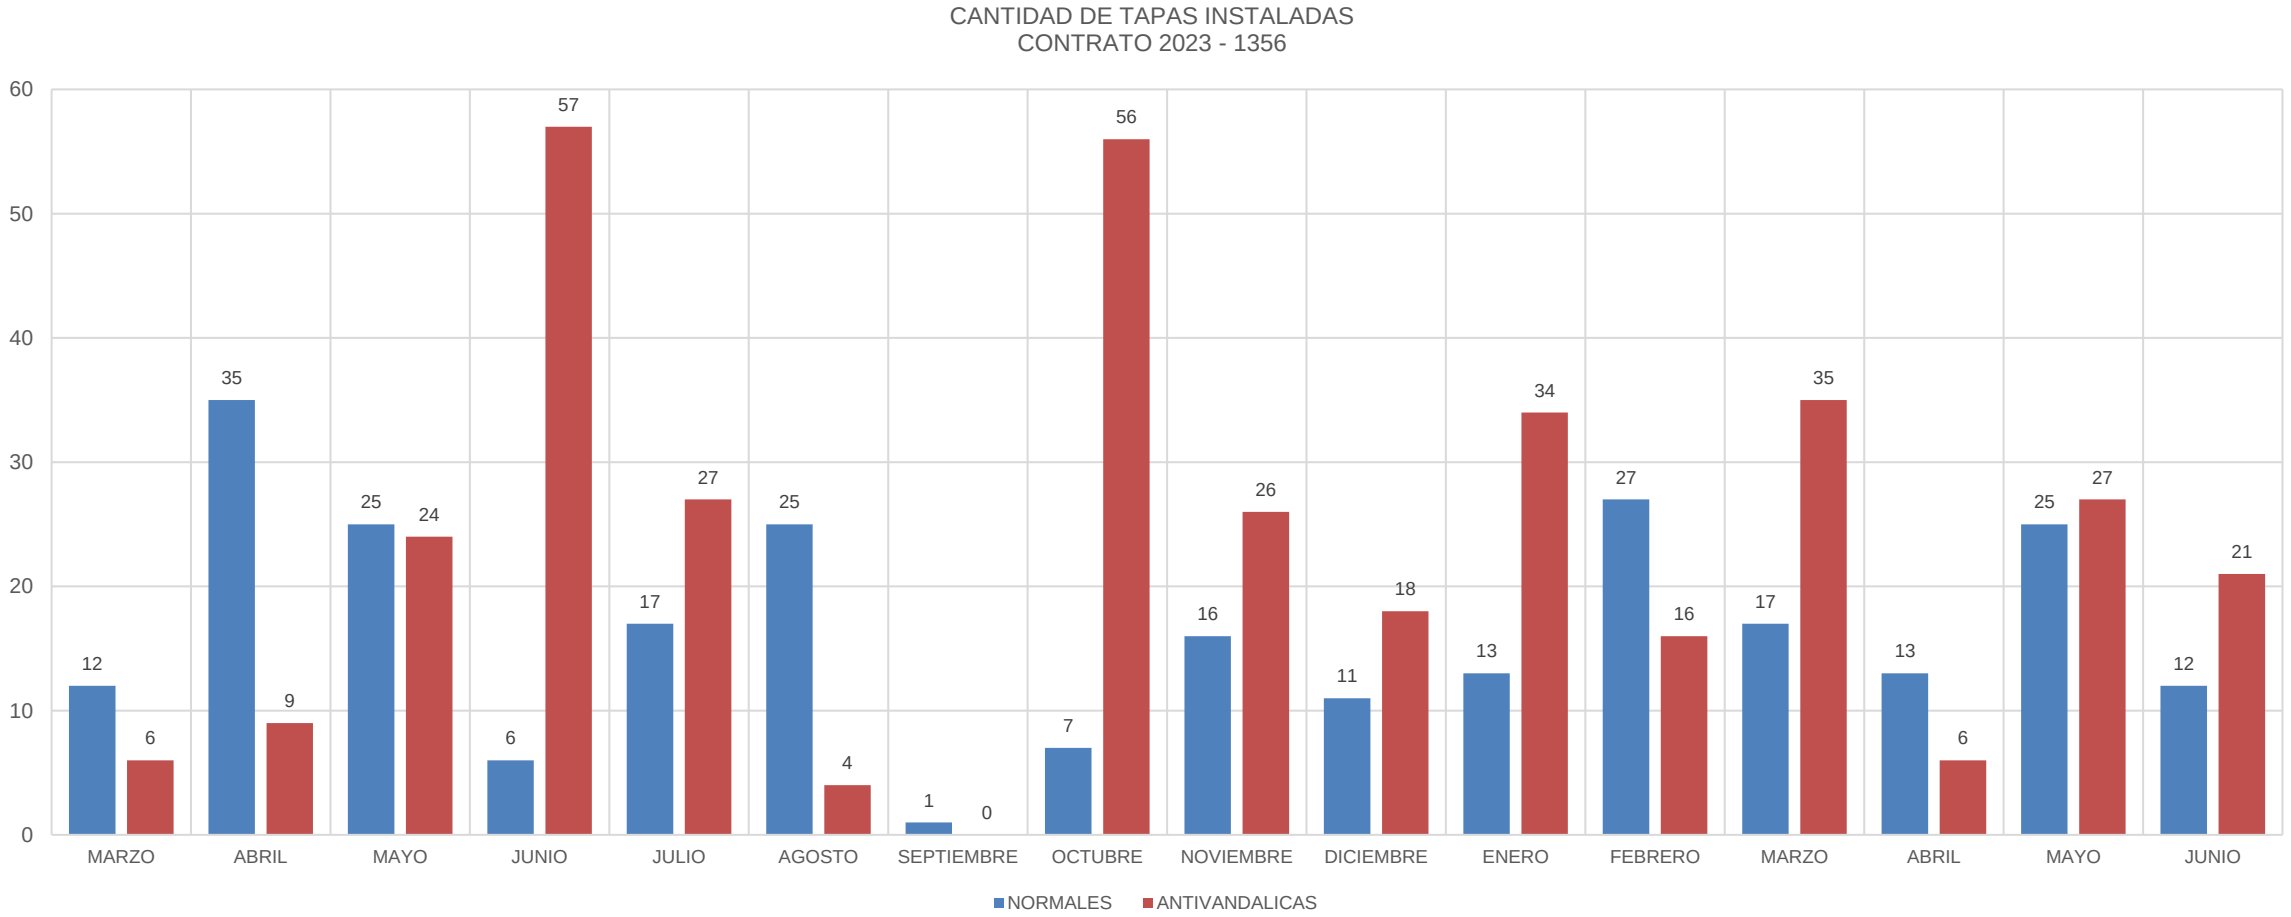


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

AVANCE PRESUPUESTO COMPONENTE POSTES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	3.831.187.901
VALOR ADICIÓN No. 1	$	1.915.539.782
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN REQUERIDA	$	5.746.727.683

VALORES PRESUPUESTALES INCLUYENDO ADICIÓN Y PRÓRROGA COTRATO 2023-1356		
2023	MARZO	$ 88.894.147
	ABRIL	$ 268.101.514
	MAYO	$ 205.670.567
	JUNIO	$ 504.990.425
	JULIO	$ 326.312.097
	AGOSTO	$ 510.264.215
	SEPTIEMBRE	$ 361.836.766
	OCTUBRE	$ 536.634.587
	NOVIEMBRE	$ 230.529.822
	DICIEMBRE	$ 215.890.654
2024	ENERO	$ 303.219.668
	FEBRERO	$ 216.703.047
	MARZO	$ 333.958.633
	ABRIL	$ 451.832.991
	MAYO	$ 329.577.918
	JUNIO	$ 429.356.256
VALOR PAGADO		$ 4.897.431.122
VALOR EJECUTADO		$ 5.313.773.307
VALOR RESTANTE		$ 432.954.376
AVANCE PRESUPUESTAL PAGADO		85,22%
AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO		92,69%
AVANCE TEMPORAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		90,30%

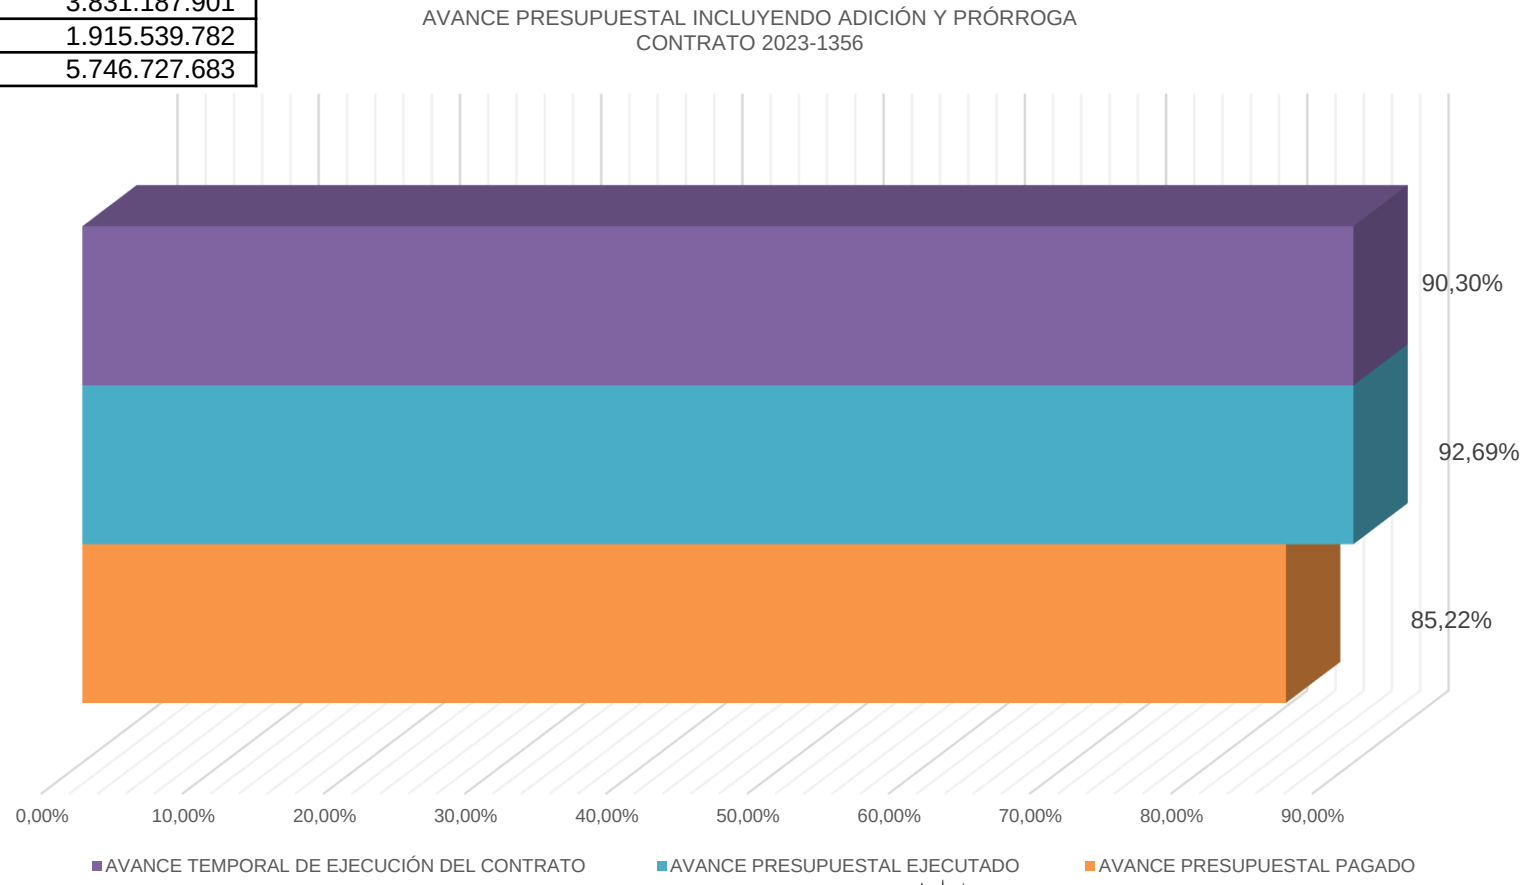

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad

BOGOTÁ



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad
