
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio STI -344-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
FECHA DEL INFORME	01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. German Albeiro Quevedo García** Supervisor Convenio Interadministrativo **STI -344-2023**
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Sevilla – Valle del Cauca Brigada de Ingenieros de Construcciones Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 “General. Francisco Tamayo Cortes”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Sevilla – Valle del Cauca y el ministerio de defensa – Ejército nacional – comando de ingenieros – Brigada de ingenieros de Construcciones – Batallón de ingenieros de construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC - ING, con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial del Municipio de Sevilla – Valle del Cauca”
CANTIDAD A EJECUTAR	Mantenimiento y mejoramiento de 6.7 kilómetros de la estructura existente mediante la instalación de 14 cm de sub base granular, construcción de obras de contención y obras de drenaje del corredor vial Sevilla – Manzanillo - La Cuchilla – El Jardín - Corozal en el municipio de Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” (BICON52)
POBLACION BENEFICIADA	Se beneficiará una población de 45.142 habitantes correspondiente a la zona urbana y rural del municipio.

BICON52

FECHA DE SUSCRIPCION	21 de junio del 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.710.935.833 millones de pesos
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de Octubre del 2023
FECHA DE ENTREGA	12 de Junio del 2024 .
MODIFICATORIOS	Modificatorio No. 1. Cláusula Décima Tercera – Garantías del convenio STI-344-2023

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

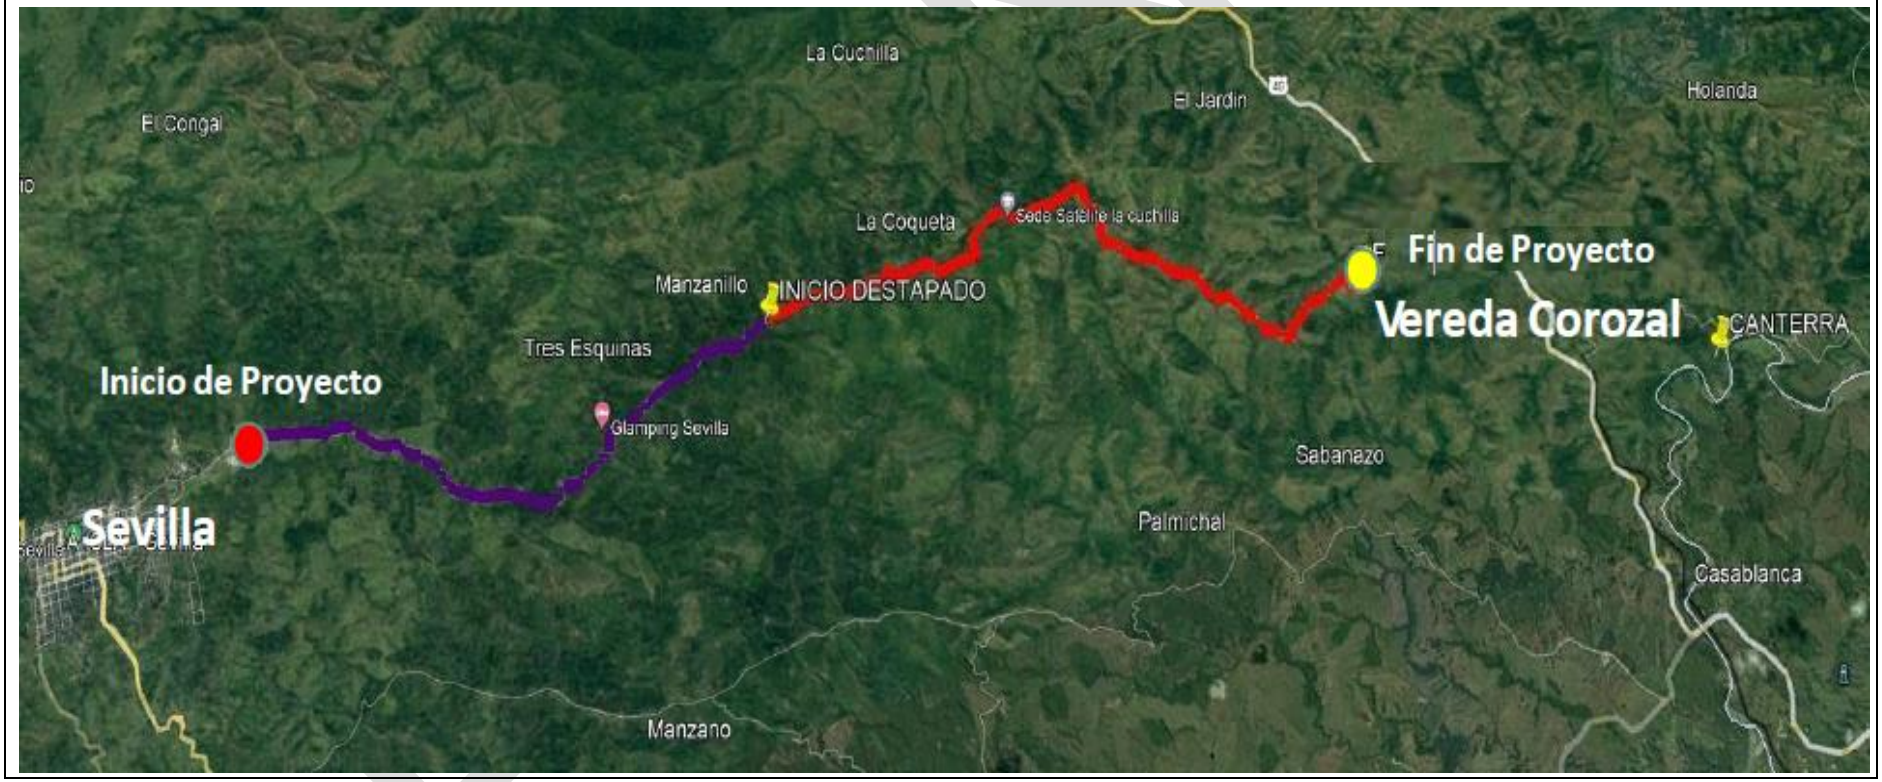

IV. INFORMACION JURIDICA

1. Está pendiente realizar reunión de comité operativo para realizar el modificatorio para el cambio de alcance del convenio STI-344-2023 de Sevilla – Valle del Cauca una vez se entregue el paquete técnico avalado por el supervisor del convenio, en compañía de la Brigada de Ingenieros de Construcciones (BRCON) y el Comando de Ingenieros (COING) y el acompañamiento jurídico para la verificación y/o modificación del mismo, donde se apruebe entre las partes técnicamente el mismo por la necesidades presentadas.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
3550	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 872.786.910,00	12 de octubre de 2023	31 de diciembre de 2023	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/07/23	12/10/23	$472.306.641,26
111487	SODEXO S.A.S	COMBUSTIBLE ACPM , COMBUSTIBLE GAL	$ 289.364.834,00	16 de Junio de 2023	30 de diciembre de 2023	-	-		$ 55.751.325,00
STI -391-2023	TRACTODIESEL	TALLER, GRASAS Y LUBRICANTES	$ 199.549.000,00	13 de octubre de 2023	30 de diciembre de 2023	-	-		$ 121.464.000,00
113515	CENCOSUD COLOMBIA	PAPELERIA, HERRAMIENTA	$ 5.334.800,00	24 de Julio de 2023		-	-		$ 22.222.445,00

BICONOZ

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
113516	S.A - POLYFLEX - HAS LTDA- FERRICENTROS- PROVEEER INSTITUCIONAL SAS	MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	$ 5.001.979,00		09 de Agosto de 2023				
113517			$ 5.257.836,00						
113518			$ 5.315.560,00						
113519			$ 1.312.270,00						
STI 354	ALCALDIA DE SEVILLA - VALLE DE CAUCA	PROFESIONALES	$ 10.000.000,00	13 de octubre de 2023	30 de diciembre de 2023	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	25/07/23		17.000.000,00
STI 375			$ 16.000.000,00						
STI 370			$ 8.000.000,00						
STI371			$ 8.000.000,00						
STI381			$ 12.000.000,00						
STI 490			$ 3.000.000,00						

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BICON 52** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista St. Torres Vargas Alejandro del BICON 52 de acuerdo al concepto técnico:

CONTRATO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SALIDA TOTAL	QUEDA
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	VARILLA DE ACERO FIGURADO CORRUGADO N° 3- N°4 - N°6	KG	22817.60	773	22044.80
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 ALAMBRE NEGRO	UND	1000.00	100	900.00

BICON52

3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	CEMENTO (TIPO PORLAND) X 50 KG	UND	4080.00	27	4053.00
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TUBERIA 24 PULG TUBERIA PARA AGUAS	UND	20.00	1	19.00
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TRITURADO DE 1"	MTC	600.00	7	593.00
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ARENA MEDIA	CMQ	600.00	11	589.00
OC-113519	ROLLO CINTA PELIGRO 500 MTS X 7.5CMS	UND	6.00	1	5.00
OC-113519	GUANTE CARNAZA-TELA WORK	UND	60.00	5	55.00
OC-113519	GAFAS SEGURIDAD POLIC NARASAFE	UND	30.00	5	25.00
OC-113519	TAPAOIDOS DESECHABLES X 6 PARES	UND	10.00	0	10.00
OC-113518	BARRA 18 LB	UND	4.00	2	2.00
OC-113518	ALMADANA 10 LB CON CABO	UND	2.00	1	1.00
OC-113518	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO	UND	30.00	5	25.00
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 X 12	UND	6.00	3	3.00
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 3 X 9	UND	6.00	3	3.00
OC-113517	CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	6.00	2	4.00
OC-113517	PALA REDONDA # 2 CON CABO	UND	5.00	2	3.00
OC-113517	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	UND	8.00	2	6.00
OC-113517	PALIN PALMERO SIN MANGO. MARCA COLIMA	UND	8.00	2	6.00
OC-113517	Anilina colores surtidos	UND	3.00	0	3.00
OC-113517	DECAMETRO DE 30MT EN FIBRA DE VIDRIO	UND	2.00	1	1.00
OC-113517	LLANA LISA METALICA MANGO MADERA	UND	4.00	2	2.00
OC-113517	MARCO DE SEGUETA 12" STANLEY	UND	6.00	1	5.00
OC-113517	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 30MT	UND	4.00	1	3.00
OC-113517	GUANTE VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO AMARILLO	PAR	60.00	0	60.00
OC-113517	Resma Reprograf de papel CARTA 75 gr	UND	10.00	1	9.00
OC-113517	Resma Reprograf de papel OFICIO 75 g	UND	6.00	1	5.00
OC-113515	LAPIZ ROJO KORES CAJA X 12	UND	5.00	0	5.00
OC-113515	BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12	UND	5.00	2	3.00

BICON52

OC-113515	MARTILLO MAZO 8 OZ - T	UND	4.00	1	3.00
OC-113515	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 5MTR	UND	2.00	1	1.00
OC-113515	PALUSTRES 8 PUL MANGO MADERA	UND	4.00	3	1.00
OC-113515	LLANA DENTADA - T	UND	6.00	0	6.00
OC-113515	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PASTA DURA	UND	10.00	3	7.00
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA TRACCION 7,5 R 15 122-118 REF. 12R22.5	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA DIRECCION REF. 7,5 R 15 122-118	UND	4.00	0	4.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT8850-MPG	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7557	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF1365 REF. P550904 - BF1365	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO DA2570 REF. P828889 - RS3544	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO DA4570 REF. P829333 - RS3545	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO B7328 REF. B163	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 31H REF. 31H1250	UND	12.00	7	5.00
STI-391-2023 (TALLER)	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE HELLA REF. 101011505	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BT7237	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (RETROEXCAVADORA)	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (RETROEXCAVADORA)	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (RETROEXCAVADORA)	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION CNH REF. 34056500	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA BOOM CNH REF. SK210-8 BO	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BD7154 REF. P559000- BD7154	UND	3.00	2	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. RS4862	UND	3.00	2	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO REF. B5134	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO REF. B5134	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO BT9422 REF. 1R-0722	UND	1.00	0	1.00

BICONS

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF587-D REF. P550587-BF7772	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO A-1204SP REF. 26460201-4816636	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO 21905023 REF. 22777449-PA4997	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE P502465 REF. B7350	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. P551313-BF970	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	RERPARACION SISTEMA ELECTRICO REF. 2446521	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 4D REF. 770AMP	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE 02/600888 REF. 23047	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF7141 REF. PM1730SP	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF4029 REF. 23142	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS7170 REF. RS30223	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS32 REF. RS30224	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO 2611/00281 REF. PT9424	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF1277-SPS REF. BF1272-SPS	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AGUA AW- 2127 REF. A-5813SP	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	FITRO AIRE PRIMARIO R 1963 REF. 23036	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	GAL	48.00	1	47.00
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	GAL	65.00	15	50.00
STI-391-2023 (TALLER)	GRASA KP 2 G 40 (EP2)	LB	17.00	1	16.00
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE 80W90	GAL	6.00	0	6.00
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION BOMBA DE INYECCION	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION MODULO DE MOTOR	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 305/70-16.5	UND	2.00	0	2.00
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA MARTILLO HIDRAULICO CHN	UND	1.00	0	1.00

BICONF2

STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION EXOSTO KRTV279	UND	1.00	0	1.00
STI-391-2023 (TALLER)	BUJIA BP6EXMAX	UND	2.00	0	2.00

NOTA: *A la fecha no se han recibido la totalidad de los materiales de construcción de las facturas FAC. MY. 107355, FAC.MY 107496 y FAC.MY 107539 de MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS*

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO STI 344-2023

A la fecha se han realizado los siguientes pagos, de acuerdo a la información brindada por parte de la Alcaldía de Sevilla.

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Pago Orden de Compra No. 113515 y Nota Debito No. D-402-4, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	16/11/2023	$ 5.334.800,00
PAGO No. 2	Pago Orden de Compra No. 113516, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	17/11/2023	$ 5.001.979,00
PAGO No. 3	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	22/12/2023	$114.417.087,02
PAGO No. 4	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 10.000.000,00
PAGO No. 5	Prestación de servicios como topógrafo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No.	27/12/2023	$ 16.000.000,00

BIOM52

	52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial		
PAGO No. 6	Prestación de servicios como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12//2023	$ 8.000.000,00
PAGO No. 7	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	28/12/2023	$ 183.368.974,25
TOTAL			**$342.122.840,27**

4. BALANCE CONTRACTUAL

	FECHA	VALOR
Valor Total Convenio	12/10/2023	$ 2.710.935.883,00
Valor disponible obra	31/12/2023	$557.595.477,86
Valor comprometido	31/12/2023	$ 1.107.046.781,00
Valor por comprometer	31/12/2023	$ 792.953.219,00
Total, Contratos	31/12/2023	$1.900.000.000,00

VI. INFORMACIÓN TECNICA

Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- Se recepciona paquete técnico de estudios y diseños por parte del Supervisor del Convenio Alcaldía, Ing. Andrés García, secretario de la Secretaria de Infraestructura y Transito de Sevilla Valle del Cauca, en donde se evidencian las siguientes obras:
  - 24 alcantarillas a lo largo del K7+00 al K14+00
  - 1 alcantarilla doble cabezal
  - 1 box Culvert con muro de Contención en La Virgen.
  - 2 muros de contención paralelos en sector de la Cuchilla

BICON52


  - 1 obra de Bioingeniería de terraceo de Talud con Guaduas sobre el sector El Jardín.
  - Diseños de la vía desde K7+00 al K14+00 para ampliación y conformación en rellenos.
- Por disponibilidad de abogada de proyectos de consolidación del Comando de Ingenieros se plantea reunión de Comité Operativo para el 2 de febrero del 2024, en el cual se revisará el alcance y posteriormente una prórroga de tiempo para ejecutar las obras en mención.
- Se da inicio a las actividades constructivas con los diseños entregados por la alcaldía, ya que es el único paquete técnico con el que se cuenta en el convenio.
- Se inician trabajos preliminares y constructivos sobre Alcantarilla de doble Cabezal, ubicada en ABS K 00+050.
  - Replanteo
  - Excavación
  - Soldado base
  - Instalación de tubería
  - Armado de estructura metálica.
  - Fundición de zapatas y placa de contrapiso.
- Se realiza ampliación y conformación de la vía desde el K07+000 hasta el K07+300
- Se recepcionan elementos de las facturas FAC. CD123330 y FAC. N° CD123359 del Contrato STI 391-2023 de repuestos, filtros, grasas y lubricantes.

- **% EJECUTADO= 2.37%**
- **% PROYECTADO= 2.68%**
- **VR. A EJECUTAR = $1.900.000.000,00**
- **VR. EJECUTADO = $626,272,744.30**
- **% EJECUTADO = 33%**

BICON52

PROGRAMACIÓN DE OBRA COVENIO STI-344-2023

	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	1	PROGRAMACION CONVENIO STI-334-2023 SEVILLA VALLE DEL CAUCA	303,31 días	jue 12/10/23	vie 14/06/24
2	1.1	ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA, DISEÑOS (PAQUETES TECNICOS AVALDOS Y FIRMADOS)	134,31 días	jue 12/10/23	lun 29/01/24
9	1.2	CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT 3000 PSI	118,31 días	jue 12/10/23	mar 16/01/24
25	1.3	AMPLIACIÓN A NIVEL DE LA RASANTE DE LA VIA EXISTENTE CON UN ANCHO DE (5,30 M) DEL KM 7+800 AL KM14+500	214 días	sáb 23/12/23	vie 14/06/24
29	1.4	CONSTRUCCIÓN DE 7 ALCANTARILLAS DE 3000 PSI	82 días	mar 6/02/24	vie 12/04/24
115	2	CONSTRUCCIÓN 01 MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR DE LA VIRGEN DE 4000 PSI K0+550	115 días	jue 15/02/24	sáb 18/05/24
152	1.6	CONSTRUCCIÓN 02 MUROS DE CONTENCION DE 4000 PSI K9+000	35 días	vie 29/03/24	sáb 27/04/24
176	2	FIN TRABAJO	0 días	vie 14/06/24	vie 14/06/24

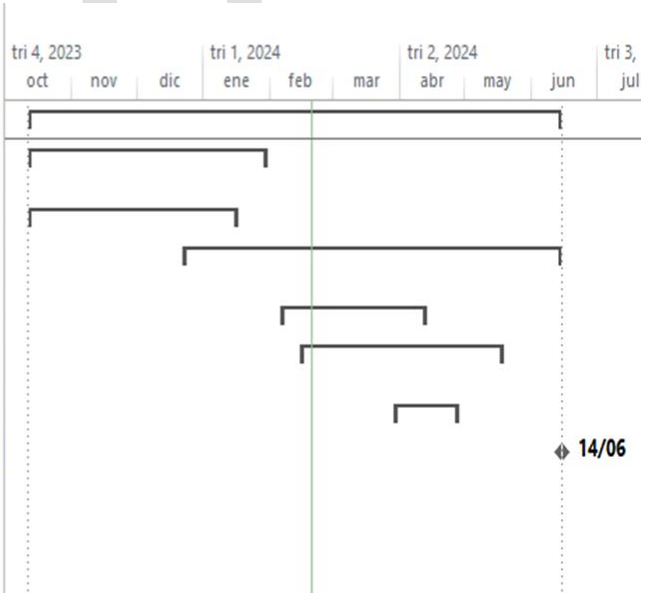

LINEA DE TIEMPO ACTUAL DEL COVENIO STI-344-2023



VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
 CONFORMACIÓN DE LA VÍA	CORTE PARA AMPLIACIÓN DE VÍA Y CONFORMACIÓN CON MATERIAL ROCA MUERTA SUMISTRADO POR LA ALCALDÍA ABS K07+100
 FIGURADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA	FIGURADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ALCANTARILLA DE DOBLE CABEZAL EN EL SECTOR DE TOTORO – SEVILLA, VALLE DEL CAUCA. ABS K00+050

COING52

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Al momento la población de las veredas Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín y Corozal de Sevilla Valle del Cauca se ven afectadas por el mal estado de la vía, no se continua con la actividad de ampliación y conformación, ya que la Alcaldía no ha suministrado más material destinado para dicha actividad, a razón del cambio de administración del municipio.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- La alcaldía solicito la estructuración y aval a través de un informe de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), cuyo objetivo fue emitir el concepto técnico ambiental sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento entre la vereda de la cuchilla y la vereda corozal, Municipio de Sevilla – Valle del Cauca” donde se manifiesta dentro de la consideración que la actividad NO requiere de trámite de un permiso o autorización, ya que se encuentra expresamente normalizado, ya que no tiene algún procedimiento especial por lo que el concepto técnico ambiental a emitir es fundamentado de manera general en las competencia otorgadas en el decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”

- La alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca a través del Secretario de Transito e Infraestructura realizó una certificación el 30 de agosto del 2023, donde se evidencia que manifiesta que no se requieren permisos de ocupación de cause por parte de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CCV).

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS					
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**		**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
1173039	18/12/2023	RIESGOS EN EL TRABAJO		30	omitido
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**

BOTAS PUNTA DE ACERO	15/12/2023	04	SLP. HERRERA GONZALEZ SLP. RODRIGUEZ PEÑA SLP. CHAPID CUARAN SLP. VELASCO PARRA	PRIMERA VEZ	NINGUNA

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERSONAL AFECTADO	MEDIDA CORRECTIVA
No se reportan accidente	omitido	omitido	omitido	omitido	omitido

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La alcaldía no ha suministrado la formaleta metálica con la cual se debe realizar el encofrado de la “aleta” entrante y saliente de la alcantarilla de doble cabezal de Totoro, actividad que es de línea base para poder continuar con la ejecución del proyecto.
2. No se ha recibido material para conformación de la vía, por tal razón no se continua con la ampliación y conformación de esta.
3. Debido al cambio de administración La Alcaldía se encuentra en proceso de empalme en el mes de diciembre, lo que ha dificultado los pagos a los proveedores, el suministro de materiales, y la solución de necesidades en el proyecto, como por ejemplo la adquisición de la formaleta metálica de los cabezales de las alcantarillas y sobre todo la entrega de paquete técnico completo con sus anexos completos y sin novedades con el fin de establecer el alcance de acuerdo a información relacionada con el cronograma de obra inicial y de esta forma iniciar el modificatorio o prorroga en caso de necesitarlo.
4. No se han realizado más capacitaciones en salud ocupacional / seguridad industrial, debido a que la profesional de seguridad en el trabajo se encuentra en licencia de maternidad.

5. Se recepciona elementos de las facturas FAC.MY 107496 y FAC.MY 107539 del Contrato 3550-2023 de materiales de construcción, elementos que no han sido solicitados por parte de Ejercito, sino mediante el cálculo de los materiales que realizo el supervisor de la Alcaldía y de los cuales no se recibió 205m3 de triturado de 1" relacionados en la Factura MY 107539.
6. Esta supervisión de Ejercito no aprobó los pagos de MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S, ya que los elementos no han sido solicitados por Ejercito, toda vez que aún no ha sido aprobado el cambio de alcance. La interventoría por parte de la Alcaldía manifiesta que se vió en la necesidad de realizar el pedido de materiales y el pago de manera inmediata con el fin de que no suban los precios por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, y de esa manera no se vea afectado financieramente el convenio.

XII. CONCLUSIONES

1. Se realizará comité operativo con el fin de verificar el alcance del proyecto propuesto por la alcaldía, de tal forma que sea un acuerdo realizado por todas las partes.
2. La actividad de encofrado con la formaleta metálica para las alcantarillas es línea base para continuar la ejecución de las obras y no generar un mayor retraso, al igual que el suministro de material de relleno para la conformación de las vías.
3. A la fecha no se cuenta con estudios ni diseños del alcance definitivo, a su vez el alcance del convenio no es especifico con la cantidad de obras a ejecutar.

XIII. RECOMENDACIONES

1. Realizar el proceso de cambio de alcance del convenio, con el fin de que sean ejecutados los únicos diseños que se tienen actualmente el proyecto y que fueron entregados por parte de la alcaldía en el presente mes. Adicionalmente para que sean utilizados todos los materiales que la Alcaldía ha dispuesto en campo.

FIRMAN:



FIRMA _____
Mayor GERMAN ALBEIRO QUEVEDO GARCÍA
Ejecutivo y Segundo comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52
Supervisor Convenio Interadministrativo STI - 344 -2023

BICON52



Subteniente CORTES GOMEZ DIEGO MAURICIO
Oficial Coordinador de Ingenieros S10 BICON 52 (E)

BICON52
