
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio STI -344-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
FECHA DEL INFORME	01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. German Albeiro Quevedo García** Supervisor Convenio Interadministrativo **STI -344-2023**
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Sevilla – Valle del Cauca Brigada de Ingenieros de Construcciones Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 “General. Francisco Tamayo Cortes”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Sevilla – Valle del Cauca y el ministerio de defensa – Ejército nacional – comando de ingenieros – Brigada de ingenieros de Construcciones – Batallón de ingenieros de construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC - ING, con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial del Municipio de Sevilla – Valle del Cauca”
CANTIDAD A EJECUTAR	Mantenimiento y mejoramiento de 6.7 kilómetros de la estructura existente mediante la instalación de 14 cm de sub base granular, construcción de obras de contención y obras de drenaje del corredor vial Sevilla – Manzanillo - La Cuchilla – El Jardín - Corozal en el municipio de Sevilla en el departamento del Valle del Cauca.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” (BICON52)
POBLACION BENEFICIADA	Se beneficiará una población de 45.142 habitantes correspondiente a la zona urbana y rural del municipio.

BICON52

FECHA DE SUSCRIPCION	21 de junio del 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.710.935.833 millones de pesos
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de Octubre del 2023
FECHA DE ENTREGA	12 de Junio del 2024 .
MODIFICATORIOS	Modificatorio No. 1. Cláusula Décima Tercera – Garantías del convenio STI-344-2023

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

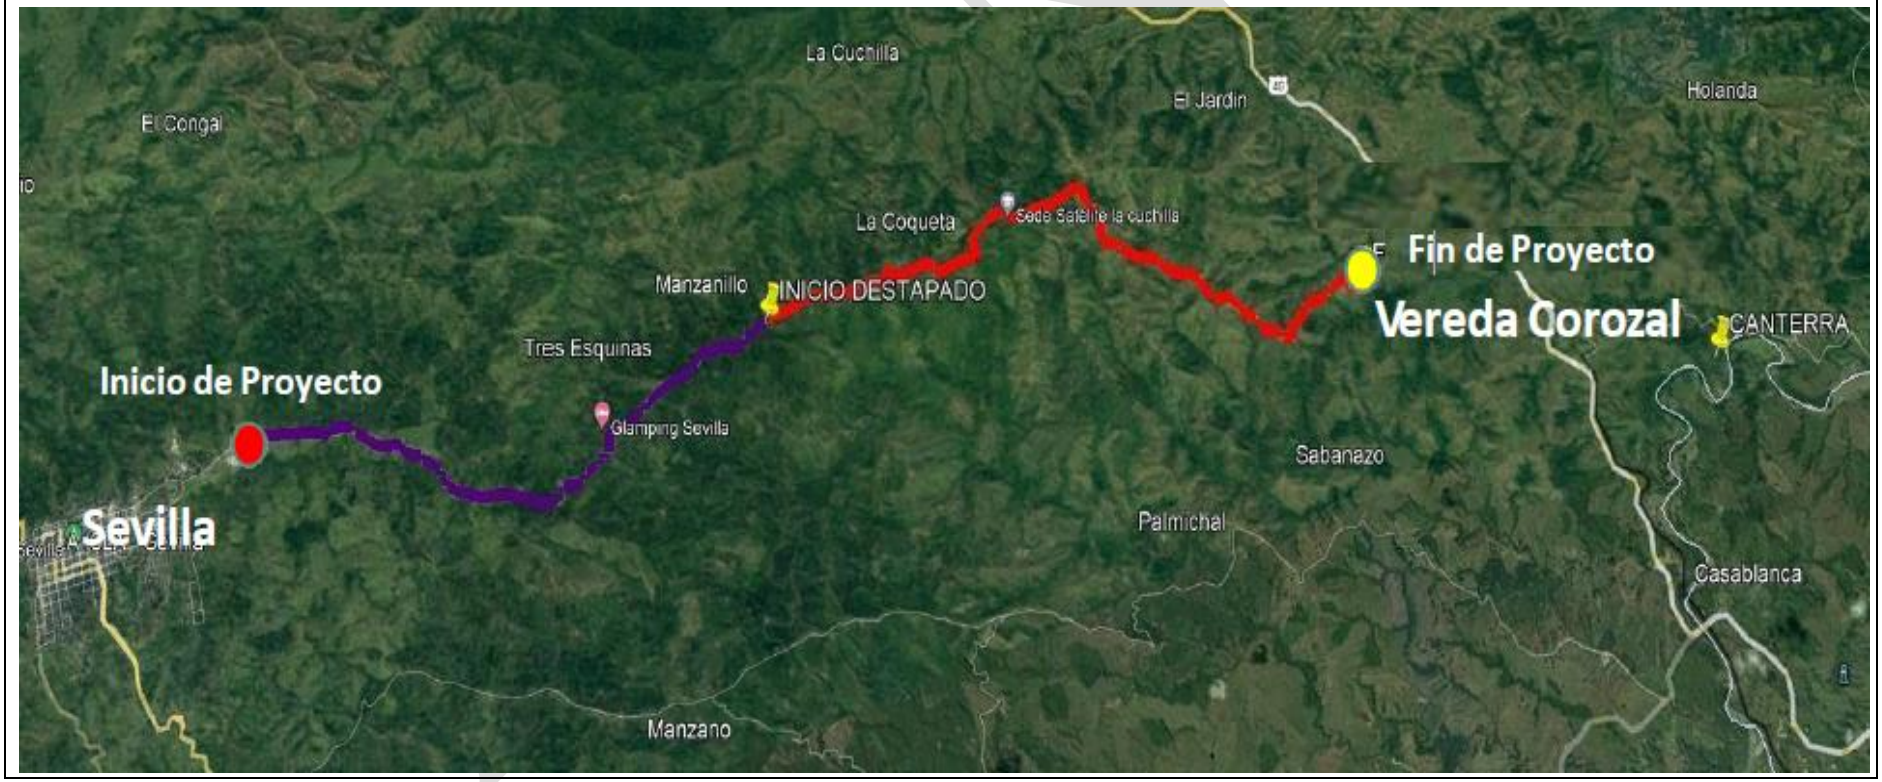

IV. INFORMACION JURIDICA

1. Está pendiente la realización de la reunión del comité operativo para dar a conocer el cambio proyecto de alcance y el modificatorio que se requiere para ello, del convenio STI-344-2023 de Sevilla – Valle del Cauca una vez se entregue el paquete técnico avalado por el supervisor del convenio, en compañía de la Brigada de Ingenieros de Construcciones (BRCON) y el Comando de Ingenieros (COING) y el acompañamiento jurídico para la verificación y de esta forma llevar a cabo los tramites requeridos , donde se apruebe entre las partes de forma técnica, ambiental, jurídica y presupuestalmente la justificación de nuevo alcance. La fecha para llevar a cabo el comité operativo esta proyectado para el 2 de febrero del 2024.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
3550	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 872.786.910,00	12 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/07/23	12/10/23	$472.306.641,26
111487	SODEXO S.A.S	COMBUSTIBLE ACPM , COMBUSTIBLE GAL	$ 289.364.834	12 de Junio de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 70.965.792
STI -391-2023	TRACTODIESEL	TALLER, GRASAS Y LUBRICANTES	$ 199.549.000	13 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 121.464.000

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
113515	CENCOSUD COLOMBIA S.A - POLYFLEX - HAS LTDA- FERRICENTROS- PROVEEER INSTITUCIONAL SAS	PAPELERIA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	$ 5.334.800	12 de Julio de 2023	09 de Agosto de 2023	-	-		$ 32.439.785
113516			$ 5.001.979,00						
113517			$ 5.257.836,00						
113518			$ 5.315.560,00						
113519			$ 1.312.270,00						
124863			10.217.340						
STI 354	ALCALDIA DE SEVILLA - VALLE DE CAUCA	PROFESIONALES	$ 10.000.000,00	13 de octubre de 2023	30 de diciembre de 2023	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	25/07/23		$ 45.000.000
STI 375			$ 16.000.000,00						
STI 370			$ 8.000.000,00						
STI371			$ 8.000.000,00						
STI381			$ 12.000.000,00						
STI 490			$ 3.000.000,00						
STI - 2024 - 111			$ 10.500.000						
STI-2024-101	COMPAÑÍA COLOMBIANA GESTIÓN Y SERVICIOS	EQUIPO MENOR	$ 35.200.000,00	12 de Junio de 2023	30 de diciembre de 2023	-	-		-

BIOINSA

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BICON 52** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista del Convenio STI 344-2023 BICON 52 de acuerdo al concepto técnico:

CONTRATO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SALIDA TOTAL	QUEDA
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	VARILLA DE ACERO FIGURADO CORRUGADO N° 3- N°4 - N°6	KG	22817.60	1887	20931
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 ALAMBRE NEGRO	UND	1000.00	179	821
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	CEMENTO (TIPO PORLAND) X 50 KG	UND	4080.00	120	3960
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TUBERIA 24 PULG TUBERIA PARA AGUAS	UND	20.00	1	19
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TRITURADO DE 1"	MTC	600.00	18	582
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ARENA MEDIA	CMQ	600.00	19	581
OC-113519	ROLLO CINTA PELIGRO 500 MTS X 7.5CMS	UND	6.00	2	4
OC-113519	GUANTE CARNAZA-TELA WORK	UND	60.00	8	52
OC-113519	GAFAS SEGURIDAD POLIC NARASAFE	UND	30.00	8	22
OC-113519	TAPAOIDOS DESECHABLES X 6 PARES	UND	10.00	3	7
OC-113518	BARRA 18 LB	UND	4.00	2	2
OC-113518	ALMADANA 10 LB CON CABO	UND	2.00	1	1
OC-113518	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO	UND	30.00	10	20
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 3 X 9	UND	6.00	3	3
OC-113517	CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	6.00	3	3
OC-113517	PALA REDONDA # 2 CON CABO	UND	5.00	2	3
OC-113517	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	UND	8.00	2	6
OC-113517	PALIN PALMERO SIN MANGO. MARCA COLIMA	UND	8.00	2	6

BICON 52

OC-113517	Anilina colores surtidos	UND	3.00	0	3
OC-113517	DECAMETRO DE 30MT EN FIBRA DE VIDRIO	UND	2.00	1	1
OC-113517	LLANA LISA METALICA MANGO MADERA	UND	4.00	3	1
OC-113517	MARCO DE SEGUETA 12" STANLEY	UND	6.00	2	4
OC-113517	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 30MT	UND	4.00	1	3
OC-113517	GUANTE VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO AMARILLO	PAR	60.00	8	52
OC-113517	Resma Reprograf de papel CARTA 75 gr	UND	10.00	1	9
OC-113517	Resma Reprograf de papel OFICIO 75 g	UND	6.00	1	5
OC-113515	LAPIZ ROJO KORES CAJA X 12	UND	5.00	2	3
OC-113515	BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12	UND	5.00	2	3
OC-113515	MARTILLO MAZO 8 OZ - T	UND	4.00	2	2
OC-113515	LLANA DENTADA - T	UND	6.00	0	6
OC-113515	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PASTA DURA	UND	10.00	3	7
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA S	UND	10.00	0	10
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA M	UND	10.00	0	10
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA L	UND	10.00	0	10
OC-124863	CASCO MILEMIUM FULL BRIM AMARILLO CON CINTAS REFLECTIVAS	UND	30.00	0	30
OC-124863	TAFILETE ARNES MILEMIUM RACHET	UND	30	0	30
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA TRACCION 7,5 R 15 122-118 REF. 12R22.5	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA DIRECCION REF. 7,5 R 15 122-118	UND	4.00	0	4
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT8850-MPG	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7557	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF1365 REF. P550904 - BF1365	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO DA2570 REF. P828889 - RS3544	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO DA4570 REF. P829333 - RS3545	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO B7328 REF. B163	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 31H REF. 31H1250	UND	13.00	7	6
STI-391-2023 (TALLER)	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE HELLA REF. 101011505	UND	1.00	0	1

BICON 2

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BT7237	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (RETROEXCAVADORA)	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (RETROEXCAVADORA)	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION CNH REF. 34056500	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA BOOM CNH REF. SK210-8 BO	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BD7154 REF. P559000- BD7154	UND	3.00	2	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. RS4862	UND	3.00	2	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO REF. B5134	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO BT9422 REF. 1R-0722	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF587-D REF. P550587-BF7772	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO A-1204SP REF. 26460201-4816636	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO 21905023 REF. 22777449-PA4997	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE P502465 REF. B7350	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. P551313-BF970	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	RERPARACION SISTEMA ELECTRICO REF. 2446521	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 4D REF. 770AMP	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE 02/600888 REF. 23047	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF7141 REF. PM1730SP	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF4029 REF. 23142	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS7170 REF. RS30223	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS32 REF. RS30224	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO 2611/00281 REF. PT9424	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF1277-SPS REF. BF1272-SPS	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AGUA AW- 2127 REF. A-5813SP	UND	1.00	0	1

BRIGONZ

STI-391-2023 (TALLER)	FITRO AIRE PRIMARIO R 1963 REF. 23036	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	GAL	48.00	1	47
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	GAL	65.00	15	50
STI-391-2023 (TALLER)	GRASA KP 2 G 40 (EP2)	LB	17.00	1	16
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE 80W90	GAL	6.00	0	6
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION BOMBA DE INYECCION	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION MODULO DE MOTOR	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 305/70-16.5	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA MARTILLO HIDRAULICO CHN	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION EXOSTO KRTV279	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	BUJIA BP6EXMAX	UND	2.00	0	2

NOTA: *A la fecha no se han recibido la totalidad de los materiales de construcción de las facturas FAC.MY 107539 de MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS*

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO STI 344-2023

A la fecha se han realizado los siguientes pagos, de acuerdo a la información brindada por parte de la Alcaldía de Sevilla.

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Pago Orden de Compra No. 113515 y Nota Debito No. D-402-4, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	16/11/2023	$ 5.334.800,00
PAGO No. 2	Pago Orden de Compra No. 113516, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	17/11/2023	$ 5.001.979,00
PAGO No. 3	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	22/12/2023	$114.417.087,02

PAGO No. 4	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 10.000.000,00
PAGO No. 5	Prestación de servicios como topógrafo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla - valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 16.000.000,00
PAGO No. 6	Prestación de servicios como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12//2023	$ 8.000.000,00
PAGO No. 7	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	28/12/2023	$ 183.368.974,25
PAGO No. 8	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 12.775.000,00
PAGO No. 9	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 66.309.000,00
PAGO No. 10	Prestación de servicios como mecánico de maquinaria pesada en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 8.000.000,00

BICON52

PAGO No. 11	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	04/01/2024	$ 196.804.614,09
PAGO No. 12	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 3.000.000,00
TOTAL			**$ 629.011.454,36**

A la fecha está pendiente por realizarse los siguientes pagos; los 3 primeros porque ya se recibieron y el ultimo porque de acuerdo al convenio, debían realizar dicho desembolso un mes después de haber firmado el acta de inicio.

No.	CONTRATO	CONCEPTO	FACTURA	VALOR
1	ORDENES DE COMPRA	Pago Orden de Compra No. 113517, 113518, 113519, en relación al cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	OC 113517, 113518, 113519	$ 11.885.666,00
2	ORDEN DE COMPRA	Combustible ACPM, combustible GAL	OC 111487	$ 289.364.834,00
3	CONVENIO	50% DEMERITO Y DESGASTE	DE ACUERDO A CONVENIO	$131.714.285,72
4	ORDEN DE COMPRA	Pago Orden de Compra No. 124863 Overoles y Cascos	OC 124863	$10.217.340,00
TOTAL				**$443.182.125,7**

BIGN2

4. BALANCE CONTRACTUAL

	FECHA	VALOR
Valor Total Convenio	12/10/2023	$ 2.710.935.883,00
Valor disponible obra	31/03/2024	$ 553.446.970,99
Valor comprometido	31/03/2024	$1,496,840,530.00
Valor por comprometer	31/03/2024	$403,159,470.00
Total, Contratos	31/03/2024	$1.900.000.000,00

VI. INFORMACIÓN TÉCNICA

Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- Se realiza reunión de Comité operativo No. 3 con fecha 7 de marzo del 2024, acta de reunión No. 00258458, en la cual se indica presentar el paquete técnico por parte de la Alcaldía de Sevilla, con el fin de verificar si se da el aval o no del cambio de alcance, al cual se realizan observaciones por parte del Comando de Ingenieros.
- Se proyecta realizar la cuarta reunión del comité operativo cuando la alcaldía de Sevilla, haya entregado el paquete técnico y este haya sido estudiado y viabilizado con el fin de dar la continuidad.
- Se continúa solicitando a la alcaldía la formaleta para construcción de alcantarillas y muros, lo cual continúa generando retrasos.
- Se continúa realizando la adecuación de otro campamento de obra, puesto que los predios donde estaba ubicado inicialmente el campamento de obra fueron vendidos.
- A la fecha no se cuenta con estudios ni diseños del alcance actual, a su vez el alcance del convenio no es especifico con la cantidad de obras a ejecutar.
- Se ha trabajado en el armado de la estructura metálica de Box Culvert k 0+50
- Se cae la banca sobre la estructura metálica del Box Culvert K0+550, se realizó ampliación de la vía por el lado opuesto de la perdida de banca por seguridad de los transeúntes, de igual manera se realizó un trincho improvisado como contención de la vía.


- **% EJECUTADO= 2,57%**
- **% PROYECTADO= 2,7%**

- **VR. A JECUTAR = $1.900.000.000,00**
- **VR. EJECUTADO = $650,073,211.30**
- **% EJECUTADO = 34,21%**


BICONS

PROGRAMACIÓN DE OBRA COVENIO STI-344-2023

	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	1	PROGRAMACION CONVENIO STI-334-2023 SEVILLA VALLE DEL CAUCA	303,31 días	jue 12/10/23	vie 14/06/24
2	1.1	ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA, DISEÑOS (PAQUETES TECNICOS AVALDOS Y FIRMADOS)	134,31 días	jue 12/10/23	lun 29/01/24
9	1.2	CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT 3000 PSI	118,31 días	jue 12/10/23	mar 16/01/24
25	1.3	AMPLIACIÓN A NIVEL DE LA RASANTE DE LA VIA EXISTENTE CON UN ANCHO DE (5,30 M) DEL KM 7+800 AL KM14+500	214 días	sáb 23/12/23	vie 14/06/24
29	1.4	CONSTRUCCIÓN DE 7 ALCANTARILLAS DE 3000 PSI	82 días	mar 6/02/24	vie 12/04/24
115	2	CONSTRUCCIÓN 01 MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR DE LA VIRGEN DE 4000 PSI K0+550	115 días	jue 15/02/24	sáb 18/05/24
152	1.6	CONSTRUCCIÓN 02 MUROS DE CONTENCION DE 4000 PSI K9+000	35 días	vie 29/03/24	sáb 27/04/24
176	2	FIN TRABAJO	0 días	vie 14/06/24	vie 14/06/24

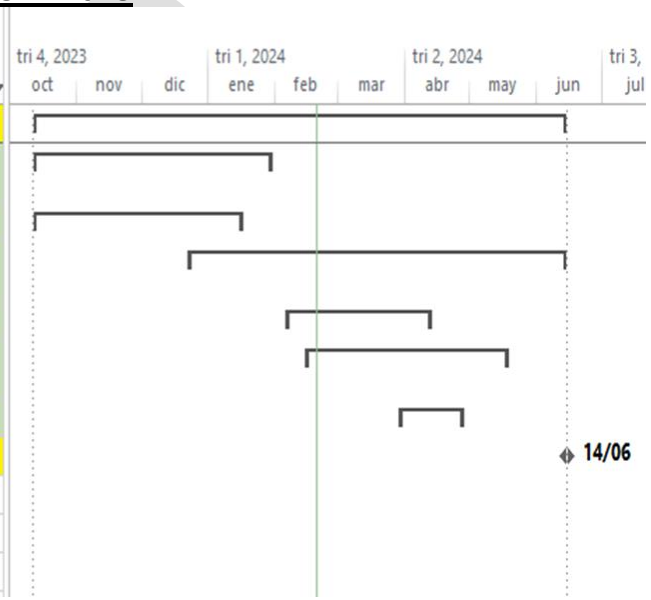

LINEA DE TIEMPO ACTUAL DEL COVENIO STI-344-2023

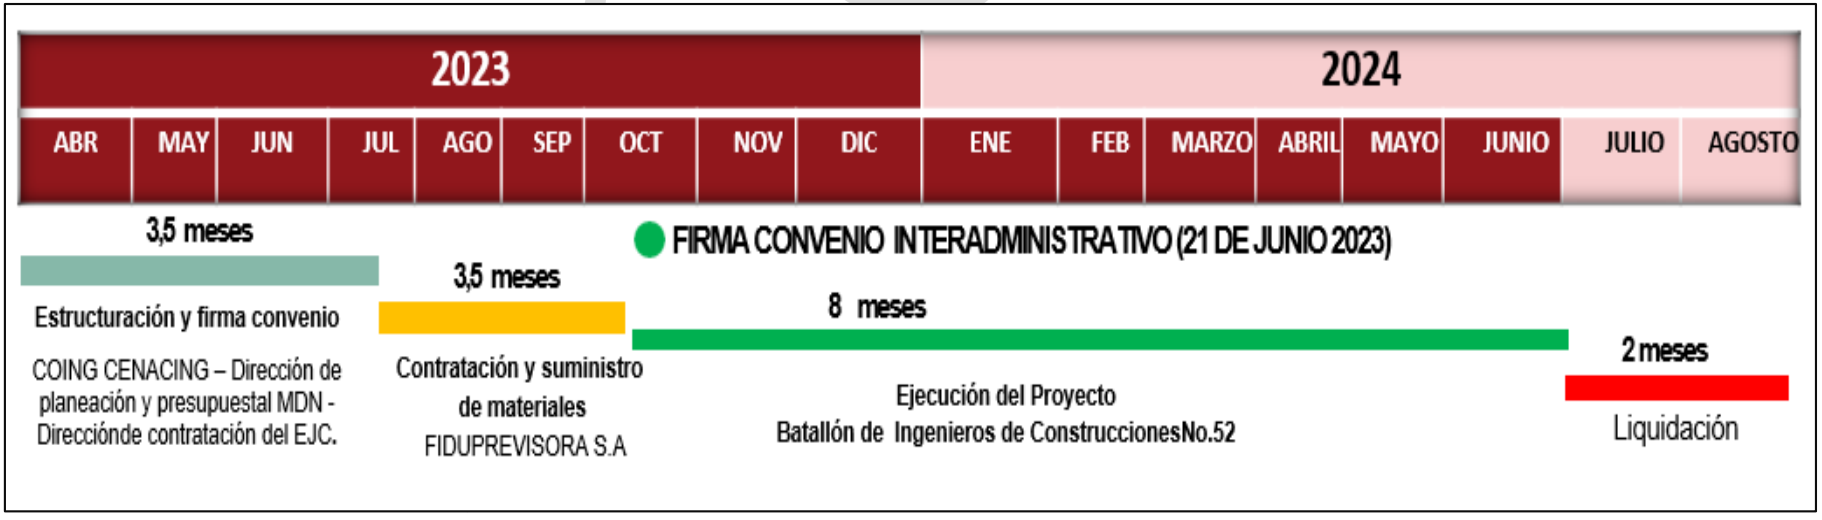

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
 ZAPATA DE ALETA NORTE BOX CULVERT K0+550	SE REALIZA EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA ZAPATA DE ALETA NORTE BOX CULVERT, DE ACUERDO A DISEÑOS DE PAQUETE TECNICO ENTREGADO POR LA ALCALDIA DE SEVILLA.
 DISIPADORES DE ENERGIA ALCANTARILLA DE DOBLE CABEZAL K0+050	SE FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGIA DE ALCANTARILLA DE DOBLE CABEZAL K0+050



BOX CULVERT K0+550



BOX CULVERT K0+550

DERRUMBE DE BANCA SOBRE ZAPATA NORTE BOX CULVERT K0+550. GENERANDO RETRASOS POR LIMPIEZA Y ENDEREZAMIENTO DE ACEROS.

SE ERRADICA UN ÁRBOL UBICADO EN LAS COORDENADAS 4°18.07.55"N - 75°55'32.95"W, POR RIESGO DE VOLCAMIENTO SOBRE TALUD POR PERDIDA DE BANCA DE LA VÍA Y RIESGO DE AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE UNA VÍA CARRETEABLE DEL MUNICIPIO,

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Al momento la población de las veredas Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín y Corozal de Sevilla Valle del Cauca manifiestan preocupación por la pérdida de banca en el K0+550

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- La alcaldía solicito la estructuración y aval a través de un informe de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), cuyo objetivo fue emitir el concepto técnico ambiental sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento entre la vereda de la cuchilla y la vereda corozal, Municipio de Sevilla – Valle del Cauca” donde se manifiesta dentro de la consideración que la actividad NO requiere de trámite de un permiso o autorización, ya que se encuentra expresamente normalizado, ya que no tiene algún procedimiento especial por lo que el concepto técnico ambiental a emitir es fundamentado de manera general en las competencia otorgadas en el decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. La alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca a través del Secretario de Transito e Infraestructura realizó una certificación el 30 de agosto del 2023, donde se evidencia que manifiesta que no se requieren permisos de ocupación de cause por parte de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

- Mediante documento de radicado 0733-146992024 del 13 de febrero del 2024, emitido por la CVC, coordenadas geográficas 4° 17’ 57,56’’ de Latitud Norte y 75° 55’ 44,32’’ de longitud Oeste y 4° 18’ 06,72’’ de latitud Norte y 75° 55’ 32.98’’ de longitud Oeste, correspondientes a las ABS K0+050 y K0+500 Alcantarilla De doble cabezal y Box Culvert respectivamente, se emite concepto en el cual manifiestan que “*se considera ambientalmente viable la construcción de las obras de drenaje para el manejo de las aguas lluvias de escorrentía, tales como una alcantarilla de doble cabezal… un box culvert… por considerar que las actividades a realizar ocasionaran un impacto ambiental bajo. Igualmente se considera ambientalmente viable la construcción de las alcantarillas a lo largo de la vía y las cunetas para el manejo de las aguas lluvias”*

- Se solicita a la CVC la erradicación de un árbol ubicado en las coordenadas 4°18.07.55"N - 75°55'32.95"W, lugar en el que se construirá el Box Culvert, ABS K0+500 por riesgo de volcamiento sobre talud por perdida de banca de la vía y riesgo de afectación a la infraestructura de una vía carreteable del municipio, quien mediante Documento de radicado 0733-208512024 del 5 de marzo del 2024, emitido por la CVC, manifiesta *“…teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable autorizar la erradicación del árbol…”*

BICON2

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS

ACTA N°	FECHA	TEMA	CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
00244514	04/03/2024	IDENTIFICACION RIESGOS Y PELIGRO	17	omitido
00274702	11/03/2024	ANTICIPACION DE ACCIDENTES	19	omitido
00319125	19/03/2024	PRIMEROS AUXILIOS	18	omitido
00355458	27/03/2024	CHARLA AMBIENTAL	16	omitido

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTO ENTREGADO	FECHA	CANTIDAD	PERSONAL QUE RECIBE EPP	TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)	OBSERVACIONES
BOTAS PUNTA DE ACERO	02/03/2024 11/03/2024 16/03/2024	3 1 1	SLP. RAMOS MARIN SLP. CAPERA ESQUIVEL SLP. AVENDAÑO SALINAS SLP. BARRETO OBANDO SLP. SIBO MUÑOZ	PRIMERA VEZ	OMITIDO
GUANTES VAQUETA	02/03/2024 11/03/2024 16/03/2024	3 1 1	SLP. RAMOS MARIN SLP. CAPERA ESQUIVEL SLP. AVENDAÑO SALINAS SLP. BARRETO OBANDO SLP. VELAZCO PARRA DANILO	PRIMERA VEZ	OMITIDO
TAPAOIDOS	02/03/2024 16/03/2024	3 1	SLP. RAMOS MARIN SLP. CAPERA ESQUIVEL SLP. AVENDAÑO SALINAS	PRIMERA VEZ	OMITIDO

GAFAS	03/03/2024	3	SLP. RAMOS MARIN SLP. CAPERA ESQUIVEL SLP. AVENDAÑO SALINAS	PRIMERA VEZ	OMITIDO
GUANTES VAQUETA	06/03/2024	3	SLP. HERRERA GONZALEZ SLP. SIBO MUÑOZ SLP. MORALES QUINTERO	PRIMERA VEZ	OMITIDO
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
No se reportan accidente	omitido	omitido	omitido	omitido	omitido

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La alcaldía no ha suministrado la formaleta metálica con la cual se debe realizar el encofrado el cabezal entrante y saliente de la alcantarilla de doble cabezal de Totoro, actividad que es de línea base para poder continuar con la ejecución del proyecto.
2. No se ha recibido material para conformación de la vía, por tal razón no se continua con la ampliación y conformación de esta.
3. Pendiente recepción y revisión del paquete técnico para el cambio de alcance.
4. Se mueve el personal a campamento B en el sector de La Cuchilla.

XII. CONCLUSIONES

1. Se evidencia gran retraso de avance de obra.
2. A la fecha no se cuenta con estudios ni diseños del alcance actual, a su vez el alcance del convenio no es especifico con la cantidad de obras a ejecutar, por tal razón se dio inicio con las actividades constructivas de acuerdo a los diseños entregados por la Alcaldía de Sevilla Valle del Cauca.

BIOS

XIII. RECOMENDACIONES

1. Realizar el proceso de cambio de alcance del convenio, con el fin de que sean ejecutados los únicos diseños que se tienen actualmente del proyecto los cuales fueron entregados por parte de la alcaldía en diciembre del 2023 y adicionalmente han sido avalados por parte la administración actual de la Alcaldía de Sevilla Valle del Cauca. Adicionalmente con el fin de que sean utilizados todos los materiales que la Alcaldía ha dispuesto en campo.

FIRMAN:



FIRMA _____
Mayor GERMAN ALBEIRO QUEVEDO GARCÍA
Ejecutivo y Segundo comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52
Supervisor Convenio Interadministrativo STI - 344 -2023



Capitán PAULA ANDREA VASQUEZ MEJÍA
Ingeniera Residente de Obra Convenio STI - 344 -2023



Teniente CAMILO MAHECHA ESPARZA
Oficial Tecnica BICON 52

BICON52
