
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio STI -344-2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
FECHA DEL INFORME	01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. German Albeiro Quevedo García** Supervisor Convenio Interadministrativo **STI -344-2023**
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo STI -344-2023
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Sevilla – Valle del Cauca Brigada de Ingenieros de Construcciones Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 “General. Francisco Tamayo Cortes”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el municipio de Sevilla – Valle del Cauca y el ministerio de defensa – Ejército nacional – comando de ingenieros – Brigada de ingenieros de Construcciones – Batallón de ingenieros de construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC - ING, con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial del Municipio de Sevilla – Valle del Cauca”
CANTIDAD A EJECUTAR	Construcción de 02 muros de contención en punto denominado crítico. Construcción de 1 alcantarilla de doble cabezal k0+50. Construcción de 16 alcantarillas de 24". Construcción de 1 box culvert la virgen de k0+500. Construcción de cunetas tipo v hasta agotar materiales.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” (BICON52)
POBLACIÓN BENEFICIADA	Se beneficiará una población de 45.142 habitantes correspondiente a la zona urbana y rural del municipio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio del 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.710.935.833 millones de pesos

BICON52

FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de octubre del 2023
FECHA DE ENTREGA	20 de octubre del 2024
MODIFICATORIOS	Modificatorio No. 1. Cláusula Décima Tercera – Garantías del convenio STI-344-2023 Modificatorio No. 2. Cláusula Segunda – Alcance del convenio. Cláusula Décima – Formas de desembolsos correspondiente al valor del demerito y desgaste y gastos de administración por parte de la alcaldía de Sevilla. Clausula Decima Segunda – Plazo de ejecución

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

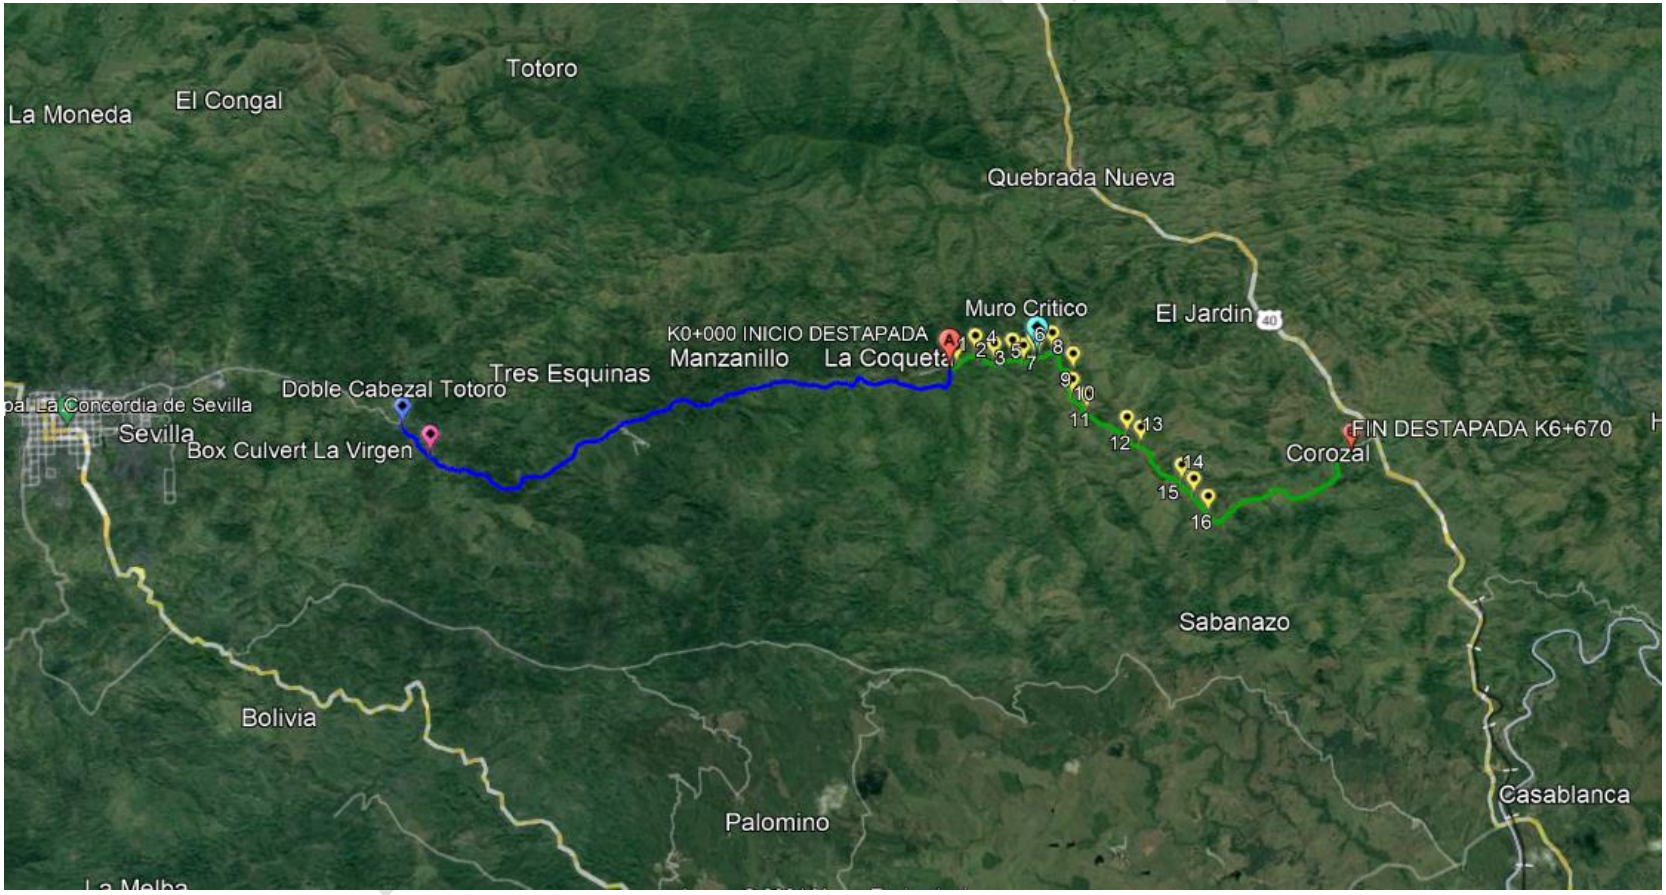

IV. INFORMACIÓN JURÍDICA

Se realizó la aprobación en comité operativo con número de acta No. 4, de fecha 17 de Mayo del 2024 , con el siguiente alcance 01 doble cabezal ubicado en la vía hacia manzanillo sector puente de Totoro, 01 box culvert ubicado en el sector de la virgen, más las obras complementarias de mencionada obra de arte, 02 muros de contención llamados muro crítico 1 y muro crítico 2 ubicados en la vereda el jardín, 16 alcantarillas con cabezal y disipador cada una y el material restante será destinado para cunetas y obras complementarias, el modificatorio del cambio del alcance del convenio STI-344-2023 de Sevilla – Valle del Cauca se efectuará una vez se entregue el paquete técnico avalado por el supervisor del convenio, en compañía de la Brigada de Ingenieros de Construcciones (BRCON) y el Comando de Ingenieros (COING) y el acompañamiento jurídico para la verificación y/o modificación del mismo, donde se apruebe entre las partes técnicamente el mismo por la necesidades presentadas, antes del 12 de junio del 2024.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
3550	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 872.786.910,00	12 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/07/23	12/10/23	$472.306.641,26
111487	SODEXO S.A.S	COMBUSTIBLE ACPM , COMBUSTIBLE GAL	$ 289.364.834	12 de Junio de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 87.303.992

BICONS

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
STI -391-2023	TRACTODIESEL	TALLER, GRASAS Y LUBRICANTES	$ 199.549.000	13 de octubre de 2023	12 de Junio de 2024	-	-		$ 121.464.000
113515	CENCOSUD COLOMBIA S.A - POLYFLEX - HAS LTDA-FERRICENTROS-PROVEEER INSTITUCIONAL SAS	PAPELERIA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	$ 5.334.800	12 de Julio de 2023	09 de Agosto de 2023	-	-		$ 32.439.785
113516			$ 5.001.979,00						
113517			$ 5.257.836,00						
113518			$ 5.315.560,00						
113519			$ 1.312.270,00						
124863			10.217.340						
STI 354	ALCALDIA DE SEVILLA - VALLE DE CAUCA	PROFESIONALES	$ 10.000.000,00	13 de octubre de 2023	30 de diciembre de 2023	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	25/07/23		$ 45.000.000
STI 375			$ 16.000.000,00						
STI 370			$ 8.000.000,00						
STI371			$ 8.000.000,00						
STI381			$ 12.000.000,00						
STI 490			$ 3.000.000,00						
STI - 2024 - 111			$ 10.500.000						
STI-2024-101	COMPAÑÍA COLOMBIANA GESTIÓN Y SERVICIOS	EQUIPO MENOR	$ 35.200.000,00	12 de Junio de 2023	30 de diciembre de 2023	-	-		$ 31.163.720
126924	INVESAKK SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	5.352.636	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 5.352.636

BICON52

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, SUMINISTRO Ó BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	EJECUTADO
126902	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	1.366.542	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 1.366.542
126894	FERRICENTROS	MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPAMENTO	12.119.989	04 de Abril de 2024	18 de Abril de 2024	-	-		$ 12.119.989

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BICON 52** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista del Convenio STI 344-2023 BICON 52 de acuerdo al concepto técnico:

CONTRATO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SALIDA TOTAL	QUEDA
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	VARILLA DE ACERO FIGURADO CORRUGADO N° 3-N°4 - N°6	KG	22817.60	2471	20346
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 ALAMBRE NEGRO	UND	1000.00	418	582
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	CEMENTO (TIPO PORLAND) X 50 KG	UND	4080.00	630	3450
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TUBERIA 24 PULG TUBERIA PARA AGUAS	UND	20.00	2	18
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	TRITURADO DE 1"	MTC	600.00	70	530
3550-2023 MATERIALES DE CONSTRUCCION	ARENA MEDIA	CMQ	600.00	62	538
OC-113519	ROLLO CINTA PELIGRO 500 MTS X 7.5CMS	UND	6.00	3	3
OC-113519	GUANTE CARNAZA-TELA WORK	UND	60.00	8	52
OC-113519	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UND	UND	3.00	3	0

BICON52

OC-113519	GAFAS SEGURIDAD POLIC NARASAFE	UND	30.00	8	22
OC-113519	TAPAOIDOS DESECHABLES X 6 PARES	UND	10.00	3	7
OC-113518	BARRA 18 LB	UND	4.00	4	0
OC-113518	ALMADANA 10 LB CON CABO	UND	2.00	2	0
OC-113518	BOTAS INDUSTRIALES PUNTA DE ACERO	UND	30.00	24	6
OC-113518	PALETA PARE Y SIGA XUND	UND	2.00	2	0
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 X 12	UND	6.00	6	0
OC-113517	PUNTILLA CON CABEZA DE 3 X 9	UND	6.00	6	0
OC-113517	CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	6.00	6	0
OC-113517	PALA REDONDA # 2 CON CABO	UND	5.00	5	0
OC-113517	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	UND	8.00	7	1
OC-113517	PALIN PALMERO SIN MANGO. MARCA COLIMA	UND	8.00	8	0
OC-113517	Anilina colores surtidos	UND	3.00	3	0
OC-113517	DECAMETRO DE 30MT EN FIBRA DE VIDRIO	UND	2.00	2	0
OC-113517	LLANA LISA METALICA MANGO MADERA	UND	4.00	4	0
OC-113517	PLASTICO NEGRO X 2MTS, POR METRO CUADRADO 50 CM	UND	100.00	100	0
OC-113517	MARCO DE SEGUETA 12" STANLEY	UND	6.00	6	0
OC-113517	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 30MT	UND	4.00	4	0
OC-113517	GUANTE VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO AMARILLO	PAR	60.00	33	27
OC-113517	COLOMBINA VIAL NARANJA DE 1.30 CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS ALTA INTENSIDAD	UND	6.00	6	0
OC-113517	Resma Reprograf de papel CARTA 75 gr	UND	10.00	5	5
OC-113517	Resma Reprograf de papel OFICIO 75 g	UND	6.00	4	2
OC-113516	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210	UND	1.00	1	0
OC-113516	COMPUTADOR EMPRESARIAL HP 400	UND	1.00	1	0
OC-113515	LAPIZ ROJO KORES CAJA X 12	UND	5.00	5	0
OC-113515	BOLIGRAFO BIC CRISTAL CON TAPA X12	UND	5.00	3	2
OC-113515	MARTILLO MAZO 8 OZ - T	UND	4.00	4	0
OC-113515	FLEXOMETRO ENCAUCHETADO 5MTR	UND	2.00	2	0
OC-113515	PALUSTRES 8 PUL MANGO MADERA	UND	4.00	4	0
OC-113515	LLANA DENTADA - T	UND	6.00	0	6
OC-113515	BARRERA O MALETA VIAL	UND	4.00	4	0
OC-113515	MARCADOR BORRABLE ERGONOMICO	UND	1.00	1	0
OC-113515	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PASTA DURA	UND	10.00	8	2
OC-113515	CONO No. 30CM POLIETILENO SPG	UND	6.00	6	0

BORRADOR

OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA S	UND	10.00	1	9
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA M	UND	10.00	10	0
OC-124863	OVEROL TIPO PILOTO 12 CREMALLERAS Y 8 BOLSILLOS TALLA L	UND	10.00	10	0
OC-124863	CASCO MILEMIUM FULL BRIM AMARILLO CON CINTAS REFLECTIVAS	UND	30.00	18	12
OC-124863	TAFILETE ARNES MILEMIUM RACHET	UND	30	0	30
STI-2024-101	CARPA DE 6 x 6	UND	2	2	0
STI-2024-101	CARPA DE 6 x 12	UND	1	1	0
STI-2024-101	LATERALES SIN VENTANAS, CERRADOS TOTALMENTE	UND	11	11	0
OC-126894	CABLE No. 10 AWG 600V 200C° X METRO	UND	100	100	0
OC-126894	CABLE No. 12 AWG 600V 200C° X METRO	UND	400	400	0
OC-126894	TELA NEGRA POLISOMBRA 80% 4MTS ANCHO X 100MTS	UND	1	1	0
OC-126894	INTERRUPTOR SENCILLO GALICIA BLANCO	UND	5	5	0
OC-126894	CABO MADERA PARA AZADON CORRIENTE	UND	3	3	0
OC-126894	APISONADOR MOTOR DIESEL	UND	1	1	0
OC-126894	SEGUETA DE MANO PARA METALES DE 12 X 18 DIENTES B	UND	20	20	0
OC-126894	PUNTILLA CABEZA DE 2. 1/2	UND	20	20	0
OC-126894	PUNTILLA CABEZA DE 1. 1/2	UND	20	20	0
OC-126902	YEE SANITARIA 3 X UND	UND	3	3	0
OC-126902	TUB. PRESION RDE 9-500 PSI 1/2 X UND	UND	30	30	0
OC-126902	CODO PRESION 90 1/2 X UND	UND	30	30	0
OC-126902	UNION CONDUIT 1/2 PULGADA X UND	UND	30	30	0
OC-126902	CINTA AISLANTE 3M X 5M	UND	3	3	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 4*6MT GERFOR 100147	UND	6	6	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 3*6MT GERFOR 100146	UND	4	4	0
OC-126924	TUBO VENTILACION 2*6MT GERFOR 100145 (ATADOS*10 UNID)	UND	4	4	0
OC-126924	BUJE SANITARIO 4*3 GERFOR 100580 UE(36)	UND	2	2	0
OC-126924	BUJE SANITARIO 4*2 GERFOR 100579 UE(36)	UND	2	2	0
OC-126924	CODO SANITARIO 90* 3 PULG DURMAN 2012852 (UE20)	UND	8	8	0

FOCONS2

OC-126924	CODO SANITARIO C*C 2 ECONOMICO PVCECO UE (200) AUROPLAST	UND	10	10	0
OC-126924	UNION SANITARIA 2 PULGADAS 2012873 (UE 45) DURMAN	UND	3	3	0
OC-126924	UNION SANITARIA 3 PULGADAS GERFOR 100606 (CAJA*36 UNID)	UND	3	3	0
OC-126924	UNION SANITARIA 4 PULGADAS 2012875 DURMAN (UE 24)	UND	3	3	0
OC-126924	VALVULA COMPUERTA PVC 1/2 STAN STANPROF (U.E. 144)	UND	10	10	0
OC-126924	TOMA CILES DOBLE SOBRE PONER BLACA (UE 40) (UE120) 44015	UND	5	5	0
OC-126924	TUBO CONDUIT 1/2 * 3MTS DURMAN (UE 1) 2016185	UND	10	10	0
OC-126924	LLAVE TERMINAL PVC 1/2*3/4 BLANCA AKKUA LINE (UE=200)	UND	20	20	0
OC-126924	CURVA CONDUIT 1/2 * 90 C*E GERFOR 100427 UE(100)	UND	10	10	0
OC-126924	SOLDADURA PVC 1/4 DURMAN 2030641	UND	2	2	0
OC-126924	LIMPIADOR PVC-CPVC 1/8 GERFOR 101041 UE(24)	UND	1	1	0
OC-126924	TEJA ONDULADA METALUM C-35 80CM *3.048MTS PESO 3.048KG ACESCO	UND	30	30	0
OC-126924	REFLECTOR LED 50W BLANCA LUZ DIA 6500K MEGAWATT 30000H 75-8OL W-T6004-3-50/RF-008 (U.E.:20)	UND	4	4	0
OC-126924	AMARRE C / PLASTICO C18 UNIDAD PARA TEJAS ETERNIT	UND	197	197	0
OC-126924	BOMBILLO SYLVANIA TOLEDO LED HW 30W 6.5K E27 100-240V 2380LM *UNIDAD P24892-19 UE10	UND	10	10	0
OC-126924	SANITARIO LAGUNA BLANCO C/ASIENTO CORONA REF 340011001 CAMBIO 340021001	UND	2	2	0
OC-126924	LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL BLANCO CORONA	UND	2	2	0
OC-126924	TUBO SANITARIO LIVIANO 6` DURMAN 2020072	UND	1	1	0
OC-126924	DISCO CORTE METAL 7*1/8*7/8 STANPROF	UND	20	20	0
OC-126924	AZADON FORJADO 4230-30 SIN CABO 242MM*100MM HERRAGRO	UND	3	3	0
OC-126924	PUNTILLA ACERO ESTRIADA 2 1/2 CORSAN	UND	20	20	0
OC-126924	PUNTILLA ACERO ESTRIADO 1 1/2 CORSAN	UND	20	20	0

PROYECTO

OC-126924	MARTILLO PULIDO M/MADERA 32 75150132 MARTILLO PULIDO	UND	2	2	0
OC-126924	MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE 1/4` *100MTS BORO	UND	1	1	0
OC-126924	MACHETE BARRIGON PULIDO 22` HERRAGRO T1214160020 UE(36)	UND	8	8	0
OC-126924	GUANTE TIPO INGENIERO (UE12)	UND	30	30	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. OLP-014	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. FLP-340	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO REF. FLP-317	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. AIP-543	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA TRACCION 7,5 R 15 122-118 REF. 12R22.5	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA DIRECCION REF. 7,5 R 15 122-118	UND	4.00	0	4
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT8850-MPG	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7557	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF1365 REF. P550904 - BF1365	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO DA2570 REF. P828889 - RS3544	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO DA4570 REF. P829333 - RS3545	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO B7328 REF. B163	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	BATERIA 31H REF. 31H1250	UND	13.00	7	6
STI-391-2023 (TALLER)	AUTOMATICO AUXILIAR ARRANQUE HELLA REF. 101011505	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	MOTOR DE ARRANQUE DELCO REMY REF. KB1214	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BT7237	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. FS1251-BF1226	UND	3.00	1	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF7922	UND	2.00	1	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (RETROEXCAVADORA)	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (RETROEXCAVADORA)	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO P569206 REF. PT91	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA CILINDRO DIRECCION CNH REF. 34056500	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA BOOM CNH REF. SK210-8 BO	UND	1.00	0	1

FO-JEMGF-COING-986

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE BD7154 REF. P559000- BD7154	UND	3.00	2	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO TIPO CARTUCHO PF7748 REF. FS19624-PF7748	UND	2.00	1	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO REF. RS4862	UND	3.00	2	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS4863	UND	2.00	1	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO REF. B5134	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	DISCO DE EMBRAGUE 14" REF. 20121445	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. BT339	UND	2.00	1	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. PA2836- P776696	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO BT9422 REF. 1R-0722	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 14.00-24 PN 14 G2/L4 REF. 1400X24LL	UND	4.00	2	2
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF587-D REF. P550587-BF7772	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO A-1204SP REF. 26460201-4816636	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO 21905023 REF. 22777449-PA4997	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO P553004 REF. BF988-P553004	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	PASTILLA FRENO DE PARQUEO CNH REF. 2799	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE P502465 REF. B7350	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. P551313-BF970	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS3544 REF. P828889 - RS3544 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO RS3545 REF. P829333 - RS3545 (VIBROCOMPACTADOR)	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	RERPARACION SISTEMA ELECTRICO REF. 2446521	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE 02/600888 REF. 23047	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF7141 REF. PM1730SP	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF4029 REF. 23142	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO RS7170 REF. RS30223	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF. RS32 REF. RS30224	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO HIDRAULICO 2611/00281 REF. PT9424	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO ACEITE REF. B76	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF. BF7814	UND	1.00	1	0

FIRMADO

STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO 2020MP-OR REF. 23046	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AIRE PRIMARIO 180521 MACK REF. 2277448-CA4996	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF1277-SPS REF. BF1272-SPS	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO TIPO CARTUCHO PF7748 BALDWIN REF. FS19624-PF7748	UND	1.00	1	0
STI-391-2023 (TALLER)	FILTRO AGUA AW- 2127 REF. A-5813SP	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	FITRO AIRE PRIMARIO R 1963 REF. 23036	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE HIDRAULICO ISO 68	GAL	88.00	1	87
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE MOTOR 15W40 GALON	GAL	65.00	20	45
STI-391-2023 (TALLER)	GRASA KP 2 G 40 (EP2)	LB	17.00	1	16
STI-391-2023 (TALLER)	ACEITE 80W90	GAL	6.00	0	6
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION BOMBA DE INYECCION	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION MODULO DE MOTOR	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	LLANTA 305/70-16.5	UND	2.00	0	2
STI-391-2023 (TALLER)	EMPAQUETADURA MARTILLO HIDRAULICO CHN	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	REPARACION EXOSTO KRTV279	UND	1.00	0	1
STI-391-2023 (TALLER)	BUJIA BP6EXMAX	UND	2.00	0	2

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO STI 344-2023

A la fecha se ha facturado lo siguiente por parte de la Alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Pago Orden de Compra No. 113515 y Nota Debito No. D-402-4, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	16/11/2023	$ 5.334.800,00
PAGO No. 2	Pago Orden de Compra No. 113516, en relación a cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	17/11/2023	$ 5.001.979,00
PAGO No. 3	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	22/12/2023	$114.417.087,02

BICON2

PAGO No. 4	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 10.000.000,00
PAGO No. 5	Prestación de servicios como topógrafo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla - valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12/2023	$ 16.000.000,00
PAGO No. 6	Prestación de servicios como profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	27/12//2023	$ 8.000.000,00
PAGO No. 7	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	28/12/2023	$ 183.368.974,25
PAGO No. 8	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 12.775.000,00
PAGO No. 9	Suministro de repuestos, filtros, grasas y lubricantes para la maquinaria pesada y el parque automotor puesto a disposición por el comando de ingenieros y el BICON52	02/01/2024	$ 66.309.000,00
PAGO No. 10	Prestación de servicios como mecánico de maquinaria pesada en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 8.000.000,00
PAGO No. 11	Adquisición de productos de ferretería con el fin de realizar obras en la vía de manzanillo corozal	04/01/2024	$ 196.804.614,09

BICON52

PAGO No. 12	Prestación de servicios como maestro de obra en cumplimiento de los estipulado en el plan de necesidades del convenio STI-344-2023 suscrito entre el municipio de Sevilla -valle del cauca y el ministerio de defensa- ejército nacional- comando de ingenieros- brigada de ingenieros de construcciones- batallón de ingenieros No. 52 a través de la central administrativa y contable- CENAC de ingenieros con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial	04/01/2024	$ 3.000.000,00
TOTAL			**$ 629.011.454,36**

A la fecha está pendiente por realizarse los siguientes pagos:

No.	CONTRATO	CONCEPTO	FACTURA	VALOR
1	OC 113517, 113518, 113519	Pago Orden de Compra No. 113517, 113518, 113519, en relación al cumplimiento del Plan de Necesidades del Convenio STI 344 de 2023	OC 113517, 113518, 113519	$ 11.885.666,00
2	OC 111487	Combustible ACPM, combustible GAL	OC 111487	$ 289.364.834,00
3	CONVENIO	50% DEMERITO Y DESGASTE	DE ACUERDO A CONVENIO	$131.714.285,72
4	OC 124863	Pago Orden de Compra No. 124863 Overoles y Cascos	OC 124863	$10.217.340,00
5	STI-2024-101	Suministro de carpas	STI-2024-101	$ 31.163.120
6	STI-2024-110	Arriendo de Formaletas Metálicas	STI-2024-110	$13.245.068
7	STI - 2024 - 111	Pago mecánico	STI - 2024 - 111	$ 10.500.000
TOTAL				**$498,090,313.72**

BION52

4. BALANCE CONTRACTUAL

	FECHA	VALOR
Valor Total Convenio	12/10/2023	$ 2.710.935.883,00
Valor disponible obra	31/05/2024	$ 505.834.529,88
Valor comprometido	31/05/2024	$1,549,820,799.00
Valor por comprometer	31/05/2024	$350,179,201.00
Total, Contratos	31/05/2024	$1.900.000.000,00

VI. INFORMACIÓN TÉCNICA

Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- Se realiza reunión de Comité Operativo N° 4con fecha 16 de mayo del 2024, en la cual se exponen 2 propuestas de ejecución, la primera con la construcción de un doble cabezal, un box culvert, una alcantarilla, mantenimientos varios sobre la vía y devolver material restante; se suspende Comité Operativo para darle continuidad el día 17 de mayo del 2024.

- Se realiza reunión de Comité operativo N° 4 con fecha 17 de mayo del 2024, en la cual se aprueba un nuevo alcance con las siguiente especificaciones así, 01 doble cabezal ubicado en la vía hacia manzanillo sector puente de Totoro, 01 box culvert ubicado en el sector de la virgen, más las obras complementarias de mencionada obra de arte, 02 muros de contención llamados muro crítico 1 y muro crítico 2 ubicados en la vereda el jardín, 16 alcantarillas con cabezal y disipador cada una y el material restante será destinado para cunetas y obras complementarias

- Se proyecta el Balance Financiero por parte del Supervisor de la Alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca de la siguiente manera, teniendo en cuenta que ya avalado el paquete técnico y las memorias de cálculo se debe realizar un reajuste para la contratación de materiales de construcción y demás necesidades que para la culminación satisfactoria del convenio de acuerdo a lo estipulado en el comité operativo No. 4 del 17 de Mayo del 2024, realizado en las instalaciones de la Alcaldía sin afectar el prepuesto inicial.

BALANCE PRESUPUESTAL CONVENIOS STI 344-2023			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRESUPUESTO NUEVO ALCANCE**	**PRESUPUESTO ALCANCE INCIAL**
1	**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**	$ 915.105.377	$ 886.561.944

2	**COMBUSTIBLE**	$ 289.364.834	$ 289.364.833
3	**EQUIPO MENOR**	$ 102.982.556	$ 35.200.000
4	**TALLER**	$ 199.549.000	$ 212.961.598
4	**PAPELERIA**	$ 5.001.979	$ 4.721.307
5	**PROFESIONALES**	$ 71.500.000	$ 41.000.000
6	**HERRAMIENTO MENOR**	$ 31.422.522	$ 11.726.440
7	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	$ 16.845.160	$ 18.970.000
8	**SERVICIOS PUBLICOS**	$ 4.800.000	$ 4.800.000
9	**DEMERITO Y DESGASTE**	$ 225.795.918	$ 225.795.918
10	**ADMINISTRACIÓN**	$ 37.632.653	$ 37.632.653
11	**IMPREVISTOS**	$ 0	$ 75.265.306
12	**IMPUESTOS**	$ 0	$ 50.000.000
13	**POLIZAS**	$ 0	$ 6.000.000
	COSTO TOTAL	**$ 1.900.000.000**	**$ 1.900.000.000**

- Se continúan las actividades de obra en frente de alcantarilla de doble cabezal, dejando esta obra en un 98%, en razón a que no se puede compactar con material de subbase hasta que el concreto no alcance su máxima resistencia después de 28 días.

- Se continúan las actividades de obra en el frente del Box culvert ubicado en el sector de la virgen, con un avance del 70 % sobre los diseños entregados.

- Se continúan las actividades de obra en frente de alcantarilla de la cuchilla, con un avance de obra del 50%.

- **% EJECUTADO CONVENIO= 19,18%**
- **% PROYECTADO = 14,44%**
- **% ATRASO= 0**

- **VR. A JECUTAR = $1.900.000.000,00**
- **VR. EJECUTADO = $ 697,575,131.30**
- **% EJECUTADO = 36,71%**

BICON

PROGRAMACIÓN DE OBRA CONVENIO STI-344-2023 (PROGRMACIÓN – PDF ALCALDIA)

ESCALA DE T

Hoy

ene '24 | feb '24 | mar '24 | abr '24 | may '24 | jun '24 | jul '24 | ago '24 | sep '24 | oct '24

Comienzo lun 4/12/23 — Agregar tareas con fechas a la línea de tiempo — Fin sáb 19/10/24

DIAGRAMA DE GANTT

	Nombre de tarea	UN DE ME	CANTI	CANT EJECU	Duración	Comienzo	Fin	Prede	% PRO	% EJEC	% compl	CPTP	CPTR
1	CONVENIO SEVILLA VALLE DEL CAUCA STI 344-2023				224,25 días	lun 4/12/23	sáb 19/10/24		100	26,99	32%	$ 946.767.363,80	$ 255.549.19
2	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y DE CONTENCIÓN				224,25 días	lun 4/12/23	sáb 19/10/24		100	26,99	32%	$ 946.767.363,80	$ 255.549.
3	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE DOBLE CABEZAL TOTORO K0+050				105,63 días	lun 4/12/23	jue 2/05/24		100	100	100%	$ 34.865.609,16	$ 34.865.609
21	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT LA VIRGEN K0+500 + OBRAS COMPLEMENTARIAS				172 días	vie 16/02/24	sáb 19/10/24		100	60,76	62%	$ 209.266.734,11	$ 127.157.37
58	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 1				20 días	mié 15/05/24	mié 12/06/24		100	100	100%	$ 22.281.221,70	$ 22.281.22
74	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 2				20 días	jue 16/05/24	jue 13/06/24		100	100	100%	$ 22.281.337,23	$ 22.281.337
90	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 3				20 días	jue 16/05/24	jue 13/06/24		100	100	100%	$ 22.282.693,23	$ 22.282.693
106	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 4				19 días	mié 12/06/24	mar 9/07/24		100	59,4	65%	$ 22.283.182,57	$ 13.236.180
122	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 5				19 días	jue 13/06/24	jue 11/07/24		100	60,33	60%	$ 22.284.049,23	$ 13.444.779
138	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 6				19 días	jue 13/06/24	jue 11/07/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
154	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 7				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
170	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 8				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
186	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 9				20 días	mié 10/07/24	mié 7/08/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
202	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 10				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
218	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 11				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
234	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 12				20 días	mié 7/08/24	jue 5/09/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00
250	CONSTRUCCION ALCANTARILLA N° 13				20 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24		100	0	0%	$ 22.284.049,23	$ 0,00

VII. EVIDENCIAS VISUALES

RESEÑA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN
	COMITÉ OPERATIVO CON NUMERO DE ACTA XXXXX DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2024, EN DONDE SE APRUEBA NUEVO ALCANCE Y SE DA PRORROGA DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.
	ALCANTARILLA DOBLE CABEZAL CON UN 98% DE EJECUCIÓN, SE REALIZA UN SELLADO DE MATERIAL, SE DEBE ESPERAR QUE EL CONCRETO ALCANCE LA RESISTENCIA MÁXIMA PARA PODER COMPACTAR DESPUÉS DE LOS 28 DÍAS DE FUNDIDO.

BORRADOR

	BOX CULVERT TIENE UN AVANCE DEL 70% SOBRE EL DISEÑO INICIAL, EL CUAL CON LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PROYECTARAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GESTIÓN DEL RIEGOS PARA QUE SE ESTA INTERVINIENDO..
	ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE LA CUCHILLA CON UN AVANCE DE OBRA DEL 50%.

COING2

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Al momento la población de las veredas Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín y Corozal de Sevilla Valle del Cauca nuevamente han retomado la ilusión por la reactivación en la ejecución de las obras sobre la vía que va de Sevilla a Corozal.
- Para el mes de mayo se mantuvo 02 frentes de obra con cuadrillas de 08 soldados de mano no calificada.
- Se realiza acta, donde se socializa charla con la comunidad y líderes sociales de la vereda, en compañía de la alcaldía y demás entidades directamente implicadas.



NOTA: Reunión llevada a cabo en el punto de intervención llamado box culvert en el sector de la virgen.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- La alcaldía solicito la estructuración y aval a través de un informe de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), cuyo objetivo fue emitir el concepto técnico ambiental sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento entre la vereda de la cuchilla y la vereda corozal, Municipio de Sevilla – Valle del Cauca” donde se manifiesta dentro de la consideración que la actividad NO requiere de trámite de un permiso o autorización, ya que se encuentra expresamente normalizado, ya que no tiene algún procedimiento especial por lo que el concepto técnico ambiental a emitir es fundamentado de manera general en las competencia otorgadas en el decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. La alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca a través del Secretario de Transito e Infraestructura realizó una

certificación el 30 de agosto del 2023, donde se evidencia que manifiesta que no se requieren permisos de ocupación de cause por parte de la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

- Mediante documento de radicado 0733-146992024 del 13 de febrero del 2024, emitido por la CVC, coordenadas geográficas 4° 17’ 57,56’’ de Latitud Norte y 75° 55’ 44,32’’ de longitud Oeste y 4° 18’ 06,72’’ de latitud Norte y 75° 55’ 32.98’’ de longitud Oeste, correspondientes a las ABS K0+050 y K0+500 Alcantarilla De doble cabezal y Box Culvert respectivamente, se emite concepto en el cual manifiestan que “*se considera ambientalmente viable la construcción de las obras de drenaje para el manejo de las aguas lluvias de escorrentía, tales como una alcantarilla de doble cabezal… un box culvert… por considerar que las actividades a realizar ocasionaran un impacto ambiental bajo. Igualmente se considera ambientalmente viable la construcción de las 24 alcantarillas a lo largo de la vía y las cunetas para el manejo de las aguas lluvias”*
- Se solicita a la CVC la erradicación de un árbol ubicado en las coordenadas 4°18.07.55"N - 75°55'32.95"W, lugar en el que se construirá el Box Culvert, ABS K0+500 por riesgo de volcamiento sobre talud por perdida de banca de la vía y riesgo de afectación a la infraestructura de una vía carreteable del municipio, quien mediante Documento de radicado 0733-208512024 del 5 de marzo del 2024, emitido por la CVC, manifiesta *“…teniendo en cuenta lo anterior, se considera viable autorizar la erradicación del árbol…”*
- Se recibe la visita de la CVC el día jueves 23 de mayo en el punto de intervención llamado Box culvert en el sector de la virgen, debido al riesgo en sitio con el desprendimiento del talud existente sobre la parte superior de la obra, realizan las recomendaciones para intervenir el talud y retirar la capa vegetal existente, sin embargo, aún se espera informe técnico de la visita de campo donde aprueban la intervención por parte de la corporación.

- La Alcaldía es la responsable de los tramites ambientales y a su vez debe dar cumplimiento de los mismos en los frentes de obra para la construcción de las obras de arte, obras de contención y campamento los cuales deben ser tramitados que ante la CVC.

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS

ACTA N°	FECHA	TEMA	CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO	OBSERVACIONES
2024544005610736	21/05/2024	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12	omitido

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTO ENTREGADO	FECHA	CANTIDAD	PERSONAL QUE RECIBE EPP	TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)	OBSERVACIONES

CASCO	-	20	SOLDADOS (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)	PRIMERA VEZ	OMITIDO
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
No se reportan accidente	omitido	omitido	omitido	omitido	omitido

NOTA: La unidad ejecutora ha realizado la salvedad y la solicitud en reuniones del uso de elementos de protección personal para trabajos en alturas (arnés, cinturón, puntos de anclaje, líneas de vida, silletas y guindolas, salva caídas) de acuerdo a resolución 4272 de 2021. sin tener respuesta por parte de la alcaldía de Sevilla Valle del Cauca.

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Se debe tener la trazabilidad y seguimientos a los compromisos adquiridos en el comité operativo N° 4 de fecha 17 de mayo del 2024 para poder cumplir con las fechas estipuladas en el documento.

2. Se solicita por parte del supervisor del convenio el seguimiento y recomendación del **GEOTECNISTA** para las actividades constructivas en el BOX CULVERT. (DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA, RECOMENDACIONES). Ya que este frente se encuentra a un 70 % de avance de obra, ya que en compromisos adquiridos en el comité el 10 de junio del 2024 se deben aterrizar las ingenieras de acuerdo a lo que sea suministrado por el supervisor del convenio de la Alcaldía de Sevilla – Valle del Cauca.

3. Teniendo en cuenta la solicitud por parte de la Alcaldía der Sevilla – Valle del Cauca mediante oficio **N° S-2071 de fecha 30 de mayo del 2024** el supervisor del convenio junto con la BRCON y el COING se encuentran realizando los trámites administrativos, técnicos y jurídicos para llevar a cabo la modificación y prórroga del convenio.

XII. CONCLUSIONES

1. Se realizó el comité operativo con número de acta de comité operativo N° 4 de fecha 30 de mayo del 2024 donde se aprobó el nuevo alcance del convenio, donde se discriminan las siguientes actividades y compromisos a entregar el 20 de octubre del 2024 así, 01 doble cabezal ubicado en la vía hacia manzanillo sector puente de Totoro, 01 box culvert ubicado en el sector de la virgen, más las obras complementarias de mencionada obra de arte, 02 muros de contención llamados muro crítico 1 y muro crítico 2 ubicados en la vereda el jardín, 16 alcantarillas con cabezal y disipador cada una y el material restante será destinado para cunetas y obras complementarias, y de no cumplir con estos compromisos se realizará acta de devolución de los materiales de

construcción y la entrega de las obras y parte administrativa del convenio a la fecha, Por lo anterior a la fecha se están realizando los trámites para la modificación y prórroga del convenio

2. La Alcaldía es la responsable de los tramites ambientales y a su vez debe dar cumplimiento de los mismos en los frentes de obra para la construcción de las obras de arte, obras de contención y campamento los cuales deben ser tramitados que ante la CVC.
3. Una vez sea firmado el modificatorio del convenio STI 344- 2023 de Sevilla – Valle del Cauca, se dará inicio a la reprogramación de obra avalada por el supervisor del convenio.

XIII. RECOMENDACIONES

Omitido

FIRMAN:



FIRMA _____

Mayor GERMAN ALBEIRO QUEVEDO GARCÍA
Ejecutivo y Segundo comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52
Supervisor Convenio Interadministrativo STI - 344 -2023



Teniente CAMILO MAHECHA ESPARZA
Oficial Coordinador de Ingenieros BICON 52



Subteniente ORDOÑEZ HERNANDEZ JOHAN
Ingeniero Residente de Obra Convenio STI - 344 -2023

BICON52
