
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Convenio No. 20233707
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo No. 20233707
FECHA DEL INFORME	01 de Julio de 2023 al 31 de Julio de 2023
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. German Albeiro Quevedo García** Supervisor Convenio Interadministrativo No.20233707
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo No. 20233707
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Pasto Brigada de Ingenieros de Construcciones Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 “General. Francisco Tamayo Cortes”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, entre el municipio de Pasto y el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Comando de Ingenieros – Brigada de Ingenieros de Construcciones – Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC – ING, con el fin de realizar mantenimiento y mejoramientos en la vías urbanas y rurales de la ciudad de San Juan de Pasto – Nariño”.
CANTIDAD A EJECUTAR	Mantenimiento y reparación estructura pavimento rígido y flexible (Longitud 1078,7 m), intervención vías rurales Longitud (77,800 m).
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” (BICON52)
POBLACION BENEFICIADA	Pendiente Certificado de Población Beneficiada

FECHA DE SUSCRIPCION	27 de Junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.637.247.844,00 millones de pesos
FECHA DE ACTA DE INICIO	No presenta Acta de Inicio
FECHA DE ENTREGA	31 de diciembre 2023
MODIFICATORIOS	Ninguno

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

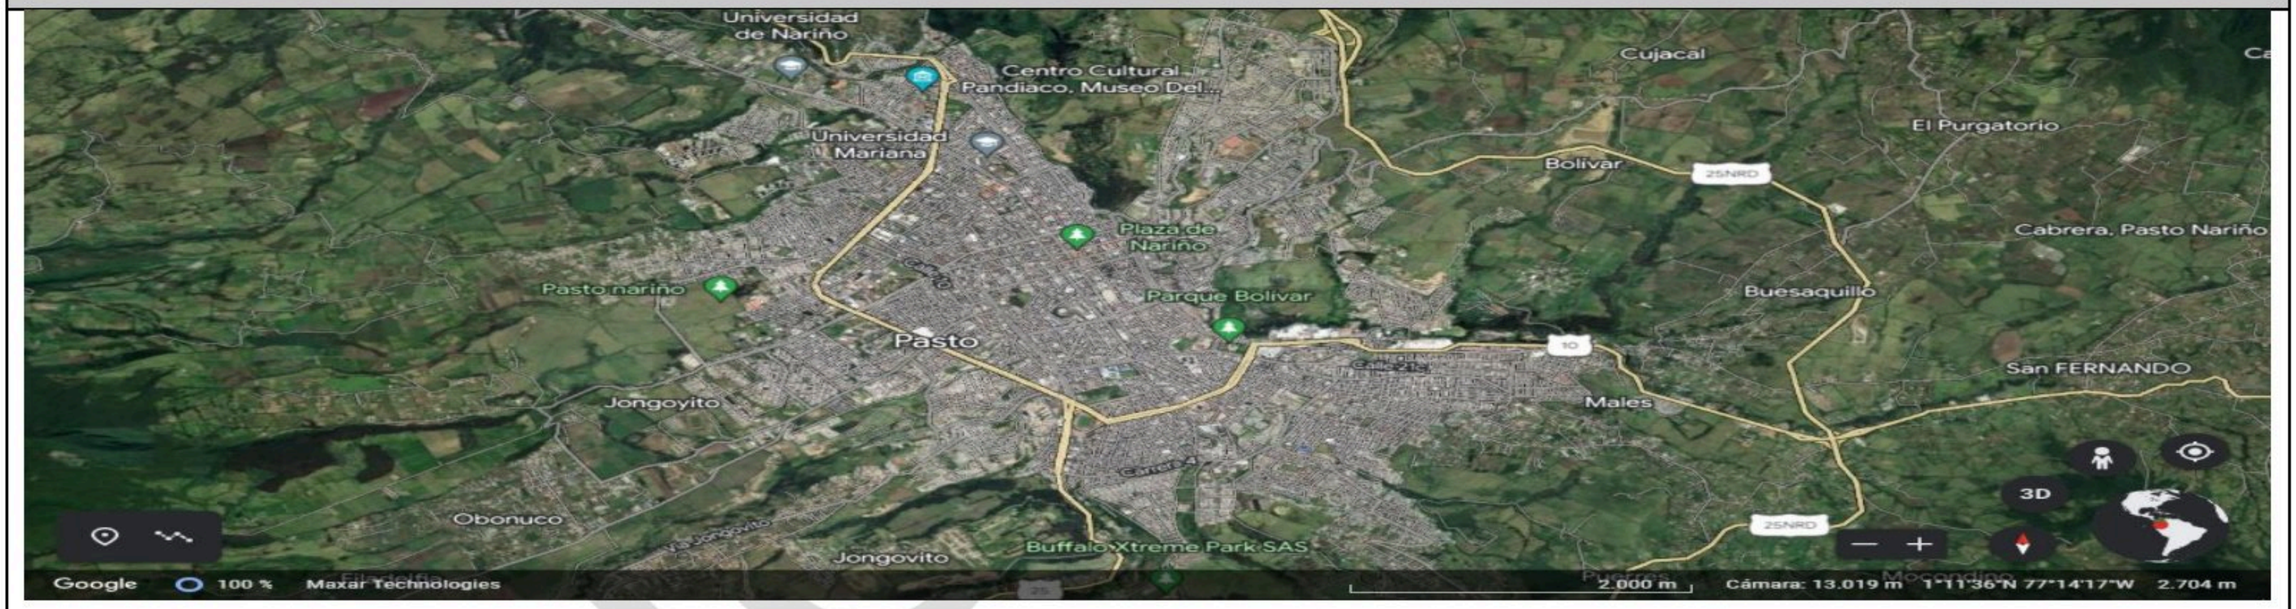

IV. INFORMACION JURIDICA

Se está realizando en acompañamiento de la Brigada de Ingenieros de Construcciones (BRCON) y la CENAC ING el acompañamiento jurídico para la verificación y/o modificación de la póliza de cumplimiento, para que sea remitida a la Alcaldía de Pasto y posteriormente se realicé la firma y continúen con el acto de la firma del ACTA DE INICIO.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

1. Plan de Compras
2. Presupuesto
3. CDP No.2023001426, CDP No.2023001448, CDP No.2023001099, CDP No.2023001445, CDP No.2023001453

N°	COMPONENTE	VALOR TOTAL 2023	VALOR EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTADO
1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$ 780.000.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
2	ALQUILER DE FORMALETA	$ 4.578.350	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
3	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	$ 59.230.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
4	COMBUSTIBLE Y EQUIPO MENOR	$ 99.337.200	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
5	GRASAS Y LUBRICANTES	$ 44.666.800	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
6	RESPUESTOS Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA EJERCITO	$ 115.924.500	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
7	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	$ 23.385.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
8	PAGO DE ESCOMBRERA DISPOSICIÓN FINAL	$ 9.935.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN

9	MATERIALES SEGURIDAD VIAL	$ 37.533.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
10	PAPELERIA Y EQUIPO	$ 3.620.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
11	CONTRATACIÓN APOYO TECNICO MAESTRO Y MECANICO	$ 14.400.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN
12	PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION	$ 36.000.000	$ 0.00	0	PENDIENTE ADJUDICACIÓN

APROPIACIÓN VIGENCIA 2023

DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO No. 20233707

1. **BALANCE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% DE AVANCE
COSTOS PLAN DE NECESIDADES	$1.228.982.572,61	$ 0	$ 0	0,0%
DEMERITO Y DESGASTE	$184.347.385,89	$ 0	$ 0	0,0%
IMPREVISTOS	$36.869.477,18	$ 0	$ 0	0,0%
VALOR TOTAL CONVENIO	$2.637.247.844,00	$ 0	$ 0	0,0%

2. **ESTADO DE CONTRACION DE PLAN DE NECESIDADES VIGENCIA 2023**

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía municipal de Pasto, realizar la publicación de todos los contratos derivados del convenio

3. **ESTADO DE DEMERITO Y DESGASTE**

No se ha efectuado acta de inicio

4. **ESTADO DE IMPROVISO**

No se ha efectuado acta de inicio

BIOSEGURO

5. MENCIONAR SITUACION ESPECIAL DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DEL TRANSPORTE

No se ha efectuado acta de inicio

VI. INFORMACIÓN TECNICA

Para el presente mes el Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 “Gral. Francisco Tamayo Cortes” realizó las siguientes actividades:

- No se han ejecutado actividades técnicas, a raíz de que no se ha efectuado el Acta de Inicio.

LINEA DE TIEMPO CONVENIO: pendiente aprobación reprogramación de obra y prórroga del convenio

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No.	Actividad			Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5			
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20
I.	PLAN DE COMPRAS																						
II.	INTERVENCIÓN VIAS URBANAS																						
No.	Comuna/Corregimiento	Barrio/Vereda	Dirección																				
1	1	Bomboná	Calle 14 30a 55																				
2	1	Bomboná	Calle 14 entre carreras 30 A y 31																				
3	1	Bomboná	Calle 14 Unad Bombona																				
4	1	Centro	Calle 14 26-72 centro																				
5	1	Centro	Calle 15 26-91																				
6	1	Centro	Calle 17 con carrera 22 (La Merced)																				
7	1	Centro	Calle 17 con carrera 24																				
8	1	Centro	Calle 17 con cra 22																				
9	1	Centro	Calle 18 con carrera 22 esquina																				
10	1	Centro	Calle 19 entre 218 y 22																				
11	1	Centro	Calle 21 29-04 Las Cuadras																				
12	1	Centro	Carrera 22 entre calles 15 y 16																				
13	1	Centro	Carrera 22 entre calles 17 y 18																				
14	1	Centro	Carrera 24 con calle 17																				
15	1	Centro	Carrera 26 entre calles 18 y 19																				
16	1	Centro	Carrera 26 entre calles 20 y 21																				
17	1	Centro	Intersección carrera 26 con calle 18																				
18	1	Las Cuadras	Calle 21 entre 27 y 28																				
19	1	Centro	Calle 17 con carrera 24																				
20	1	Santiago	Calle 13 entre 23 y 24																				
21	1	Santiago	Carrera 23 entre calle 10 y 11																				
22	1	Santiago	Carrera 23 entre calles 12 y 13																				
23	2	Av Julian Buchelli	Carrera 16 A calle 12 - 11 coliseo																				
24	2	Av Julian Buchelli	Carrera 16 A calle 12 - 11 coliseo																				
25	2	Fátima	Calle 18 A # 12 -43 fatima																				
26	2	Fátima	Calle 18 con carrera 14																				
27	2	Las Americas	Carrera 12 calle 16 - 17 fatima																				
28	2	Navarrete	Carrera 16 calle 17 - 16b centro																				
29	2	Navarrete	Carrera 16 calle 17 - 16b centro																				
30	2	Navarrete	Carrera 16 calle 18 - 18 centro																				
31	2	San Miguel	Carrera 13 calle 11 - 12 fatima																				
32	4	Betania	calle 19 B entre carrera 3E, 4E																				
33	6	Chapal II	Clle 12 enrtre CR 9 CR 10 Estadio																				
34	7	Capusigra	Carrera 22 E entre calles 2 y 4																				
35	7	Capusigra	Carrera 23 A entre calles 2 y 3																				
36	7	Capusigra	Cruce Exito panamericana con x 22b																				
37	7	Capusigra	Cruce Exito panamericana con x 22b																				
38	7	Capusigra	Cruce Exito panamericana con x 22b																				
39	7	Capusigra	Cruce Exito panamericana con x 22b																				
40	7	Cresemillas	Cruce panamericana con x 27																				

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

				Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5			
No.	Actividad			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20
2	MOCONDINO	Mocondino Centro	Mocondino a IEM Ciudadela																				
3	BUESAQUILLO	Buesaquillo Centro	Busaquillo Centro a Cujacal																				
4	MORASURCO	Morasurco Centro	Daza a Pinazaco																				
5	MAPACHICO	Mapachico Centro	Hospital San Pedro a Genoy																				
6	MAPACHICO	Mapachico Centro	Anganoy a Los Lirios																				
7	OBONUCO - CATAMBUCO	Obonuco - Catambuco	Barrio Las Palmas a Centro Poblado Catambuco																				
8	CATAMBUCO	Catambuco Centro	Granja UdeNar a Cruz de Amarillo																				

A la fecha se lleva:

PROYECTO CONVENIO PASTO 20233707

Presupuesto: **$ 2.637.247.844,00**

Programado General: 100%
Ejecutado General: 0%
Atraso o avance general: 0%

ACTIVIDADES DE OBRA	ALCANCE	EJECUTADO MES	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO	% AVANCE
Mantenimiento y reparación estructura pavimento rígido y flexible (Longitud 1078,7 m),	1 km	0,0%	0,0%	100%	0,0%

Intervención vías rurales Longitud (77,800 m).	77,8 km	0,0%	0,0%	100%	0,0%

VII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se encuentra pendiente realizar con la alcaldía municipal de Pasto las actas de vecindad con respecto a los tramos a intervenir del convenio

VIII. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

La alcaldía municipal de Pasto manifiesta que NO es necesario ningún permiso ambiental, por lo cual se solicitó a la alcaldía un medio por el cual respalden dicha decisión.

FIRMA _____
Mayor GERMAN ALBEIRO QUEVEDO GARCÍA
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52
Supervisor Convenio Interadministrativo **No. 20233707**

Subteniente. HERNÁNDEZ FAUSTO STIVEN
Oficial Técnica BICON52

Teniente. MAHECHA ESPARZA CAMILO
Oficial Coordinador de Ingenieros BICON52

Mayor. CEPEDA SANCHEZ DIEGO
Oficial de Operaciones BICON 52

BICON52
